


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	0.VIII 18	27.VIII 18	03.IX 18	10.IX 18	17.IX 18	24.IX 18	01.X 18	08.X 18	15.X 18	22.X 18	29.X 18	05.XI 18	12.XI 18	19.XI 18	26.XI 18	
1		Vybudování kavárny v nebytových prostorech	60 dny	01.10. 18	25.11. 18																
2		převzetí staveniště	1 den	01.10. 18	01.10. 18																
3		přípravné práce	5 dny	02.10. 18	06.10. 18																
4		bourací práce	9 dny	06.10. 18	14.10. 18																
5		práce HSV	23 dny	15.10. 18	05.11. 18																
6		rozvody VZT, elektro, zdravotnicka, vytápění	20 dny	19.10. 18	06.11. 18																
7		dokončovací práce	8 dny	06.11. 18	13.11. 18																
8		malby, úklidy	5 dny	14.11. 18	18.11. 18																
9		úklidy	3 dny	18.11. 18	21.11. 18																
10		zahájení přejímky	1 den	21.11. 18	22.11. 18																
11		dokončení přejímky	1 den	25.11. 18	25.11. 18																

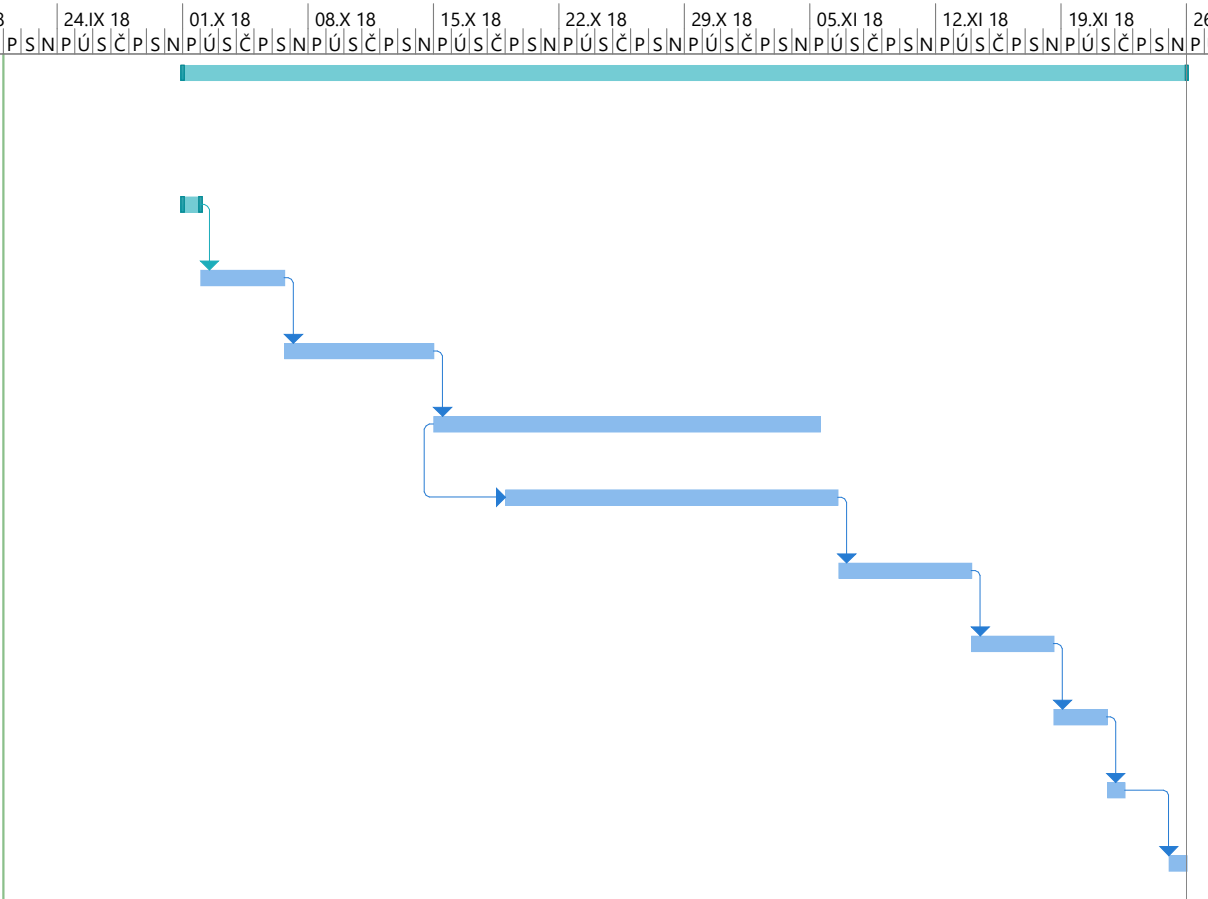

Projekt: HMG Kavárna Sokolovs Datum: 21.09. 18	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			
