


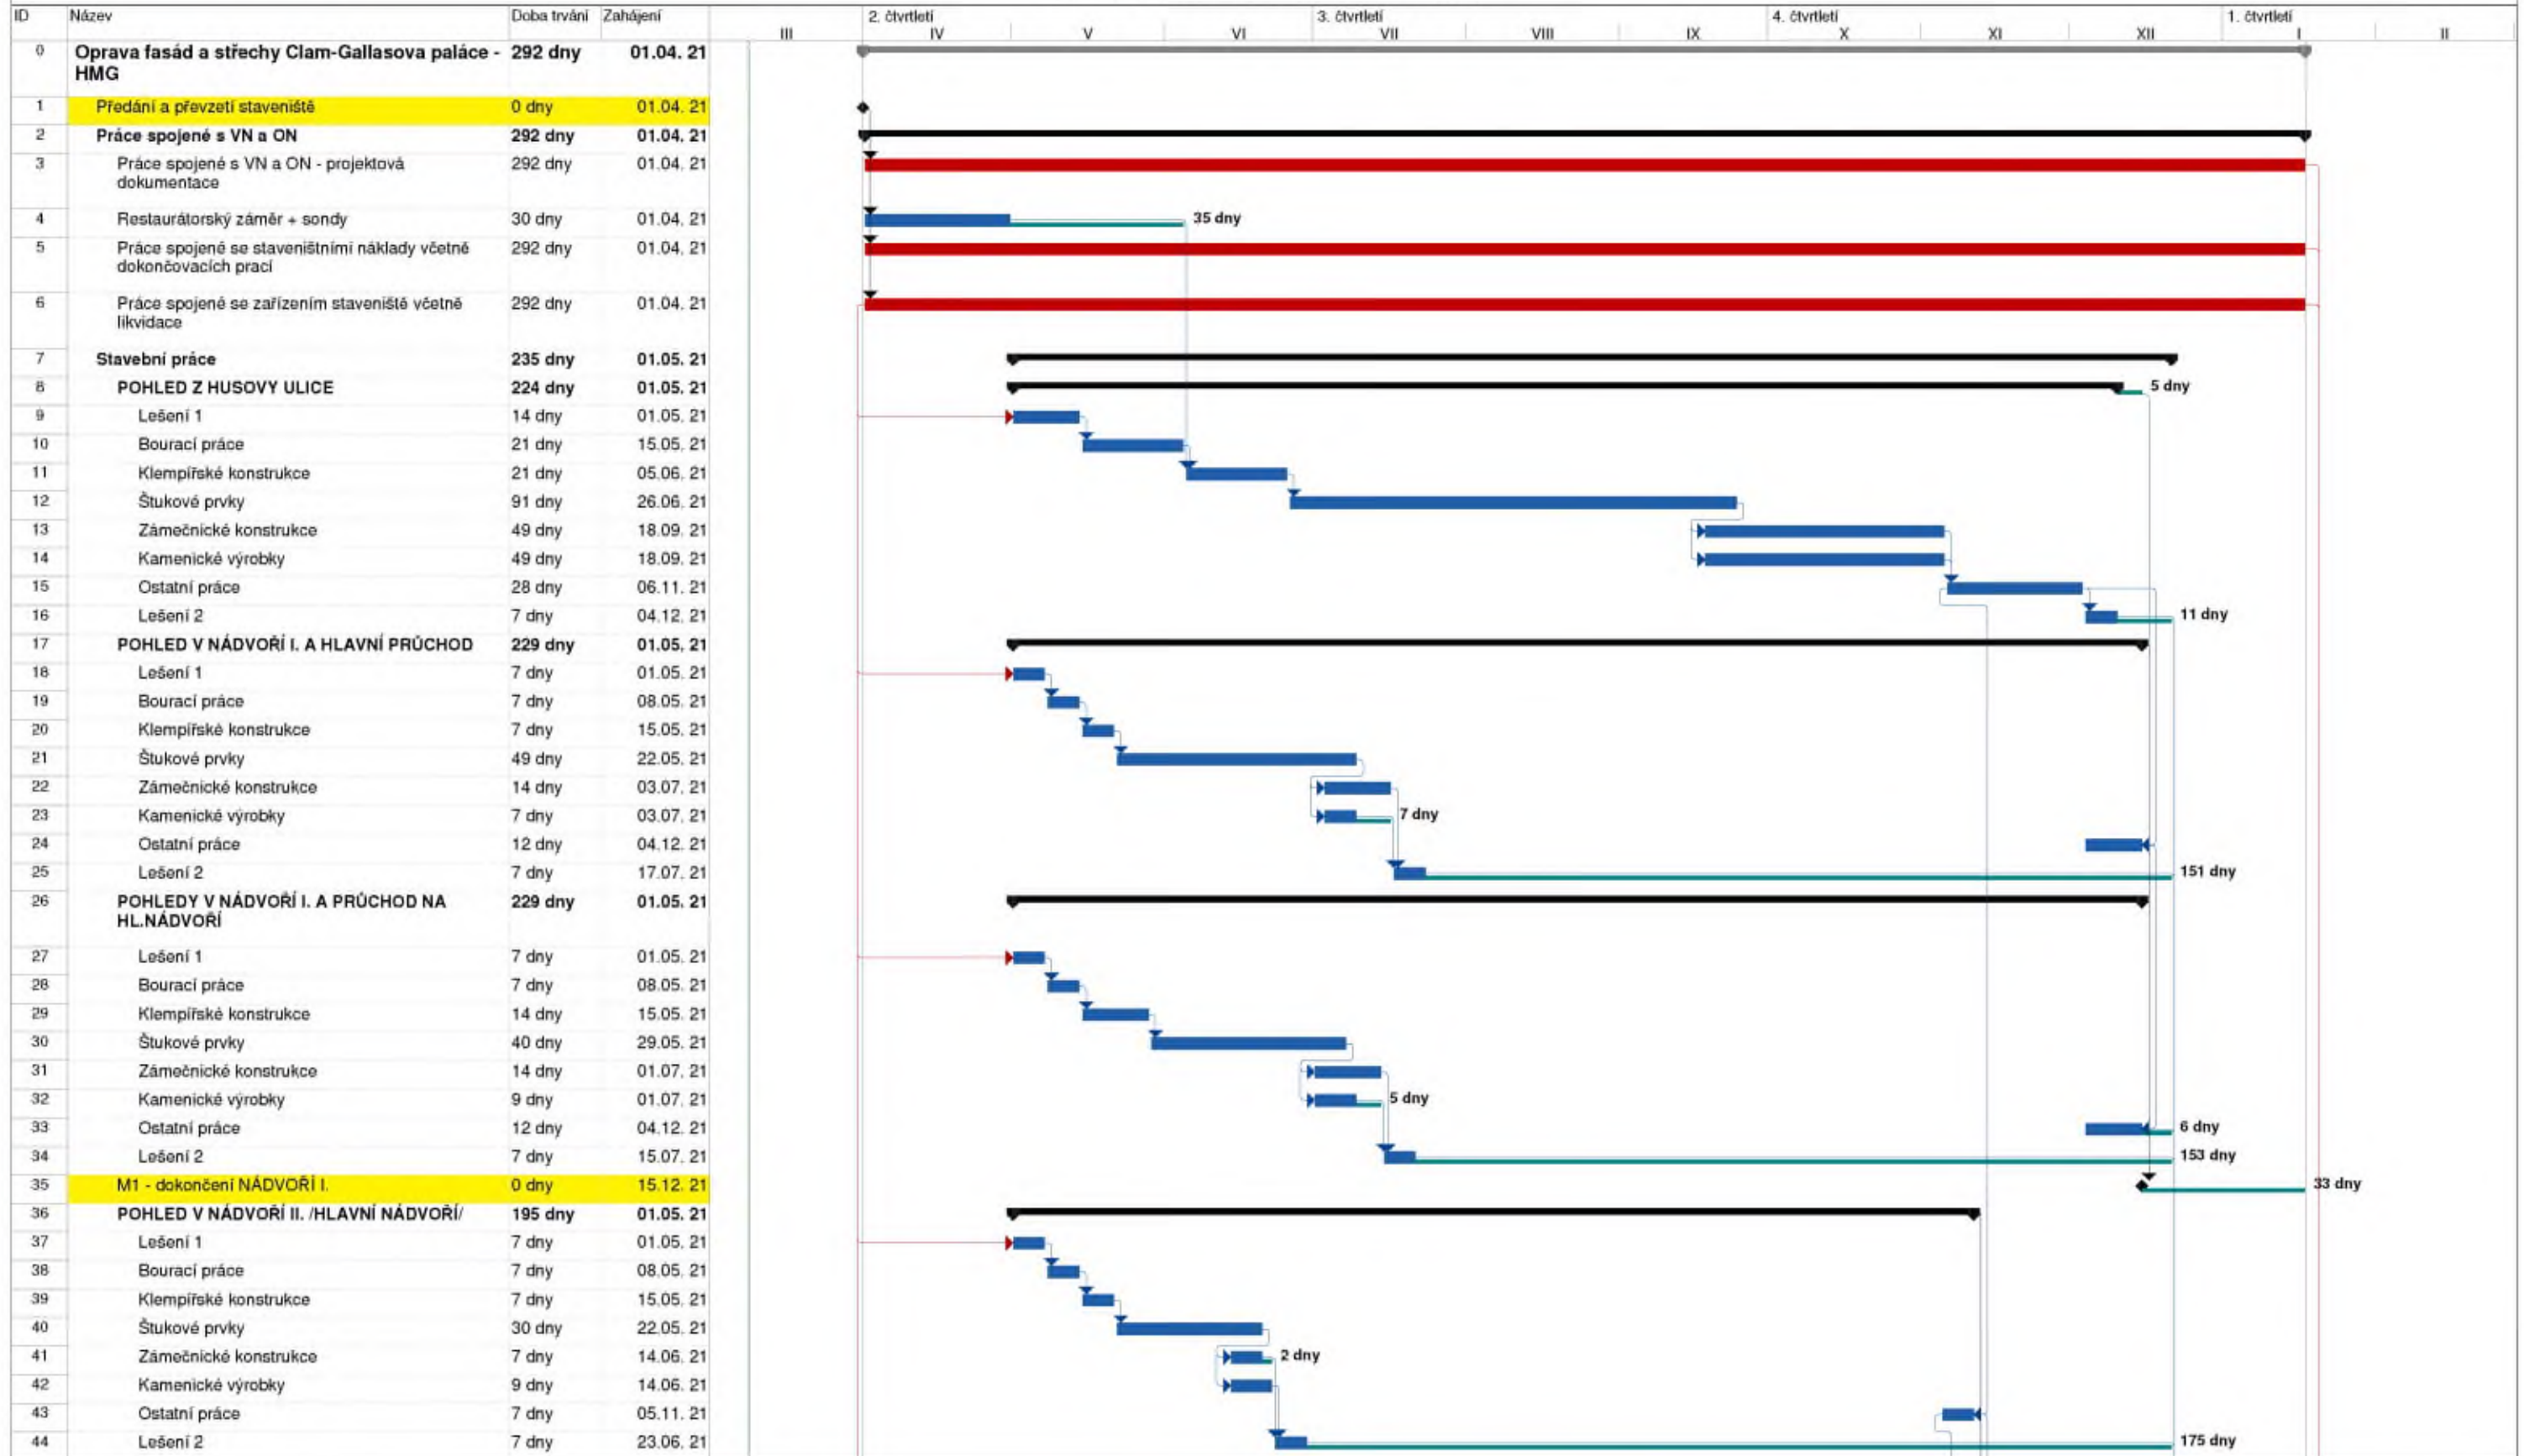



Podrobný harmonogram výstavby včetně zkoušek a revizí



Podrobný harmonogram výstavby včetně zkoušek a revizí

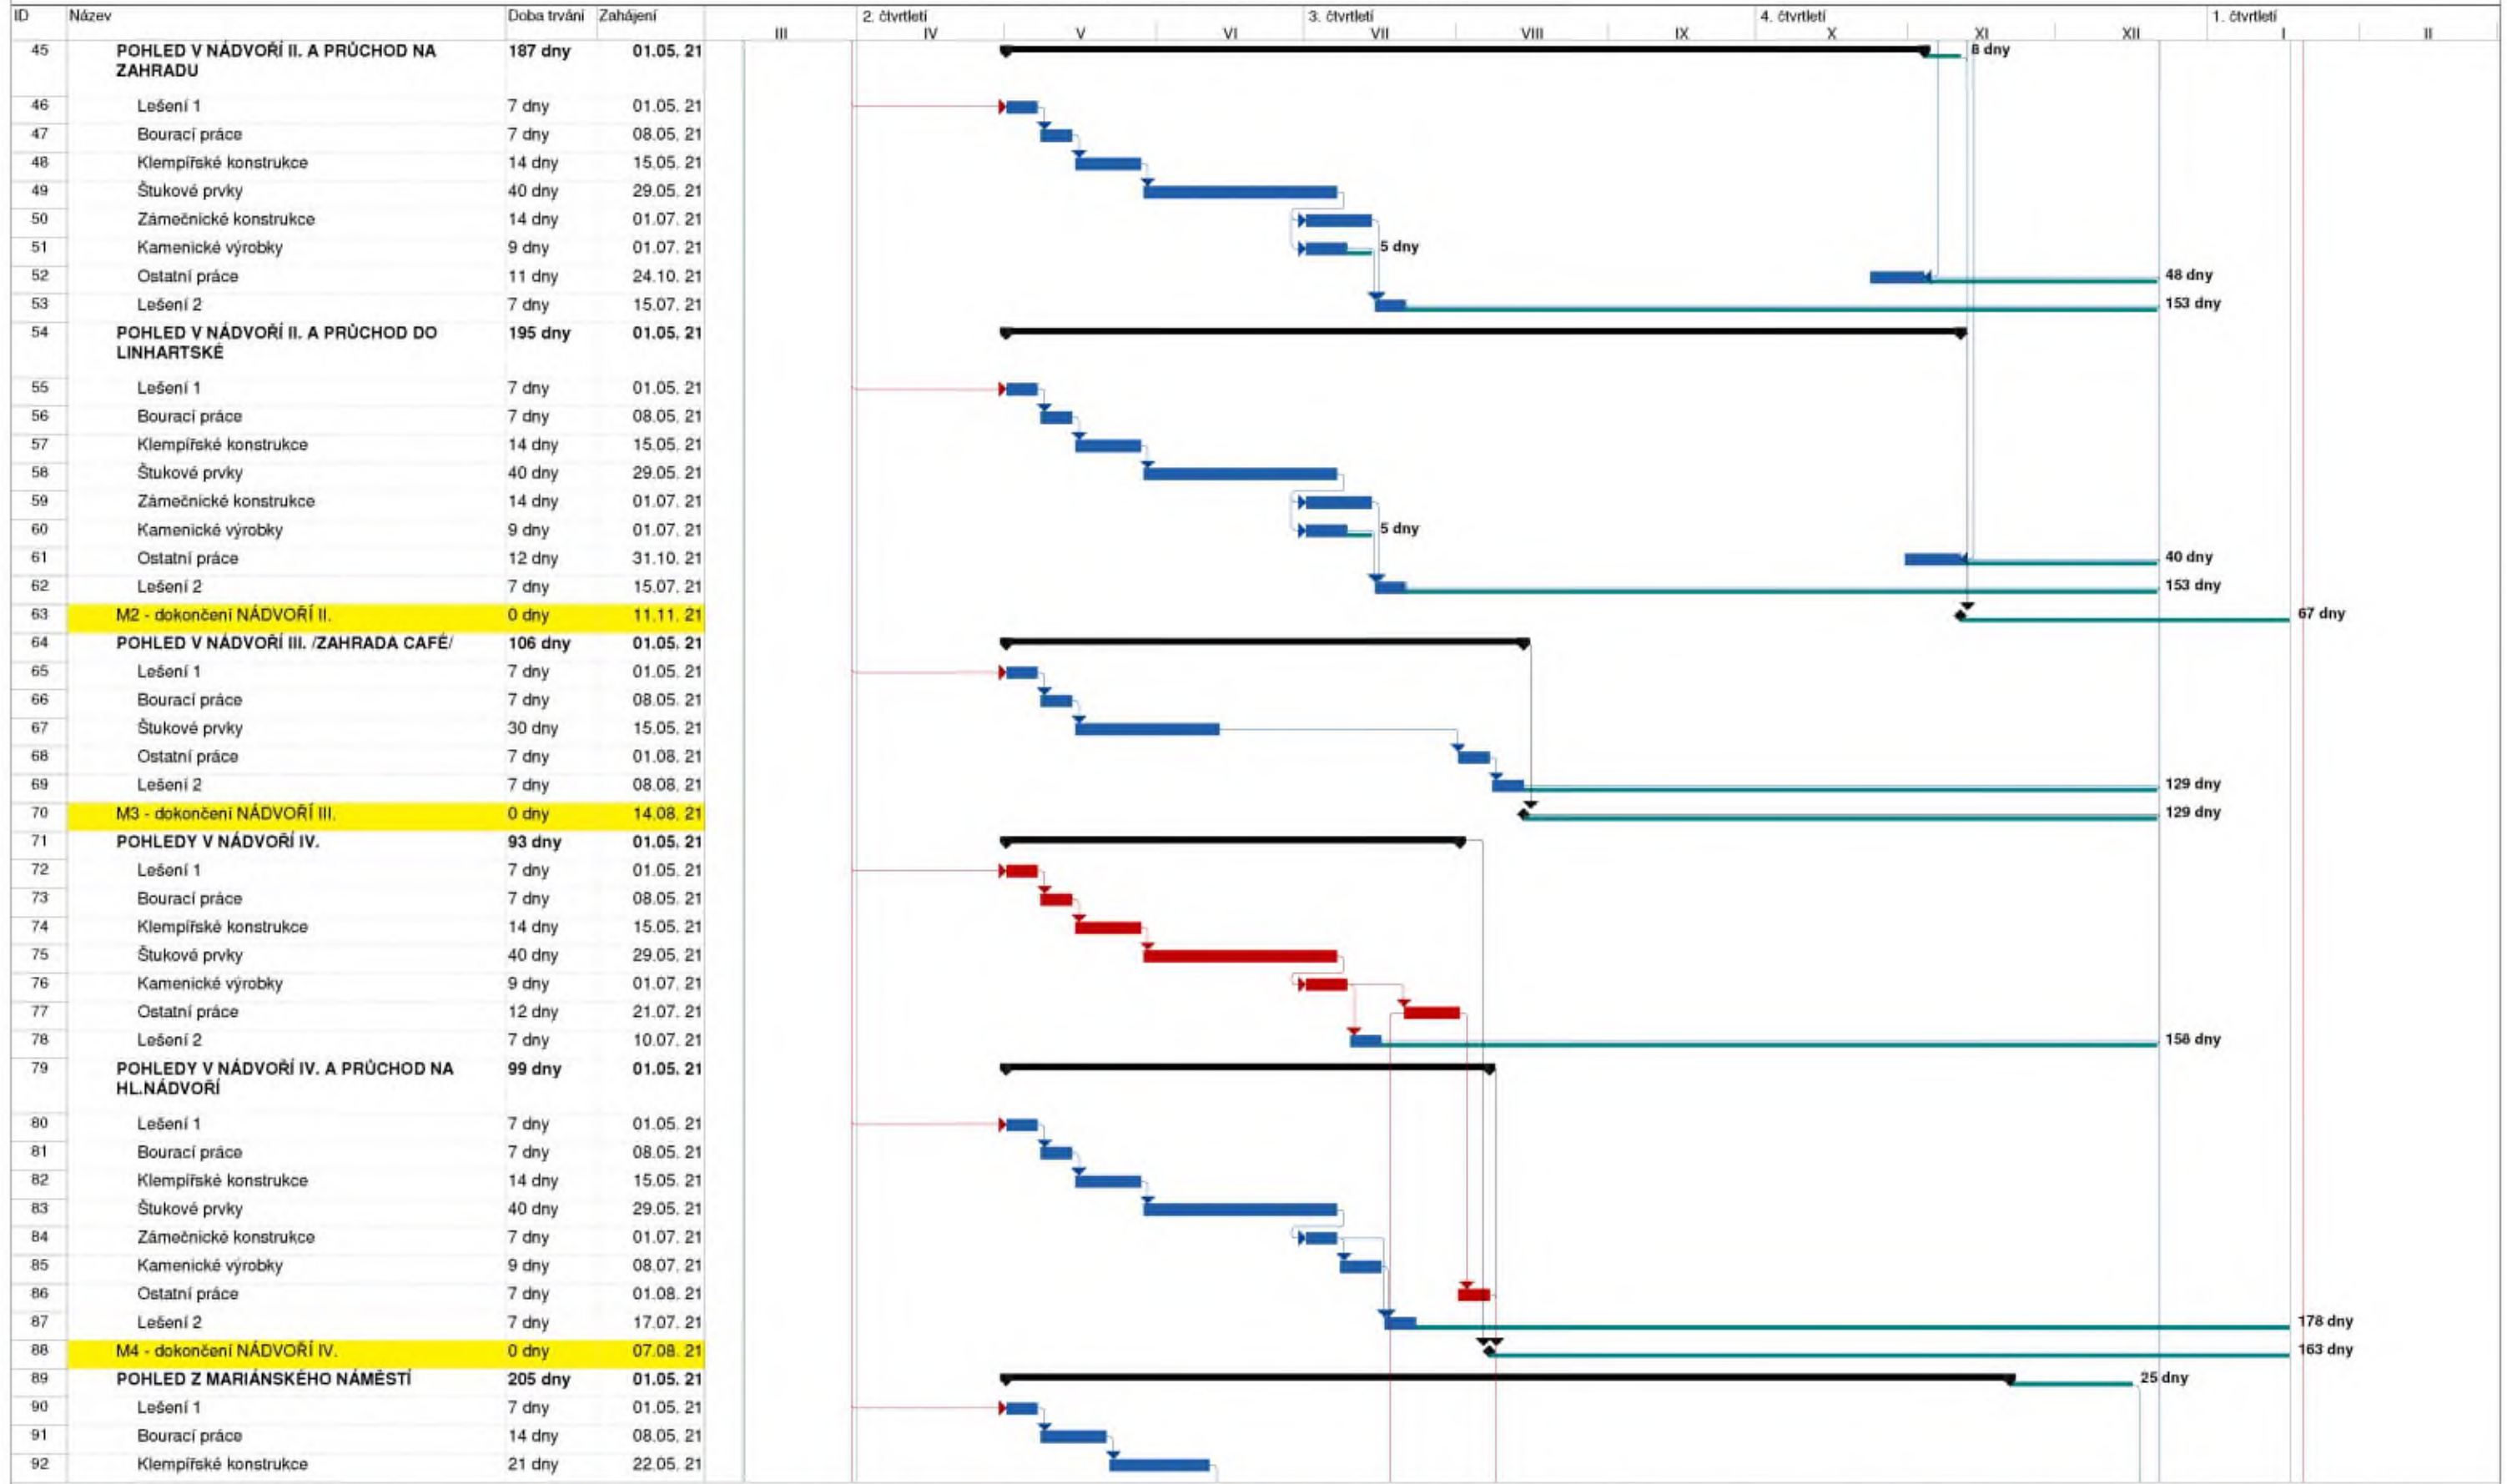


Podrobný harmonogram výstavby včetně zkoušek a revizí

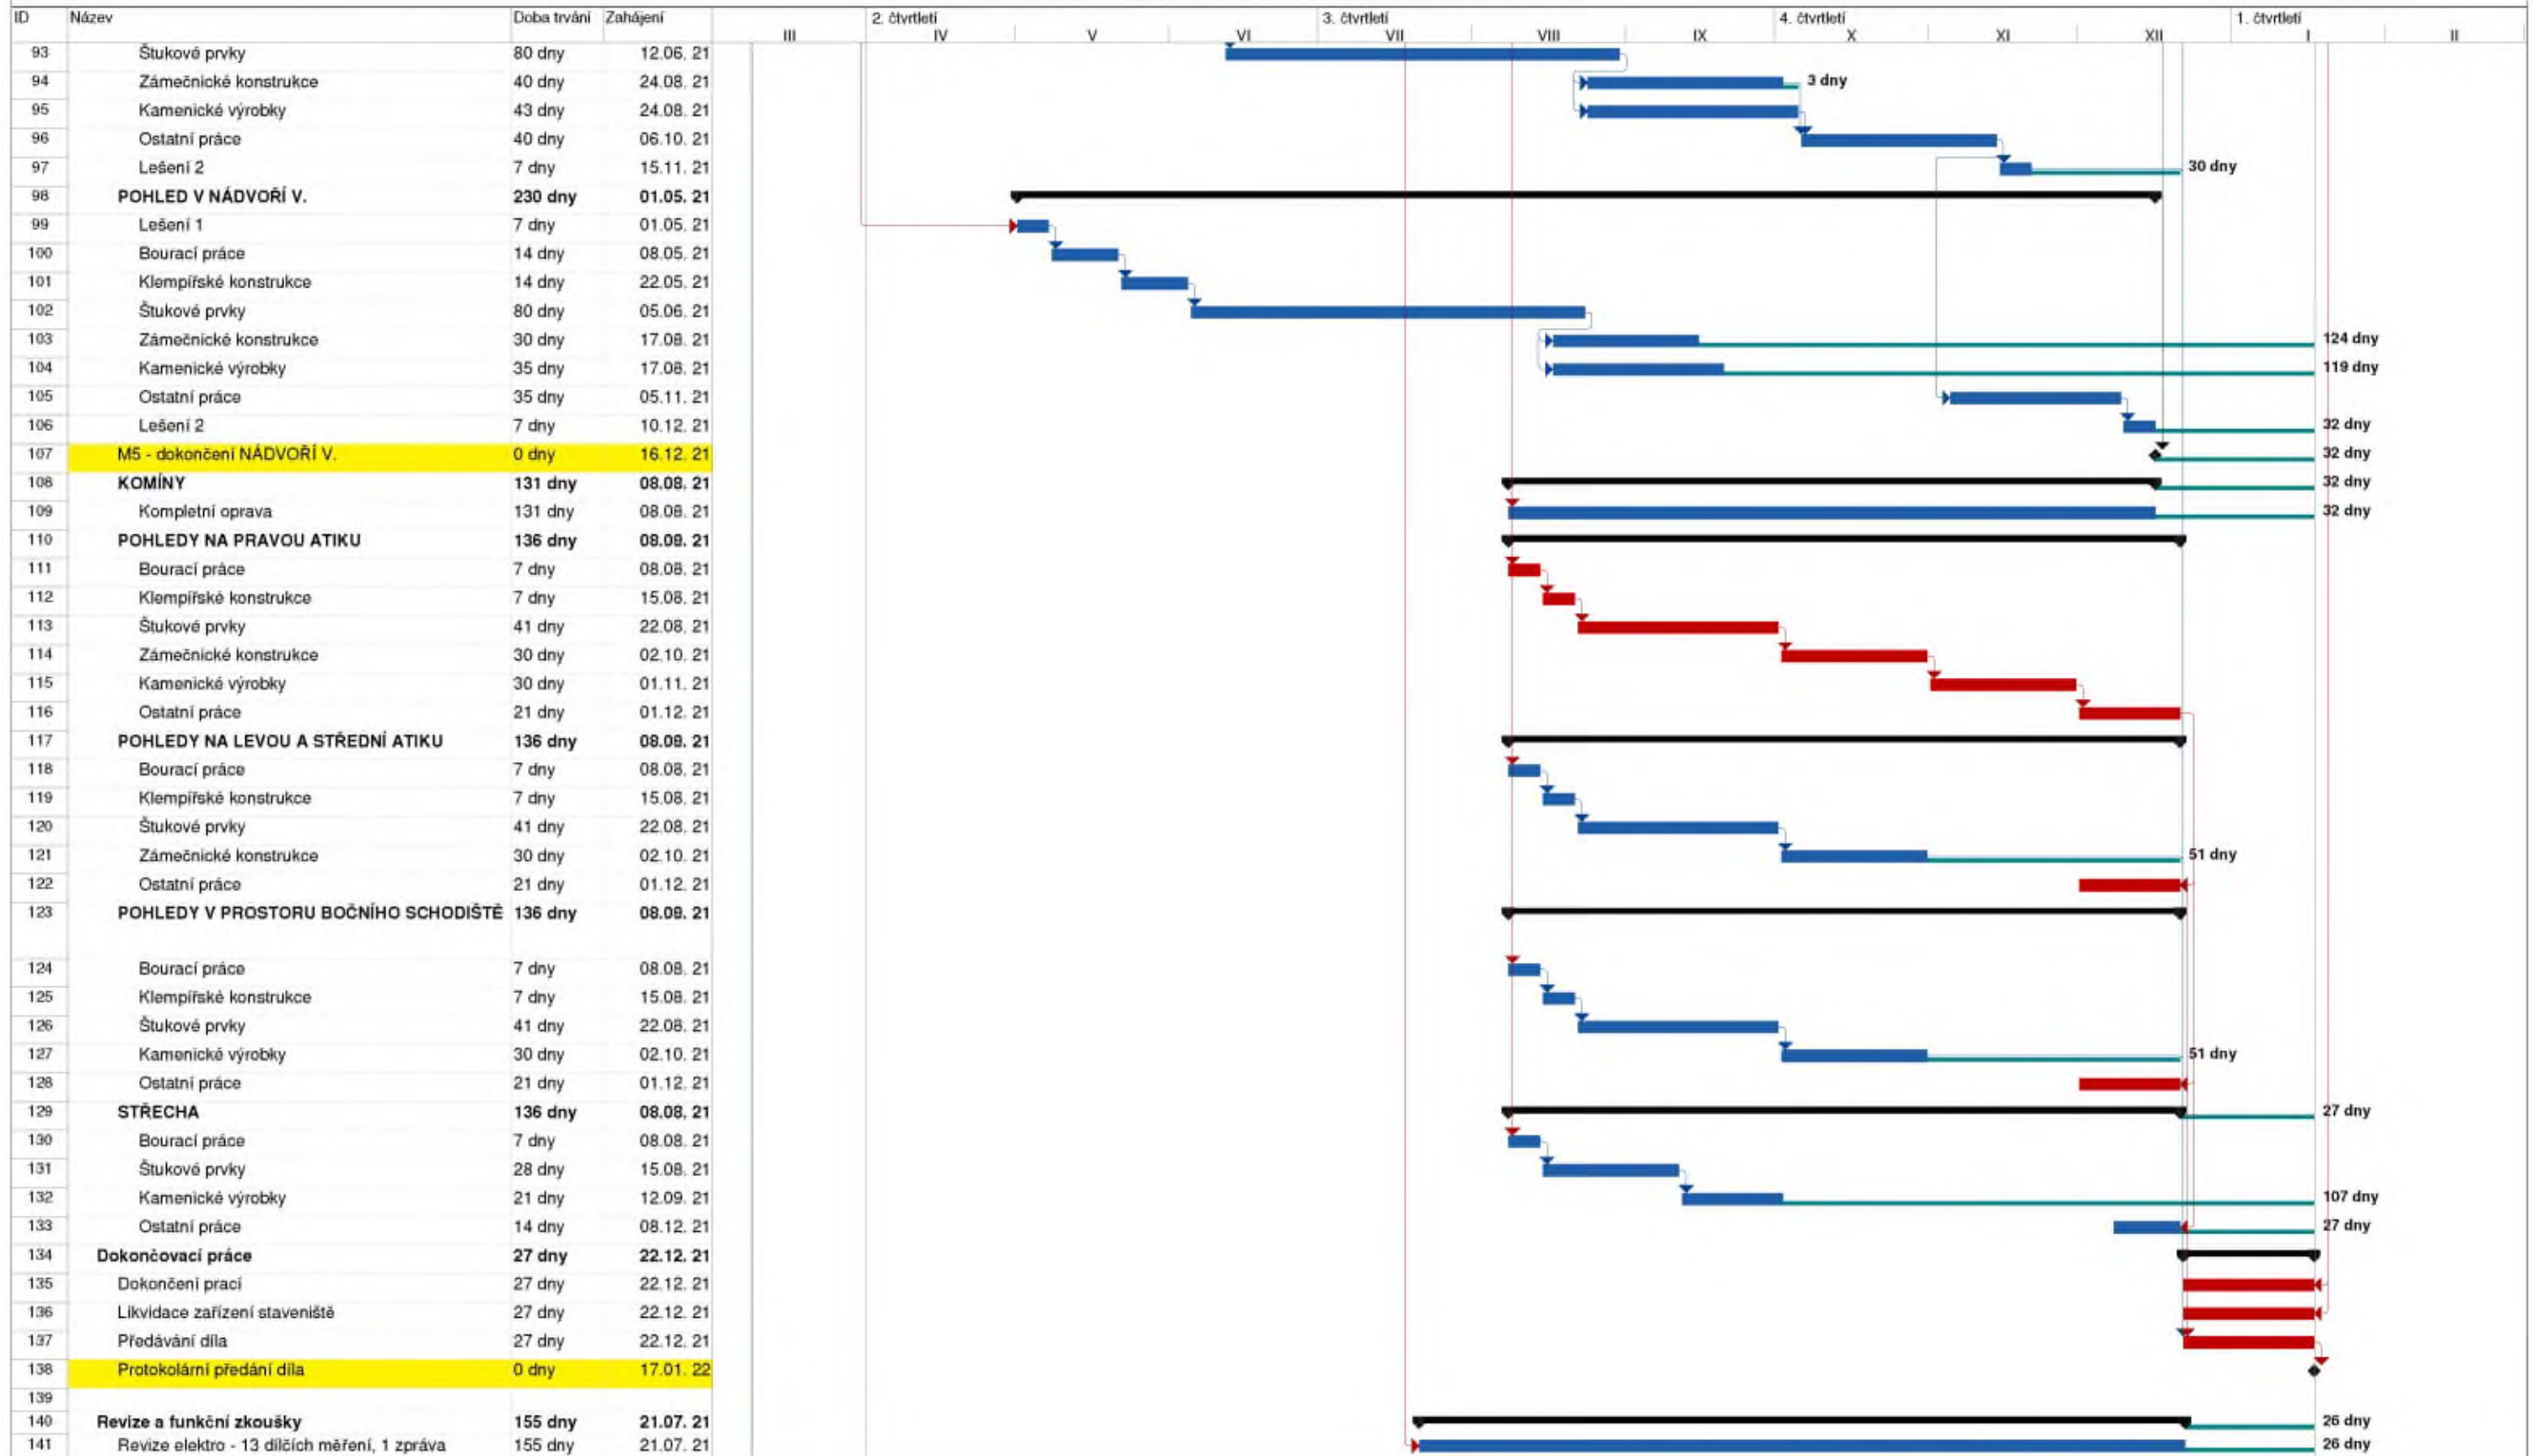


Kritický		Časová rezerva		Rozdělení zahnutého kritického úkolu		Neaktivní souřtm		Pouze zahájení		[
Rozdělení kritického úkolu		Skuz		Vnější úkoly		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		]
Úkol		Souhrnný		Vnější mílník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín		↓
Rozdělení		Souhru projektu		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Průběh		—
Mílník		Zahnutý kritický		Neaktivní mílník		Ruční souřtm				

Náklady			Rok										2022	Celkový součet
			Měsíc											
			2021											
Úkol	Úkol 1	Úkol 2	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden		
Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce - HMG														
	Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce - HMG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Předání a převzetí staveniště		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obecně	Obecně	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Přípravné práce	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	
		Zařízení staveniště	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	
		Oplocení	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	
	Obecně Celkem		750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	
	Stavební práce	Stavební práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		POHLED Z HUSOVY ULICE	0	719643	696429	719643	719643	696429	719643	696429	232143	0	5200000	
		POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD	0	67686	65502	67686	67686	65502	67686	65502	32751	0	500000	
		POHLEDY V NÁDVOŘÍ I. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ	0	67686	65502	67686	67686	65502	67686	65502	32751	0	500000	
		M1 - dokončení NÁDVOŘÍ I.	0	0	0	0	0	0	0	0	3700000	0	3700000	
		POHLED V NÁDVOŘÍ II. /HLAVNÍ NÁDVOŘÍ/	0	120337	116455	120337	120337	116455	120337	42700	0	0	756960	
		POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD NA ZAHRADU	0	82447	79787	82447	82447	79787	82447	10638	0	0	500000	
		POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD DO LINHARTSKÉ	0	79487	76923	79487	79487	76923	79487	28205	0	0	500000	
		M2 - dokončení NÁDVOŘÍ II.	0	0	0	0	0	0	0	6400000	0	0	6400000	
		POHLED V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADEK CAFÉ/	0	233962	226415	233962	105660	0	0	0	0	0	800000	
		M3 - dokončení NÁDVOŘÍ III.	0	0	0	0	3100000	0	0	0	0	0	3100000	
		POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV.	0	223840	216619	223840	7221	0	0	0	0	0	671520	
		POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ	0	250505	242424	250505	56566	0	0	0	0	0	800000	
		M4 - dokončení NÁDVOŘÍ IV.	0	0	0	0	2200000	0	0	0	0	0	2200000	
		POHLED Z MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ	0	151220	146341	151220	151220	146341	151220	102439	0	0	1000000	
		POHLED V NÁDVOŘÍ V.	0	134783	130435	134783	134783	130435	134783	130435	69565	0	1000000	
		M5 - dokončení NÁDVOŘÍ V.	0	0	0	0	0	0	0	0	2200000	0	2200000	
		KOMÍNY	0	0	0	0	512977	641221	662595	641221	341985	0	2800000	
		POHLEDY NA PRAVOU ATIKU	0	0	0	0	105882	132353	136765	132353	92647	0	600000	
		POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU	0	0	0	0	158824	198529	205147	198529	138971	0	900000	
		POHLEDY V PROSTORU BOČNÍHO SCHODIŠTĚ	0	0	0	0	35294	44118	45588	44118	30882	0	200000	
		STŘECHA	0	0	0	0	15882	19853	20515	19853	13897	0	90000	
	Stavební práce Celkem		0	2131595	2062834	2131595	7721594	2413449	2493898	8577925	6885592	0	34418480	
	Dokončovací práce	Dokončovací práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dokončovací práce	0	0	0	0	0	0	0	0	566837	963623	1530460	
		Likvidace zařízení staveniště	0	0	0	0	0	0	0	0	92593	157407	250000	
		Předání díla	0	0	0	0	0	0	0	0	92593	157407	250000	
		Protokolární předání díla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dokončovací práce Celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	752022	1278438	2030460	
Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce - HMG Celkem			750000	2131595	2062834	2131595	7721594	2413449	2493898	8577925	7637614	1278438	37198940	
Celkový součet			750000	2131595	2062834	2131595	7721594	2413449	2493898	8577925	7637614	1278438	37198940	




## graf potřeby pracovníků

■ 2021 - Duben ■ 2021 - Květen ■ 2021 - Červen ■ 2021 - Červenec ■ 2021 - Srpen  
■ 2021 - Září ■ 2021 - Říjen ■ 2021 - Listopad ■ 2021 - Prosinec ■ 2022 - Leden

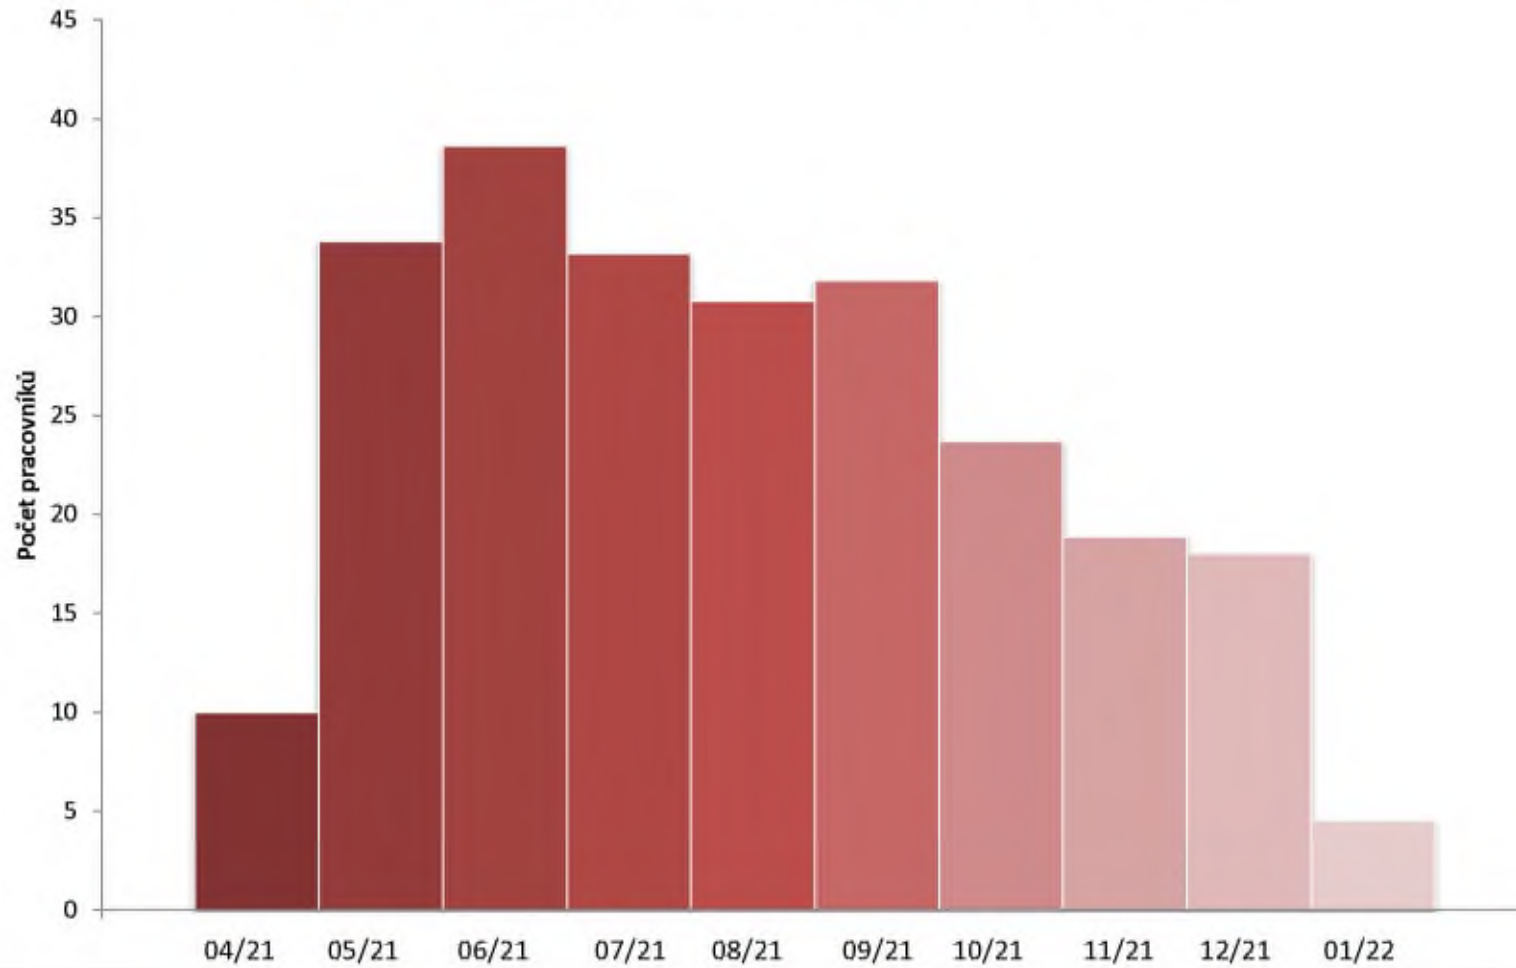

## Oprava fasád a střechy Clam-Gallasova paláce Graf spotřeby zdrojů financí

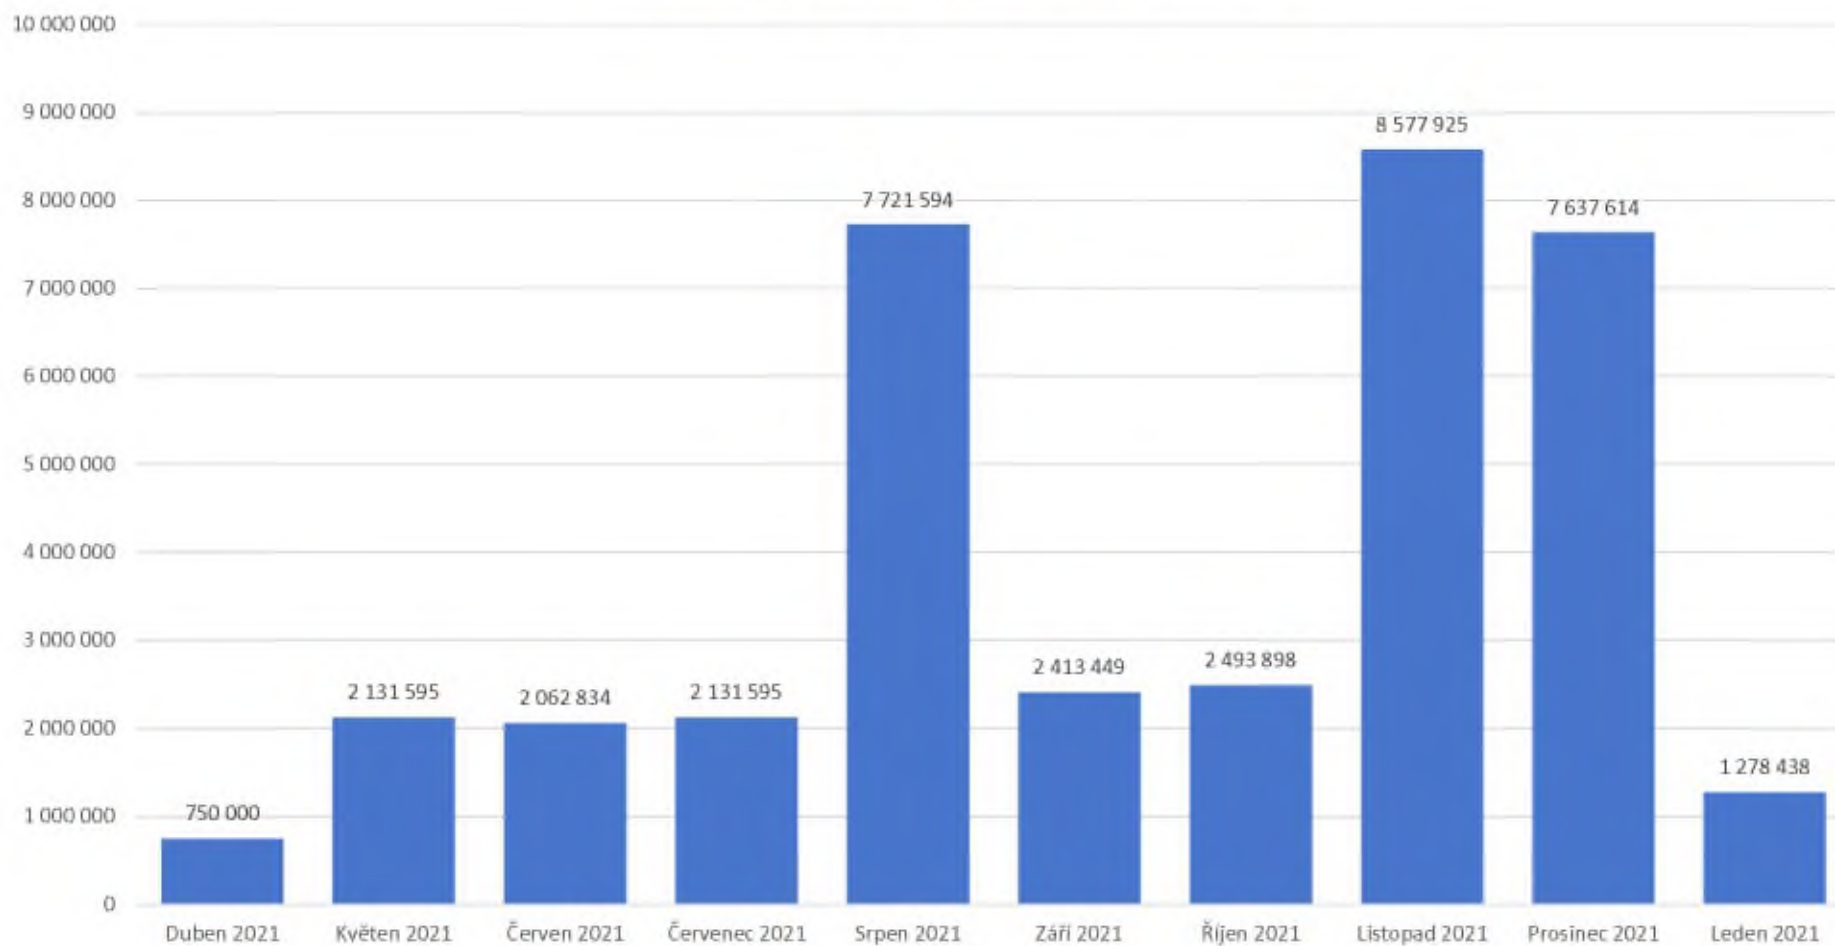

## OPRAVA FASÁD A STŘECHY CLAM-GALLASOVA PALÁCE

---

### Seznam milníků (uzlových bodů) harmonogramu

Milník (uzlový bod)	Předmět	Termin
M1: dokončení NÁDVORÍ I.	Finální dokončení opravy fasád v NÁDVORÍ I.	15.12.2021
M2: dokončení NÁDVORÍ II	Finální dokončení opravy fasád v NÁDVORÍ II.	11.11.2021
M3: dokončení NÁDVORÍ III	Finální dokončení opravy fasád v NÁDVORÍ III.	14.08.2021
M4: dokončení NÁDVORÍ IV.	Finální dokončení opravy fasád v NÁDVORÍ IV	07.08.2021
M5: dokončení NÁDVORÍ V.	Finální dokončení opravy fasád v NÁDVORÍ V	16.12.2021
