


	MASARYKOVA UNIVERZITA
Investor	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
M U N I	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku na výše uvedenou stavbu, vždy ke dni, ke kterému byl tento zápis zřízen
Stavba	OPRAVA FASÁDY NA FSS
Datum:	6.8.2025
Přítomni:	

Číslo	Text, termín plnění, odpovědná osoba
	- ZHODOVITEL INFORMOVAN O PROBLÉMECH V VYŘEZENÍ ZÁKAZU TRS STAVBY LEŠENÍ (VIZ PŘÍLOHA) - REALNĚ ZÁKAZ STAVBY LEŠENÍ 18.8.2025 149

Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství


Odsouhlaseno dne: 01.08.2025

Pod č. j.: KRPB-142106-2/ČJ-2025-0602DI

v kontextu č. j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI

Die § 77 z. č. 361/2000 Sb.

§ --- z. č. 13/1997 Sb.

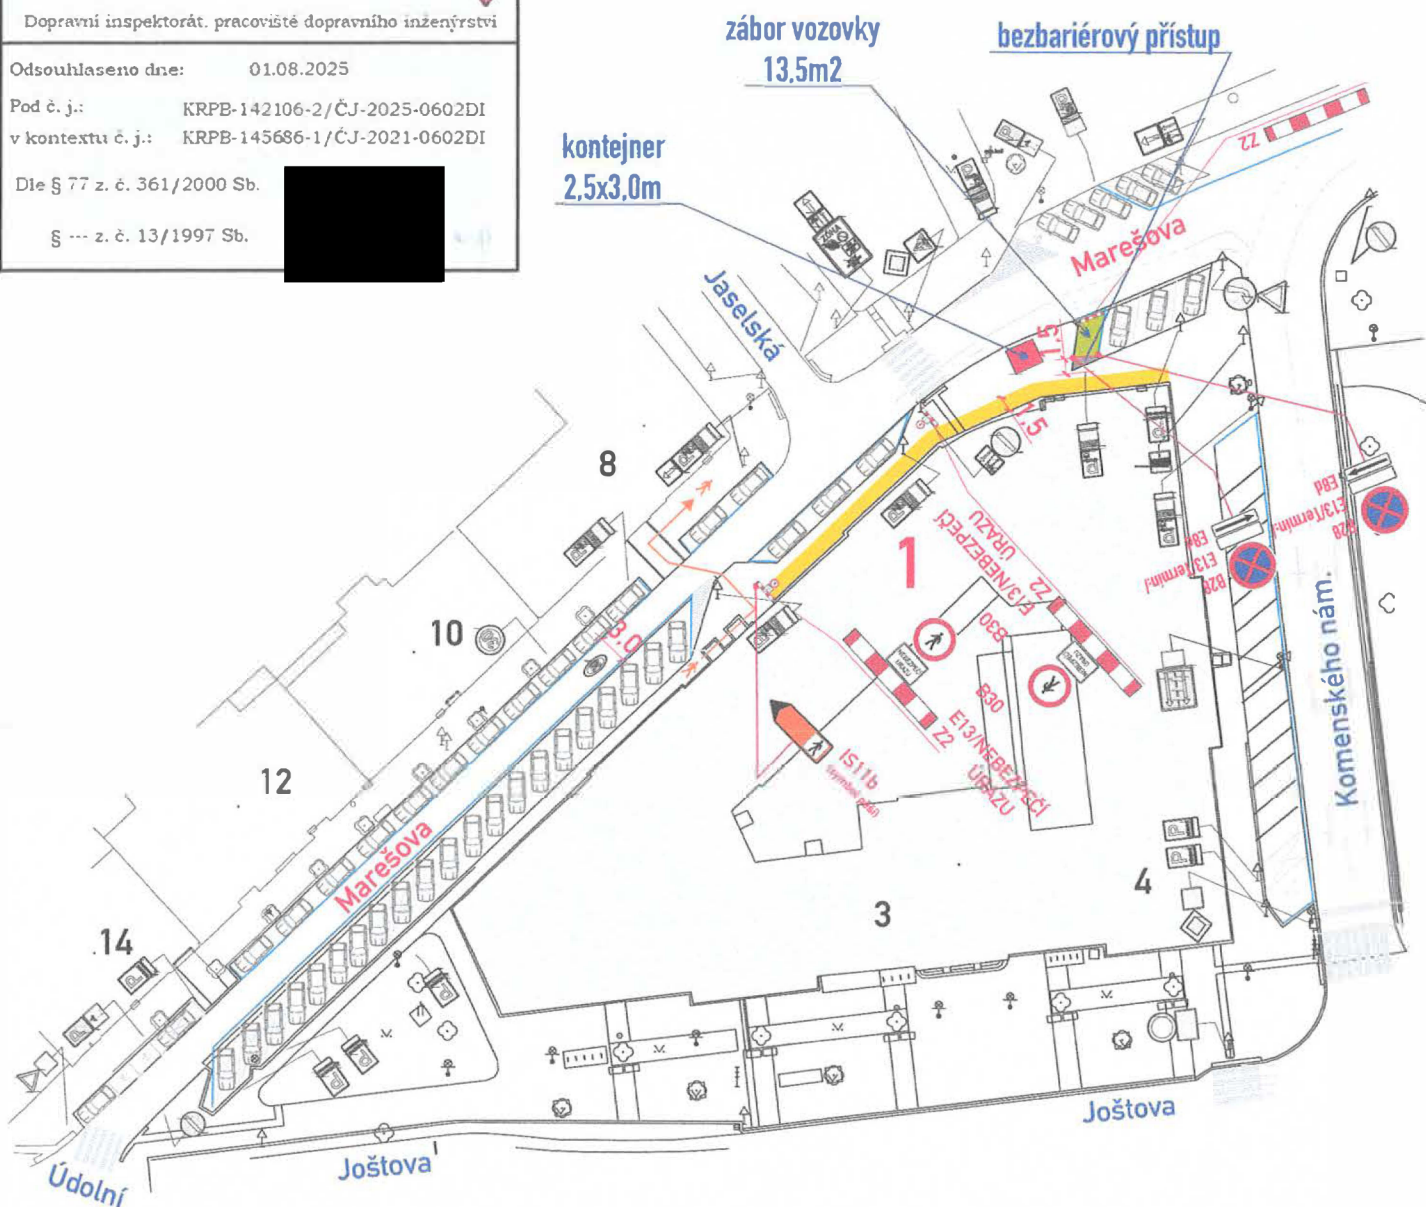

zábor vozovky 13.5m²

- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133,66,65

Etapa - 1

Legenda značení ve schématu /barva popisu :

přenosné SDZ :

stávající SDZ :

stávající SDZ zakrýt / zrušit:

záhor vozovky :

zábor chodníku

pěší trasa :

stavební oplocení nebo Z2 : - - - - -



VYPRACOVAL :

KONTROLOVAL

obsah schématu :

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Částečná uzavírka

místo akce/název :

BRNO, ul. Marešova č.o.1
Oprava fasády



kontakt :

SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno

Tel.: [REDACTED] mistr: tel.: [REDACTED]

Služba mimo pracovní dobu: tel: [REDACTED]

číslo objednávky / datum :

250551
30.7.2025

číslo schématu :

1

ZUK MAREŠOVA 1 – oprava fasády

- 17.6. podpis smlouvy
- 24.6. schůzka s lešenářskou firmou
- 26.6. zadáno firmě SIGNEX žádost na 1. a 2. etapu současně na PČR vč. nákresu a návrhu dopravního značení
- 3.7. CN + termíny realizace lešení – lešenářská firma
- 9.7. žádost Privileg o ZUK na 1.etapu (původní záměr) na BKOM – dovolená
- 10.7. souhlas od BKOM – 1. etapa – původní záměr
- 10.7. Žádost + souhlas BKOM na 1. etapu na MMB OD – dovolená
- 11.7. dokončeno zakreslení obou etap od firmy Signex – zaslán podklad pro vyjádření PČR
- 14.7. PČR žádá přehození etap – zahájení levé části od Červeného kostela, z důvodu úzké průchozí části chodníku podél lešení směrem přes vozovku ke kostelu a s ohledem na zahájení školního roku v září
- 17.7. Změna – přiděleno jinému pracovníkovi na MMB OD
- 18.7. PRIVILEG obdržel souhlas od MMB OD na 1. etapu
- 24.7. Požadavek PČR sdělila firma PRIVILEG na BKOM s žádostí, jak postupovat, BKOM navrhl nebrat původní žádost zpět a nechat firmu SIGNEX pokračovat ve změně zadání, jak na BKOM, tak MMB OD.
- 25.7. Signex provedl úpravu dle požadavku PČR
- 31.7. Zaslána žádost od Signex vč. potvrzení varianty od PČR na BKOM, odd. uzavírek
- 31.7. BKOM, odd. uzavírek nesouhlasí s uzavřením přechodu Marešova/Jaselská a ponechat průchod kolem lešení směrem k Červenému kostelu
- SIGNEX upravuje výkres, ponechává přechod Marešova/Jaselská včetně průchodu ke kostelu
- 31.7. Nová úprava předložena MMB OD, referát přechodné úpravy provozu na komunikacích a ten požaduje nové schválení od PČR vzhledem k rozsahu úpravy
- 1.8. SIGNEX zaslal úpravu na PČR k odsouhlasení
- 1.8. došlo datovou schránkou na Privileg od MMB OD „Opatření – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Přechodná úprava se může umístit ode dne 6.8. s tím, že musí být vydáno platné rozhodnutí o povolení ZUK

BUDE NÁSLEDOVAT:

- SIGNEX následně BUDE po odsouhlasení dávat žádost znovu na BKOM – ZUK, vč. potvrzeného výkresu změn a etap
- SIGNEX následně BUDE po vydání souhlasu žádat o ZUK na příslušném ÚMČ Brno-střed (podklady BKOM,
- Po obdržení souhlasu se BUDE zasílat ohlášení záboru a platit výměr za zábor
