


**Příloha číslo II smlouvy o dílo číslo DP/...../2018  
Harmonogram plnění prací a dodávek**

# HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

## Příloha č. II. návrhu smlouvy o dílo

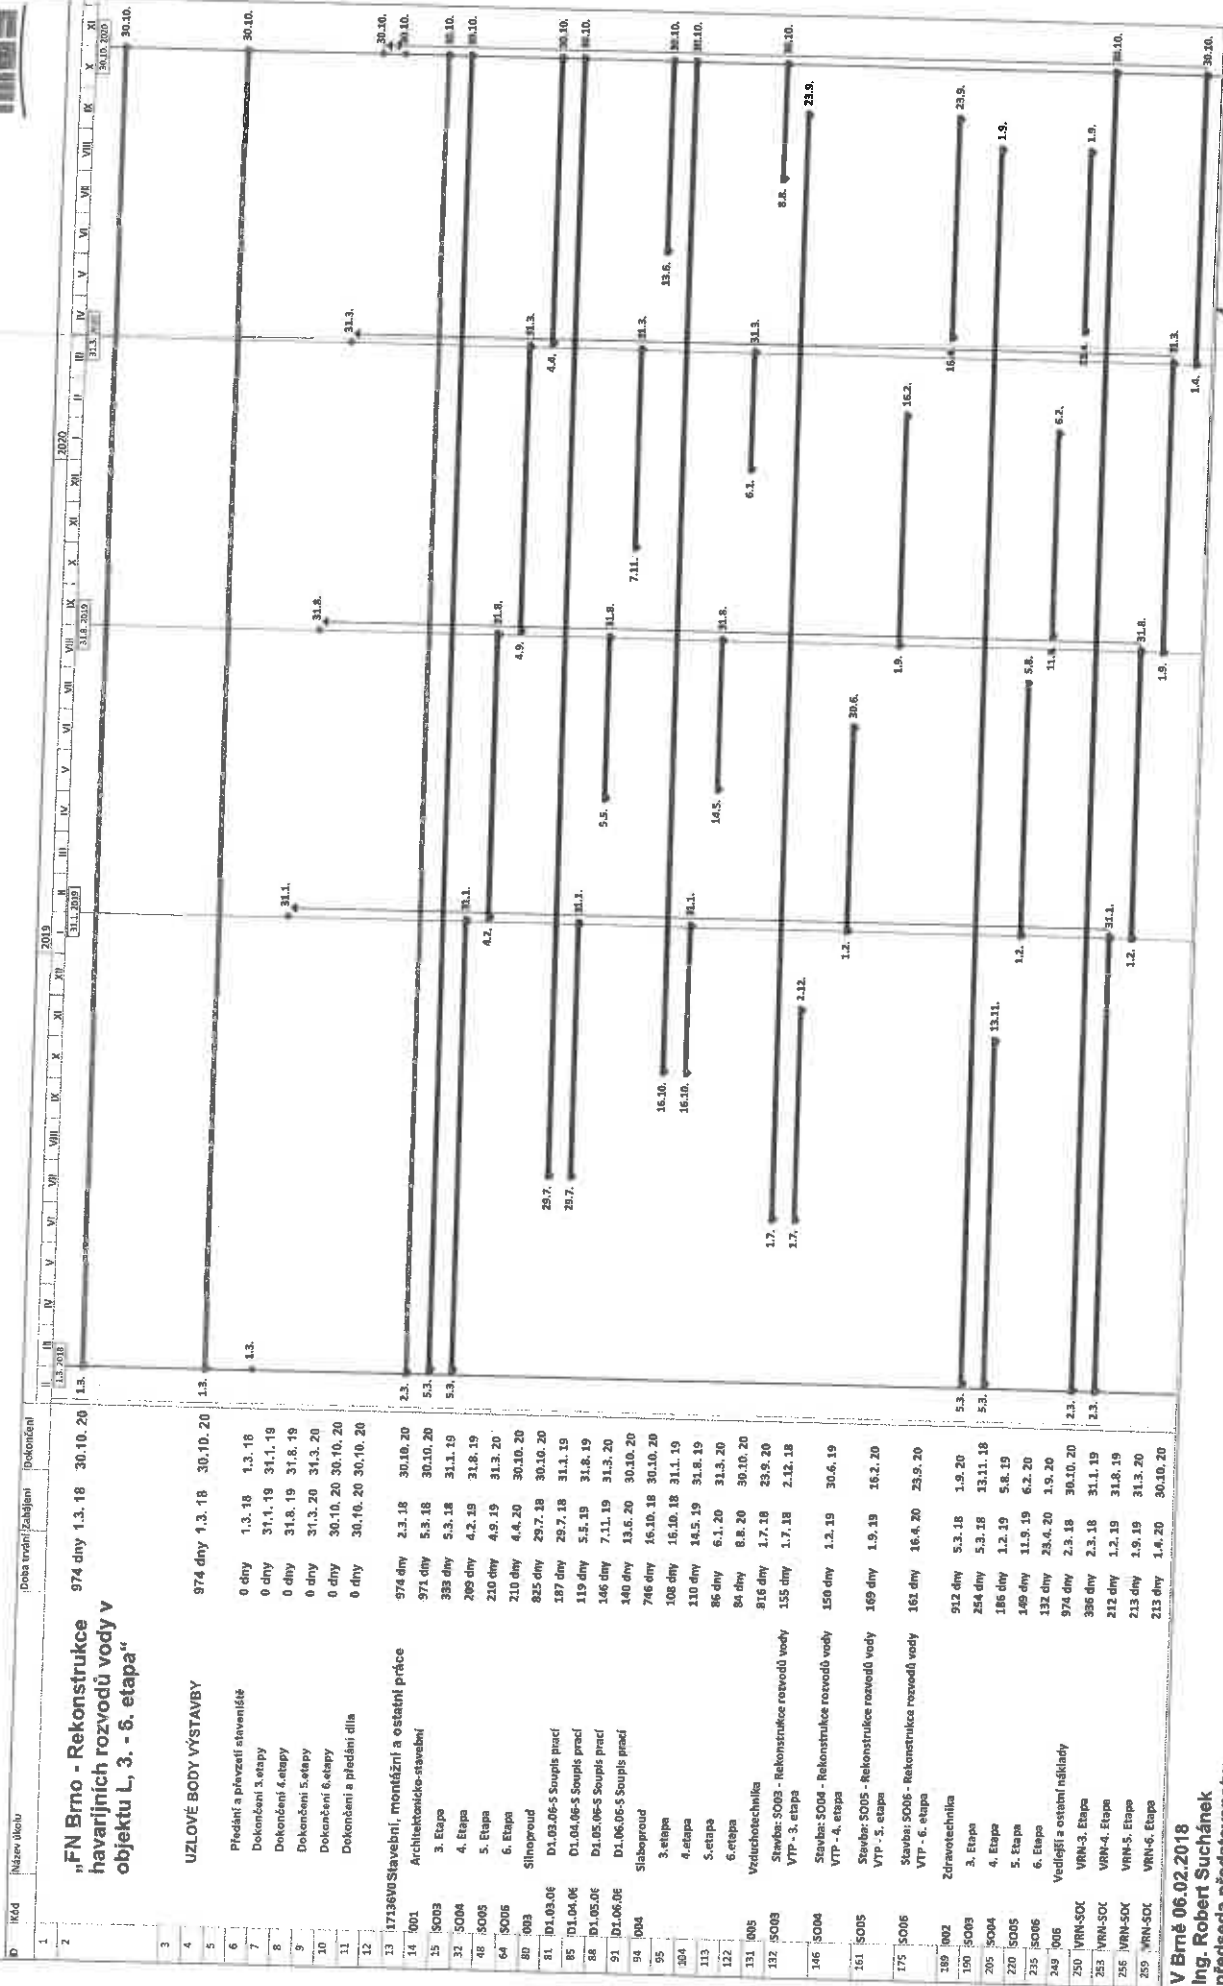

ID	Název úkolu	Doba trvání / Začátek / Dokončení
1		
2	FN Brno - Rekonstrukce havarijních rozvodů vody v objektu L, 3. - 6. etapa	974 dny 1.3.18 30.10.20
3	UZLOVÉ BODY VÝSTAVBY	974 dny 1.3.18 30.10.20
4		0 dny 1.3.18 1.3.18
5		0 dny 31.1.19 31.1.19
6		0 dny 31.8.19 31.8.19
7		0 dny 31.3.20 31.3.20
8		0 dny 30.10.20 30.10.20
9		0 dny 30.10.20 30.10.20
10		0 dny 30.10.20 30.10.20
11		0 dny 30.10.20 30.10.20
12		0 dny 30.10.20 30.10.20
13	17136VN Stavění, montážní a ostatní práce	974 dny 2.3.18 30.10.20
14	1001 Architektonicko-stavební	974 dny 2.3.18 30.10.20
15	3. Etapa	333 dny 5.3.18 31.1.19
32	4. Etapa	209 dny 4.2.19 31.8.19
48	5. Etapa	210 dny 4.9.19 31.3.20
64	6. Etapa	210 dny 4.4.20 30.10.20
80	Slaboproud	825 dny 29.7.18 30.10.20
81	D1.03.06-S	187 dny 29.7.18 31.1.19
85	D1.04.06-S	119 dny 5.5.19 31.8.19
88	D1.05.06-S	146 dny 7.11.19 31.3.20
91	D1.06.06-S	140 dny 13.6.20 30.10.20
94	Slaboproud	746 dny 16.10.18 30.10.20
95	3. etapa	108 dny 16.10.18 31.1.19
104	4. etapa	110 dny 14.5.19 31.8.19
113	5. etapa	86 dny 6.1.20 31.3.20
122	6. etapa	84 dny 8.8.20 30.10.20
131	Vzduchotechnika	816 dny 1.7.18 23.9.20
132	Stavba: SO03 - Rekonstrukce rozvodů vody VTP - 3. etapa	155 dny 1.7.18 2.12.18
146	Stavba: SO04 - Rekonstrukce rozvodů vody VTP - 4. etapa	150 dny 1.3.19 30.6.19
161	Stavba: SO05 - Rekonstrukce rozvodů vody VTP - 5. etapa	169 dny 1.9.19 16.2.20
175	Stavba: SO06 - Rekonstrukce rozvodů vody VTP - 6. etapa	161 dny 16.4.20 23.5.20
189	Zároveň technika	912 dny 5.3.18 1.9.20
190	3. Etapa	254 dny 5.3.18 13.11.18
205	4. Etapa	186 dny 1.2.19 5.8.19
220	5. Etapa	140 dny 11.5.19 6.2.20
235	6. Etapa	132 dny 23.4.20 1.9.20
249	Vedlejší a ostatní úkony	974 dny 2.3.18 30.10.20
250	VRN-3. Etapa	396 dny 2.3.18 31.1.19
253	VRN-4. Etapa	212 dny 1.2.19 31.8.19
256	VRN-5. Etapa	213 dny 1.9.19 31.3.20
259	VRN-6. Etapa	213 dny 1.4.20 30.10.20

V Brně 06.02.2018  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva
