

**GEOSAN GROUP a.s.**  
 U Nemocnice 430  
 280 02 Kolín III

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
 Tynecok\_dur\_do0418

Vyřizuje  
 Roztočil

Misto a datum odeslání  
 Praha, 27.6.2018

**Věc: „Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 × III/10513“ – návrh ZBV - vyjádření AD**

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 21.6.2018 o vyjádření k připravované změně během výstavby výše uvedené akce Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující stanovisko.

Seznámili jsme se s poskytnutými podklady, které se týkají těchto změn a upřesnění rozsahu a provedení stavby:

*ZBV č. 1 – SO 110 Okružní křižovatka*

– použití žulových obrubníků obloukových u obrubníkových hran malých poloměrů z důvodu usnadnění následné údržby silnice. Kladecký výkres obrubníků zpracován v rámci RDS, technické řešení se oproti PDPS jinak nemění. V soupisu prací PDPS je použita položka pro obruby přímé;

*ZBV č. 2 – SO 801 Vegetační úpravy*

doplnění položky soupisu prací týkající se nákupu potřebné ornice a odebrání položky uložení na skládku, technické řešení se oproti PDPS žádným způsobem nemění;

*ZBV č. 3 – SO 134 Chodníky pro pěši*

– použití žulových obrubníků obloukových u obrubníkových hran malých poloměrů z důvodu usnadnění následné údržby silnice. Kladecký výkres obrubníků zpracován v rámci RDS, technické řešení se oproti PDPS jinak nemění. V soupisu prací PDPS je použita položka pro obruby přímé;

– upřesnění materiálového provedení „slepeckých“ dlažeb a souvisících předlažeb v souladu s požadavky Města Týnec nad Sázavou (v době zpracování Aktualizace PDPS nebyl ještě k dispozici odsouhlasený čistopis „Manuálu povrchů a mobiliáře Města Týnec nad Sázavou). Technické řešení upřesněno v přílohách RDS. Příslušným způsobem upraven soupis prací;

– úprava položky soupisu prací týkající se dodávky dílu ocelového zábradlí, technické řešení se oproti PDPS žádným způsobem nemění.

Po prostudování dostupných podkladů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Autorský dozor prohlašuje, že se změnami navrhovanými v rámci ZBV 1, 2 a 3 souhlasí.

S pozdravem



atelierpromika s.r.o.



Ing. Tomáš Roztočil  
 Atelier PROMIKA s.r.o.

Přílohy: bez příloh





**GEOSAN GROUP a.s.**

**U Nemocnice 430**

**280 02 Kolín**

V Praze dne 28.6.2018

**Věc: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513 – vyjádření TDI  
k návrhu ZBV 1,2,3**

Na Vaši žádost o stanovisko k předloženým změnám během výstavby výše uvedené akce ze dne 21.6.2018 Vám sděluji následující:

1) ZBV 1 - SO 110 Okružní křižovatka

S návrhem na použití obloukových obrubníků na základě předloženého požadavku MÚ Týnec nad Sázavou a v souladu s manuálem povrchů komunikací a chodníků města Týnec nad Sázavou souhlasím, při dodržení parametrů stanovených AD tj. do poloměru 15 m včetně. Žádám vyznačit změněné úseky do koordinační situace a doložit výpočet výměr.

2) ZBV - SO 801 Vegetační úpravy

S upřesněním položky soupisu prací na nákup ornice souhlasím.

3) ZBV 3 - SO 134 Chodníky pro pěši

a) Použití žulových obloukových obrubníků - na základě žádosti MÚ Týnec nad Sázavou obdobně viz bod 1. do poloměru 15 m včetně souhlasím.

b) Slepecká dlažba - s výměnou materiálu na základě požadavku MÚ Týnec za materiál COMCON souhlasím, žádám vyznačit a upřesnit skutečné pozice a výpočet skutečných výměr slepecké dlažby.

c) Zámková dlažba - tvary. Se záměnou tvarů betonové zámkové dlažby na základě požadavku manuálu povrchů MÚ Týnec nad Sázavou souhlasím

d) Náhrada svodidla zábradlím - za předpokladu dodržení potřebných technických parametrů dle PDPS souhlasím. Žádám doložit stanovisko respektive žádost MÚ Týnec n. Sázavou, protože z příložené není zcela zřejmý požadavek na zábradlí.


S pozdravem



Ing. Jindřich Přívratský, TDI

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Položky	Množství	MJ
COMCON CD30, bílá, slepecká	17,0	m2
COMCON CD60, bílá, slepecká	22,0	m2
COMCON CDR35, bílá	5,5	m2
COMCON CDR60, bílá	7,0	m2



## RE: Fwd: Poptávka - Dlažba pro nevidomé "OK, Týnec nad Sázavou"

Od: Coming Pavlov <coming.pavlov@coming.cz>

Komtu: 'Dávid Buxár' <dbuxar@ggez.eu>

Kopie: 

Datum: 7.6.2018 8:09

Dobrý den,

v příloze Vám zasilám cenovou nabídku slepecké dlažby COMCON a technické listy k výrobkům.

V případě dotazů se prosím neváhejte na mě obrátit.

S pozdravem

Dana Kudrnová

COMING PLUS a.s.

Provoz Pavlov 58

582 55 Herálec

Czech Republic

tel: +420 569 445 119



**From:** Dávid Buxár <>

**Sent:** Wednesday, June 06, 2018 2:32 PM

**To:** Coming Pavlov

**Subject:** Re: Fwd: Poptávka - Dlažba pro nevidomé "OK, Týnec nad Sázavou"

Dobrý den paní Kudrnová,

dle našeho dnešního telefonátu Vás prosím o aktualizaci Vaší CN.

COMCON CD 30, bílá	16,5 m <sup>2</sup>
COMCON CD 60, bílá	21,4 m <sup>2</sup>
COMCON CDR 35, bílá	5,5 m <sup>2</sup>
COMCON CDR 60, bílá	7,0 m <sup>2</sup>

Dále Vás prosím o zjištění, jestli by to šlo v tomhle množství dodat TOPTransem. Jestli ano, tak prosím o cenovou nabídku včetně dopravy na stavbu. Kdyby to nešlo, tak Vás prosím o kontakt na dopravce, s který dlouhodobě spolupracujete.

Předem děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

**Ing. Dávid Buxár**  
výrobní přípravitel staveb

**GEOSAN GROUP a. s.**  
Závod dopravních staveb  
U Práhonu 1516/32  
170 00 Praha 7



**Od:** Coming Pavlov [redacted]  
**Komu:** [redacted]  
**Odesláno:** 22.5.2018 7:36  
**Předmět:** FW: Fwd: Poptávka - Dlažba pro nevidomé "OK, Týnec nad Sázavou"

Dobrý den,  
v příloze Vám zasílám cenovou nabídku slepecké dlažby COMICON a technické listy k výrobkům.  
V případě dotazu se prosím neváhejte na mě obrátit.

S pozdravem

Dana Kudrnová

COMING PLUS a.s.  
Provoz Pavlov 58  
582 55 Herálec  
Czech Republic

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** Poptávka - Dlažba pro nevidomé "OK, Týnec nad Sázavou"

**Datum:** Fri, 18 May 2018 13:42:08 +0200

**Od:** Dávid Buxár [redacted]

**Komu:** [redacted]

Dobrý den,  
prosím Vás cenovou nabídku na **dlažbu pro nevidomé včetně dopravy** na naší připravovanou stavbu:  
**"Okružní křižovatka, Týnec nad Sázavou"**. Stavba jde do realizace od června do srpna 2018. Materiál bychom potřebovali mít na stavbě v druhé polovině června 2018. Společně s nabídkou Vás prosíme o  
informaci, jestli máte námi poptávané materiály běžné skladem, nebo se na jejich výrobu a dodání čeká  
nějakou dobu.

**Poptávaný materiál - Dlažba pro nevidomé:**

COMCON CD30, 200 x 200 x 30 mm, bílá	12 m <sup>2</sup> (cca 300 ks)
COMCON CD60, 200 x 200 x 60 mm, bílá	26 m <sup>2</sup> (cca 650 ks)
COMCON CDR, 255 x 255 x 35 mm, bílá	27 bm (cca 106 ks)
COMCON CDR, 255 x 255 x 60 mm, bílá	63 bm (cca 247 ks)
Doprava materiálu na stavbu	1 kpl

Cenovou nabídku od Vás očekávám do úterý 22.5.2018.

Předem děkuji za CN a přeji Vám hezký den.

S pozdravem

**Ing. Dávid Buxár**

výrobní přípravář staveb

**GEOSAN GROUP a. s.**

Závod dopravních staveb

U Práhonu 1516/32

170 00 Praha 7

mobil:

email:



*Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a. s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoli jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP a. s. a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran jak uvedeno shora, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoli fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.*

*Společnost GEOSAN GROUP a. s. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržíuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury společnosti GEOSAN GROUP a. s. je Criminal compliance program (viz [www.geosan-group.cz](http://www.geosan-group.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu společnosti GEOSAN GROUP a. s. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na [www.geosan-group](http://www.geosan-group).*

*Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a. s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoli jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP a. s. a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran jak uvedeno shora, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoli fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.*

*Společnost GEOSAN GROUP a. s. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržíuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury společnosti GEOSAN GROUP a. s. je Criminal compliance program (viz [www.geosan-group.cz](http://www.geosan-group.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu společnosti GEOSAN GROUP a. s. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na [www.geosan-group](http://www.geosan-group).*

**Přílohy:**

- GEFOSAN GROUP86a -22.5.2018.doc
- CD\_60 (3).pdf
- CD\_30200x200.pdf
- CDR\_3560.pdf

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Dávid Buxár


E-mail:

Mobil:

Naše zn.: 27\_086\_186a

Datum: 7.6.2018

Cenová nabídka slepecké dlažby COMCON na stavbu „ Okružní křižovatka, Týnec nad Sázavou“

Položka		m2	Celkem Kč
COMCON CD 200x200x30 mm bílá			30 685,-
COMCON CD 200x200x60 mm bílá			77 286,-
COMCON CDR 255x255x35 mm bílá			10 868,-
COMCON CDR 255x255x60 mm bílá			26 782,-
6 ks x paleta atyp.nevratná+paletizace+foliování			1 212,-
CENA CELKEM bez DPH			146 833,00

**Poznámka:**

- ceny jsou uvedeny bez DPH , platí pro rok 2018
- EXW provoz Pavlov - dopravu nezajišťujeme
- celková cena bude fakturována na základě skutečně provedeného odběru
- termín dodání: 2-4 týdny od objednání
- platební podmínky: zálohová faktura

S pozdravem

Za COMING Plus, a.s.  
Dana Kudrnová

Příloha: technický list CD30,60 , CDR35,60

**COMING Plus, a.s.**

Provoz Pavlov 58

582 55 Herálec u Humpolce

tel.:

fax:

e-mail:

www.coming.cz

IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793

Komerční banka, a.s.

číslo účtu

IBAN:CZ93 0800 0000 0000 0265 7612

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854

ISO 9001: 2009



# Report: Nabídka Tecam

Od: Petra Špačková <spackova@tecampraha.cz>

Komu: [REDACTED]

Datum: 20.6.2018 14:58

Dobrý den pane Buxáre,

V příloze Vám zasílám aktualizovanou cenovou nabídku, termín dodání 2-4 týdny.

S pozdravem

**Ing. Petra Špačková**

obchodní oddělení

**TECAM PRAHA s.r.o.**

K jezu 2120/2

143 00 Praha 12 Modřany

mobil.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

**Přílohy:**

- Nabídka Tecam.PDF

# Nabídka

## N1/2018/402

**Dodavatel:**

**TECAM Praha s.r.o.**  
**K Jezu 2120/2**  
**143 00 Praha - Modřany**  
**Czech Republic**  
**IČO: 24747611**  
**DIČ: CZ24747611**



TECAM Praha s.r.o.  
K Jezu, 2120/2, Praha - Modřany, 143 00

**GEOSAN GROUP a.s.**  
**U Nemocnice 430**  
**280 02 Kolín III**  
**CZ**

**Odběratel : GEOSAN GROUP**

GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430  
280 02 Kolín III  
CZ  
IČO: 28169522  
DIČ: CZ28169522

Zakázku podal: p. Buxár, 601 551 436  
Vaše objednávka: OK, Týnec nad Sázavou  
Platnost nabídky:  
Ze dne: 18.6.2018  
Způsob dopravy: -  
Způsob odběru: -

**Zakázka: N1/2018/402**

**Název akce: -**

Na základě předaných požadavků Vám předkládáme seznam nabídek našich výrobků i dalšího zboží, které jsme schopni v rámci kooperace nabídnout. Nabídková cena je platná pouze při kompletním ohrázení výrobků dle této nabídky.

Platnost podmínka - platba předem.

Termín dodání - 3-4 týdny od objednání

Nabídka neobsahuje desky a prokladový materiál. V případě, že bude objednáno menší množství, tak je vhodné paleta bude přitvářeno buďné.

Průběh a výška obráběných materiálů a také se musí dle platných předpisů a produktů a obráběných podmínek.

Děkujeme Vám, že jste nás kontaktovali s Vaší poptávkou a projevili zájem o naše výrobky a jsme připraveni naši nabídku buď osobně nebo telefonicky předat.

tel.: +420 776 413 000

Zboží	Množství	Netto/MJ	Netto
<b>Stavba: -</b>			
dlažba COMCON CD 200x200x30 bílá slepecká	17,00 m2	1 880,81	31 973,77 Kč
dlažba	22,00 m2	3 660,55	80 532,01 Kč
COMCON CD 200X200X60 mm bílá			
dlažba COMCON CDR 255x255x35 bílá slepecká	5,50 m2	2 058,99	11 324,46 Kč
dlažba	7,00 m2	3 986,69	27 906,84 Kč
COMCON CD 225x255x60 mm bílá			
paleta dřevěná nevratná	7,00 ks	180,41	1 262,90 Kč
atyp, nevratná + paletizace + foliování			
Přepravné	1,00 ks	5 000,00	5 000,00 Kč
<b>Celkem za stavbu: -</b>			<b>157 999,99 Kč</b>

	Daň %	Netto	DPH
Základní sazba DPH 21%	21	157 999,99	33 180,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>157 999,99</b>	<b>33 180,00 Kč</b>
<b>Celkem brutto</b>			<b>191 179,99 Kč</b>

Datum vystavení: 18.6.2018

# **Nabídka**

**N1/2018/402**

Dodací podmínky: -  
Způsob dopravy: -

**Datum:** 20.6.2018  
**Vystavil:** Petra Špačková

# FW: Poptávka - Slepecká dlažba COMCON "OK, Týnec nad Sázavou"

Od: [redacted]  
Komu: [redacted]  
Kopie: [redacted]  
Datum: 19.6.2018 10:16

Dobrý den,  
V příloze Vám posílám upravenou nabídku na výše uvedenou akci.  
V případě dotazu prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce p. Petrův tel. 606 710 111

S pozdravem

Martin Alexa  
cenař  
**JOKVA OLMOUC, a.s.**  
Kolovratská 1476  
251 01 Říčany u Prahy

mobil: [redacted]  
telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Web: [redacted]

... známe řešení ...



**Kompletní sortiment výrobků pro kanalizace, vodovody, plynovody a komunikace.**

**From:** Dávid Buxár [redacted]  
**Sent:** Friday, June 15, 2018 3:01 PM  
**To:** Petrův Miloš [redacted]  
**Subject:** Poptávka - Slepecká dlažba COMCON "OK, Týnec nad Sázavou"

Dobrý den,

prosím Vás o cenovou nabídku na slepeckou dlažbu od společnosti COMING včetně dopravy, palet, balného, atd. na naší stavbu: "Okružní křižovatka, Týnec nad Sázavou". Termín realizace stavby je 1.6. - 31.8.2018.  
Materiál bychom potřebovali mít na stavbě koncem července 2018.  
Cenovou nabídku od Vás očekávám do pondělí 18.6.2018, 13:00 hod.

COMCON CD 200x200x30 mm, bílá	17 m2
COMCON CD 200x200x60 mm, bílá	22 m2
COMCON CDR 255x255x35 mm, bílá	5,5 m2

**COMCON CDR 255x255x60 mm, bílá**  
**doprava na stavbu: Týnec nad Sázavou**

**7 m2**  
**1 kpl**

Předem moc děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

**Ing. Dávid Buxár**  
výrobní přípravář staveb

**GEOSAN GROUP a. s.**  
Závod dopravních staveb  
U Průhonu 1516/32  
170 00 Praha 7

mobil:  
email:



*Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost GEOSAN GROUP a. s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoli jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi společností GEOSAN GROUP a. s. a adresátem e-mailu, dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran jak uvedeno shora, přičemž jakákoliv změna v dohodnutém obsahu smlouvy je považována za novou nabídku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoli fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.*

*Společnost GEOSAN GROUP a. s. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury společnosti GEOSAN GROUP a. s. je Criminal compliance program (viz [www.geosan-group.cz](http://www.geosan-group.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za společnost GEOSAN GROUP a. s. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze jej považovat za jednání v rámci nebo v zájmu společnosti GEOSAN GROUP a. s. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně, způsoby uvedenými na [compliance@geosan-group.cz](mailto:compliance@geosan-group.cz).*

#### **Přílohy:**

- 041180253.pdf

# NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 041180253

**Dodavatel :** JOKVA OLOMOUC, a.s.

Náklo, Mezice 81  
783 32 Náklo



IČ : 25874608

DIČ : CZ25874608

Zapsáno v obch.rejstříku Krajským soudem v Ostravě odd.B vl.2468

Číslo dokladu : 041180253

Sklad : 002

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 24523 Týnec nad Sázavou - dlažba

Telefon : +420 585 967 660 - 2

Fax : +420 585 754 038

E-mail :

**Pobočka :** JOKVA OLOMOUC, a.s.

Kolovratská 1476  
251 01 Říčany u Prahy

Telefon :  
Fax :  
E-mail :

**Odběratel :** GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430  
28002 Kolín III

Datum porizeni : 19.6.2018

Splatnost :

Termín dodání :

IČ : 28169522

DIČ : CZ28169522

ř.č.	Skupina	Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH po slevě	Celkem bez DPH po slevě
1	XXX	COMCON CD 200x200x30 mm bílá	17,00	m2	1 895,25	32 219,25
2	XXX	COMCON CD 200x200x60 mm bílá	22,00	m2	3 688,65	81 150,30
3	XXX	COMCON CDR 255x255x35 mm bílá	5,50	m2	2 074,80	11 411,40
4	XXX	COMCON CDR 255x255x60 mm bílá	7,00	m2	4 017,30	28 121,10
					<b>Celkem :</b>	<b>152 902,05</b>
					51,50	152 902,05

**Celkem Kč bez DPH**

**152 902,05**

PŘED PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ OVĚŘIT PLATNOST CEN A TERMÍN DODÁNÍ.

Platnost nabídky do: 10.7.2018

Poznámka:

- 6 x paleta atyp.nevratná+paletizace+foliování 1212,-
- EXW provoz Pavlov - dopravu nezajišťujeme
- celková cena bude fakturována na základě skutečně provedeného odběru
- termín dodání: 2-4 týdny od objednání

nabídka neobsahuje obalový ani prokladový materiál

Výše uvedené ceny jsou platné při objednání celého množství.

Ceny jsou počítány z aktuálních nám garantovaných cen, v nutném případě si vyhrazujeme právo na možnou úpravu nabízených cen.

Pozn.: V případě objednávky uveďte prosím číslo naší nabídky. Děkujeme.

Naši nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a upřesnit před Vaším konečným rozhodnutím a následným uzavřením smluvních vztahů.

Odpovědná osoba : Petrův Miloš  
Zpracováno systémem Helios Orange

Vystavil :  
Kontakt :

Nabídka : 041180253

Strana: 1 / 2

# NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB 041180253

**Dodavatel** : JOKVA OLOMOUC, a.s.

783 32 Náklo



Číslo dokladu : 041180253

Sklad : 002

Budete-li potřebovat další informace neváhejte nás kontaktovat a to na čísle

Věříme, že naši nabídku shledáte zajímavou a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

Petrův Miloš

# POVRCHY

## VOZOVKA:

### ASFALT


- ve staré části Týnce je kromě hlavní komunikace nežádoucí a bude postupně nahrazován kamennou dlažbou

- Asfaltové povrchy by neměly být starší než 20 let. Po této době by mělo být přistoupeno minimálně ke kontrole stavu vozovky.


### BETONOVÉ PANELE

- panely budou postupně nahrazovány kamennou dlažbou


Behosovská a Parka

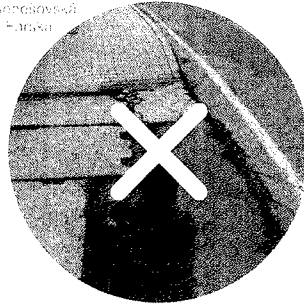

Behosovská

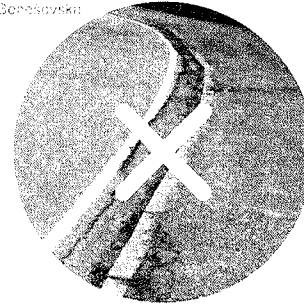

Parka

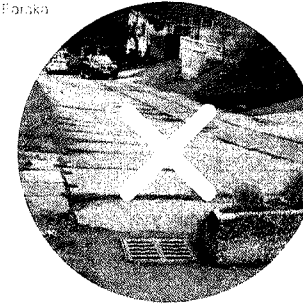


## CHODNÍK:


### ZÁMKOVÁ DLAŽBA

- chodníky ze zámkové dlažby jsou nesourodé  
- zámková dlažba by neměla být použita ve formě kostí, háček a dalších příliš složitých tvarech. Tyto typy dlažby se špatně kombinují a jejich tvar nevychází z žádné historické souvislosti. Obecně by se mělo přistoupit k výměně těchto povrchů za nové.

Čiřbátov

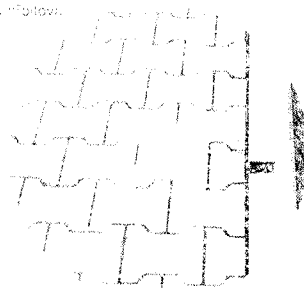


Pod Saubou

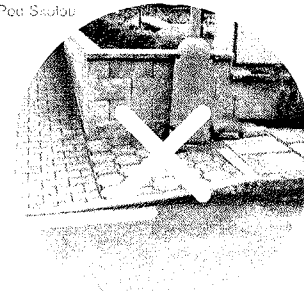

ČESTŮVA





K Návli

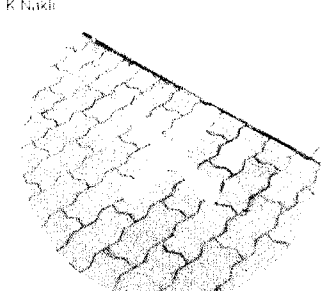


### BETONOVÁ DLAŽBA

- chodníky z betonové dlažby jsou nesourodé a často ve špatném stavu  
- betonová dlažba velkých formátů s velkými spárami je nevhodná pro chůzi a měla by se vyměnit.  
- betonová dlažba podlouhlého formátu skládaná podél komunikace.  
- skládání betonové dlažby do čtvercu. Dlažba by měla mít stejné kladení po celé délce chodníku.


Družstevní

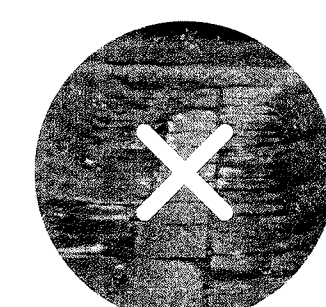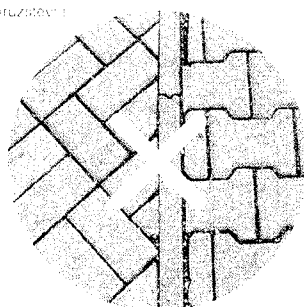


K Junt

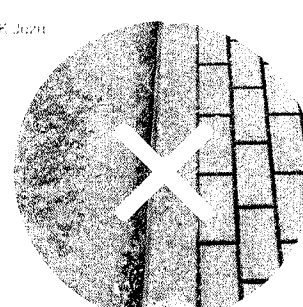

Družstevní

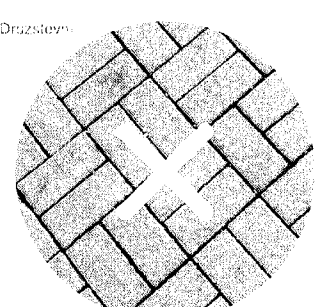

Pod Saubou

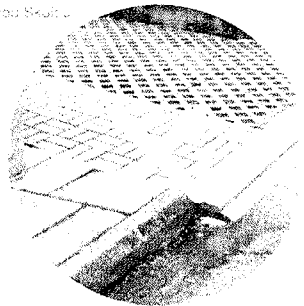

Pod Hradičkou





## B.1 POVRCHY

### VOZOVKA:

#### ASFALT


- bude používán na hlavní komunikace (ul. Benešovská, Jilovská, Pražská)
- lze využít i na vedlejších komunikacích




#### BETONOVÁ DLAŽBA

- bude používána na zklidněných místních komunikacích
- betonová dlažba 100x200x80 nebo 200x200x80mm nebo podobných rozměru
- skládaná do řádku nebo do V
- barevnost šedá/tmavě šedá


presbeton holland I 100/200

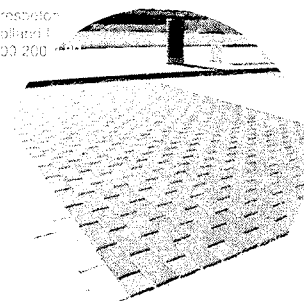


presbeton querra II 210/140/80

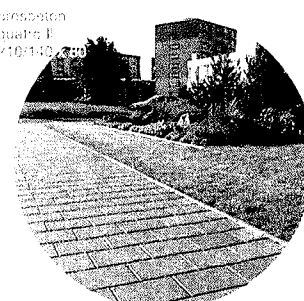

presbeton altuna III 150/160/80

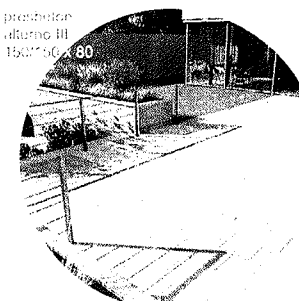

presbeton holland III 200/200

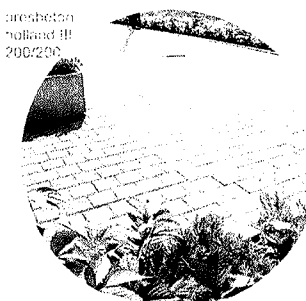


### VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ:


#### KAMENNÁ DLAŽBA

- bude používána na dílčích významných plochách
- žulová dlažba větších formátu
- tryskaný formát
- v kombinaci s jinými formáty (např. kostka 80/100)
- skládaná do řádku
- barevnost šedá/ světle šedá

dlažba žulová tryskaná větší formát

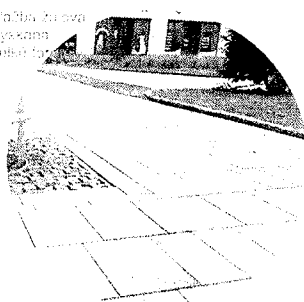

žulová dlažba kostka 80/100

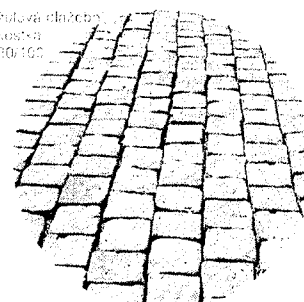

### CHODNÍK:


#### BETONOVÁ DLAŽBA

- skládaná do řádku
- barevnost šedá


best Mento 80/120x80




best Mento 70/90x80

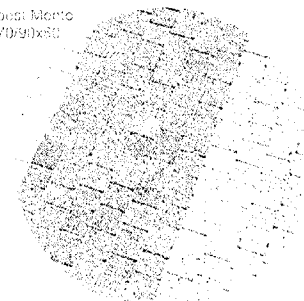

presbeton holland I 100/200

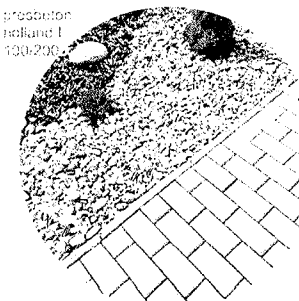

presbeton ralk II mix 140/210 x 60

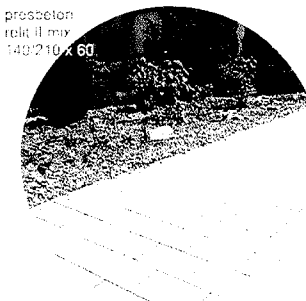


## B.1 POVRCHY


### CHODNÍK:

#### KAMENNÁ DLAŽBA

- bude používána na dílčích významných plochách
- žulová dlažba větších formátů
- tryskaný formát, skládaná do řádků
- v kombinaci s jinými formáty (např. kostka 40/60), skládanými do řádků nebo do vějíře
- barevnost šedá/ světle šedá/ melír

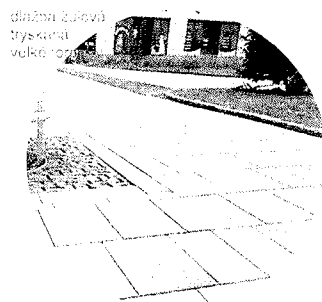


žulová dlažební  
kostka  
40/60

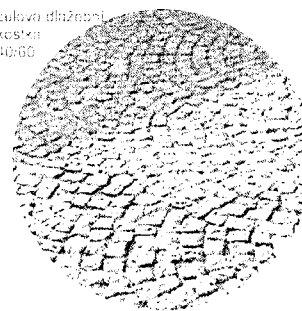


#### DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ

- betonová dlažba 200x100 bude používána v kombinaci
- s betonovou dlažbou
- vždy bílá nebo tmavá
- nepoužívat červenou

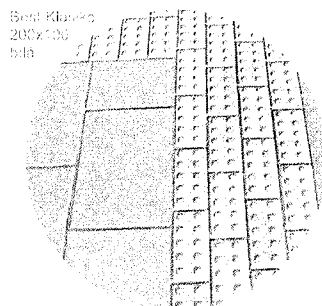

COMCON CD60  
300x300  
250x250




COMCON CD60  
200x200



### OBRUBNÍK:

#### KAMENNÝ / BETONOVÝ

- kamenný obrubník OP 3 na hlavních tazích (250x200x800-1600 mm) nebo betonový obrubník 250mm
- kamenný obrubník na významných plochách
- betonový obrubník 150mm na vedlejších

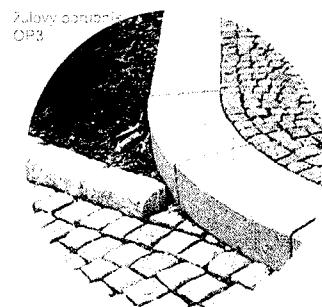

betonový obrubník  
250mm






betonový obrubník  
150mm



## B.2 MOBILIÁŘ

## ZÁBRADLÍ TÝNEC

- výška 1100mm, minimální délka pole 2000mm
- pokud více polí, pak pole sloupky sdílí, nedělají se dva
- na koncových polích přesah profilu madla o cca 10mm
- svařovaná ocelová konstrukce, zároveň zinkovaná
- profily kulaté Ø 30-40mm
- nátěr - vypalovací lak
- barva RAL 7024 / RAL 7004
- primární barva RAL 7024 - Grapnitgrau pokud není řečeno jinak
- vždy skryté šrouby a kotvení

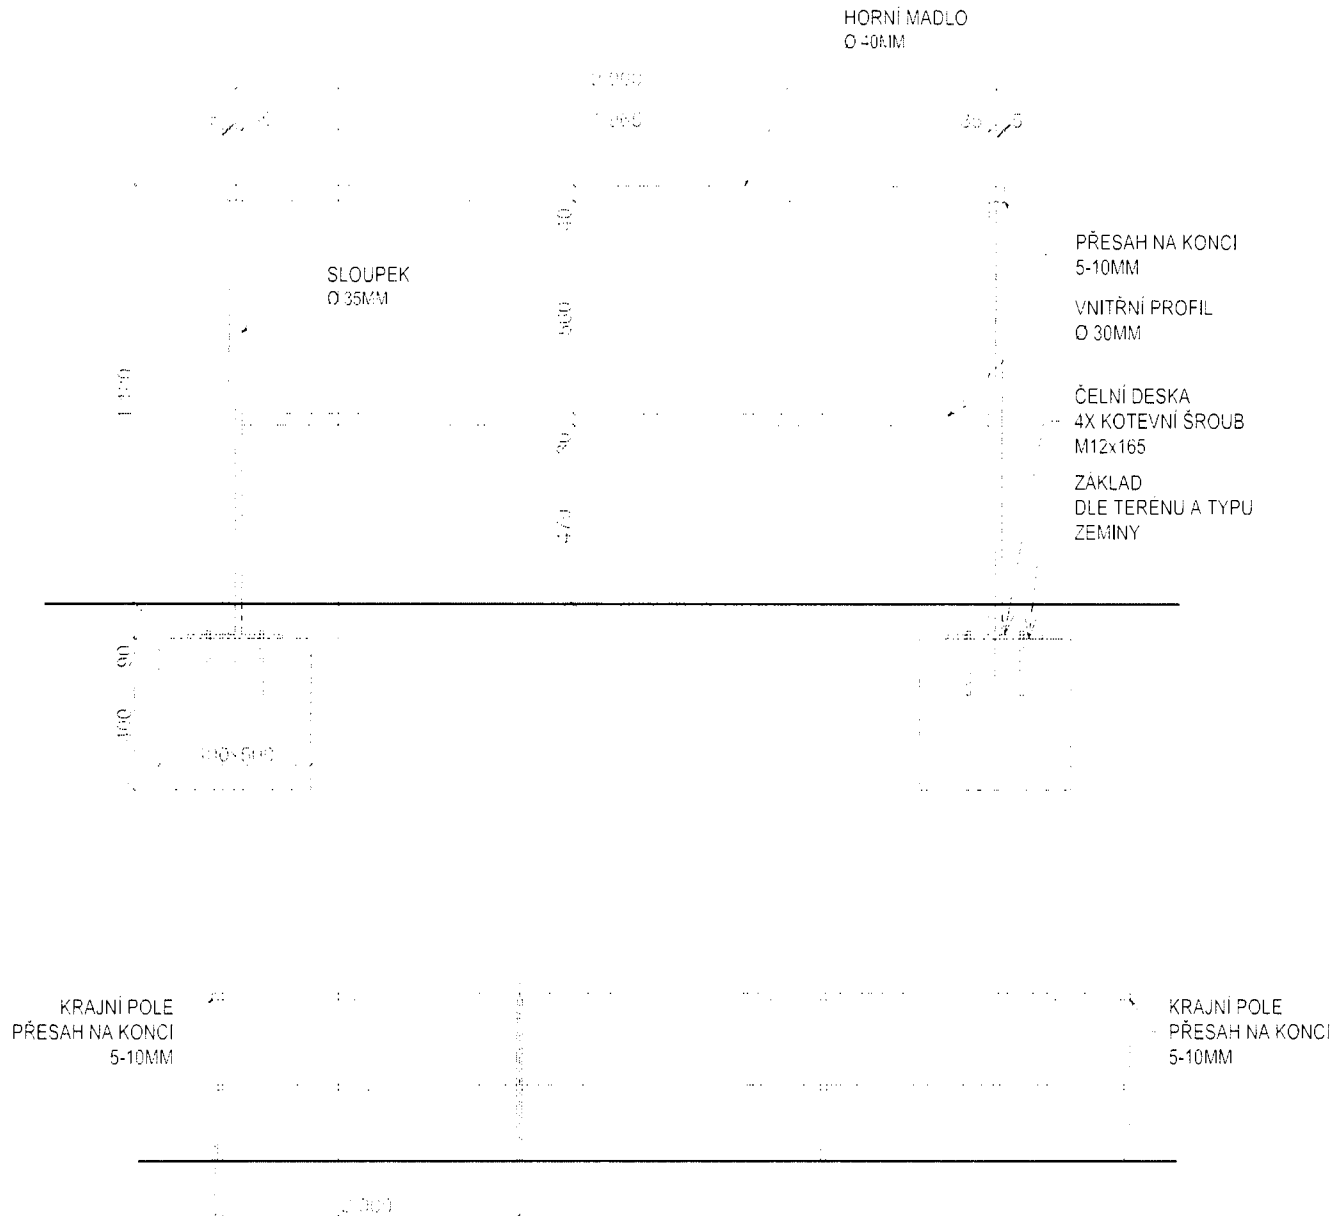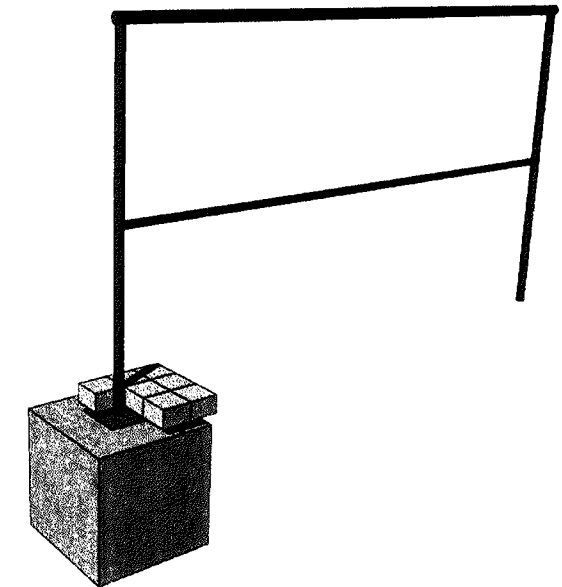

## Zápis z kontrolního dne č. 1 stavby

*Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 x III/10513*

### Kontrolní den – operativní porada

Číslo 1 konaný dne 5.6.2018

### Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 1

### Program kontrolního dne / operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
  - a) Stav PD (předávání RDS, schvalování TePř ...)
  - b) Popis provedených prací
  - c) Finanční plnění
2. Kontrola úkolu z minulého KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

#### 1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného HMG (předávání podkladů – RDS aj ) Stavba byla zahájena v rámci aktualizovaného HMG ( 4. fáze), konečný termín do 31.8. 2018  
Předán koncept RDS, zhotovitel dodá čístopis RDS
- b) popis provedených prací Zhotovitel vypracuje měsíční zprávu o provedených pracích.  
Zahájeny stavební práce. DIO, odfrézování stávající vozovky, probíhá demolicí opěrné zídky, demontáž chodníku.
- c) finanční plnění Zahájeno, dosud 0

#### 2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
------------	-------	----------------------------	-----------	---------------------

#### 3. Kontrola kvality

- a) zpráva o vyhodnocení kvality Práce prováděny dle TKP, probíhá odsouhlasování TePř.

#### 4. Stav BOZP a PO

Nebylo zjištěno porušení předpisu a směrnic BOZP. Problematika BOZP bude řešena samostatnou měsíční zprávou. Nutno udržovat značení a oplocení stavb s ohledem na riziko pohybu cizích osob.  
KOO BOZP připomíná důsledné používání osobních ochranných pomůcek – přilby, rukavice, brýle a nošení reflexního oblečení - vest s firemním označením.

## 5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.1	Termin pokládky živ povrchu	Ověřit možnosti a termíny pokládky nových živičných povrchu za úplné uzavírky.	Zhotovitel	19.6.2018
1.2	Týdenní plán prací - info	Zasílat týdenní plán prací na období 2 týdnů do dalšího KD	Zhotovitel	Pruběžně
1.3	RDS – změny PDPS	Zhotovitel předložil identifikované změny mezi PDPS a RDS. Doplní a zdůvodní položky, a zašle v přehledné excel. tab. k předběžnému posouzení nároku.	Zhotovitel	6.6.2018
1.4	RDS – vyjádření	Zdůvodnit změny - rozdílový výkaz výměr mezi PDPS a RDS	AD – autorský dozor	7.6.2018
1.5	Informační tabule	Zhotovitel osadil 2 ks požadované informační tabule	Zhotovitel	Splněno, vypustit
1.6	Pasportizace obj. trasy	Předat KSÚS pasportizaci objízdné trasy dle podmínek stav. povolení a dohody	Zhotovitel	8.6.2018
1.7	Prujezdnost KO	Udržovat sjízdný a rovný povrch staveniště pro veřejnou dopravu, udržovat nájezdové klíny v napojení na stávající vozovky	Zhotovitel	Pruběžně
1.8	Vyzískaný materiál – kostky atd.	Nakládání s vyzískaným materiálem a jeho odkup řešit v souladu s SOD, pozor na ztráty především žulových kostek apod. Evidovat a dokumentovat množství.	Zhotovitel	Pruběžně
1.9	Subdodávky	Předložit případné subdodavatele ke schválení	Zhotovitel	Pruběžně

## 5. Různé

- R.01 Kontrola stavby se zápisem (zajistí TDI) – formou dispečinku, 2 x měsíčně bude KD, KDK a KD KOO BOZP – sloučeno v jednom dni. Platí vzestupné číslování bodu
- R.02 Oběh dokumentu – zásadně se vyplní / vytiskne POUZE jeden originál zápisu, který bude po podpisu oscanován a (ve formátu PDF) jako příloha e-mailu rozeslán. Obdobně se též budeme chovat ke konceptům (PD, TePř, KZP ...) i čistopisům. Rozesílá se ZÁSADNĚ mailem (dopis jako příloha v PDF), každý účastník si vytiskne dle své potřeby potřebný počet. Archivaci zajišťuje TDI (i dopisy došlé do datové schránky musí být předány na TDI, aby mohly být evidovány).

## 7. Závěr

Datum konání příštího KD / OP      KD č. 2 – úterý 19.6.2018 – 9.00 na stavbě

Zapsal TDI:  
VPÚ DECO PRAHA, a.s.

Ing. Jindřich Přivratský



Objednatel – KSÚS

Ing. Milan Fiala

Zhotovitel – GEOSAN GROUP a.s.  
Stavbyvedoucí

Jan Vacek



## Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina OP / KD č. 1

## Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky.

**Elektronicky odesláno dne 6.6. 2018 na adresy, uvedené v prezenční listině.**

## PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

*Účastníci jednání berou na vědomí, že*

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině*
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14.00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování*
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky*
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající*

## Prezenční listina

**Název akce:** Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 x III/10513**Místo konání:** Týnec nad Sázavou**Datum konání:** 5. 6. 2018

1. Ing. Milan Fiala KSÚS – Středočeský kraj  
2. JUDr. Luděk Beneš KSÚS – Středočeský kraj  
3. Miloslav Pohunek KSÚS – SK, oblast Benešov  
4. Ing. Jindřich Přívratský VPÚ DECO – TDI  
5. Roman Veleba VPÚ DECO – KOOBOZP  
6. Ing. Šimon Mytzyk GEOSAN GROUP a.s.  
7. Jan Vacek GEOSAN GROUP a.s.  
8. Ing. Tomáš Roztočil Ateliér PROMIKA – AD  
9. Jiří Vrbata Město Týnec nad Sázavou

Ing. Milan Fiala

KSÚS – Středočeský kraj

JUDr. Luděk Beneš

KSÚS – Středočeský kraj

Miloslav Pohunek

KSÚS – SK, oblast Benešov

Ing. Jindřich Přívratský

VPÚ DECO – TDI

Roman Veleba

VPÚ DECO – KOOBOZP

Ing. Šimon Mytzyk

GEOSAN GROUP a.s.

Jan Vacek


GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Tomáš Roztočil

Ateliér PROMIKA – AD

Jiří Vrbata

Město Týnec nad Sázavou

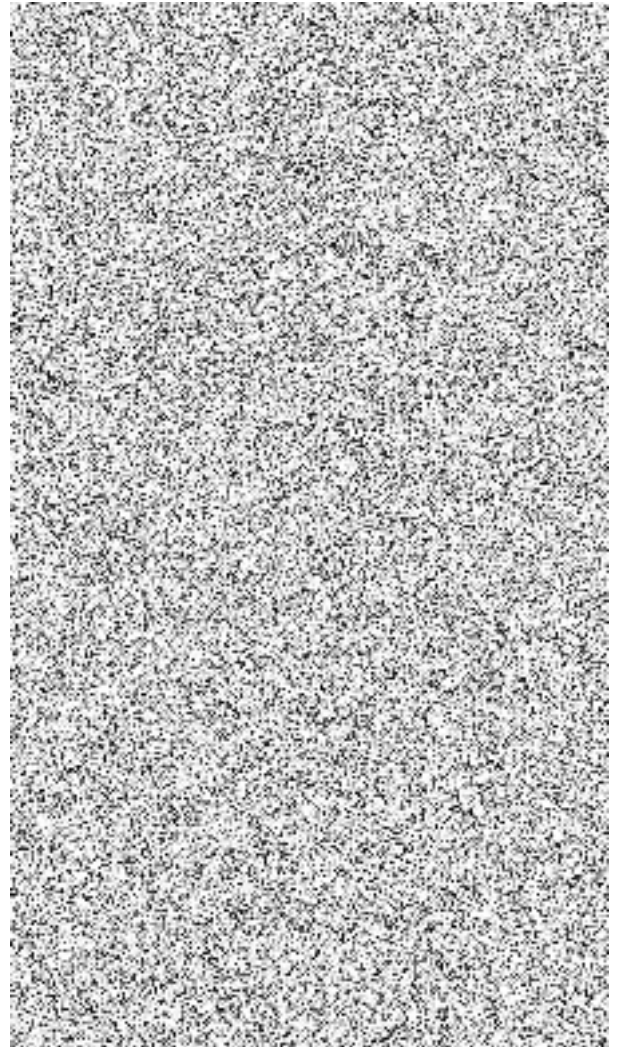

## Zápis z kontrolního dne č. 2 stavby

### Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 x III/10513

#### Kontrolní den – operativní porada

Číslo 2 konaný dne 19.6.2018

#### Účastníci

Seznam účastníku je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 2

#### Program kontrolního dne / operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby.
  - a) Stav PD (předávání RDS, schvalování TePř ...)
  - b) Popis provedených prací
  - c) Finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

#### 1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného HMG (předávání podkladu – RDS aj ) Stavba byla zahájena a probíhá v rámci aktualizovaného HMG ( 4. fáze). konečný termín do 31.8. 2018 platí. Předpoklad zahájení fáze 3 od 23.6.2018
- b) popis provedených prací Zhotovitel vypracuje měsíční zprávu o provedených pracích. Probíhá sanace aktivní zóny, zřizování zemní pláně a podkladních štěrkových vrstev vozovky, přeložka VO, dokončení demolice opěrné zidky, úklid sutě.
- c) finanční plnění Zahájeno, dosud fakturace 0

#### 2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.1	Termín pokládky živ. povrchu	Ověřit možnosti a termíny pokládky nových živých povrchů za úplné uzavírky	Zhotovitel	Trvá 3.7.2018
1.2	Týdenní plán prací - info	Zasílat týdenní plán prací na období 2 týdnů do dalšího KD	Zhotovitel	Průběžné
1.3	RDS – změny PDPS	Zhotovitel předložil identifikované změny mezi PDPS a RDS. Doplní a zdůvodní položky, a zašle v přehledné excel tab k předběžnému posouzení nároku.	Zhotovitel	Trvá 26.6.2018
1.4	RDS – vyjádření	Zdůvodnit změny - rozdílový výkaz výměr mezi PDPS a RDS	AD – autorský dozor	Trvá 26.6.2018
1.6	Pasportizace obj. trasy	Předat KSÚS pasportizaci objízdné trasy dle podmínek stav. povolení a dohody	Zhotovitel	Splněno. vypustit
1.7	Průjezdnost KO	Udržovat sjízdný a rovný povrch staveniště pro veřejnou dopravu, udržovat nájezdové klíny v napojení na stávající vozovky	Zhotovitel	Průběžné



1.8.	Vyzískaný materiál – kostky atd.	Nakládání s vyzískaným materiálem a jeho odkup řešit v souladu s SOD, pozor na ztráty především žulových kostek apod. Evidovat a dokumentovat množství. RE KSÚS: vytěžené kostky cca 6 t jsou majetkem města Týnec, viz zápis v SD	Zhotovitel	Splněno vypustit
1.9	Subdodávky	Předložit případné subdodavatele ke schválení	Zhotovitel	Průběžně, vypustit

### 3. Kontrola kvality

a) zpráva o vyhodnocení kvality Práce prováděny dle TKP, probíhá odsouhlasování TePř.

### 4. Stav BOZP a PO

Nebylo zjištěno porušení předpisu a směrnic BOZP. Problematika BOZP bude řešena samostatnou měsíční zprávou. Nutno udržovat značení a oplocení stavby s ohledem na riziko pohybu cizích osob.

KOO BOZP připomíná důsledné používání osobních ochranných pomůcek – přilby, rukavice, brýle a nošení reflexního oblečení - vest s firemním označením.

### 5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
2.1	Nález vyústění dešť. kanalizace z ul. Lipová	Stavbou nalezené vyústění DK z opěrné zdi napojit dle návrhu AD na pokračující stávající trubní vedení. Profil a technický detail upřesní AD se zhotovitelem. Pořízena fotodokumentace. MěÚ nemá k dispozici pasport stávající dešťové kanalizace v prostoru stavby. Případné nové nálezy ohlásí zhotovitel správci sítí. PDPS byla řešena předpokladem AD.	AD, Zhotovitel	26.6.2018
2.2	Sanace aktivní zóny	Nevhodný materiál aktivní zóny sanovat dle návrhu geotechnika a AD, viz zápis v SD	Zhotovitel	Splněno vypustit
2.3	ZBV 1,2,3	Zpracovat čistopis ZBV, samostatně každý SO a předložit schvalovateli	Zhotovitel	29.6.2018
2.4	Dodatek č. 1	Přípravit dodatek č. 1 Sod na základě ZBV 1-3	Zhotovitel	3.7.2018
2.5	MěÚ – požadavek na pružnost cyklotrasy	Je udržována, odpovídá DIO.	Zhotovitel	Splněno vypustit
2.6	MěÚ – požadavek předání DIO	Bylo již předáno. Aktualizace předávat alesp. 2 dny předem s uvedením časového rozsahu.	Zhotovitel	Splněno vypustit
2.7	MěÚ – požadavek rovinnost povrchu	Udržovat lepší sjízdnost povrchu staveniště	Zhotovitel	Průběžně
2.8	MěÚ – návrh zpruždnit křižovatku dne 23.6. po dobu oslav 700 let Týnec n. S.	Z hlediska platného DIO, HMG stavby a stavební rozpracovanosti nelze zprovoznit. Práce budou probíhat i nadále.	Zhotovitel	Splněno vypustit
2.9	MěÚ – požadavek ul. Pod Hradištěm	Udržovat komunikaci a šterbinový žlab v čistém stavu, po dokončení komplet vyčistit	Zhotovitel	Průběžně
2.10	MěÚ – požadavek úpravy nastavení semaforu	Provéřit nastavení semaforu ve špičkách, především pá odpol. ve směru od Prahy, po-čt odpol. ve směru od Benešova. Tvoří se kolony	Zhotovitel	26.6.2018
2.11	KSÚS- poškození obrusní vrstvy ul. Benešovská II/106	Bude opraveno po dokončení stavby v rozsahu a způsobem dohodnutým s KSÚS	Zhotovitel	Dokončení stavby

### 5. Různé

R.01 Kontrola stavby se zápisem (zajisti TDI) – formou dispečinku. 2 x měsíčně bude KD, KDK a KD KOO BOZP – sloučeno v jednom dni. Platí vzestupné číslování bodu

R.02 Oběh dokumentu – zásadně se vyplní / vytiskne POUZE jeden originál zápisu, který bude po podpisu oscanován a (ve formátu PDF) jako příloha e-mailu rozeslán. Obdobně se též budeme chovat ke konceptum (PD, TePr, KZP ...) i čistopisům. Rozesílá se ZÁSADNĚ mailem (dopis jako příloha v PDF), každý účastník si vytiskne dle své potřeby potřebný počet. Archivaci zajišťuje TDI (i dopisy došlé do datové schránky musí být předány na TDI, aby mohly být evidovány).

## 7. Závěr

Datum konání příštího KD / OP KD č. 3 – úterý 3.7. 2018 – 9.00 na stavbě

Zapsal TDI:  
VPÚ DECO PRAHA, a.s

Ing. Jindřich Přivratský

Podpis

Objednatel – KSÚS

Ing. Milan Fiala

Zhotovitel – GEOSAN GROUP a.s  
Stavbyvedoucí

Jan Vacek

Podpis

## Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina OP / KD č. 2

## Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky.

**Elektronicky odesláno dne 20.6. 2018 na adresy, uvedené v prezenční listině.**

## PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím


## Prezenční listina

**Název akce:** Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 x III/10513

**Místo konání:** Týnec nad Sázavou

**Datum konání:** 19. 6. 2018

Ing. Milan Fiala	KSÚS – Středočeský kraj
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS – Středočeský kraj
Miloslav Pohunek	KSÚS – SK. oblast Benešov
Ing. Jindřich Přívratský	VPÚ DECO – TDI
Roman Veleba	VPÚ DECO – KOOBOZP
Ing. Šimon Mytzyk	GEOSAN GROUP a.s.
Jan Vacek	GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Tomáš Roztočil	Ateliér PROMIKA – AD
Jiří Vrbata	Město Týnec nad Sázavou

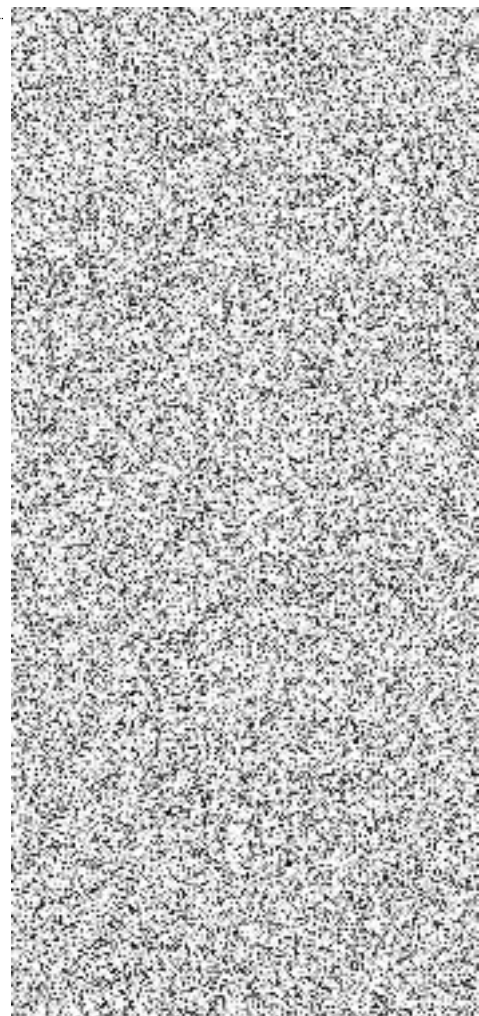



# Město Týnec nad Sázavou

K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

---

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

---

## Z á p i s č. 15/2017

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 04.09.2017

### Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka  
Ing. Bedřich Pešan  
František Kašpárek      příchod 17.00  
Mgr. Petr Znamenáček  
Pavel Korec

### Omluveni:

---

### Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník  
Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor

### Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

---

starosta

---

místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 04.09.2017

Schůze rady byla zahájena v 16:00 hodin v zasedací místnosti rady.

#### **A) Zahájení**

Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání byl ověřen, námítky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program jednání.

#### **B) Nová usnesení**

- 15/1 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení převodu družstevního podílu na byt č. C34, Na Kněžině č.p. 37 a schválení nájemní smlouvy.  
Schváleno 4 - 0 - 0
- 15/2 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení převodu družstevního podílu na byt č. C33, Na Kněžině č.p. 37 a schválení nájemní smlouvy.  
Schváleno 4 - 0 - 0
- 15/3 Žádost Bytového družstva Bystřice o schválení převodu družstevního podílu na byt č. B72, Na Kněžině č.p. 43 a schválení nájemní smlouvy.  
Schváleno 4 - 0 - 0
- 15/4 Žádost J.P. o vyjádření ke stavbě oplocení, které bude provedeno podél východní strany pozemku parc. č. 85/2 v katastrálním území Pecerady (směrem ke komunikaci). Podezdívka a sloupky budou z betonových tvarovek, výplň kovová, výška oplocení max. 2 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.  
Schváleno 4 - 0 - 0
- 15/5 Žádost P.Ř. a společnosti Waldstein.cz o vyjádření ke stavebním úpravám a vestavbě podkrovní v domě č.p. 56 v ulici Pod Hradištěm, Týnec nad Sázavou. Rada s úpravami souhlasí, požadujeme vybudování parkoviště dle záměru z roku 2010 (upraveného dle požadavků územního plánu) s minimálním počtem 9 míst. Žadatele upozorňujeme, že možnost parkování na pozemku 3030 v k.ú. Týnec nad Sázavou již není možná (vzhledem ke změně způsobu využití č.p. 2) a rušíme tak platnost stanoviska MUTnS - 3979/2013 ze dne 13.6.2013.  
Schváleno 4 - 0 - 0
- 15/6 Žádost M.S. o souhlas s uložení vodovodní přípojky do obecního pozemku komunikace parc. č. 3817/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Přípojka bude zásobovat vodou stavbu na pozemku parc. č. st. 88/2 (bar Neplecha). Rada se stavbou přípojky souhlasí. Standardní podmínky vstup do komunikace. Komunikace bude opravena v celé šíři (od obruby k obrubě).  
Schváleno 4 - 0 - 0
- 15/7 Žádost Bytového družstva Bystřice o vyjádření k rekonstrukci střech domů Na Kněžině č.p. 36-45. Rada jednoznačně preferuje rekonstrukci při použití plochých střech z důvodu zachování stávající střešní krajiny. Z předloženého posudku ateliéru DEK vyplývá, že doporučený způsob opravy je použití ploché střechy. Jde o jednodušší, levnější a z hlediska statiky o doporučené řešení.  
V případě rozhodnutí BD o realizaci šikmých střech požadujeme předložit souhlas původních autorů sídliště (m4architekti s.r.o.) s plánovanými změnami. V případě souhlasu původních autorů s použitím jiných, než plochých střech, může rada udělit souhlas i s jiným provedením.  
Upozorňujeme, že řešení se šikmou střechou obsahuje detail, který neřeší psychologickou obavu obyvatel, že do budovy bude nadále zatékat. Dešťová kanalizace totiž svádí vodu ze střechy znovu do střešních vpustí, při použití nejméně dvou prostupů skrze stávající konstrukce a minimálně dvou kanalizačních kolen - tedy v dlouhodobém horizontu místa, kde mohou vznikat problémy.

V případě zpracování projektu na šikmé střechy pro stavební povolení vyžadujeme následující:

1. Studii na proměnu střešní krajiny sídliště včetně zákresů do fotografií z pohledu člověka a dálkové pohledy na sídliště.
2. Musí být zajištěna celistvost návrhu - tzn. že střechy musí být stejné na celém sídlišti.
3. Výměna střech musí proběhnout v uceleném časovém úseku max. 3 roky na jedno povolení pro všechny domy.
4. Barevnost střech musí být v neutrální podobě - v šedé barvě, jejíž odstín bude barevně odvozen od stávající barvy omítky.

Schváleno 4 - 0 - 0

15/8 Nové projednání žádosti SŽDC o majetkové vypořádání stavby dráhy (Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany). Vypořádání je požadováno rozdílně od uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z r. 2015.

- a. Železniční přejezd u zastávky v Chrástu nad Sázavou – žádost o věcné břemeno na pozemku parc. č. 4188 v k. ú. Týnec nad Sázavou a odkup části tohoto pozemku (část o velikosti 9 m<sup>2</sup>), na které je umístěn technologický domek.
- b. Železniční přejezd v obci Chrást nad Sázavou – žádost o odkup částí pozemků parc. č. 4299/1 a 4235/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou (části o velikosti 8 a 5 m<sup>2</sup>), na kterých je umístěna závora. Původně mělo být na těchto pozemcích zřízeno věcné břemeno. Pozemky pro odkup, částečně zasahují do obecní komunikace.

Rada navrhuje směniti část p.č. 4235/1 o výměře 5 m<sup>2</sup> a vyznačenou část p.č. 4299/1 o výměře cca 3 m<sup>2</sup> a pozemky u zastávky ČD v Chrástu za komunikaci vedoucí na p.č.4036/2, nyní ve vlastnictví SŽDC s doplatkem. Cena za rozdíl výměr by byla dle znaleckého posudku, který nechají vyhotovit SŽDC případně za cenu 150 Kč/m<sup>2</sup> dle směrnice města Týnec nad Sázavou č. 2016/5. Rada pověřuje odbor majetku projednat požadavek na směnu s žadatelem.

Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích, cena za VB bude dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/9 Žádost J.P. o nové vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 73/3 v katastrálním území Krusičany. Rodinný dům bude o půdorysu 8 x 8 m, zastavěná plocha 64 m<sup>2</sup>. Dům bude mít sedlovou střechu. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.

Schváleno 5 - 0 - 0

**Plnění usnesení č. 15/1 až 9 zajistí Mgr. Martina Havránková**

15/10 9. rozpočtové opatření rady města pro rok 2017

Schváleno 5 - 0 - 0

**Plnění usnesení č. 15/10 zajistí Ing. Kateřina Hrušková**

15/11 Žádosti o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studní. Všechny žádosti splňují podmínky programu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace pro P.J.L., P.N., L.S.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/12 Záměr akcí k oslavám 700 let Týnce. Předpokládaný termín 23.06.2018. Dopoledne sport, hasiči na hřišti v Náklí, odpoledne kulturní program ve spolupráci s rádiem Blaník - cena 340.000 Kč bez DPH (diskotéka, Michal Nesvatba, soutěže, Václav Neckář & Bacily, Xindl X) a večerní taneční zábava Horvath Band - cena 27.000 Kč.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/13 Návrhy na udělení ocenění Významný občan. Rada doporučuje udělení ocenění pro Františka Ptáčníka.

Schváleno 5 - 0 - 0

15/14 Stanovení platové třídy ředitelce Mateřské školy Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace od 01.09.2017.
