

Zpráva k projektu PM-03

Projekt: **Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**

Předmět: změna osazení táhrel v 2.np

Pro: **XXXXXXXXXX**

Od: **XXXXXXXXXX**

Datum: 17.12.2019

Příloha:

Původní návrh předpokládal, že v úrovni podkroví 2 nad pokladnicí je realizováno zajištění obvodového zdiva provedené v rámci rekonstrukce krovu. V době zpracování dokumentace tento prostor nebyl přístupný a skutečný stav nebylo možné ověřit.

Dne 13.12.2019 jsem společně s **XXXXXXXXXXXX** prohlédl podkroví a dokumentoval stav zajištění obvodového zdiva táhly. V příčném směru je každý vazný trám zakotven do obvodového zdiva hlavní lodi a římsy pokladnice dle detailu 3-07 uvedeném na výkresu S.02 Púdorys 2.np. Část kotev je zakončena v cihelném zdivu, část v kameni.

V podélném směru není obvodové zdivo zajištěno.




Obrázek 1: Podkroví 2, pokladnice: Skutečné provedení zajištění obvodového zdiva


Změna

Na úrovni 2.np se bude realizovat sanace původních táhrel T50 a T51 a osazení táhrel T01, T03 a T04 se vypustí.


Táhlo T02 místo na úrovni 2.np bude osazeno na úrovni podkroví 2, tj nad klenbou pokladnice pod vaznými trámy cca 15 cm nad rubem klenby. Přesná poloha bude vyznačena na místě. Kotvení táhla ve stěně u opěráku OP5 zůstane stejné, kotvení na štítu u opěráku OP6 bude pomocí kované závlače.

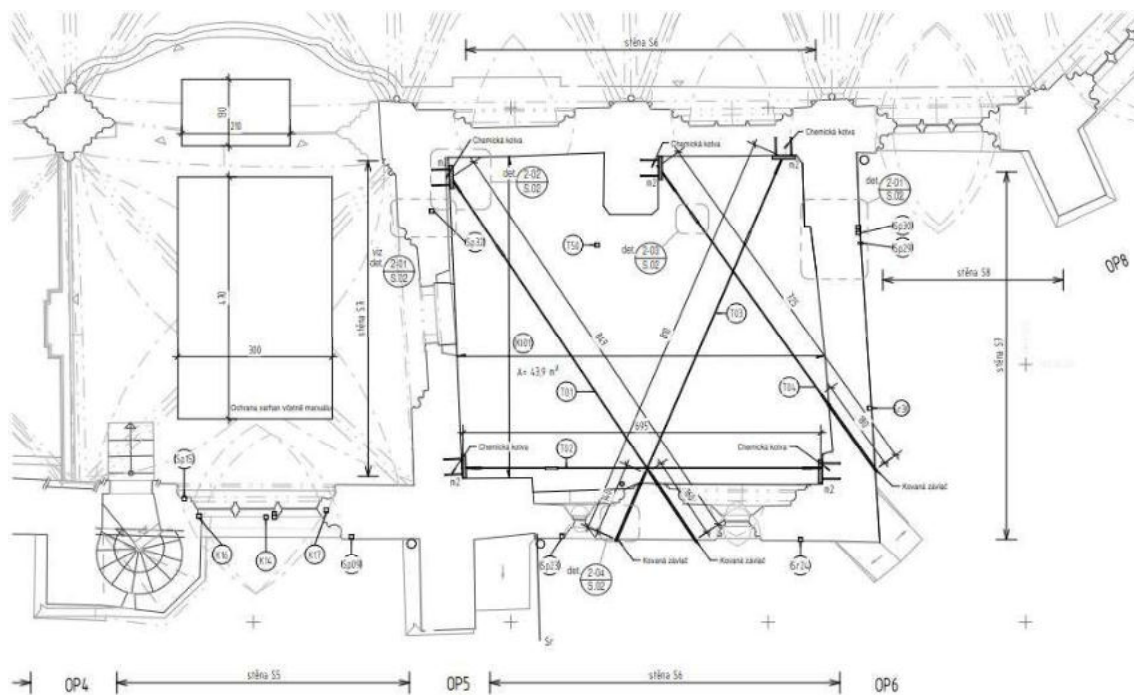

Obrázek 2: 2.np, pokladnice: Původní návrh zajištění obvodového zdiva

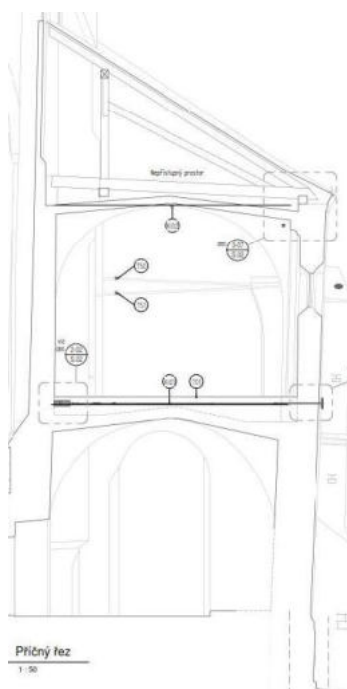

(a) Příčný řez

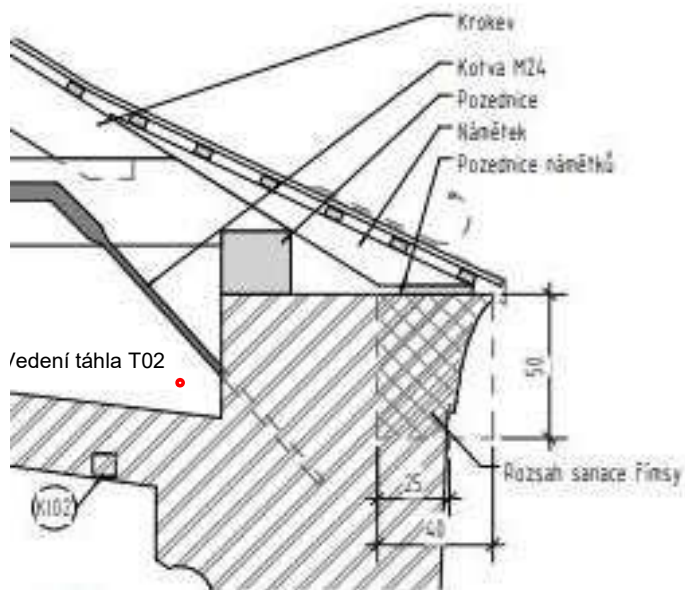

(b) Detail 3-07, poloha táhla T-02 (červeně)

Obrázek 3: Pokladnice: Původní návrh zajištění obvodového zdiva, změna polohy táhla T-02 v řezu

Maurec
