

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS. 101/3	Číslo ZBV 10
--	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	387 617,69	387 617,69

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	0,00	387 617,69	387 617,69

Části ZBV se čísují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby II/114, Neveklov - I/3; s.č.: Z2019-016243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Pozemní komunikace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS 101/3	Číslo ZBV 10
---	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-E/00066001/2020 a zhotovitel č. S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21. 1. 2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sukova 525 - 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu	Paré č.	Příjme
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění a soupisu prací	3	Projektant (AO)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 10	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	6	
7. Další doklady a přehledu dokladů	27	

Indikátor změny: Zholovitel

Podpis a zdůvodnění Změny:

Zpěvnění příkopů

Změna vznikla na základě odlišného stavu příkopů na vnitřních okrajích vozovky v obloucích v serpentínách zjištěného při realizaci oproti předpokladu PDPS.

PDPS předpokládala, že podélné komunikace budou vyhovující podmínky pro vytvoření dostatečně kapacitního příkopu pro odvod vody i s předepsanou šířkou krajnice.

Při realizaci po oděžení a podrobném zaměření příkopů oblouků v serpentínách bylo zjištěno, že pro zajištění odvodnění je nutné v příkopech na vnitřních stranách oblouků, s ohledem na průjezd vozidel a hranice sousedních pozemků provést zpěvnění a vytvoření podélného žlabu pomocí dlažby z kamenných káček kladených do betonu (viz. doklad č. 11 - Fotodokumentace). Zpěvnění příkopu bylo provedeno dle návrhu AO (viz. doklad č. 09 Schéma sanace základu OP1 - příkop) a po domluvě s KSJS se namísto žlabovky použily kamenná kůstky. Množství provedených příkopů bylo následně geodeticky zaměřeno (viz. doklad č. 10 Geodetický protokol). Provedení prací bylo zaznamenáváno ve stavebním deníku (viz doklad č. 08 - Zápis SD)

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsane nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijatých smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k doležené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 14 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TCI (viz. doklad č. 13 - Vyjádření TCI) a projektantem AO (viz. doklad č. 12 - Vyjádření AO)

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1. písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	387 617,69	387 617,69	387 617,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavebyvedoucí): B C S s.r.o.	Jméno	Ing. Petr Nagy	datum	21. 06. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): SUDOV PRAHA a.s.	Jméno	Ing. Marek Stádník	datum	28. 06. 2021	podpis
Stavební dozor: SOS Czech Republic spol. s r.o.	Jméno	Ing. Milan Kadeřel	datum	25. 06. 2021	podpis
Supervize (Regionální dozorčí kancelář)	Jméno	Ing. Václav Chytil	datum	28. 07. 2021	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	Jméno	Jan Zakostelský	datum	28. 07. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, uokamenné a uctmnné v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny z tohoto Změnového listu nejsou zepěvněny dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nezměněny. Na dlekaz toto přijímají příslušné osoby oprávněné jednat: jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své pozp sy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Ing. Jan Lichtrope	datum		podpis
Zhotovitel (jednatel)	Jméno	Ing. Luboš Kiz	datum	21. 06. 2021	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Název Stavby:	II/114, Neveklov - I/3; a.č.: Z2019-018243
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Pozemní komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
61 086 056,57

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	61 086 056,57	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	387 617,69	387 617,69	0,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	61 473 674,26	387 617,69	0,63%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stádník
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s.r.o.	souhlasím	Ing. Mířan Kodet
Zástupce Objednatel:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

SO 101

Číslo a název rozpočtu: SO 101

Skupina změn 4

Ř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODFADČ. NEMOŽITA MIRDVÁNYCH 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘ. DA. TÍŽITELNOSTI	T	2300,374	22410,375	210,000	101,820	2 270 524,18	0,00	11 200,20	2 281 624,38	11 200,20	0,49%
		Nové položky											
122	12283	HLAUBEK. RÁM. Š. P. DO 2M PAŽ. NCPAŽ. TŘ. II	M3	0,000	55,000	55,000	1121,200	0,00	0,00	61 666,00	61 666,00	61 666,00	100,00%
123	10170	OPRAVA PLOŠNÉ SF. ZHUTNĚNIM V HORNINĚ TŘ. II	M2	0,000	192,500	192,500	25,450	0,00	0,00	4 899,13	4 899,13	4 899,13	100,00%
124	5E333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠÍŘKODRT. T. DO 150MM	M2	0,000	192,500	192,500	129,700	0,00	0,00	24 967,25	24 967,25	24 967,25	100,00%
1025	62845	SPÁROVÁNÍ STAVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENTOVOU MALTOU	M2	0,000	97,110	97,110	201,000	0,00	0,00	7 459,11	7 459,11	7 459,11	200,00%
1026	94582	PLÁTY A RIGIDNÍ DLAŽEBNÍ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	0,000	164,800	164,800	1620,000	0,00	0,00	266 976,00	266 976,00	266 976,00	200,00%
1027	1B235	KOZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVNĚ V L. DO 0,5M	M2	0,000	137,500	137,500	76,000	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		Celkem							0,00	387 617,69		387 617,69	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Pctvzují zároveň skvělečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, Istavbyvedoucí

Za Objednatelů: (jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **IK114. Neveklov - I/3 - e.0 : Z2019-01B243**

1000000000	Náklady vzniklé stavbě bez majetku a DPH	17 264 547,82
1000000000	Aktivní změna stavby (soma záporná)	16 272 224,14
	Kumulativní stavby (soma stavby) - celkové DPH	34 478 438,38
1000000000	Průběžné změny Příklad 3a (sumy záporné)	107,30%
1000000000	Středovní vyhraněných změn (Skupina 1)	0,90%
1000000000	Středovní střední položek (Skupina 2)	0,90%
1000000000	Změny do skupin 1 a 2, pro pozemkové změny, pro změny skupin 1 a 2, celkové, sumy, %	-1,26%

1000000000	Průběžné změny skupin 3 a 4 (Skupina 3 a Skupina 4)	5 716 164,11
1000000000	Středovní změny 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7 000
1000000000	Změny skupin 3 a 4 (Skupina 3 a Skupina 4)	31 726 344,11

1000000000	Středovní změny 45 % Skupina 5	2 020
1000000000	Středovní změny 50 % Skupina 6	3 400
1000000000	Suma středních a střední 20% střední a 20% střední pro Skupiny 3 a Skupiny 4	7 534 788,82
1000000000	Základní 50 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	34 162 273,92

1000000000	100%	111 954 662,89
1000000000	Středovní změny (15%)	0,00%
1000000000	Středovní skupiny 3	7,00%

SKP	Změna	Název SKP a předmět změny	Změna (sumy pro 2024/2025)	Změny kance	Incidenci SKP	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -	
						Změny skupin (podle výše uvedených skupin)	Změny skupin	Změny skupin (podle výše uvedených skupin)	Změny skupin	Změny skupin (podle výše uvedených skupin)	Změny skupin (podle výše uvedených skupin)	Změny skupin (podle výše uvedených skupin)	Změny skupin (podle výše uvedených skupin)		
11	17	11	111 954 662,89	111 954 662,89	111 954 662,89	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
101	1	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
102	2	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	3	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	4	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	5	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	6	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	7	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	8	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	9	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	10	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
111	11	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
112	12	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
113	13	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
114	14	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
115	15	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
116	16	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
117	17	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
118	18	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
119	19	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
120	20	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

Poznámka: Změny skupin 1 a 2, pro pozemkové změny, pro změny skupin 1 a 2, celkové, sumy, %

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název a evidenční číslo stavby:	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Pozemní komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápisy SD	2	
09 Schema sanace základu OP1 - příkop	1	
10 Geodetický protokol	4	
11 Fotodokumentace	4	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	1	
14 Zápis z KD	11	
Počet listů celkem	27	

Rozpis ocenění změn položek - celkem

Liderno číslo a název stavby, IČD, Návrh. úřad, n.č. ZD (9-05834)		DĚLNÁ SOUPISU PRACÍ (SÚ/PS)											
Číslo a název SÚ/PS: SÚ 101 Práce na komunikaci		SÚ 101 celkem											
Číslo a název rozpisu: SÚ 101													
ř.č.	Popis práce	M	Měřicí jednotka	Množství	Měrná cena	Pracovní náklady	Cena za jednotku	Pracovní náklady	Pracovní náklady	Pracovní náklady	Pracovní náklady	Pracovní náklady	Pracovní náklady
19	19010101 Konečný úprava povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 1901010101 Konečný úprava povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 190101010101 Konečný úprava povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 19010101010101 Konečný úprava povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	476,000	879,000	419,916	879,000	419,916	419,916	419,916	419,916	419,916	419,916
20	20010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2001010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 200101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 20010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	428,700	100,000	528,700	123,566	528,700	123,566	528,700	123,566	528,700	123,566
21	21010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 210101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 21010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	9,122,000	7,758,000	10,000	11,270	11,220,000	1,240	11,220,000	1,240	11,220,000	1,240
22	22010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2201010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 220101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 22010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	23010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2301010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 230101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 23010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000
24	24010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2401010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 240101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 24010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	7,000	709,000	510,000	72,857	709,000	72,857	709,000	72,857	709,000	72,857
25	25010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2501010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 250101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 25010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	309,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
26	26010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2601010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 260101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 26010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
27	27010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2701010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 270101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 27010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
28	28010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2801010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 280101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 28010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
29	29010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 2901010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 290101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 29010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
30	30010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 3001010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 300101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 30010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
31	31010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 3101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 310101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 31010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
32	32010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 3201010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 320101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 32010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	261,800	261,800	261,800	261,800	261,800	261,800	261,800	261,800	261,800
33	33010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 3301010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 330101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek 33010101010101 Práce na úpravě povrchu vozovky zhotovením povrchu z betonových kostek	M	1000	0,000	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500	127,500

Denní záznam stavby

Stavba: II/104, stavba 1/3

číslo: 8

datum: 20.11.20

časová část: 18.00

Práce: obnova - příprava, 1 - 10%

1 - 20.11.20

Pracovníci: 700 - 1500 hod., 1000 - 1100 hod. práce

Práce provedené: 1x FHP - 100%

100% - 100% - 100% - 100%

Práce provedené: 100% - 100% - 100%

Práce provedené:

1. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

2. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

3. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

4. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

5. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

6. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

7. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

8. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

9. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

10. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

11. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

12. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

13. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

14. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

15. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

16. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

17. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

18. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

19. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

20. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

21. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

22. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

23. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

24. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

25. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

26. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

27. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

28. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

29. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

30. Práce provedené: 100% - 100% - 100%

Denní záznam stavby

datum: 11/11/2014, čtvrtek - 1/12

čas: 10:00



10:00

10:00 - 10:30

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

10:30 - 11:00

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

11:00 - 11:30

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

11:30 - 12:00

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

12:00 - 12:30

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

12:30 - 13:00

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech


Práce na stavbě - vyčištění terasy, práce na střeše, práce na základech

Sanace propadlých okrajů vozovky

ÚSEK 3, část "serpentine"

km 63.850-65.460

km 63.850-65.460

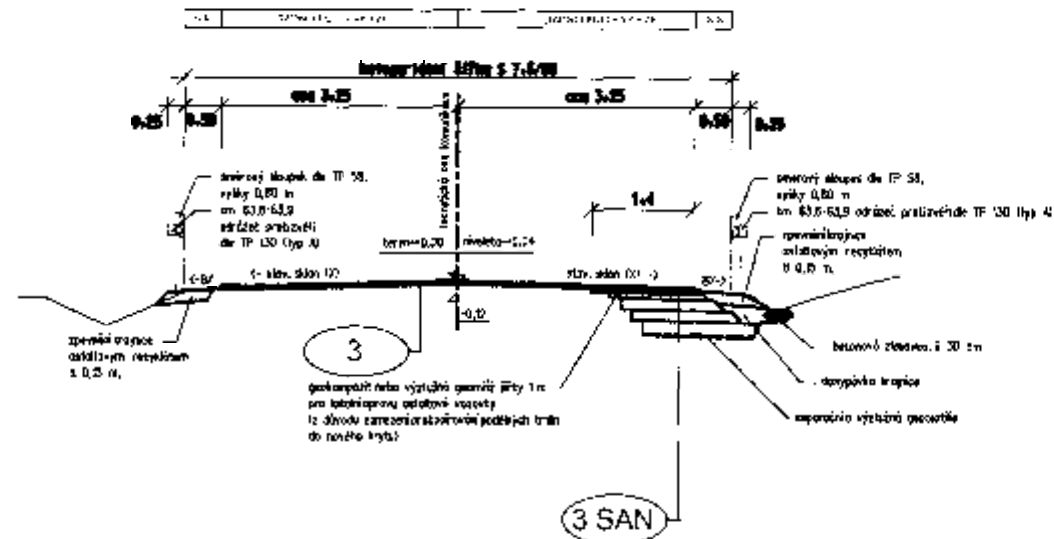

3 SAN

Kontrolní vozovky úseku č. 3
 km 63.850-65.460 (km 5.875-7.575 do dopravního)
 v místě současné propadlé části vozovky -
 - odřazení odlišnosti v úrovni "serpentine"

do TP 70, odvozeno z řady DO-N-5

ŘADY DO, TID: B, P 8

okružní beton pro odvodnění	AC 1	20/20	40 mm	100	200	1000-1	
okružní pásník z vodní, světlé zrnité	F 1	F 1-0	0,35 kg/m ²	100	100	1000	
okružní beton pro odvodnění	AC 11	20/20	30 mm	100	100	1000-1	
okružní pásník z vodní, světlé zrnité	F 1	F 1-0	0,35 kg/m ²	100	100	1000	
okružní beton pro podkladní vrstvu	AC 22	20/20	20 mm	100	100	1000-1	
okružní pásník z vodní, světlé zrnité	F 1	F 1-0	0,20 kg/m ²	100	100	1000	
betonová základna	BC	20/20	100 mm	100	100	1000-1	100 MPa
okružní P. A. B. 5/22	OP		100 mm	100	100	1000-1	40 MPa
okružní P. A. B. 6/22	OP		200 mm	100	100	1000-1	40 MPa
Kontrolní okružní beton			100 mm				

GEODETIKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1052/2020/ZŽ

Číslo zakázky: 20200162

Název akce: Zaměření a výpočet sanací vozovky II/114, Neveklov -I/3 a plochy kamenné dlažby na úseku 3 (km 63,055-66,000)

Název stavby: Oprava II/114, Neveklov-I/3

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o. **Pracoviště:** TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6 **JE Temelín**
370 07 České Budějovice **373 05 Temelín - elektrárna**

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřická síť: stabilizována a zaměřená firmou TKP geo.s.r.o.


Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41249/2017


Postup prací: V říjnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce II/114, Neveklov-I/3. Dále byla zaměřena plocha kamenné plochy. Z toho zaměření byly následně vypočteny jednotlivé plochy. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o.

	Sanace propadlých krajnic	Sanace asfaltových souvrství	Kamenná dlažba
plocha	666,5 m ²	135,4 m ²	164,8 m ²

Zaměří	Adzima, Šnorek	Ověřil	Ing. Ivan Tureček	Převzal	
Dne	říjen 2020	Dne	18.12.2020	Číslo	647/C 2020
Zhotoví	Ing. Zuzana Ženišková				
Dne	18.12.2020				
Předal					
Dne					
	za TKP geo s.r.o.		Naležlostmi a přesností odpovídá právní předpisům a sad mukám písemně doloženým s objednatel		za BES s.r.o.

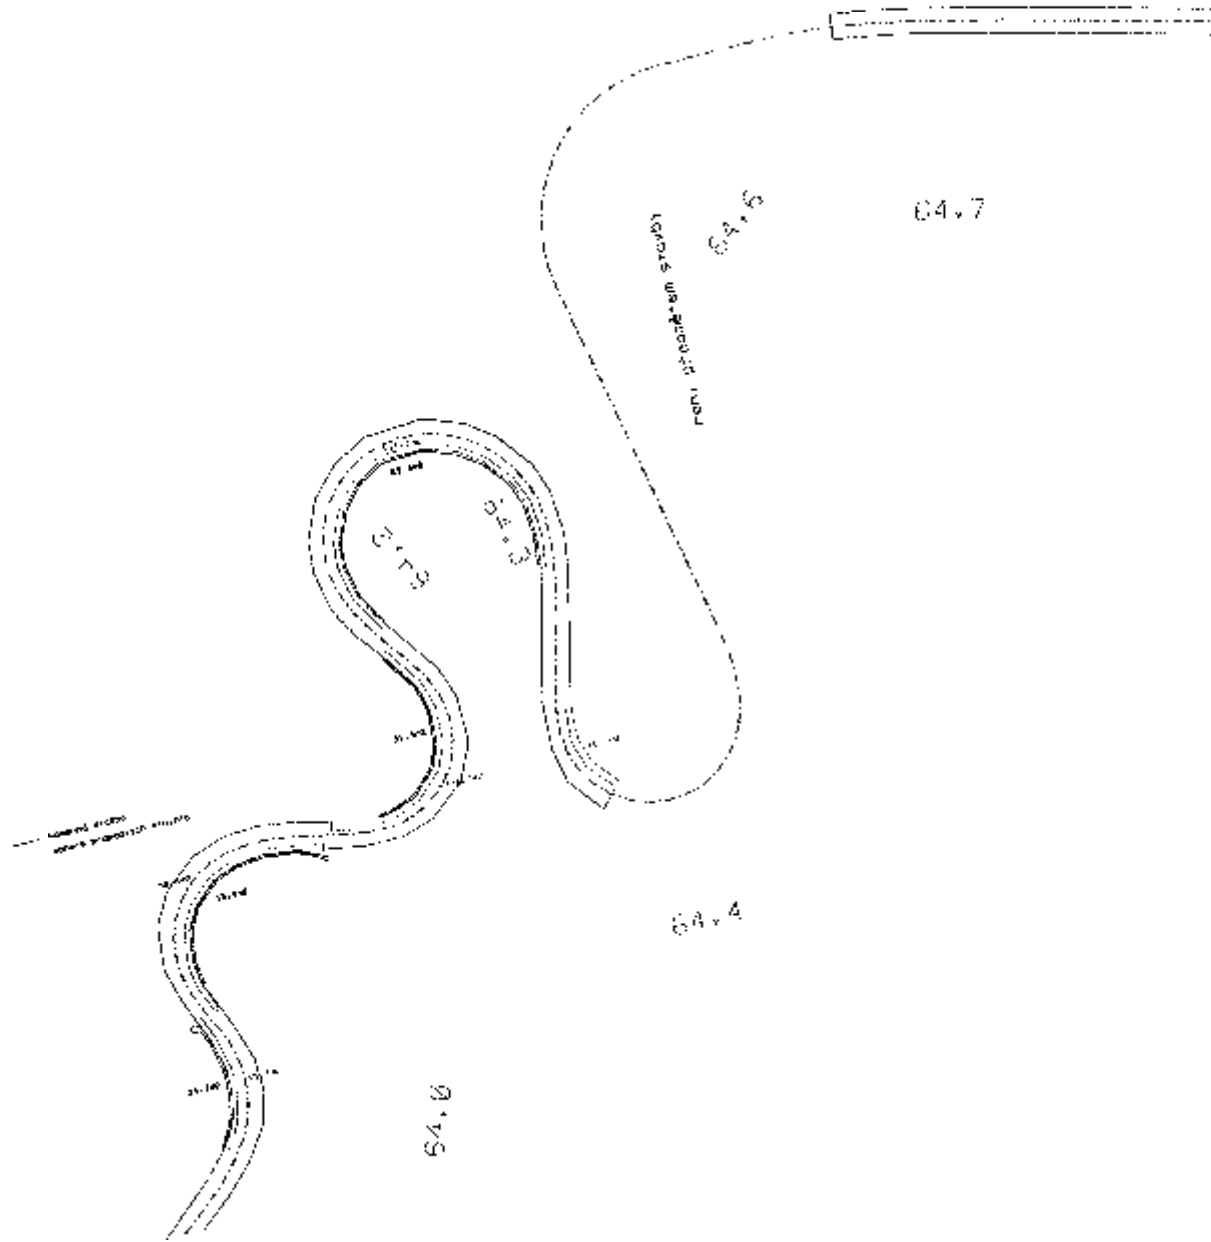


..... ochrana pred dažďami
..... ochrana pred snehom





65, 3

65, 4

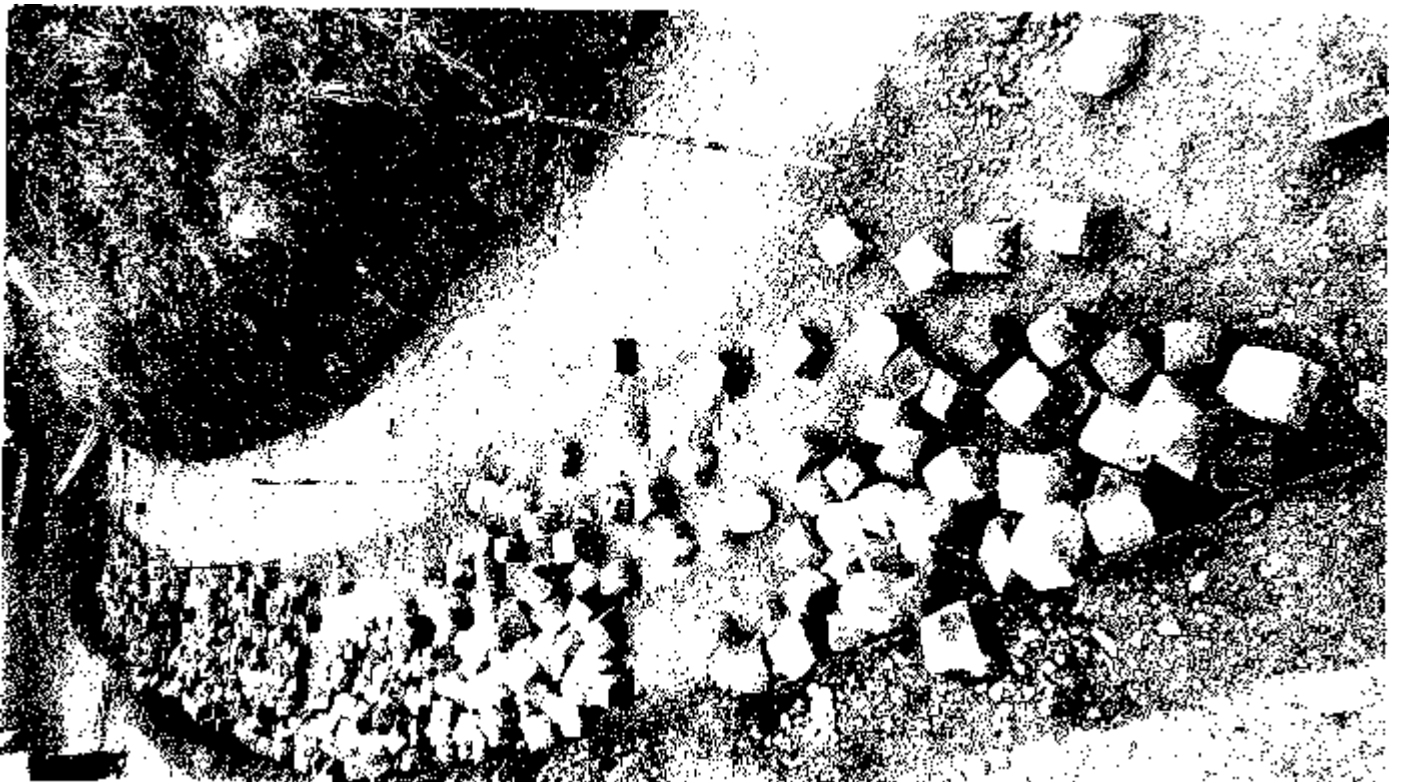



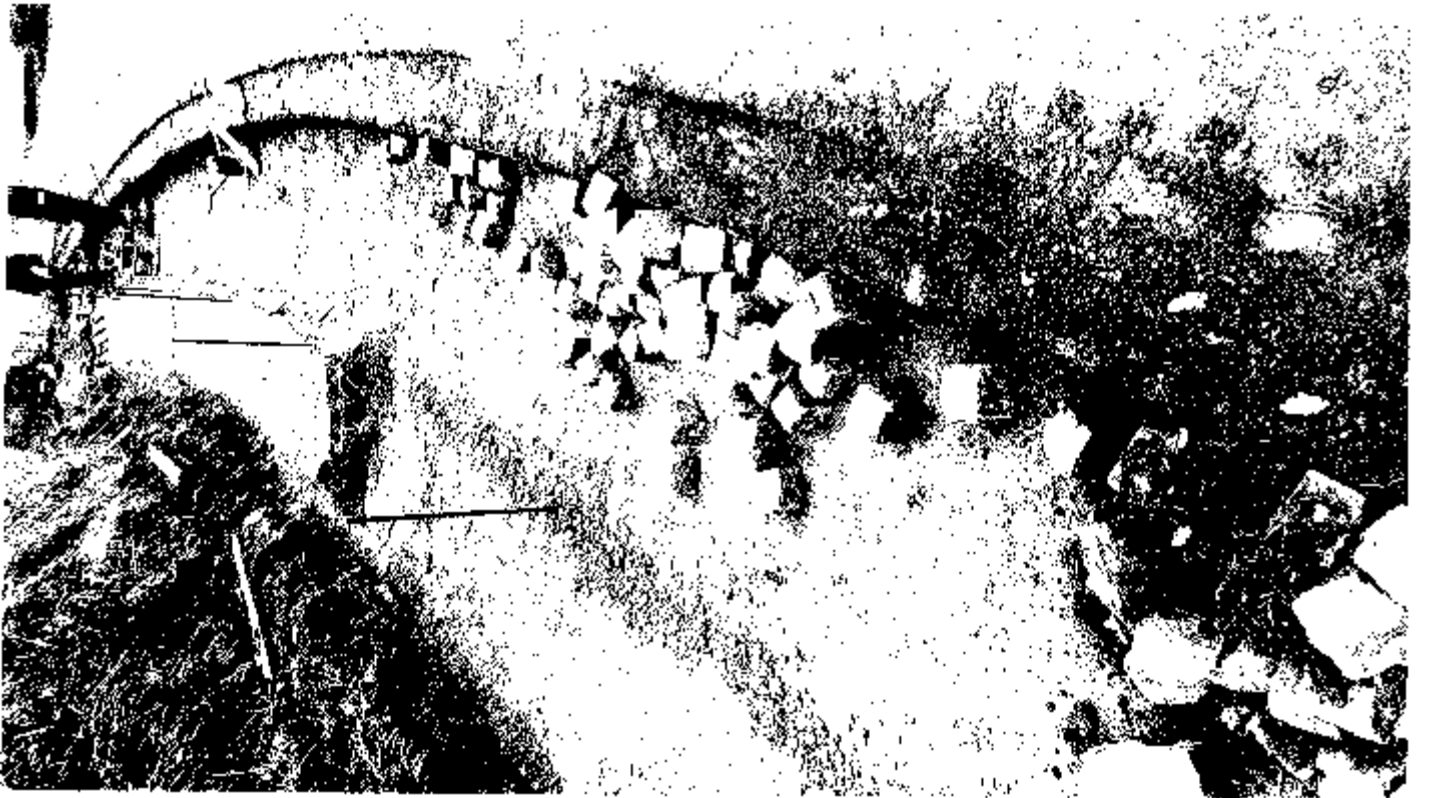

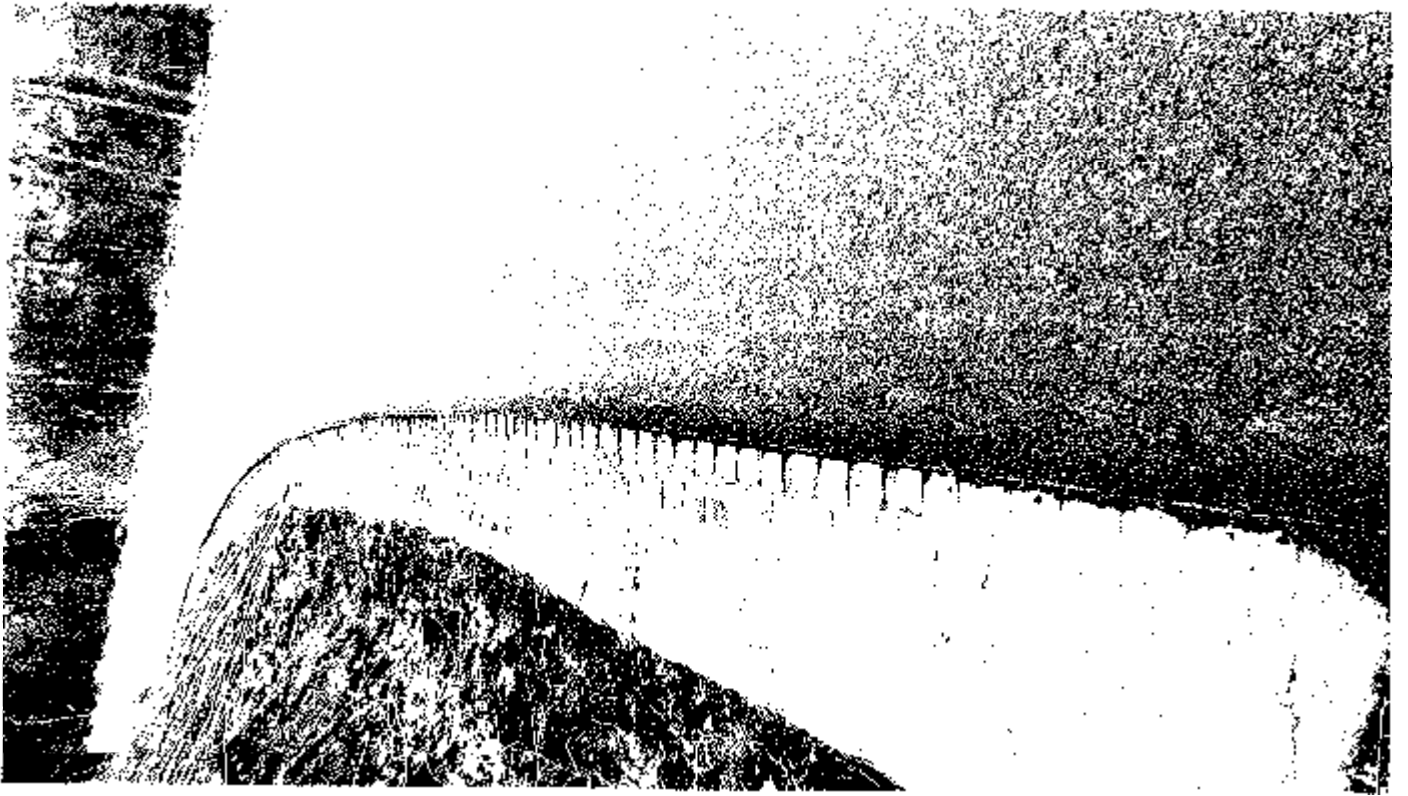

VÁS ODPIS ZNAČKY

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

302 / 025 / 2021

VYKŘIŽUJE

Ing. Marek Štadník

TEL.:

E-MAIL:

IQQS

MÍSTO / DATUM:

Praha / 2.2. 2021

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje

p. Jan Zakostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – I/3

Stanovisko AD k ZBV 10 - SO 101 – příkop „serpentin“

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 10 které se týká:

SO 101 – Silnice II/114

ZBV 10 se týká zřízení dlážděného rigolu v oblasti „serpentin“

PDPS předpokládala ve stavbě pročištění stávajících příkopů. Toto pročištění příkopu se předpokládalo i v řešených příkopech na vnějších stranách úseku serpentin.

V době zpracování PDPS byl stav předmětných příkopů na vnitřních stranách úseku serpentin takový, že postačovalo navržené pročištění příkopů.


Návrh zpevnění příkopů na těchto vnitřních stranách v úseku serpentin nebyl v PDPS navržen s ohledem na vlastnictví pozemků a nutnost, aby technické řešení zůstávalo v rámci stávajícího silničního tělesa. Tento postup je v souladu se závěry jednání, které se konalo 28.2.2018 na KSUS.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 10 – SO 101, příkop „serpentin“, připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 25. 2. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

p. Jan Žákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 10 předložené v rámci realizace
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“

vedoucí společník

BES s.r.o., Sukova 625 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 10 – SO 101 Sitnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené se zpevněním vnitřních okrajů vozovky
oblouků serpentín.


V průběhu realizace bylo po podrobném zaměření a kontrole tělesa komunikace zjištěno, že
pro zajištění odvodnění komunikace je nutné provést zpevnění vnitřních okrajů vozovky
oblouků v serpentínách pomocí kamenné dlažby. Zpevnění bylo realizováno v souladu s
návrhem autorského dozoru.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 10 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem

Ing. Milan Kodet



Zápis z 10. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 22. 9. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 22.9.2020 – z důvodu realizace kanalizace v obci Jírovice probíhají práce v odlišném termínu od IIMČI.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MČÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.



- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (stanoviště km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Probíhá geodetické zaměření původního povrchu. Od zítra bude probíhat frézování asfaltového souvrství, čištění krajnic a příkopů od nánosů.

Do příštího KD bude provedeno frézování asfaltového souvrství, bude probíhat čištění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel a dopravního značení, práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.
– KD 11 8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vozíčí čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vozíčí čára.

13. Nové body

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí.

Příští KD se bude konat **6. 10. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na stavovišti u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



Zápis z 12. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 20. 10. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov - I/3

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS, Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.

KD 20.10.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.

- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Probíhá čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách - čištění a dláždění čel, u propustku SO 101.15 je provedena demolice a probíhá realizace nového propustku.

Do příštího KD bude probíhat čištění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel, práce na opravě propustků v serpentínách, realizace nového propustku SO 101.10.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodíací čára. V Tisem u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodíací čára.


10.1 Na MČÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú.

Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 - 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu

AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. - KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek řádkových čt. betonu.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. - KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku.




11.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průložného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

13. Nové body

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracoví spáry. AD navrhuje způsob řešení.

Příští KD se bude konat 3. 11. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obec Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet



Zápis z 15. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 1. 12. 2020

Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření

Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tísem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tísem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Sládník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule

Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tísem.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
Propustky

6. Inženýrské Síť


Inženýrské síť jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 1,12,2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staniční km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.

V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čištění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Je provedena pokládka ložné asfaltové vrstvy u odbočky na Tvoršovice. Je provedeno čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentínách – dláždění čel, odkop a zépný zásyp u výtokového čela propustku SO 101.11 včetně prodloužení potrubí. u propustků SO 101.10 a 101.15 je provedena demolice a realizace nových propustků. Je dokončena sanace okrajů vozovky v serpentínách včetně zpevnění příkopů na vnitřních okrajích oblouků serpentín z kamenné dlažby.

Probíhá čištění povrchu, spojovací postřiky a pokládka asfaltových vrstev.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, násyp krajnic z asfaltového recyklátu, montáž svodidel, realizace dopravního značení, terénní úpravy.

11. Různé

-


12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.

Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tisem u výjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25-59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. – KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. – KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do betonu. – KD 1.12 práce dokončeny, bude vypracováno ze zápisu



12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhne způsob řešení. – KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace. KD 18.11. bylo provedeno odfrézování v tl. 50 mm, u okrajů vozovky bylo vzhledem k poruchám v podkladních vrstvách nutné provést sanaci až na úroveň zemní pláně. *KD 1.12. práce dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu.*

14.1 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že v úseku stavby mezi km 57,880 (začátek úseku stavby) a km 66,012 (křižovatka se silnicí II/11455 směr Tvoršovice) proběhne dne 14.12.2020 přijímací řízení. Zástupce TDI připraví Protokol o předání a převzetí. *KD 1.12. přijímací řízení proběhne 14.12. se srazem ve 13:30 u křižovatky na Tvoršovice.*

14.2 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že pro úsek uvedený v bodu 14.1 bude podána žádost o kolaudační řízení. Zástupce TDI podá žádost o kolaudaci. *KD 1.12. kolaudační řízení proběhne 14.12. se srazem ve 14:00 na začátku úseku stavby u obce Neveklov.*

13. Nové body

13.11. souhlasu s čl. 4.2 Smlouvy Zhotovitel oznámí, že po dokončení prací v úseku mezi km 57,880 – 66,012 budou práce převzeny z důvodu zimní přestávky. O zahájení zimní přestávky dle čl. 4.2 Smlouvy rozhodne Objednatel.

Příští KD se bude konat 14. 12. 2020 od 13:30 hod. se srazem na staveništi u křižovatky na Tvoršovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. Ing. Milan Kodet

