

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov

číslo smlouvy zhotovitele: 1082015LLH.01

číslo smlouvy objednatele: 11/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [redacted], č. účtu: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.1. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
Kontaktní adresa: **závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: **[redacted], ředitelem závodu Č. Budějovice, na základě plné moci**
tel.: 387 203 417 e-mail: eurovia-ceskebudějovice@eurovia.cz
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: [redacted], pobočka Praha 1, č. účtu: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561, datum zápisu 4.5.1992.

Zástupce ve věcech smluvních:	[redacted]	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
	[redacted]	tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 37979)
[redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 39684)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 1082015LLH.01 a č. objednatele 11/VZ/2021 uzavřené dne 20. 4. 2021 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termíny plnění uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2021)**
 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.
 Dokončení prací a předání stavby: **do 154 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**
 Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 184 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 184 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 5. 8. 2021
 Aktualizovaný harmonogram stavby

Za objednatele:
 České Budějovice, dne: 25. 08. 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
 IČO: 700 71 841 (10)

Ing. Andrea Jančková
 ředitelka organizace
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
 České Budějovice, dne: 23. 8. 2021


 EUROVIA CS, a. s.
 U Michelského lesa 1581/2

ředitel závodu České Budějovice
 EUROVIA CS, a. s.

EUROVIA CS, a.s.

Odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72
370 11 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
Ing. Andrea Jankovcová – ředitelka organizace

Váš dopis značky

Naše značka
RSA/ŽT1

vyřizuje/linka

██████████
7 ██████████

České Budějovice dne
5. 8. 2021

Věc: Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov

- Žádost o posun termínu dokončení prací

Vážená paní ředitelko,

dne 20. 4. 2021 nabyla účinnosti smlouva o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“ (číslo smlouvy objednatele: 11/VZ/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 1082015LLH.01).

Předání staveniště bylo provedeno dne 26.4.2021. V den předání staveniště byly zahájeny stavební práce.

Stavba je spojená s výstavbou chodníků, vodovodu a veřejného osvětlení, které jsou investované Obcí Adamov. V průběhu výstavby požádal starosta obce Hůry, pan Jiří Borovka, o prodloužení vodovodu SO 301 a rozšíření obrub ohraničujících komunikaci SO 101a. Celkem se jedná o 118 m potrubí DN 100 mm a 208 m silničních obrub. Daná rozšíření jsou investovaná obcí Hůry.

Provedení vodovodu a obrub bylo konzultováno a odsouhlaseno všemi účastníky výstavby při kontrolních dnech stavby, přičemž provedení zmíněných prací bylo podmíněno prodloužením termínu stavby u investorů Správy a údržby silnic a Obce Adamov. Na vodovod bylo avizováno na KD č.3 nutné prodloužení termínu o 13 dní a na obruby o 9 dní, celkem tedy o 22 kalendářních dní. S ohledem na dosavadní postup výstavby, kdy se podařilo vybrané činnosti zrychlit oproti harmonogramu prací navrhujeme, v souladu s čl. 3.3, 3.4. a 3.5. výše uváděné smlouvy o dílo, **prodloužení termínu dokončení prací a předání stavby o 14 kalendářních dnů**, namísto původně avizovaných 22 kalendářních dnů.

Navrhujeme uzavření dodatku č. 1, ve kterém bude upraven termín dokončení prací a předání stavby, a to na 154 dnů, tj. do 26. 9. 2021 a termín kompletního dokončení a předání díla, a to na 184 dnů, tj. do 26. 10. 2021.

Přílohy:

- Zápis z 3. kontrolního dne stavby
- Zápis ze 7. kontrolního dne stavby

Předem děkuji za vstřícný postoj.

S přátelským pozdravem



EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice

provozně obchodní ředitelka
EUROVIA CS, a.s.
závod České Budějovice

3

Zápis z 3. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“

7.6.2021 Přítomní viz. prezenční listina

Termín zahájení prací: 26. dubna 2021

Termín dokončení prací: 12. září 2021

3. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
Nemanická 2133/10, České Budějovice 370 10
Zastoupený [REDACTED] – dočasně pověřený vedením organizace
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Tel: 387 021 010
4. Zhotovitel stavby: **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupený [REDACTED], ředitel závodu České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Tel: 387 203 417
5. TDS: **Budway s.r.o.**
Ostrolovský Újezd 81, 374 01
IČO: 08521727
Zastoupená [REDACTED]
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]
6. Koordinátor BOZP: **MS-Progress s.r.o**
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 28149327
Tel: [REDACTED], email: s [REDACTED]
7. Zpracovatel PDPS: **Ging s.r.o**
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 25166891

1. Postup prací stavby, kontrola harmonogramu

- Zhotovitel odfrézoval stávající asfaltobetonové vrstvy.
 - Zhotovitel má dokončen objekt SO301a.
 - Zhotovitel zahájil zemní práce na SO101a Komunikace, pokládku drenáží a separační geotextilie. Dále je nasypána 1.KV frakce 0-125mm v úseku 0,24 km až 0,3 km.
- Práce postupují dle harmonogramu, který je přílohou SOD.

2. Financování stavby:

Fakturace za měsíc květen, fa č. 5803003649

Fakturace: 1xměsíčně, bude předložena ke schválení na konci měsíce června.

3. Vícepráce, méněpráce, změnové listy:

Drobné změny oproti PDPS budou zakreslovány do přehledné situace a zapisovány do stavebního deníku, poté budou tyto změny vyznačeny v DSPS. Tyto drobné změny nebudou zasahovat mimo pozemky záboru stavby, nebudou mít dopad na termín dokončení stavby.

4. Kontrola technologických předpisů nebo pracovních postupů:

- Zhotovitel upozorňuje na dodržování PD, konkrétně provádění podsypu pod potrubím, dle výkresu SO301, detail uložení kanalizačního potrubí. **TDS žádá o zaslání fotografií poslaných provozovateli.**



- Zhotovitel průběžně vytyčuje a obnovuje polohu stávajících inženýrských sítí.
- Zhotovitel předložil ke kontrole provozovateli Čevak a.s. kamerovou zkoušku potrubí SO 301a

5. Kontrola dokladů k vlastnostem materiálů:

Veškeré doklady k dodávaným materiálům budou předkládány v dostatečném předstihu před zabudováním k odsouhlasení. Doklady budou součástí závěrečné zprávy. Bude veden seznam předložených materiálů.

6. Předložené zkoušky:

Ke všem prováděným zkouškám zhotovitel vždy vyzve v dostatečném předstihu TDS k účasti u zkoušek, kopie od zkoušek předloží k měsíční fakturaci.

Zkoušky jsou evidovány v samostatné příloze.

7. Koordinátor BOZP:

Koordinátor vydal zápisy:

1. 6.5.2021
2. 17.5.2021
3. 24.5.2021

Zhotovitel nahlásí koordinátorovi všechny subdodavatele, kteří se budou na stavbě pohybovat.

Zhotovitel vyvěsil cedulky OIP
Zhotovitel vyvěsil stavební povolení

8. Ostatní:

Zhotovitel zajistí přístup při svozu domovního dopadu – průběžně
Zhotovitel se dohodl se starostou obce Adamov [REDAKCE], že vždy den před svozem bude dohodnut způsob, dle situace na stavbě.

Zhotovitel předložil k odsouhlasení aktualizovaný KZP – objednatel požaduje u kontrol, které provádí zástupce zhotovitele, doplnění TDS. **Splněno, vypouští se.**

Zástupci firmy CB PLYN s.r.o. potvrdili nástup a délku trvání výstavby plynovodu dle harmonogramu, který je přílohou v SOD. Tedy od 31.5.2021, doba výstavby 4 týdny. **Termín nástupu a zahájení výstavby splněn.**


Zhotovitel prověří sondami, zda vzhledem k odstupovým vzdálenostem od stávajících kabelů a plynovodu, bude možné dle požadavku SÚS Jk umístit celý vodovod do chodníku (mimo komunikaci). Ihned po dokončení sond, bude TDS vyzván k prohlídce na místě stavby. **Splněno, vypouští se.**

BUDWAY

INŽENÝRSKÁ ČINNOST SE STAVEBNÍMI

TDS byl vyzván k prohlídce 18.5.2021 za účasti SÚS Jk, provozovatele Čevak, starosty obce, TDS Obce. Byla konstatována nutnost vedení části vodovodního potrubí v komunikaci, která je ve správě SÚS Jk. Dle dohody, zhotovitel předložil novou trasu, zakres do situace, k vyjádření p. ████████ – SÚS Jk. Ten v pátek 21.5.2021 vydal souhlasné stanovisko s nově navrženou trasou. **Splněno, vypouští se.**

Starosta obce Hůry upozornil na zhoršující se stav komunikace naproti obecnímu úřadu, způsobený otáčením těžké nákladní techniky. **Trvá.**

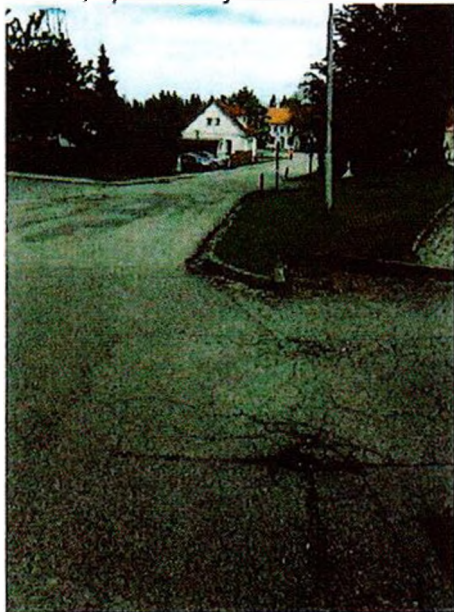

Zhotovitel požádal na KD o prodloužení termínu dokončení díla o poměrnou část, vzhledem k navýšení objemu prací na vodovodu cca 128m a nových obrubnicích cca 208m, o 22dnů. Dle článku 3.3. SOD č.o.: 11/VZ/2021 má zhotovitel na změnu nárok, vzhledem ke změně rozsahu prací nebo realizace víceprací. Protože se práce netýkají SO301a, SO101a TDS žádá o prověření smluvního vztahu s investorem řešené části – Obec Hůry. Pokud smlouva s obcí Hůry připouští prodloužení termínu na základě nárůstu objemu prací, za TDS prosím, aby se zhotovitel vhodným postupem prací pokusil požadovaných 22 dnů zkrátit na minimum.



Kontrolní dny budou probíhat po dohodě vždy 1x za 14 dní – pondělí 10:00.

3. kontrolní den stavby proběhne v Pondělí 21.06.2021 v 10:00

Přílohy: Prezenční listina

V Českých Budějovicích
07.06.2021

Zapsal:


Technický dozor stavebníka


BUDWAY®
INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
Budway s.r.o.
IČ: 165 21 727, DIČ: CZ06521727
Ctřebovský Újezd č.p. 81, PSČ 374 01

Zápis z 7. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“

02.8.2021 Přítomní viz. prezenční listina

Termín zahájení prací: 26. dubna 2021

Termín dokončení prací: 12. září 2021

3. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
Nemanická 2133/10, České Budějovice 370 10
Zastoupený [REDACTED] dočasně pověřený vedením organizace
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Tel: 387 021 010
 4. Zhotovitel stavby: **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupený [REDACTED], ředitel závodu České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Tel: 387 203 417
 5. TDS: **Budway s.r.o.**
Ostrolovský Újezd 81, 374 01
IČO: 08521727
Zastoupená : [REDACTED]
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]
 6. Koordinátor BOZP: **MS-Progress s.r.o**
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 28149327
Tel: 739 219 620, email: soukup8044@gmail.com
 7. Zpracovatel PDPS: **Ging s.r.o**
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 25166891
-

1. Postup prací stavby, kontrola harmonogramu

Zhotovitel odfrézoval stávající asfaltobetonové vrstvy.

Zhotovitel má dokončen objekt SO301a.

Práce na objektu SO101a postupují z cca desetidenním zpožděním oproti harmonogramu, který je přílohou SOD. Zhotovitel uvedené zpoždění odůvodňuje vícepracemi na objektu vodovodu. Přesněji bude zpoždění určeno na příštím KD, dle postupu na objektu SO101a. – **Zhotovitel požádá písemně o prodloužení termínu, na základě objektivních příčin, víceprací na vodovodu a obrubnicích.**

Zhotovitel provádí 1.konstrukční vrstvy na objektu SO101a a obruby v severní části stavby.

2. Financování stavby:

Fakturace za měsíc květen, fa č. 5803003649

Fakturace za měsíc červen, fa č. 5803011363

Fakturace: 1xměsíčně, bude předložena ke schválení na konci měsíce července.

3. Vícepráce, méněpráce, změnové listy:

Drobné změny oproti PDPS budou zakreslovány do přehledné situace a zapisovány do stavebního deníku, poté budou tyto změny vyznačeny v DSPS. Tyto drobné změny nebudou zasahovat mimo pozemky záboru stavby, nebudou mít dopad na termín dokončení stavby.

4. Kontrola technologických předpisů nebo pracovních postupů:

Zhotovitel průběžně vytyčuje a obnovuje polohu stávajících inženýrských sítí.

TDS požaduje předložit tepř. (pracovní postup) a recepturu pro recyklaci za studena, před zahájením prací. – **Původní receptura bude před zahájením recyklace za studena ověřena přímo na odtěženém materiálu geologem stavby.**

5. Kontrola dokladů k vlastnostem materiálů:

Veškeré doklady k dodávaným materiálům budou předkládány v dostatečném předstihu před zabudováním k odsouhlasení. Doklady budou součástí závěrečné zprávy. Bude veden seznam předložených materiálů.

Zhotovitel předložil ke schválení dodavatele potrubí kanalizační stoky, za provozovatele (Čevak a.s.) materiál odsouhlasil Josef Wostl, za TDS bez připomínek.

Při kontrole stavby byly schváleny Uliční vpusti (sifonové) a betonové výrobky (obrubníky).

6. Předložené zkoušky:

Ke všem prováděným zkouškám zhotovitel vždy vyzve v dostatečném předstihu TDS k účasti u zkoušek, kopie od zkoušek předloží k měsíční fakturaci.

Provedena kontrola rovinatosti a únosnosti 1.KV v km 0,24 – 0,43. Požadavky PD dodrženy.

Zhotovitel předložil objednateli a provozovateli kamerovou zkoušku SO301a kanalizace. – **V úsecích Š2-Š1 a Š3-Š2 nutné vyčistit sediment a provést opětovně kamerovou zkoušku**

Zhotovitel předložil protokol o zkoušce zemní pláně v km 0,25 s výsledkem Edef2 84mPa – **Parametr splněn**

Zhotovitel předložil protokol o zkoušce 1. KV v km 0,38 s výsledkem Edef2 112 mPa – **Parametr splněn**

Všechny protokoly budou součástí závěrečné zprávy.

7. Koordinátor BOZP:

Koordinátor vydal zápisy:

1. 06.5.2021
2. 17.5.2021
3. 24.5.2021
4. 08.6.2021
5. 21.6.2021
6. 01.7.2021
7. 20.7.2021

Zhotovitel nahlásí koordinátorovi všechny subdodavatele, kteří se budou na stavbě pohybovat.

Zhotovitel vyvěsil cedulky OIP
Zhotovitel vyvěsil stavební povolení

8. Ostatní:

Zhotovitel zajistí přístup při svozu domovního dopadu – průběžně

Zhotovitel se dohodl se starostou obce Adamov [REDAKCE], že vždy den před svozem bude dohodnut způsob, dle situace na stavbě. – **Trvá.**

Starosta obce Hůry upozornil na zhoršující se stav komunikace naproti obecnímu úřadu, způsobený otáčením těžké nákladní techniky. - **Trvá**

Kontrolní dny budou probíhat po dohodě vždy 1x za 14 dní – pondělí 10:00.

8. kontrolní den stavby proběhne v Pondělí 16.08.2021 v 10:00

Přílohy: Prezenční listina

V Českých Budějovicích
02.08.2021

Zapsal:

[Redacted signature]

Technický dozor stavebníka

BUDWAY®

[Redacted signature]

SO101a: UV, geotextilie, drenáže



