


č.b.	Y [m]	X [m]	H [m]	č.b.	Y [m]	X [m]	H [m]	č.b.	Y [m]	X [m]	H [m]
193	723353,70	1082928,38	472,82	262	723467,08	1082800,71	462,84	331	723318,88	1082958,99	473,86
194	723361,11	1082920,73	472,45	263	723466,00	1082799,69	462,82	332	723329,42	1082948,31	473,64
195	723360,11	1082919,58	472,55	264	723472,56	1082792,73	462,06	333	723330,53	1082947,16	473,69
196	723356,91	1082916,10	472,54	265	723473,67	1082793,81	462,08	334	723340,91	1082936,74	473,45
197	723355,94	1082915,03	472,49	266	723477,00	1082797,10	462,08	335	723351,09	1082925,85	472,97
198	723362,01	1082908,61	472,11	267	723478,10	1082798,20	462,08	336	723361,51	1082915,32	472,44
199	723363,10	1082909,53	472,15	268	723485,16	1082790,87	461,15	337	723371,56	1082904,37	471,71
200	723366,38	1082912,63	472,14	269	723484,18	1082789,65	461,19	338	723381,55	1082893,79	471,01
201	723367,54	1082913,76	472,05	270	723480,72	1082786,37	461,21	339	723391,65	1082883,46	470,30
202	723374,40	1082906,69	471,55	271	723479,61	1082785,39	461,17	340	723401,53	1082873,03	469,63
203	723373,19	1082905,31	471,66	272	723486,19	1082778,26	460,26	341	723411,60	1082862,31	468,95
204	723370,20	1082902,06	471,62	273	723487,31	1082779,29	460,35	342	723419,15	1082854,30	468,37
205	723369,25	1082901,07	471,58	274	723490,79	1082782,70	460,36	343	723428,05	1082845,09	467,50
206	723375,92	1082894,21	471,11	275	723491,93	1082783,70	460,35	344	723436,31	1082836,16	466,58
207	723376,88	1082895,04	471,14	276	723496,95	1082778,57	459,70	345	723445,48	1082826,99	465,58
208	723380,26	1082898,20	471,15	277	723495,77	1082777,42	459,76	346	723455,49	1082816,44	464,46
209	723381,39	1082899,35	471,08	278	723492,58	1082773,77	459,69	347	723465,41	1082805,88	463,29
210	723389,94	1082890,26	470,50	279	723491,50	1082772,68	459,58	348	723475,95	1082795,06	462,06
211	723388,84	1082889,18	470,57	280	722700,25	1083530,46	458,59	349	723485,30	1082785,23	460,94
212	723385,69	1082885,95	470,54	281	722701,97	1083532,91	458,64	350	723495,06	1082774,86	459,68
213	723384,73	1082884,88	470,48	282	722703,70	1083535,36	458,58	351	723503,42	1082766,37	458,61
214	723389,81	1082879,49	470,10	283	722896,16	1083392,03	472,34	352	723508,66	1082760,57	457,82
215	723390,71	1082880,59	470,18	284	722897,98	1083394,42	472,43	353	723509,77	1082759,36	457,77
216	723393,91	1082883,81	470,20	285	722899,79	1083396,80	472,52	354	723516,61	1082751,96	457,13
217	723395,00	1082884,92	470,19	286	722700,25	1083530,46	458,59	355	723517,64	1082750,77	456,90
218	723401,87	1082877,87	469,68	287	722701,97	1083532,91	458,64	356	723528,27	1082739,79	455,76
219	723400,90	1082876,70	469,75	288	722703,70	1083535,36	458,58	357	723538,27	1082729,44	454,65
220	723397,78	1082873,35	469,70	289	723308,22	1082970,24	474,08	358	723548,38	1082718,83	453,55
221	723396,87	1082872,30	469,66	290	723309,34	1082974,90	474,15	359	723558,32	1082708,58	452,47
222	723403,20	1082865,45	469,19	291	723302,38	1082982,18	474,36	360	723568,36	1082697,93	451,34
223	723404,40	1082866,29	469,26	292	723303,33	1082979,76	474,32	361	723578,45	1082687,50	450,28
224	723407,82	1082869,40	469,30	293	723301,15	1082977,69	474,37	362	723588,74	1082676,57	449,24
225	723409,06	1082870,31	469,20	294	723298,99	1082975,62	474,32	363	723598,99	1082665,50	448,16
226	723415,04	1082864,13	468,87	295	723298,30	1082975,05	474,29	364	723609,47	1082654,71	447,07
227	723413,86	1082862,88	468,89	296	723305,66	1082967,35	474,10	365	723619,66	1082643,72	445,96
228	723410,73	1082859,68	468,80	297	723671,32	1082584,32	441,26	366	723630,35	1082633,29	444,89
229	723409,69	1082858,71	468,77	298	723677,36	1082589,40	441,21	367	723640,26	1082622,51	443,97
230	723417,11	1082850,86	468,17	299	723690,51	1082575,64	440,47	368	723650,77	1082611,55	443,06
231	723418,11	1082851,86	468,22	300	723685,00	1082570,07	440,47	369	723661,03	1082600,50	442,16
232	723421,81	1082855,12	468,25	301	723698,98	1082555,43	440,05	370	723671,33	1082589,76	441,29
233	723422,89	1082856,21	468,22	302	723704,34	1082561,16	440,04	371	723681,85	1082578,93	440,57
234	723419,49	1082857,43	468,44	303	723497,98	1082777,72	459,60	372	723692,11	1082568,20	440,12
235	723417,75	1082858,65	468,57	304	723496,48	1082776,26	459,63	373	722902,94	1083390,49	472,50
236	723429,74	1082848,92	467,55	305	723494,55	1082774,23	459,65	374	722894,19	1083397,23	472,24
237	723428,64	1082847,54	467,58	306	723492,16	1082771,89	459,56	375	722886,41	1083403,26	471,92
238	723425,27	1082844,14	467,50	307	723498,23	1082765,49	458,80	376	722874,36	1083411,23	471,19
239	723424,34	1082843,19	467,44	308	723502,30	1082761,28	458,21	377	722862,54	1083419,96	470,40
240	723431,84	1082835,38	466,62	309	723505,89	1082757,61	457,70	378	722849,97	1083428,46	469,53
241	723432,86	1082836,39	466,69	310	723508,45	1082755,21	457,40	379	722837,96	1083437,02	468,60
242	723436,21	1082839,35	466,74	311	723510,18	1082757,80	457,54	380	722825,85	1083445,36	467,58
243	723437,50	1082840,66	466,73	312	723513,28	1082761,47	457,63	381	722813,75	1083453,82	466,57
244	723444,35	1082833,38	465,96	313	723510,64	1082764,23	457,87	382	722801,98	1083462,24	465,56
245	723443,31	1082832,16	465,95	314	723506,89	1082768,26	458,43	383	722789,99	1083470,68	464,60
246	723440,16	1082828,84	465,87	315	723503,85	1082771,36	458,82	384	722777,79	1083479,43	463,59
247	723439,11	1082827,84	465,77	316	723500,41	1082775,07	459,28	385	722766,88	1083486,91	462,72
248	723445,02	1082821,57	465,19	317	723494,69	1082769,10	459,27	386	722755,17	1083494,72	461,81
249	723446,11	1082822,61	465,25	318	723513,68	1082749,77	457,00	387	722743,50	1083503,27	460,90
250	723449,26	1082825,75	465,30	319	723516,09	1082752,28	457,05	388	722731,75	1083511,72	460,02
251	723450,45	1082827,00	465,30	320	723517,16	1082754,17	457,12	389	722720,12	1083519,85	459,38
252	723457,67	1082819,39	464,44	321	723518,44	1082756,35	457,19	390	722709,50	1083527,24	458,82
253	723456,62	1082818,23	464,45	322	723520,24	1082754,62	456,98	391	722711,22	1083526,04	459,00
254	723453,27	1082815,05	464,45	323	723523,30	1082751,18	456,58	392	722698,34	1083535,51	458,42
255	723452,25	1082814,05	464,40	324	723527,38	1082746,87	456,15				
256	723458,91	1082807,25	463,65	325	723530,33	1082743,76	455,84				
257	723459,91	1082808,29	463,70	326	723532,55	1082741,45	455,60				
258	723463,09	1082811,72	463,70	327	723530,33	1082739,07	455,61				
259	723464,13	1082812,76	463,68	328	723528,41	1082736,78	455,50				
260	723471,36	1082805,27	462,82	329	723526,81	1082735,22	455,39				
261	723470,37	1082803,98	462,87	330	723308,22	1082970,24	474,08				

Schéma zaměřených úseků vyrovnávací vrstvy

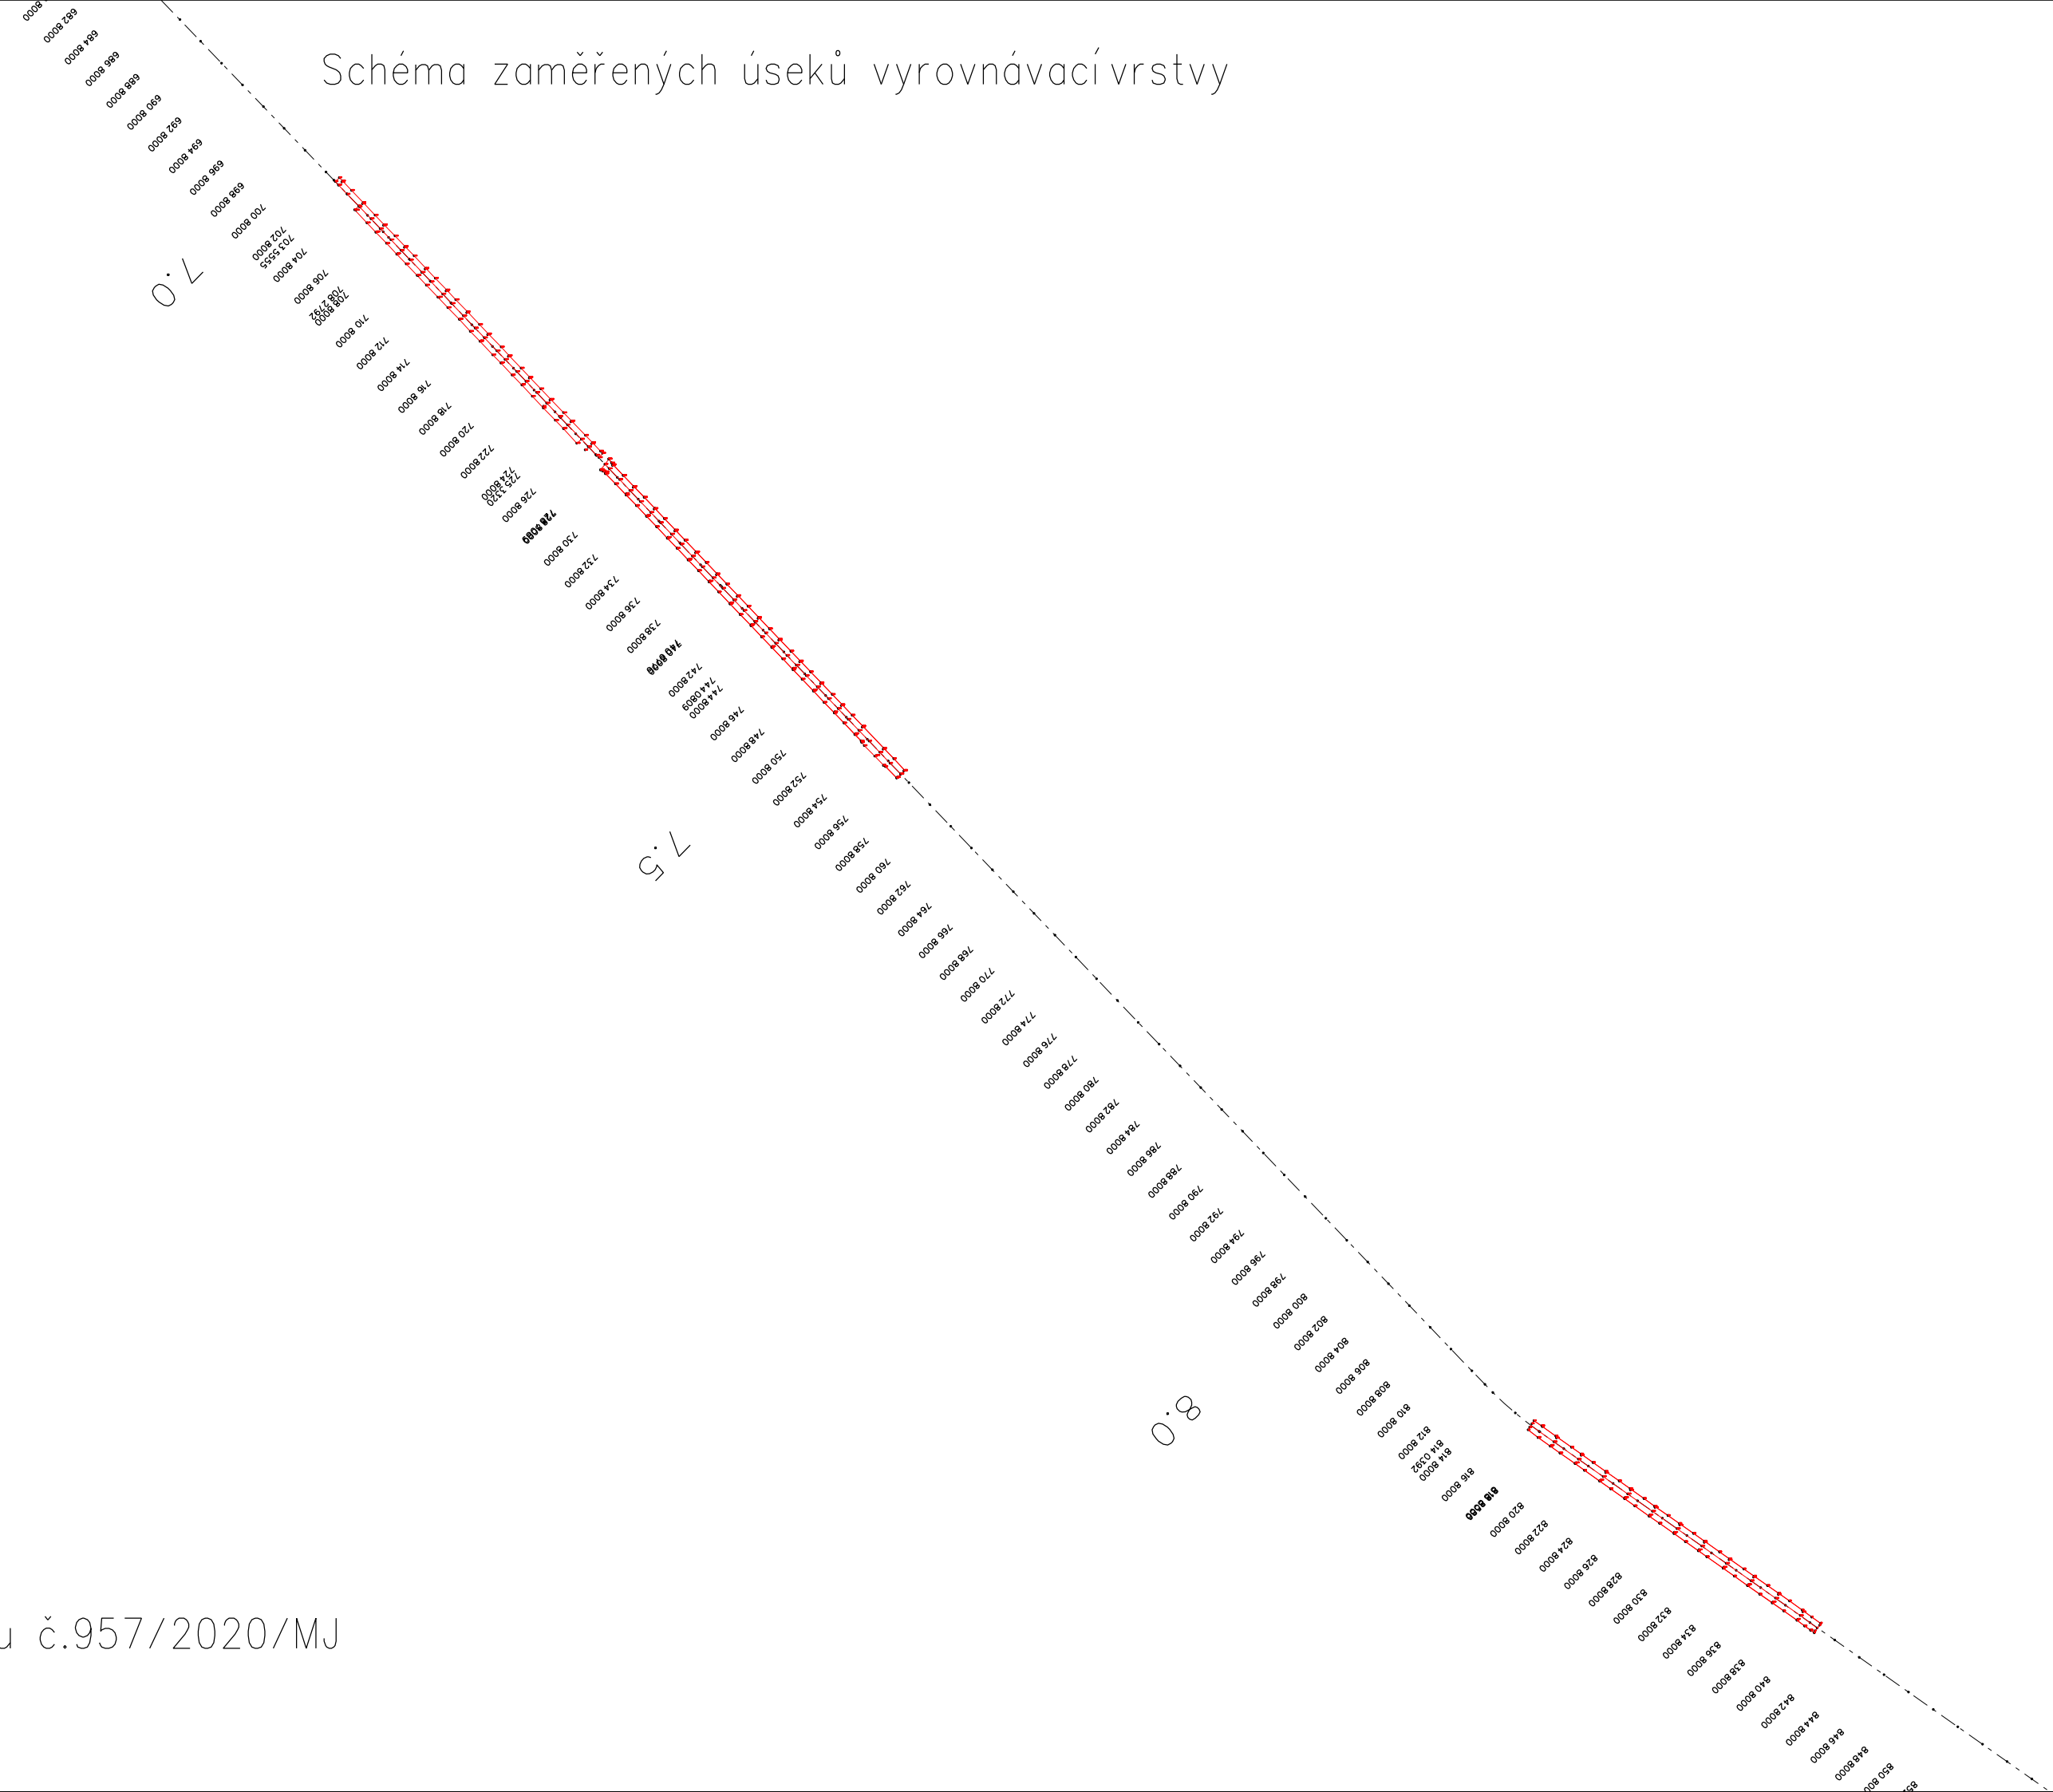

Měřítko 1 : 4000

Příloha protokolu č.957/2020/MJ

TKPgeo s.r.o.



BES s.r.o.

k rukám pana Josefa Houdka
Sukova 625
256 01 Benešov u Prahy

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
Struha_pdps_do0421

Vyřizuje
Veselá

Místo a datum odeslání
Praha, 7.6.2021

**Věc: „II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48“
- vyjádření AD k ZBV7**

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 2.6.2021 o vyjádření k návrhu změn během výstavby výše uvedené akce Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující:

Seznámili jsme se s poskytnutými podklady, které se týkají níže uvedených změn a upřesnění rozsahu a provedení stavby. Návrhy změn vychází z předběžných dohod provedených na Kontrolních dnech stavby, což je dokumentováno zápisy ve Stavebním deníku. Předmět ZBV7 v rámci rekonstrukce silnice II/112 je:

- pokládka vyrovnávací vrstvy z AC v úsecích s ponechávanou podkladní vrstvou tvořenou žulovou kostkou velkou

Po prostudování dostupných podkladů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Autorský dozor prohlašuje, že se změnami navrhovanými v rámci předloženého ZBV7 souhlasí.

S pozdravem





ing. Sarka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Přílohy: bez příloh



atelierpromika s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Vaše č.j.		
Naše spis. zn.	II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice	
Naše č.j.		
Vyřizuje:	Ing. Jindřich Přívratský	
Tel.:		
E-mail:		
Datum:	11.6.2021	

„Sdružení BES – COLAS“
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Věc: II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48– vyjádření TDI k návrhu ZBV 7.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující:


ZBV 7. - SO 121.4 Vyrovnávka ponechané podkladní vrstvy asfaltobetonem.

Z důvodu zachycení stabilního podloží a dvou úseků pevné podkladní vrstvy komunikace z původních žulových kostek bylo po odfrézování stávajícího asfaltového souvrství rozhodnuto o jejím ponechání a dalším využití do nové konstrukce. Po úpravě projektu byla vrstva žulových kostek doplněna asfaltovou vyrovnávkou a nahradila tak v těchto úsecích podkladní vrstvy komunikace ze štěrkodrti včetně úpravy zemní pláně vápennou stabilizací. Odpočtové položky podkladních vrstev jsou řešeny v samostatném ZBV za celý úsek komunikace.

Změna byla nepředvídatelná, zjištěná až v průběhu stavby po odfrézování stávajícího asfaltu komunikace a odzkoušení podkladu, projednána a odsouhlasena v rámci KD stavby zástupci objednatele, projektanta a zhotovitele a výměry upravovaných ploch geodeticky zaměřeny de skutečnosti.

S výše uvedeným návrhem ZBV7 za TDI souhlasím.

S pozdravem



Ing. Jindřich Přívratský, TDI
PUDIS a.s.

Denní záznam stavby

S.D.C.2

Název akce: 11/112 STŘEHAŘOV

List číslo: 5

Datum

Číslo akce: 1264 30 121, 182, 190, 193

7. PRÁCE: - ZACÍSTĚNÍ RYHŮ PRO SAMACI / 9. 2020
KRAJSÉ VOŽOVKY PRAVA, LEVA
STRANA V RŮZECH 9280 - 9480
UJINĚNÍ: PLÁNOVÉ RYHŮ, PŘÍPRAVA
GEOMETRIE, DEONAZNÍ TRUBEY
ODVOZ ZEMINY NA DEPONII

- SBĚR KOSTEK VOŽOVKY VE STANICI
7280 - 7420

POČASÍ: 10°C ÷ 19° VASNO

STAV: SOUVĚŠ, PĚNKOVA, 8x STROJIK, 5x DĚLNÉ STĚŽDA

PRAC. DOBA: 4^h 11²⁰ 12²⁰ 14²⁰

MĚCHANIZACE: 2x D4 316; 1x CATPACBAGR, 5x DOKOP
KALČ, HUTNĚNÍ DOŠKA

PRÁCE: - UKLADKA GEOMETRIE, DEONAZNÍ

TRUBEY DO UJINĚNÍ PRO SAMACI
KRAJSNICE, ŽALSYA 3D0-63, 0-62
HUTNĚNÍ SAMACE KRAJSÉ VOŽOVKY
VE STANICI 9280 - 9480 LEVA, PRAVA
STRANA

- NAKLADKA 3D 0-63 PŘEDVŮZ

- ODSTRANĚNÍ ZEMINY DO VÝŠE
STĚŽU VOŽOVKY PRO SAMACI KRAJSÉ
VOŽOVKY LEVA, PRAVA STRANA VE
STANICI 9160 - 9040.

- UJINĚNÍ RYHŮ PRO SAMACI VE STA-
NICI 9160 - 9040 KRAJSÉ VOŽOVKY
ODVOZ ZEMINY NA DEPONII, HUTNĚNÍ
PLÁNOVÉ RYHŮ

ZÁPIS PROJEKTANTA RDS:

VZHLEDEM KE SKUTEČNĚ ZASTIŽENÉ KONSTRUKCI
VOŽOVKY (KAMENNÉ KOSTKY) BUDE V DAUČCH
1M1 STECH PŘIZVEDNUTA NIVELETA. PŘED A ZA

Denní záznam stavby

S.D.E.2

Název akce: 11/142 STRUHAROV

Číslo akce: 1464 20 121, 122, 140, 143

List číslo: 6

Datum

PŘEJEZDEM (TRAT' SZ) BUDE V DELCE
CCA 20M BUDE PLYNULÉ NAPOJENA NIVELETA
NA STAVALICI STAV. TOTO OPATŘENÍ SI UŽÁDA
ODSTRANENÍ KAMENÝCH KOSTEK UCELE
SIDLE VOZOUK

3.9.20
~~2020~~

DALE BYLO POUHLIDKOU STAVBY ZJISTENO, ŽE
V KM 7,020P STAVALICI PLAZBA VÝKOPU JE
V DELCE CCA 15M VYPAJNE FOXVOZENÍ.
V TOMTO ÚSEKU MUTNO PLAZBU ODSTRANIT A
NAHRADIT PLNOU KONSTRUKCI VOZOUK

Za 7)1. polovinu

KOSTEK

PODASÍ: 13°C = 14°C POLOJASNO

3.9.20
ČTVRTÉ

STAV: SOUHRNĚ, AŽUKAVA, 8x STOVNICE, 4x DEŽNÍ

PRAC. DOBA: 4^h 11^h 12^h 16^h

METCHANIZACE: DH 316 2x, DEMPAR 4x, TRAKTORBAGR

PRACE: - ODSTRANENÍ ŽEMINY KOLEM PROPUSTK

OP. VE STANICI 7,46 KM, ROZEBRANÍ

KAMENNÉHO PROPUSTKU, KUTNENÍ

BRÁNY POD PROPUSTKEM, BETONÁŽ

PODLAŽNÍHO BETONU C/P10, ODVOZ ŽEMINY

NA DETONII

- VÝKOP RÝHY PRO SANACI KRAJE

VOZOVKY VE STANICI 9160 - 9060

ODVOZ ŽEMINY NA DETONII - LEVA - PRAVA STR.

- UKLÁDÁNÍ ŽD O-63 SANACE KRAJE

VOZOVKY VE STANICI 4460 - 4380

KUTNENÍ A UKLÁDÁNÍ Č. 50 MĚŘÍTELE S

ŽA 84 RST 10-32 S KUTNENÍM

Za 7)1.

Práce: pokládání žd na proplech
povrchu podkladního bet. a uložení žd

9.20

PODASÍ: 16°C = 20°C POLOJASNO

PRÁZE

STAV: SOUHRNĚ, AŽUKAVA, 8x STOVNICE, 4x DEŽNÍ

PRAC. DOBA: 4^h 11^h 12^h 16^h 30

METCHANIZACE: DH 316 2x, TRAKTORBAGR 1x

DEMPAR, KUTNENÍ DOŠE

Denní záznam stavby

S.D.C. 2

Název akce: 11/112 STRUKTURU

List číslo: 29

Datum

Číslo akce: 1469

SO 121; AP2. 190; 193

Podasí: 9° ÷ 12°C ZATŘEŠKO, POLOVAJNO
STAV: SOUŠROJE (BOS) PLEKAVÁ, 3x STROJNÍK,
2x DĚLNÍK (BOS) LINGR, 10x STROJNÍK,
2x DĚLNÍK (ČUS), 1x STROJNÍK (BOS)

4. 11. 20
STŘEDA

PRAC. DOBA: 4^h - 11^h - 12^h - 16^h

METALIZACE: ČISTĚNÍ VÍŽ - CISTERNA POSTĚK (BOS)
MÍZOP, 2x MĚŘA (BOS) FLEŽA, HODVÁK
VÁLCE 2x, ČIŠTĚNÍ, CISTERNA 5x (ČUS)

PRAC: - ÚPRAVA FLEŽOVANÝM S ÚPRAVOU POUČU
S POUČEM (ČUS) ASF. PĚNA)
V KĚŽOVANÝM UMÍSTĚ, AUTODUSOVÁ
ZASTAVĚNÁ UMÍSTĚ, PŘED A ZA BĚŽ-
ZNĚNÍM PŘÍJEDNÍM U DOBRÉ ČIKOHA
- ÚPRAVA SVAHU SE ZAHROMOSOVANÝM
V TRASĚ STANOVY 990 - 920
- ÚKLID KOMUNIKACE UMÍSTĚ
KOSTROVĚ NAŘEŽY VESTAVIČNÍ
990 - 940 S POUČEM ČUS
PŘÍJEDNÍM VESTAVIČNÍ 1600m²
- KONTROLA OBJEZOVÉ TRASY DO

FAKIS ZMOTOVITEL:

4. 11. 20

ZAVOLANÍ IDI O PŘEVZETÍ OBVĚSTOVÉHO POUČU
KOSTROVĚ NAŘEŽY S POUČEM ČUS
VOROVĚN KSC VE STANOVY 990 - 940
COLEOVĚ UMÍSTĚ ČSA 1600m² A POUČOVÍ
NÁSTĚK S POUČEM ČUS P1-C 1,0 kg/m²
ALE ČSN 436129 POD PODKLADNÍ VRSŤOU.

STŘEDA

Za IDI.

Kontrola stavu. Toulky polokováním prac
a provedení jednotlivých.
Plochu kontrolovat cistrou bez spadnutí
lišti.

Denní záznam stavby

S.D.C.2

Název akce: 11/112 STROHARŮV

List číslo: 30

Datum

Číslo akce: 1/64 SO 121, 182, 190, 193

ZÁPIS ZHOTOVITELŮ:

4.11.20

ZÁKONEM ZASTUPCE TDI O PŘEVZETÍ INFILTRACNÍHO POSTŘIKU NA KOSTKOVÉ NÁZEBÍ KOMUNIKACE SE SADAČÍ KRAJE ESC A POUŽITÍ VLOŽENÍ VSTUPY ACP 16+ JOMA VE STANICI P190 - P110

STŘEDA

Za TDI:

Fotolep: funkcionální plán a položení
množství vstupů dle ZPS
základní rámec dle skutečnosti a vyřadit
pro další zpracování ZSV.

4.11.20

STŘEDA

Počasi: 6° - 9° POUŠAHO

PRÁCE: - UKLÁDÁ VYROVNÁVACÍ Vrstvy V
MÍSTĚ KOSTKOVÉ NÁZEBY VÍŠKA 3m
VE STANICI P190 - P110

5.11.20

ČTVRTEK

Dne 6.11.2020 byly provedeny zkoušky lehkou dynamickou deskou na recyklovací vrstvě na studenci. Všechny zkoušky provedeny jsou vyhovující které předepisuje kZP.

Dr. Aljoza Fed

6.11.20

ZÁPIS ZHOTOVITELŮ:

6.11.20

ZÁKONEM TDI O POUŽITÍ NASTŘIKU INFILTRACNÍHO POSTŘIKU NA ZÁKLADĚ PŘEVZETÍ OČIŠŤOVACÍHO POUČHU RC A PROBEHLOU ZKOUŠEK PŘEVNOSTI POUČHU LEHKOU DYNAMICKOU DESKOU NA RECYKLOVANÉ Vrstvě
DĚLČÍ TRASY 6,7 - 9,48 km

PAŤEK











Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/112

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

121 / 5

Číslo ZBV:

8

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnosti "Sdružení BES - COLAS"
B E S s.r.o., vedoucí člen sdružení
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	-5 821 479,49	0,00	-5 821 479,49

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-5 821 479,49	0,00	-5 821 479,49

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/112	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 121 / 5	Číslo ZBV: 8
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2517/DOP/2020 a zhotovitel č.: 152/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost "Sdružení BES - COLAS"

Přílohy Změnového listu	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 8	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	37	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna - Odečet nerealizovaných prací

První změna:

Po odfrézování AC souvrství byla v úseku od ZÚ až 7,035 dále 7,568 až 8,169 a 8,616 až KÚ odhalena spodní vrstva tvořená únosným souvislým kamenným štětem překrytým vrstvou ŠD proměnlivé tloušťky. Na základě návrhu zhotovitele a požadavku TDI byli provedeny statické zatěžovací zkoušky (příloha č. 09 Statické zatěžovací zkoušky a příloha č. 13 Fotodokumentace) k prokázání únosnosti podkladního souvrství. Výsledky SZZ prokázali vhodnost současného podkladu (E_{def2} 117,3 až 406,0) a za souhlasu TDI (příloha č. 11 Vyjádření TDI) a AD (příloha č. 10 Vyjádření AD) nebyly realizovány odkopávky, vápnění a zpětný návoz ŠD.

Druhá změna:

Pokládka AC vrstev byla provedena sestavou dvou finišerů jedoucích v tandemu. Styčná spára je tedy řešena jako tzv. teplá spára. Vzhledem k provedené technologii nebyla nutnost ošetřovat středovou spáru profrézováním a zalitím.

Změna jsou vyjádřeny novou smluvními položkou č. 3, 9, 10, 11, 12, 41, 42 43, 55 a 67. Změna snižuje smluvní cenu stavby o 5 821 479,49Kč.

Výše popsané změny byly změny nepředvídatelné, zjištěné poodfrézování AC souvrství. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-5 821 479,49	0,00	-5 821 479,49	5 821 479,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "Sdružení BES - COLAS"	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Atelier PROMIKA s.r.o.	jméno	Ing. Šárka Veselá	datum	podpis
Stavební dozor: Pudis a.s.	jméno	Ing. Jindřich Přivratský	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Mgr. Jan Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby:	II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	121 / 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/112

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
40 855 358,35

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-796 657,09	14 569 049,95	54 627 751,21	13 772 392,86

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-5 821 479,49	0,00	14 569 049,95	35,66%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-6 618 136,58	48 806 271,72	7 950 913,37	19,46%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): Společnost "Sdružení BES - COLAS"	souhlasím	Ing. Aleš Sládek
Projektant (autorský dozor): Atelier PROMIKA s.r.o.	souhlasím	Ing. Šárka Veselá
Stavební dozor: PUDIS a.s.	souhlasím	Ing. Jindřich Přivratský
Zástupce Objednatele: Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	souhlasím	Ing. Jan Lichneger
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Milan Peška

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Z2019-022986								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice II/112								SO 121					
Číslo a název rozpočtu: 180122 II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		smluvní položky											
3	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	20 860,000	0,000	-20 860,000	26,50	552 790,00	-552 790,00	0,00	0,00	-552 790,00	-100,00%
9	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 649,850	824,550	-825,300	74,90	123 573,77	-61 814,97	0,00	61 758,80	-61 814,97	-50,02%
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	824,925	412,275	-412,650	21,90	18 065,86	-9 037,04	0,00	9 028,82	-9 037,04	-50,02%
11	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 055,300	230,000	-825,300	199,40	210 426,82	-164 564,82	0,00	45 862,00	-164 564,82	-78,21%
12	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	527,650	115,000	-412,650	35,70	18 837,11	-14 731,61	0,00	4 105,50	-14 731,61	-78,21%
41	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 m2	m2	19 110,000	0,000	-19 110,000	54,80	1 047 228,00	-1 047 228,00	0,00	0,00	-1 047 228,00	-100,00%
42	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	202,948	0,000	-202,948	2 824,10	573 145,45	-573 145,45	0,00	0,00	-573 145,45	-100,00%
43	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	28 470,000	0,000	-28 470,000	104,40	2 972 268,00	-2 972 268,00	0,00	0,00	-2 972 268,00	-100,00%
55	573211100-1	Nalítí hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 40 mm	m	8 505,000	283,000	-8 222,000	40,30	342 751,50	-331 346,60	0,00	11 404,90	-331 346,60	-96,67%
67	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8 735,000	513,000	-8 222,000	11,50	100 452,50	-94 553,00	0,00	5 899,50	-94 553,00	-94,13%
		Celkem							- 5 821 479,49	0,00		- 5 821 479,49	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	76 961 718,06
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	86 302 772,05
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	104 426 354,18
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	112,14%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,60%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	9 341 053,99
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,14%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 088 515,42

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,52%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	16,82%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 577 327,15
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 480 859,03

12=(1)*0,15	Limit	11 544 257,71
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis (Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice	- 6 618 136,58	15 959 190,57	9 341 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 895 847,19	3 736 430,43	- 2 159 416,76	9 632 277,62	- 722 289,39	12 222 760,14	11 500 470,75	12 945 049,53	0,00	0,00	0,00
203	1	Sanace založení mostu ev.č. 112-010	0,00	281 006,76	281 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 006,76	281 006,76	281 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2	Sanace pokladu mostu ev.č. 112-009	0,00	830 737,07	830 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 737,07	830 737,07	830 737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3	Sanace krajů komunikace	0,00	11 077 962,83	11 077 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 962,83	11 077 962,83	11 077 962,83	0,00	0,00	0,00
121	4	Změna DN potrubí u mostu 112-008	- 74 367,70	201 528,81	127 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 367,70	201 528,81	127 161,11	275 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	5	Sanace přechodové oblasti a obsyp most	0,00	278 396,79	278 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 396,79	278 396,79	278 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
121	6	Upravení receptury recyklace za studena	- 722 289,39	1 144 797,31	422 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 722 289,39	1 144 797,31	422 507,92	1 867 086,70	0,00	0,00	0,00%
121	7	Vyrovnávka AC v úseku žulových kostek	0,00	2 144 761,00	2 144 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 761,00	2 144 761,00	2 144 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	8	Odečet nere realizovaných prací	- 5 821 479,49	0,00	- 5 821 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 821 479,49	0,00	- 5 821 479,49	5 821 479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/112
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121 / 5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	9	
08 Zápisy z KD 1. a 2.	8	
09 Statické zatěžovací zkoušky	7	
10 Vyjádření AD	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Zápisy v SD zhotovitele	5	
13 Fotodokumentace	6	
Počet listů celkem	37	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice Z2019-022986								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice II/112								SO 121						
Číslo a název rozpočtu: 180122 II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice								celkem						
Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Náklady soupisu celkem

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV							40 786 668,22	-6 618 136,58	10 370 609,47	44 539 141,11	3 752 472,89	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--

D	1	Zemní práce							9 374 830,97	-802 938,44	5 655 148,76	14 227 041,29	4 852 210,32	
---	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--

1	CS ÚRS 2019 02	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	500,000	500,000	0,000	46,30	23 150,00	0,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00%
---	----------------	-----------	---	----	---------	---------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

odborný odhad 500

2	CS ÚRS 2019 02	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	500,000	500,000	0,000	30,90	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00%
---	----------------	-----------	---	----	---------	---------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

odborný odhad 500

3	CS ÚRS 2019 02	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	20 860,000	0,000	-20 860,000	26,50	552 790,00	-552 790,00	0,00	0,00	-552 790,00	-100,00%
---	----------------	-----------	--	----	------------	-------	-------------	-------	------------	-------------	------	------	-------------	----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

*odstranění stávající konstrukce (tl. průměrně 200mm), prováděno po odfrézování" 19500+2720*0,5

ZBV 8

nerealizovaný odkop

4	CS ÚRS 2019 02	113154234	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	350,000	350,000	0,000	56,30	19 705,00	0,00	0,00	19 705,00	0,00	0,00%
---	----------------	-----------	---	----	---------	---------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Poznámka k položce: Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu :

*frézování manipulační plochy (tl. 100mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 350

5	CS ÚRS 2019 02	113154434	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	19 500,000	19 500,000	0,000	39,90	778 050,00	0,00	0,00	778 050,00	0,00	0,00%
---	----------------	-----------	--	----	------------	------------	-------	-------	------------	------	------	------------	------	-------

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Poznámka k položce: Spodní vrstva tl. do 100mm - směs s obsahem nebezpečných látek, bude použito na stavbě bez odvozu na mezideponii! ; neuvažována hmotnost sítě, následně využít

*frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 80mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 19500

6	CS ÚRS 2019 02	113154435	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	19 500,000	19 500,000	0,000	77,50	1 511 250,00	0,00	0,00	1 511 250,00	0,00	0,00%
---	----------------	-----------	--	----	------------	------------	-------	-------	--------------	------	------	--------------	------	-------

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Poznámka k položce: Vrchní vrstva tl. do 200mm - směs bez obsahu nebezpečných látek, lze následně využít i mimo stavbu, předpoklad použití celého rozsahu :

*frézování vozovky v celém rozsahu stavby (tl. průměrně 150mm) - nastavení R 0/32 (následně použito pro podkladní vrstvy a sjezdy)" 19500

7	CS ÚRS 2019 02	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2 227,000	2 227,000	0,000	28,80	64 137,60	0,00	0,00	64 137,60	0,00	0,00%
---	----------------	-----------	--	----	-----------	-----------	-------	-------	-----------	------	------	-----------	------	-------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

*v tl. 0,1m, dm, degradovaná ornice - trvalá skládka" (44705-2585-19500-350)*0,1

8	CS ÚRS 2019 02	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	100,000	100,000	0,000	86,50	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00%
---	----------------	-----------	---	----	---------	---------	-------	-------	----------	------	------	----------	------	-------

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

*úprava doplňkové zeleně v šířce cca 2,0m a tl. cca 0,25m - trvalá skládka" 400*0,25

9	CS ÚRS 2019 02	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 649,850	824,550	-825,300	74,90	123 573,77	-61 814,97	0,00	61 758,80	-61 814,97	-50,02%
---	----------------	-----------	---	----	-----------	---------	----------	-------	------------	------------	------	-----------	------------	---------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

*stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosu - trvalá skládka" 5170*0,5*0,23

predikce 50% tř. 3

*výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" (20860+2720)*0,07*0,5

*odstranění případné konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu či zřízení propustku v hloubce max. 1,0m - trvalá skládka" 460*1,0*0,5

ZBV 8

*nerealizovaný výkopy po odstranění stávající konstrukce vozovky na úroveň navrhované pláně, prům. tl. 70mm - trvalá skládka" (20860+2720)*0,07*0,5

10	CS ÚRS 2019 02	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	824,925	412,275	-412,650	21,90	18 065,86	-9 037,04	0,00	9 028,82	-9 037,04	-50,02%
----	----------------	-----------	---	----	---------	---------	----------	-------	-----------	-----------	------	----------	-----------	---------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3

lepvost 50%

*stržení krajnice v šířce cca 0,5m prům. tl. 230mm (na úroveň frézy), včetně odstranění nánosu" 5170*0,5*0,23

			ZBV 4 Most 112-008, změna množství obetonování -(10*0,1*1,9)+(12,5*2,98*1,1)+(3,14*0,3*2*12,5)			35,543												
67	CS ÚRS 2019 02	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8 735,000	513,000	-8 222,000	11,50	100 452,50	-94 553,00	0,00	5 899,50	-94 553,00	-94,13%				
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu tloubky přes 50 do 100 mm															
			"zařiznutí živičného krytu stávající vozovky při frézování" 115*2		230,000													
			"profesze spár při pokládce po polovinách + napojení" 2720*3+115*3		8 505,000													
			ZBV 8 "pokládka AC vrstev byla provedena sestavou dvou finišerů jedoucích v tandemu, styčná spára je řešena jako tzv. teplá spára, skutečná výměra provedených řezů 513"		513,000													
68	CS ÚRS 2019 02	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	5 170,000	5 170,000	0,000	62,50	323 125,00	0,00	0,00	323 125,00	0,00	0,00%				
			Profilace a čištění příkopu komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezevňadních nebo zpevněných oblomu nánosů otes 0,15 do 0,30 m3/m <i>Polozávka k položce: průměrná hodnota 0,3m3/m</i>															
			"pročištění příkopu příkopovým rypadlem - trvalá skládka" 5170		5 170,000													
69	CS ÚRS 2019 02	938902482	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	45,500	45,500	0,000	727,40	33 096,70	0,00	0,00	33 096,70	0,00	0,00%				
			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloubky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm															
			"čištění propustků DN 800, resp. do DN 1000"															
			"silniční" 1*23,0		23,000													
			"drážni" 3*7,5		22,500													
70	CS ÚRS 2019 02	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	15,000	15,000	0,000	121,00	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00%				
			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m															
			"silniční" 15		15,000													
71	CS ÚRS 2019 02	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	350,000	350,000	0,000	6,40	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00%				
			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného															
			"manipulační plocha - po odfrézování plochy, před provedením infiltračního postřiku" 350		350,000													
		997	Přesun sutě						1 315 184,37	0,00	25 390,64	1 340 575,01	25 390,64					
72	CS ÚRS 2019 02	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	7 065,464	7 527,953	462,489	54,90	387 893,97	0,00	25 390,64	413 284,61	25 390,64	6,55%				
			Vodorovná doprava sutí na skládku bez naložení, ale se skložením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby															
			"kamenivá" 6049,4		6 049,400													
			"profilace a čištění příkopů" 1002,98		1 002,980													
			"čištění propustků a vozovek" 11,739+0,645+0,7		13,084													
			ZBV 3 dle položky 77. 1109,086*0,417		462,489													
73	CS ÚRS 2019 02	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	155,625	155,625	0,000	74,90	11 656,31	0,00	0,00	11 656,31	0,00	0,00%				
			Vodorovná doprava sutí na skládku bez naložení, ale se skložením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby															
			"odstranění propustků" 155,625		155,625													
74	CS ÚRS 2019 02	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	7 221,089	7 221,089	0,000	126,80	915 634,09	0,00	0,00	915 634,09	0,00	0,00%				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504															
			"sypký materiál" 7065,464		7 065,464													
			"kusový materiál" 155,625		155,625													
		998	Přesun hmot						205 614,97	0,00	911 858,38	1 117 473,35	911 858,38					
75	CS ÚRS 2019 02	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 763,642	15 019,803	12 256,161	56,40	155 869,41	0,00	691 247,48	847 116,89	691 247,48	443,48%				
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu															
			ZBV 3 automatický výpočet programu KROS 4		12 256,161													
76	CS ÚRS 2019 02	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	2 763,642	15 019,803	12 256,161	18,00	49 745,56	0,00	220 610,90	270 356,46	220 610,90	443,48%				
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m															
			ZBV 3 automatický výpočet programu KROS 4		12 256,161													
			Celkem - smluvní položky						40 786 668,22	-6 618 136,58	10 370 609,47	44 539 141,11	3 752 472,89					

nové položky rozpočtu - ÚRS 2019 02

D	HSV	Práce a dodávky HSV							0,00	0,00	4 093 544,78	4 093 544,78	4 093 544,78	
D	1	Zemní práce							0,00	0,00	57 450,65	57 450,65	57 450,65	
77	CS ÚRS 2019 02	113106451	Rozebrání dlažeb při překopec vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2	m2	0,000	1 109,086	1 109,086	51,80	0,00	0,00	57 450,65	57 450,65	57 450,65	100,00%

ZBV 3
 "délka sanace dle geodetického zaměření č. 823/2020/MJ, průměrná šířka 1,0 metru
 rozebrání dlažby u přejezdu 1 083,086
 26,000

D	2	Zakládání						0,00	0,00	1 199 440,00	1 199 440,00	1 199 440,00	
78	CS ÚRS 2019 02	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m2	0,000	5 170,000	5 170,000	232,00	0,00	1 199 440,00	1 199 440,00	1 199 440,00	100,00%

ZBV 3
 délka sanací (dle geodetického zaměření v příloze ZBV) + vyústění á 50m(2467,6+2496,4)+103*2 5 170,000

5		Komunikace pozemní						0,00	0,00	2 771 581,00	2 771 581,00	2 771 581,00	
79	CS ÚRS 2019 02	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	0,000	2 022,000	2 022,000	310,00	0,00	626 820,00	626 820,00	626 820,00	100,00%

ZBV 3
 "ploch dle geodetického zaměření č. 823/2020/MJ a 14/2021/MP" 1 996,000+26.000 2 022,000

84	CS ÚRS 2019 02	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytí asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	0,000	5 659,000	5 659,000	379,00	0,00	2 144 761,00	2 144 761,00	2 144 761,00	100,00%
----	----------------	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--------	------	--------------	--------------	--------------	---------

ZBV 7
 "výměra dle geodetického zaměření č. 957/2020/MJ - 5 659,000m2 5 659,000

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	65 073,13	65 073,13	65 073,13	
81	CS ÚRS 2019 02	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	0,000	12,500	12,500	1 770,00	0,00	22 125,00	22 125,00	22 125,00	100,00%

ZBV 4
 osazení nové trouby na most 112-008 12,500

82	CS ÚRS 2019 02	59223023	trouby ŽB hrdlové DN 600	m	0,000	12,688	12,688	1 990,00	0,00	25 248,13	25 248,13	25 248,13	100,00%
----	----------------	----------	--------------------------	---	-------	--------	--------	----------	------	-----------	-----------	-----------	---------

ZBV 4
 "nové trouby na most 112-008" 12,5*1,015 12,688

83	CS ÚRS 2019 02	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	0,000	200,000	200,000	88,50	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
----	----------------	-----------	---	---	-------	---------	---------	-------	------	-----------	-----------	-----------	---------

ZBV 4
 "druhá reprofilace a přespádování příkopů" 200 200,000

nové položky rozpočtu - převzaty z jiných SO

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,00	104 895,70	104 895,70	104 895,70	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--	------	------	------------	------------	------------	--

D	VRN4	Inženýrská činnost						0,00	0,00	104 895,70	104 895,70	104 895,70	
---	------	--------------------	--	--	--	--	--	------	------	------------	------------	------------	--

80	CS ÚRS 2019 02	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	0,000	14,000	14,000	7 492,55	0,00	104 895,70	104 895,70	104 895,70	100,00%
----	----------------	-----------	--------------------	-----	-------	--------	--------	----------	------	------------	------------	------------	---------

ZBV 3
 převzata z objektu VRN - Vedlejší rozpočtové náklady, původní popis položky: "Zkoušky
 zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí
 vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací" 14,000
 celkem provedeno 24 zkoušek SZZ viz příložené protokoly, dle výše uvedeného zadání
 čerpáno 10 zkoušek z objektu VRN, zbylé součástí ZBV

Celkem - nové položky 0,00 0,00 4 198 440,48 4 198 440,48 4 198 440,48

Celkem - stavební objekt po započtení ZBV 7 40 786 668,22 -6 618 136,58 14 569 049,95 48 737 581,59 7 950 913,37

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70-9,48

Kontrolní den	
Číslo	1 konaný dne 23.6. 2019

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 1

Program kontrolního dne / operativní porady
1. Předání staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: a) Popis provedených prací b) plnění věcného HMG c) Finanční plnění
3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště	
předání staveniště	15.6.2020 proběhlo protokolární předání staveniště, Investor předal staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný protokol o předání a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	Ihned po předání staveniště zahájil zhotovitel práce na stavbě, bylo osazeno DIO dle schválené PD a rozhodnutí, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava bude vedena po objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby. Bylo provedeno frézování vozovky v celém úseku, probíhá čištění krajnic a příkopů Práce by měly trvat zhruba 6 měsíců.
b) plnění věcného HMG	Práce byly zahájeny dle harmonogramu. Předpoklad dalších prací: most 112-009 odtěžit od 25.6.20, demolovat od 29.6.20 , most 112-007 odtěžit od 29.6.20, demolovat od 3.7.20. Nástup vrtné soupravy cca 8.7.20
c) finanční plnění	Nejsou požadavky – práce byly zahájeny

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
0.1	Pasportizace	Proveden pasport stavby a objízdných tras – předložit	Zhotovitel	Splněno vypustit

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 01/2020	II/112 STRUHAŘOV, REKONSTRUKCE SILNICE – PROVOZNÍ STANIČENÍ KM 6,70-9,48	FORMULÁŘ KD/OP	STRANA: 1/3
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		

0.2	Harmonogram	Předložit aktualizovaný	Zhotovitel	Splněno vypustit
0.3	PDPS – úprava vrstev vozovky	Zhotovitel předložil návrh změny pořadí vrstev ŠTD (spodní) x recyklát – AD, TDI a objednatel souhlasí - změnit v RDS	Zhotovitel	Trvá
0.4.	Subdodávky	Předložit ke schválení	Zhotovitel	průběžně
0.5	Geodet. body - rušení	Na mostech 112-107,112-110 budou zrušeny geodet. body - doložit souhlas	Zhotovitel	Do zahájení práce na mostech

3. Kontrola kvality

a) zpráva o vyhodnocení kvality Nelze hodnotit, stavba je právě zahájena

4. Stav BOZP a PO

Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli seznámeni s Plánem BOZP.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.1	Změna RDS – podloží	Po odfrézování stáv. vozovky zachycen kamenný štět v podloží komunikace v celém úseku – předpoklad změny konstrukce. Ověřit únosnost pomocí SZZ a sondy, střídavě v jízdnicích pruzích a na krajnici, předat podklady AD k posouzení a navrhnout úpravy konstrukce, Předpoklad nerealizace sanací podloží a vznik ZBV.	Zhotovitel	29.6.2020
1.2	Geodetické zaměření po odfrézování	Zaměřit stav komunikace po odfrézování vozovky, doložit výměru fréz. recyklátu, předat jako podklad k případné úpravě nivelety a návrhu nové skladby	Zhotovitel	29.6.2020
1.3	Postup při změnách během výstavby - ZBV	Dodržovat „Zásady pro procesování ZBV“ od Pragoprojektu resp. KSÚS	Zhotovitel	průběžně
1.4.	Technologické předpisy, KZP	Předkládat Tepř pro činnosti na stavbě, především mosty	Zhotovitel	průběžně

5. Různé

0.1	V případě nepřítomnosti TDI Ing. Jindřicha Přívratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Ing. Dan Krejčí (tel. 730 857 716)
0.2	Odesláno ohlášení zahájení stavby na OIP a archeolog.průzkum
1.1.	Dle požadavku KSÚS od projektantů převzata PDPS (4x TUBES mosty, 3x PROMIKA komunikace) a předána zhotoviteli (2+2 ks)

7. Závěr

Datum konání příštího KD / OP	KD č.2 – 30.6.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 za uzávěrou komunikace, v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany
-------------------------------	--

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

Ing. Jindřich Přívratský



PUDIS
Podpis

Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pudis.cz

21

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 01/2020	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD č.1

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 26.6.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ


Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 01/2020	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 3/3

Prezenční listina

Název akce: „II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70-9,48“ - předání staveniště			
Místo konání: Struhařov, Chotýšany			
Datum konání: 23. 6. 2020			
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis

PRŮVZATSKÝ	PUDIS, PDI		
SLÁDEK	BES p.r.o.		
ŘEJKAVA Q.	BEUERER s.r.o.		
HLÁDEK J.	BES s.r.o.		
ŘEHŮBĚ FILIP	TUBES s.r.o.		
BAOČEK DENÍK	BES s.r.o.		
JAN NEPADÍLEK	COLASCF a.s.		
MICHAL STEININGER	COLASCF a.s.		
DAN KREJČÍ	PUDIS, KOOPBOP		

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		Prezence
EVIDENČNÍ ČÍSLO:		
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKA 2 Z 3

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70-9,48

Kontrolní den	
Číslo	2 konaný dne 30.6. 2019

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 2

Program kontrolního dne / operativní porady
1. Předání staveniště
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby: a) Popis provedených prací b) plnění věcného HMG c) Finanční plnění
3. Kontrola úkolů z minulého KD
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
5. Stav BOZP a PO
6. Nové úkoly
7. Různé
8. Závěr

1. Předání staveniště	
předání staveniště	15.6.2020 proběhlo protokolární předání staveniště, Investor předal staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný protokol o předání a převzetí staveniště.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	Ihned po předání staveniště zahájil zhotovitel práce na stavbě, bylo osazeno DIO dle schválené PD a rozhodnutí, v celém úseku stavby je úplná uzávěra, doprava bude vedena po objízdných trasách. Toto bude platit po celou dobu výstavby. Komunikace: Bylo provedeno frézování vozovky v celém úseku, probíhá čištění krajnic a příkopů. Mosty: 112-009 odkopávky a demolice, 112-007 odkopávky 112-010 nezahájeno
b) plnění věcného HMG	Práce byly zahájeny dle harmonogramu. Předpoklad dalších prací: most 112-007 demolice od 1.7.20. Nástup vrtné soupravy cca 8.7.20
c) finanční plnění	Předložen návrh fakturace za 06/2020 ve výši 5 475 286 Kč bez DPH, dtto celkem od začátku stavby.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 02/2020	II/112 STRUHAŘOV, REKONSTRUKCE SILNICE – PROVOZNÍ STANIČENÍ KM 6,70-9,48	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
0.3	PDPS – úprava vrstev vozovky	Zhotovitel předložil návrh změny pořadí vrstev ŠTD (spodní) x recyklát – AD, TDI a objednatel souhlasí - změnit v RDS	Zhotovitel	Překonáno vlivem ZBV, vypustit
0.4.	Subdodávky	Předložit ke schválení	Zhotovitel	průběžně
0.5	Geodet. body - rušení	Na mostech 112-107,112-110 budou zrušeny geodet. body - doložit souhlas	Zhotovitel	Do zahájení práce na mostech
1.1	Změna RDS – podloží	Po odfrézování stáv. vozovky zachycen kamenný štět v podloží komunikace v celém úseku – předpoklad změny konstrukce. Ověřit únosnost pomocí SZZ a sondy, střídavě v jízdních pruzích a na krajnici, předat podklady AD k posouzení a navrhnout úpravy konstrukce, Předpoklad nerealizace sanací podloží a vznik ZBV. KD2: SZZ provedeny a předány AD, AD souhlasí se změnami (zrušení sanace podloží), návrh nové konstrukce předloží zhot v RDS	Zhotovitel	29.6.2020
1.2	Geodetické zaměření po odfrézování	Zaměřit stav komunikace po odfrézování vozovky, doložit výměru fréz. recyklátu, předat jako podklad k případné úpravě nivelety a návrhu nové skladby KD2 : zaměřeno, protokol do 3.7. zpracovat do RDS	Zhotovitel	22.6.2020
1.3	Postup při změnách během výstavby - ZBV	Dodržovat „Zásady pro procesování ZBV“ od Pragoprojektu resp. KSÚS	Zhotovitel	průběžně
1.4.	Technologické předpisy, KZP	Předkládat Tepř pro činnosti na stavbě, především mosty	Zhotovitel	Částečně splněno, trvá

3. Kontrola kvality

a) zpráva o vyhodnocení kvality Nehodnoceno, stavba je právě zahájena

4. Stav BOZP a PO

Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli seznámeni s Plánem BOZP.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
2.1	Ohraničení stav. jámy u mostů	Označit a ohraničit pevnými zábranami stavební jámy zdemolovaných mostů v trase	Zhotovitel	Ihned
2.2.	VTD mostů	Předat VTD a odsouhlasit s AD i objednatelem. Dle prohlášení zhotovitele navrženy pouze změny bez vlivu na cenu díla.	Zhotovitel	Ihned

5. Různé

- 0.1 V případě nepřítomnosti TDI Ing. Jindřicha Přivratského (tel. 604 220 703) provádí zástup Ing. Dan Krejčí (tel. 730 857 716)
- 0.2 Odesláno ohlášení zahájení stavby na OIP a archeolog.průzkum
- 1.1. Dle požadavku KSÚS od projektantů převzata PDPS (4x TUBES mosty, 3x PROMIKA komunikace) a předána zhotoviteli (2+2 ks)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 02/2020	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 2/3

7. Závěr

Datum konání příštího KD / OP KD č.3 – 7.7.2020 ve 13,00 hod na stavbě, sraz na KÚ km 9,48 za uzávěrou komunikace, v případě nevhodného počasí následný přesun na BES Chotýšany

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

Ing. Jindřich Přívratský



číslo 1014/20
částka 6
891
s.c.z

21

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD č.2

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 2.7.2020.... na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 02/2020	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 3/3

Prezenční listina

Název akce: „II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70-9,48“		
Místo konání: Struhařov		
Datum konání: 30.6. 2020		
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon
Ing. Petr Nádvořník		
JUDr. Luděk Beneš		
Miloslav Pohunek		
Pavel Šach		
Ing. Jindřich Přivratský		
Ing. Dan Krejčí		
Ing. Aleš Sládek		
Dominik Brožík		
Josef Houdek		
Ing. Jan Neradílek		
Michal Steininger		
PEŮ WOLFA V. JENEBEB		
JAKUB ŽALUD		
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD/OP_ /2020	II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení	Prezence
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKA 1 Z 2

Protokol č. ST - 93/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Struhařov - rekonstrukce silnice; SO 121

Staničení : km 9,320 / 1m od osy v pravo

Konstrukční prvek : pláň

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 24.06.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažeřovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	140,7
	0,076	0,09		II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	175,5
	0,138	0,18					
	0,210	0,30					
	0,281	0,41					
	0,350	0,52					
	0,420	0,63					
	0,501	0,79					
Odlehčení	0,251	0,68					
	0,126	0,55					
	0,007	0,18					
II. zatěžovací cyklus	0,082	0,26					
	0,139	0,32					
	0,212	0,41					
	0,279	0,51					
	0,347	0,60					
	0,421	0,71					

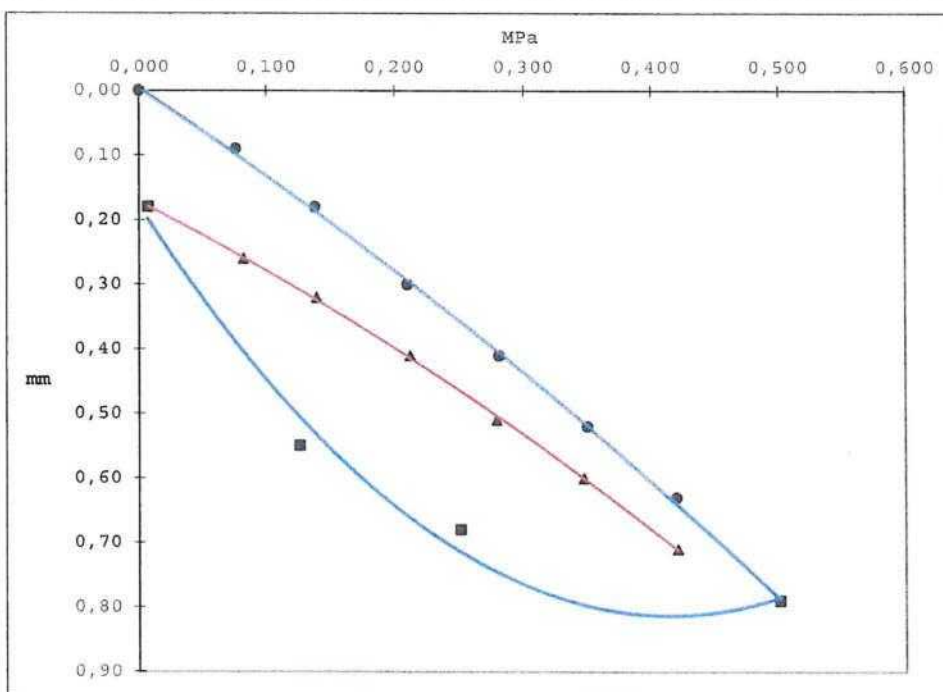

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 94/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Struhařov - rekonstrukce silnice; SO 121

Staničení : km 8,980 / 1m od osy v levo

Konstrukční prvek : pláň

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 24.06.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažeřovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	134,4
	0,075	0,11			II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}
	0,141	0,20					
	0,212	0,31					
	0,280	0,40					
	0,349	0,53					
	0,419	0,69					
	0,499	0,89					
Odlehčení	0,246	0,74					
	0,129	0,57					
	0,000	0,20					
II. zatěžovací cyklus	0,077	0,31					
	0,148	0,41					
	0,211	0,48					
	0,279	0,58					
	0,349	0,67					
	0,418	0,79					

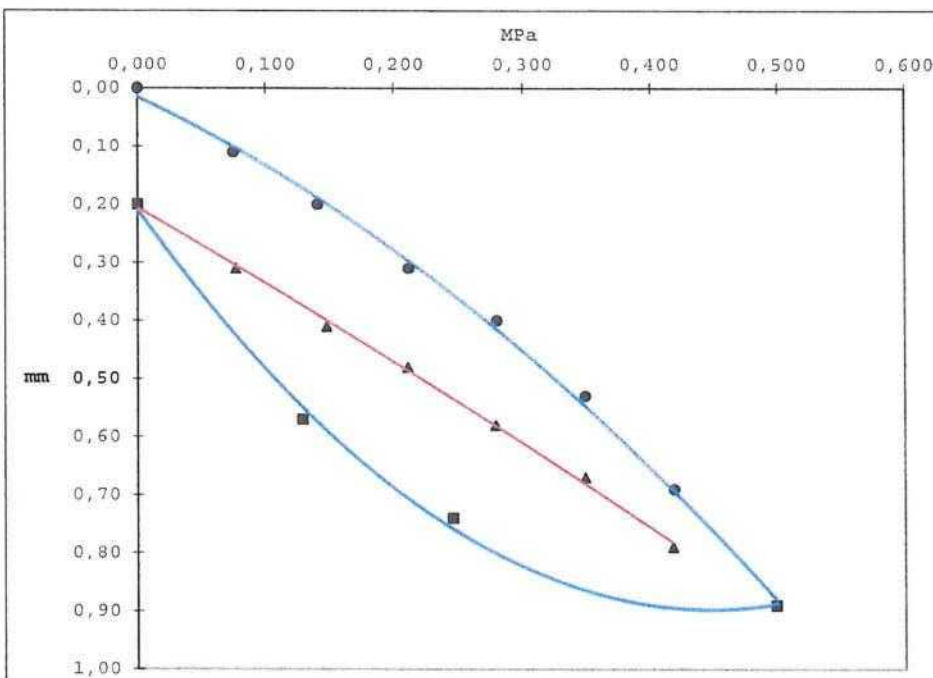

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 96/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Struhařov - rekonstrukce silnice; SO 121

Staničení : km 8,600 / 1m od osy v pravo

Konstrukční prvek : pláň

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 24.06.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažeřovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa		E_{def2} / E_{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	393,6	1,03
	0,076	0,07						
	0,142	0,11						
	0,209	0,15						
	0,279	0,18						
	0,348	0,21						
	0,418	0,25						
	0,498	0,37						
Odlehčení	0,249	0,31	300 mm	II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	406,0	
	0,128	0,24						
	0,000	0,12						
II. zatěžovací cyklus	0,078	0,18	300 mm	II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	406,0	
	0,140	0,22						
	0,208	0,26						
	0,278	0,30						
	0,348	0,33						
	0,419	0,35						

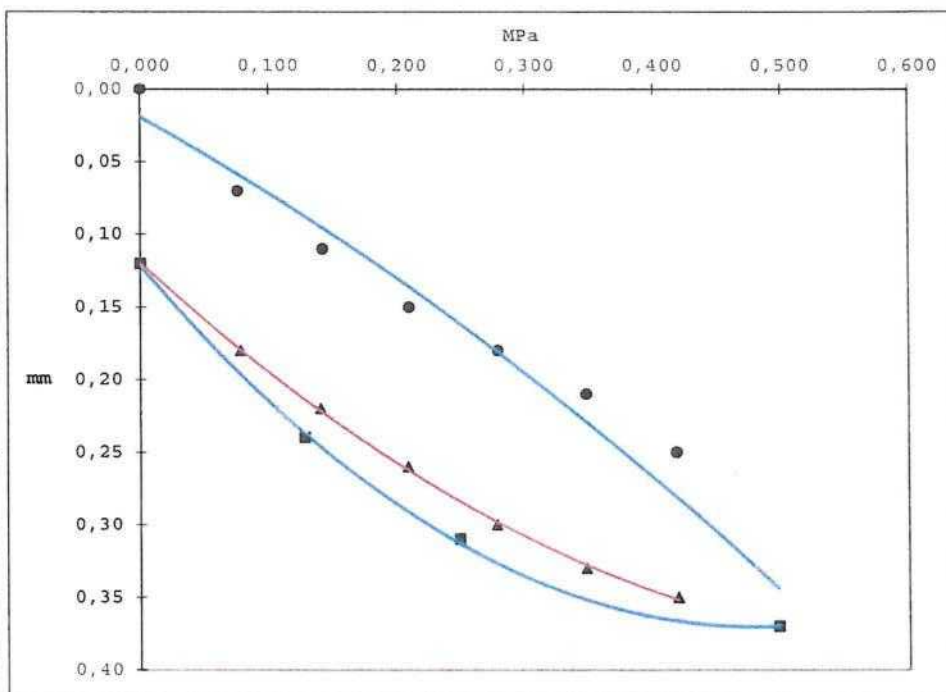

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Proslav Šopík
vrat jinak, než celý

Protokol č. ST - 97/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Struhařov - rekonstrukce silnice; SO 121

Staničení : km 7,990 / 1m od osy v levo

Konstrukční prvek : pláň


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 24.06.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

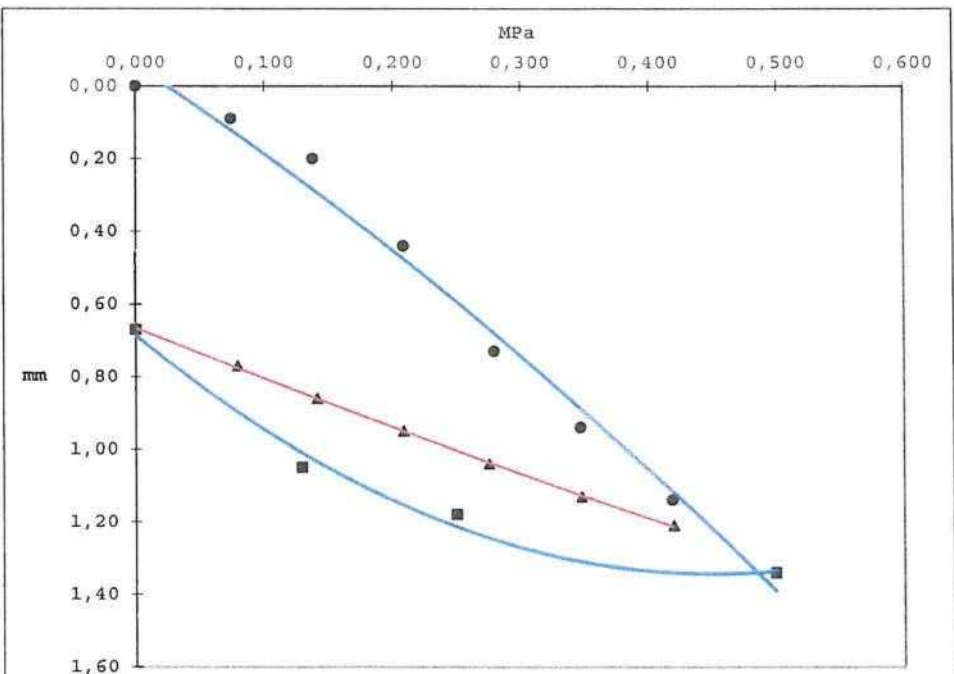Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky	zažeřovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa		E_{def2} / E_{def1}
			300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	71,6	2,41
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	172,2	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00						
	0,074	0,09						
	0,138	0,20						
	0,208	0,44						
	0,279	0,73						
	0,347	0,94						
	0,418	1,14						
	0,499	1,34						
Odlehčení	0,250	1,18						
	0,129	1,05						
	0,000	0,67						
II. zatěžovací cyklus	0,079	0,77						
	0,141	0,86						
	0,208	0,95						
	0,275	1,04						
	0,348	1,13						
	0,419	1,21						

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



oslav Šopík

Protokol č. ST - 98/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Struhařov - rekonstrukce silnice; SO 121

Staničení : km 7,620 / 1m od osy v pravo

Konstrukční prvek : pláň

Materiál : SD 0/63


Datum měření : 24.06.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky 300 mm	zažeřovací cyklus	P _{max} MPa	modul přetvárnosti E _{def} MPa	E _{def2} / E _{def1}
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00	300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E _{def1}	146,0
	0,070	0,07					
	0,137	0,16					
	0,210	0,27					
	0,278	0,36					
	0,347	0,47					
	0,417	0,59					
	0,498	0,79					
Odlehčení	0,257	0,69	300 mm	II. zatěžovací cyklus	0,42	E _{def2}	218,7
	0,122	0,55					
	0,000	0,24					
II. zatěžovací cyklus	0,072	0,34	300 mm	II. zatěžovací cyklus	0,42	E _{def2}	218,7
	0,141	0,42					
	0,210	0,51					
	0,280	0,58					
	0,350	0,62					
	0,420	0,67					

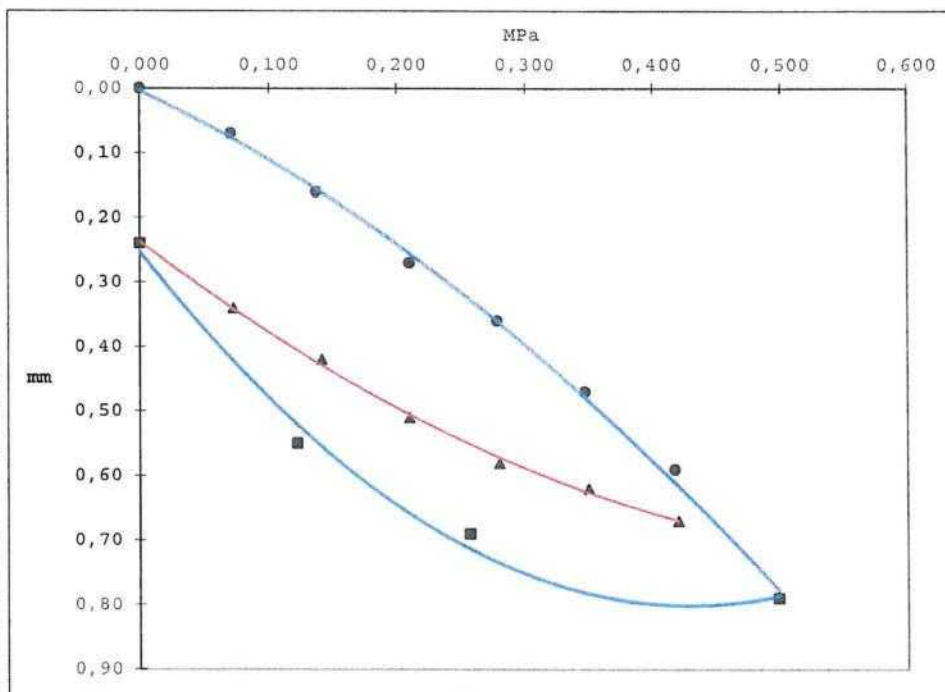

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 99/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Struhařov - rekonstrukce silnice; SO 121

Staničení : km 6,970 / 1m od osy v levo

Konstrukční prvek : pláň


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 24.06.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

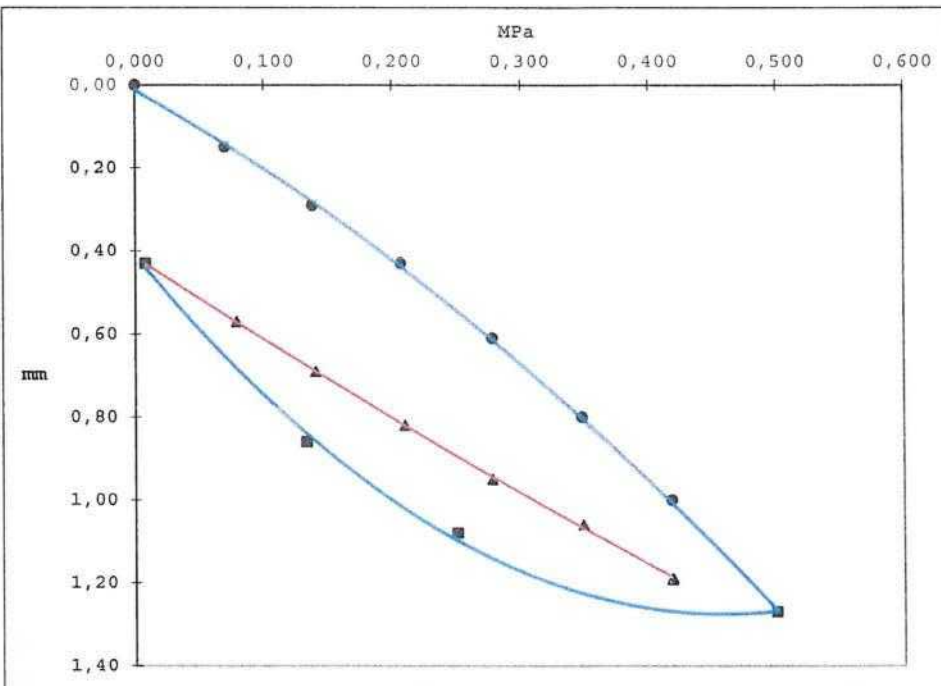Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky	zažeřovací cyklus	P_{max} MPa	modul přetvárnosti E_{def} MPa	E_{def2} / E_{def1}
			300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E_{def1}	91,1
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E_{def2}	1,34
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00					
	0,070	0,15					
	0,138	0,29					
	0,207	0,43					
	0,278	0,61					
	0,348	0,80					
0,418	1,00						
0,500	1,27						
Odlehčení	0,251	1,08					
	0,133	0,86					
	0,008	0,43					
II. zatěžovací cyklus	0,079	0,57					
	0,140	0,69					
	0,210	0,82					
	0,278	0,95					
	0,349	1,06					
	0,419	1,19					

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

Protokol č. ST - 100/2020

Zkouška měření statického modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel : BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01, Benešov

Stavba : II/112 Struhařov - rekonstrukce silnice; SO 121

Staničení : km 6,780 / 1m od osy v pravo

Konstrukční prvek : pláň


Materiál : SD 0/63

Datum měření : 24.06.2020

Měření provedl : Ježek

Klimatické podmínky : jasno 20°C

Výsledky měření :

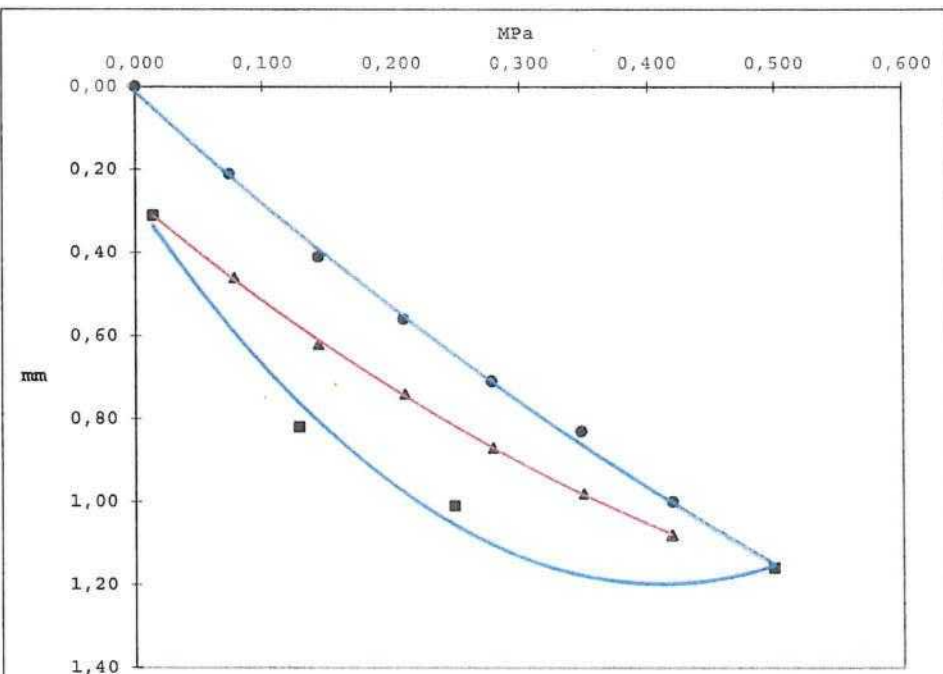Fáze zkoušky	TLAK MPa	ZATLAČENÍ mm	Průměr desky	zažeřovací cyklus	P _{max} MPa	modul přetvárnosti E _{def} MPa		E _{def2} / E _{def1}
			300 mm	I. zatěžovací cyklus	0,50	E _{def1}	100,3	1,17
				II. zatěžovací cyklus	0,42	E _{def2}	117,3	
I. zatěžovací cyklus	0,000	0,00						
	0,074	0,21						
	0,143	0,41						
0,209	0,56							
0,278	0,71							
0,348	0,83							
0,419	1,00							
0,499	1,16							
Odlehčení	0,249	1,01						
	0,128	0,82						
	0,014	0,31						
II. zatěžovací cyklus	0,078	0,46						
	0,143	0,62						
	0,210	0,74						
	0,279	0,87						
	0,350	0,98						
	0,419	1,08						

Poznámky:

1. Informace o staničení, druhu materiálu, konstr. prvku a stavbě dodal objednatel.

Datum vyhotovení protokolu : 26.06.2020

Protokol zpracoval: Šopík



Vedoucí pracoviště - Miroslav Šopík

BES s.r.o.
k rukám pana Josefa Houdka
Sukova 625
256 01 Benešov u Prahy

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
Struha_pdps_do0521

Vyřizuje
Veselá

Místo a datum odeslání
Praha, 7.6.2021

**Věc: „II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48”
- vyjádření AD k ZBV8**

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 2.6.2021 o vyjádření k návrhu změn během výstavby výše uvedené akce Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující:

Seznámili jsme se s poskytnutými podklady, které se týkají níže uvedených změn a upřesnění rozsahu a provedení stavby. Návrhy změn vychází z předběžných dohod provedených na Kontrolních dnech stavby, což je dokumentováno zápisy ve Stavebním deníku. Předmět ZBV8 v rámci rekonstrukce silnice II/112 je:

- ponechání stávajícího podkladního souvrství vyhovujících vlastností v úsecích s kamenným stětem

Po prostudování dostupných podkladů a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Autorský dozor prohlašuje, že se změnami navrhovanými v rámci předloženého ZBV8 souhlasí.



S pozdravem



Ing. Sárka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Přílohy: bez příloh

 **atelierpromika** s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

-	
Vaše č.j.	
Naše spis. zn.	II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice
Naše č.j.	
Vyřizuje:	Ing. Jindřich Přívratský
Tel.:	
E-mail:	
Datum:	11.6.2021

„Sdružení BES – COLAS“
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Věc: II/112 rekonstrukce silnice PS 6,70-9,48– vyjádření TDI k návrhu ZBV 8.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující:

ZBV 8. - SO 121.5 Využití podkladní vrstvy z kamenného štětu, úspory v podkladní konstrukci a řezání spar.

Z důvodu zachycení stabilního podloží a několika úseků pevné podkladní vrstvy komunikace z původního kamenného štětu bylo po odfrézování stávajícího asfaltového souvrství rozhodnuto o jejím ponechání a dalším využití do nové konstrukce. V celém úseku komunikace tak bylo možno nahradit podkladní vrstvy ze štěrku včetně úpravy zemní pláň vápennou stabilizací. Další změnou – úsporou v celém úseku komunikace bylo provedení styčné spáry při pokládce asfaltového souvrství technologií „teplé spáry“ a tím bez nutnosti následného prořezu a zálivky, jak bylo uvažováno v PDPS.

Změna byla nepředvídatelná, zjištěná až v průběhu stavby po odfrézování stávajícího asfaltu komunikace a odzkoušení podkladu, projednána a odsouhlasena v rámci KD stavby zástupci objednatele, projektanta a zhotovitele a výměry upravovaných ploch geodeticky zaměřeny de skutečnosti.

S výše uvedeným návrhem ZBV8 za TDI souhlasím.

S pozdravem



Ing. Jindřich Přívratský, TDI
PUDIS a.s.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - SRUHANOV

List číslo: 2

Datum

Číslo akce: 1764

16.6.2020

Počasí: 25°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰-17⁰⁰

Mechanizace: 10xNA, Fréza 2m, 2xTP2PCO, CISTERNA

Počet pracovníků: 2xTHP, 10xŘIDIČ, 4xSTROJÁK

Popis prací: - Frézování AC s odvozem

- střezení KRAVNICE S ODVOZEM

- čišťení PŘÍKOPU S ODVOZEM

Počasí: 28°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰-17⁰⁰

Mechanizace: 10xNA, Fréza, CISTERNA, 2xTP2PCO

Počet pracovníků: 3xTHP, 10xŘIDIČ, 4xSTROJÁK

Popis prací: - Frézování AC s odvozem sůlí

- střezení KRAVNICE s odvozem

- střezení DRNU ve suchu a čišťení PŘÍKOPU s odvozem

Zápis zhotovitele: 1. zhotovitel po odfrézování ASFALTOVÉHO

KRYTU INFORMUJE, že podloží UPRADÍ

ÚROVNĚ A NZUTKUSE UDĚLAT ZPĚTVOLE ZKOUSKY.

2. ve stančení 7 - 7,2 km a 8,2 km

SE NACHAZÍ PŮVNÍ KOSTKY PO CELÉ ŠÍŘCE

Zápis T)1

po odfrézování asfalt. krytu se chystá položit

úrodné podloží tvořené kamenitým materiálem

kalkulačním systémem případně dlažbou

Zápis zhotovitele o provedení statických zatěženích

zkontroluje ověření jeho únosnosti v celé

délce trasy, střídavě v jízdních pruzích

i na krajních. Dle výsledků bude stanoveno

dálší postup prací, lze předpokládat realizaci

sanace podloží v rozsahu T)1S

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - STROUHAŘOV

List číslo: 3.

Datum

Číslo akce: 1764

Počasí: 19°C zatlačeno s deštivými přeháňkami

18.6.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: Podvozník, 12kVA, 2xKAPLO, CISTERNA, FREZZ 2, PRÉZZ 1

Počet pracovníků: 2xTHP, 13xŘPÍČ, 6xSTROJNÍK

Popis prací: - Frézování AC s odvozem

- ODSTRANĚNÍ KRAJICE S ODVOZEM

- ODSTRANĚNÍ KRAJICE S ODVOZEM

- ODSTRANĚNÍ PRNU ZE SUZHU S ODVOZEM

- ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU S ODVOZEM

Vícepráce - DOFRÉZOVÁNÍ O.S. PRUHU PO VELKÉ TRÁZE KUČCI KAMENKÉ PŘÍDLAŽBĚ

Počasí: 18°C zatlačeno s deštivými přeháňkami

19.6.2020

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: Podvozník, 12kVA, 2xKAPLO, CISTERNA, FREZZ 2, PRÉZZ 1

Počet pracovníků: 2xTHP, 13xŘPÍČ, 6xSTROJNÍK

Popis prací: - Frézování AC s odvozem

- ODSTRANĚNÍ KRAJICE S ODVOZEM

- ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU S ODVOZEM

- STRÁŽENÍ PRNU ZE SUZHU S ODVOZEM

Vícepráce: - DOFRÉZOVÁNÍ O.S. PRUHU PO VELKÉ TRÁZE KUČCI KAMENKÉ PŘÍDLAŽBĚ

Zápis zhotovitele: Přešního dne byl na stavbě strážný dozor kučci frézování v místě u podlaží žel. přejezdů

Počasí: 18°C dešť

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Mechanizace: 4xNA, 2xKAPLO

Počet pracovníků: 1xTHP, 2xSTROJNÍK, 4xŘPÍČ

Popis prací: - STRÁŽENÍ KRAJICE S ODVOZEM

- ČIŠTĚNÍ PRNU S ODVOZEM

Za TDI

Kamenné podlaží přetruvávat v celém odfrézovaném úseku, dle lit. postup období tj. SZZ k ověření vlastnosti.

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 STRUHÁROV

List číslo: 4.

Datum

Číslo akce: 1764

22.6.2020

Počasí: 18°C ztlívno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: 2xLP2D10, 4xNA

Počet pracovníků: 2xSTRANIK, 4xŘIDIČ, 2xTHP

Popis prací: - Čištění příkopu s odvozem suti

- STAŽENÍ KŘÍŽNICE S ODVOZEM SUTI

- STAŽENÍ DRNVU ZE SVAZU S ODVOZEM

Zápis TD:

kontrolní den stavby, viz samostatný zápis v příloze

23.6.2020

Počasí: 21°C jasno 26° jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: 2xLP2D10, 4xNA

Počet pracovníků: 2xSTRANIK, 4xŘIDIČ, 2xTHP, 3xgeodet

Popis prací: - Čištění příkopu s odvozem suti

- STAŽENÍ KŘÍŽNICE S ODVOZEM SUTI

- STAŽENÍ DRNVU ZE SVAZU S ODVOZEM SUTI

- KONTROLA DIB

- Změřování vrstev po odstranění vrstev

25.6.2020

Počasí: 18°C jasno, 29°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Mechanizace: 3xLP2D10, 5xNA

Počet pracovníků: 2xTHP, 3xSTRANIK, 5xŘIDIČ, 1xlaborant, 3xgeodet

Popis prací: - Změřování vrstev po odstranění vrstev

- Čištění příkopu s odvozem suti

- STAŽENÍ KŘÍŽNICE S ODVOZEM SUTI

- STAŽENÍ DRNVU NA SVAZU S ODVOZEM SUTI

- provedení statické zátěžové zkoušky 9 kN

Zápis zhotovitele: Zhotovitel provedl statické zátěžové zkoušky

v komunikaci na vrstvě plátna a na celé

a pravé straně křivice. Výsledky byly

zapsány TD a bude z nich zpracován

protokol. V komunikaci byly výsledky

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 STRUHAROV

List číslo: 5

Datum

Číslo akce: 1764

vrstvou ~~ste~~ v a vrtovnicí, ale v křivce níže a
nevtovnicí, Zhotovitel žádá o vyšetření TD.

2, Bil. procedur kopané sondy ve stavění 8,020m
(koupa v praxiku) vr. fotodokumentace. Skladba
vozovky: 300mm vrtovnicí HDK, 250mm kamenný štět,
pále rostlý terén. Obávám se že kamenný štět
má proměnou hloubku a místy má 70mm zvláště
HDK pad sebou

Za TD

Žádám předat výsledky SŽT a nálezy sondy k posouzení A)
a projektantů ZDS k posouzení a návrhu konstrukce vozovky
TD

25.6.2020

Teplota: 17°C jasno - 29°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Podobnost: 3x7p20/6, 5,NA

Počet pracovníků: 3, státník, 2, TD, 2, THP

Popis prací: - střežení křivice s odvozem suti

- střežení domu s odvozem suti

- čišťení příkopu s odvozem suti

26.6.2020

Teplota: 22°C jasno, 28°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Podobnost: 3x7p20/6, 5,NA

Počet pracovníků: 3, státník, 2, TD, 2, THP

Popis prací: - střežení křivice s odvozem suti

- střežení domu ze suchu s odvozem suti

- čišťení příkopu s odvozem suti

- kontrola díla

Denní záznam stavby

Název akce: 11/112 - STAHAŘOV

List číslo: 6.

Datum

Číslo akce: 1264

Počasí: 15°C dešt

29.6.2020

#

Zaps. zhotovitel: práce byly přerušeny, kvůli špatným klimatickým podmínkám (silný déšť)

Zápis D1

Kontrolní den stavby, viz samostatný



30.6.2020


Počasí: 18°C jasno - 25°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰

Mechanizace: 2x R-pádlo, 2xNA

Počet pracovníků: 2x STROJNÍK, 2xNA, 3xTHP

Popis prací: - STRŽENÍ KRAJNICE S ODVOZEM SUTÍ
- ČISTĚNÍ PŘÍKOPU S ODVOZEM SUTÍ
- KONTROLA D1.0



Počasí: 19°C jasno, 29°C jasno

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Mechanizace: 1x R-pádlo, 1xNA

Počet pracovníků: 2xTHP, 1xMLPZ, 1x ~~STROJNÍK~~ STROJNÍK, 2x geodet

Popis prací: - Zrušení plochy po odfrézování
- Vytváření osy vozovky
- STRŽENÍ KRAJNICE
- ČISTĚNÍ PŘÍKOPU



Zápis D1

Zadáním předložit výsledky geodetického zaměření skutečného stavu po odfrézování vrstev vozovky k porovnání s rozpočtem D1.0 a také k případným úpravám konstrukce a nivelet nové vozovky.

