




Dostavba kanalizace v Brně II.			
- dostavba kanalizace v městských částech -			
Změnový list č. 01/BOS/-KOM/2020		Datum předložení:	13.7.2020
Ev. č.		Datum schválení:	
Objednatel:	Statutární město Brno		
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV		
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.		

Změnový list předkládá:	Zhotovitel, Společnost „Kanalizace Brno II“		
Charakter změny:		Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	Stavba: BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU číslo a název SO: SO IV.06 ULICE HOŠTICKÁ DSO IV.06.4AN		
Specifikace změny: FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE – VĚTŠÍ MOCNOST ZIVIČNÉ VRSTVY PROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. UVAŽOVÁNO 100 MM, SKUTEČNOST 250MM			
Zdůvodnění změny: Skutečná tloušťka asfaltových vrstev na ulici Hoštická neodpovídá stavu uvedeném v rozpočtu stavby. Místo uvažovaných 10 cm se na stavbě nachází asfaltové souvrství o mocnosti 25 cm. Naopak je to v případě položky ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE, tato vrstva se konstrukci vozovky nenachází (méněpráce)			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
	Vícepráce	708 528,67	
	Méněpráce	- 178 165,60	
	Dopad do ceny	530 363,07	
Změna ceny po schválení:	530 363,07 Kč		

Stanovisko správce stavby:
Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Viz příloha č.3
Vyjádření PIU:

Přílohy:	1. Neobsazeno 2. Položkový rozpočet, záznamy z měření, geodetické zaměření měřičských bodů (situace, technická zpráva), fotodokumentace, záznam z měření celkové plochy odstraňované komunikace včetně situačních výkresů 3. Stanovisko projektanta 4. Neobsazeno 5. Neobsazeno 6. Zápis ze stavebního deníku, situace s vyznačením rozsahu změny 7. Neobsazeno
-----------------	---

Schvalovací proces:	
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS ZÁSTUPCE PIU
Změnu doporučuji / nedoporučuji -schválit xx)	Změnu doporučuji / nedoporučuji -schválit xx)
	
Jméno	Jméno
Datum	Datum
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji / neschvaluji xx)
Jméno	Jméno
Datum	Datum

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu

čísla MČ:

1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorská – odkanalizování místní části
5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

xx) ~~nehodící se škrtněte~~

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO IV.06
DSO IV.06.4AN

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE HOŠTICKÁ
KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotkov	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 Zemní práce									
10	2017_OTSKP-SPK	113728.a		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). (5018.3)*0.25=1254,575 [A] odpočet z kanalizací a vodovodů (splašková + dešťová + vodovod): -219,718 m3-276,949 m3 -127,466m3 =- 624,133 [B] odpočet z přípojek (splašková + dešťová + vodovod): -123,01 -62,108m3- 80,401 m3=- 265,519 Celkem: A+B+C=364,923 [D] skutečnost 145,971 [D] smlouva rozdíl 364,923-145,971=218,952	M3	218,952	2 586,00	566 209,87	
							1		566 209,87
OST Zemní práce									
2	2017_OTSKP-SPK	014111R01		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt	M3	218,952	650,00	142 318,80	
OST									
									142 318,80
OST									
									142 318,80
Celkem									
									708 528,67

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
SO IV.06
DSO IV.06.4AN

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU
ULICE HOŠTICKÁ
KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Zemní práce								
11	2017_OTSKP-SPK	123738.a		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 	M3	- 142,319	540,20	- 76 880,72

(5018.3)*0.25=1254,575 [A]

odpočet z kanalizací a vodovodů (splašková + dešťová + vodovod): -219,718 m3-276,949 m3

-127,466m3 =- 624,133 [B]

odpočet z přípojek (splašková + dešťová + vodovod): -123,01 -62,108m3- 80,401 m3=-

265,519

Celkem: A+B+C=364,923 [D] skutečnost

145,971 [D] smlouva

rozdíl 364,923-145,971=218,952*0,65=142,319

12	2017_OTSKP-SPK	123838.a	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SIENIC A ZELEZNIC TR. II S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 	M3	- 76,633	607,40	- 46 546,88
----	----------------	----------	---	----	----------	--------	-------------

(5018.3)*0.25=1254,575 [A]

odpočet z kanalizací a vodovodů (splašková + dešťová + vodovod): -219,718 m3-276,949 m3

-127,466m3 =- 624,133 [B]

odpočet z přípojek (splašková + dešťová + vodovod): -123,01 -62,108m3- 80,401 m3=-

265,519

Celkem: A+B+C=364,923 [D] skutečnost

145,971 [D] smlouva

rozdíl 364,923-145,971=218,952*0,35=142,319

Zemní práce

- 123 427,60

1

OST

Ostatní

4	2017_OTSKP-SPK	014121R04	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - 17 05 04 - Zemina a kamení ostatní</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>	M3	- 218,952	250,00	- 54 738,00
---	----------------	-----------	--	----	-----------	--------	-------------

OST

Ostatní

- 54 738,00

Celkem

- 178 165,60


ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)
Sekce:	<i>Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)</i>
Objednatel:	Statutární město Brno
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“- vedoucí společník OHL ZS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV
Název objektu:	<i>DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</i>
Sledované období:	<i>1.3.2020 - 30.6.2020</i>
Datum měření:	<i>15.4.2020</i>
Popis důvodu měření:	<i>Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve stavebním deníku.</i>

Použité měřidlo, certifikace *stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. KL P14494/2019 kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322*

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 6 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)



FRÉZOVÁNÍ ... $1,22 \cdot 0,25 = 0,305$

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v rozpočtové části změnového listu. Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. Fotodokumentace viz foto č.6.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
7	113728.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	0,305

Změřeno a ověřeno:


Datum: <i>15.4.2020</i>	Správce stavby	Podpis:	
Datum: <i>15.4.2020</i>	Zhotovitel	Podpis:	

ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)
Sekce:	<i>Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)</i>
Objednatel:	Statutární město Brno
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV
Název objektu:	DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Sledované období:	1.3.2020 - 30.6.2020
Datum měření:	15.4.2020
Popis důvodu měření:	<i>Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve stavebním deníku.</i>
Použité měřidlo, certifikace	<i>stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. KL P14494/2019 kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322</i>

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 5 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)



FRÉZOVÁNÍ ... $1,22 \cdot 0,25 = 0,305$

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v rozpočtové části změnového listu. Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. Fotodokumentace viz foto č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
7	113728.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: <i>15.4.2020</i>	Správce stavby	Podpis:
Datum: <i>15.4.2020</i>	Zhotovitel	Podpis:


ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)
Sekce:	Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
Objednatel:	Statutární město Brno
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV

Název objektu:	DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Sledované období:	1.3.2020 - 30.6.2020
Datum měření:	15.4.2020
Popis důvodu měření:	Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve stavebním deníku.
Použité měřidlo, certifikace	stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. KL P14494/2019 kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 4 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)



FRÉZOVÁNÍ ... $1,22 \cdot 0,25 = 0,305$

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v rozpočtové části změnového listu. Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. Fotodokumentace viz foto č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
7	113728.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	0,305

Změřeno a ověřeno:


Datum: 15.4.2020	Správce stavby	Podpis:
Datum: 15.4.2020	Zhotovitel	Podpis:

ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)
Sekce:	<i>Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)</i>
Objednatel:	Statutární město Brno
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV
Název objektu:	DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Sledované období:	1.3.2020 - 30.6.2020
Datum měření:	15.4.2020
Popis důvodu měření:	Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve stavebním deníku.
Použité měřidlo, certifikace	stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. KL P14494/2019 kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 2 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)



FRÉZOVÁNÍ ... $1,22 \cdot 0,25 = 0,305$

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v rozpočtové části změnového listu. Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. Fotodokumentace viz foto č.2,3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
7	113728.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: <i>15.4.2020</i>	Správce stavby	Podpis:	
Datum: <i>15.4.2020</i>	Zhotovitel	Podpis:	

ZÁZNAM Z MĚŘENÍ


Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)
Sekce:	Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
Objednatel:	Statutární město Brno
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV

Název objektu:	DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Sledované období:	1.3.2020 - 30.6.2020
Datum měření:	15.4.2020
Popis důvodu měření:	Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve stavebním deníku.

Použité měřidlo, certifikace *stáček metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. KL P14494/2019 kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322*

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 1 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)




FRÉZOVÁNÍ ... $1,22 \cdot 0,25 = 0,305$

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v rozpočtové části změnového listu. Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. Fotodokumentace viz foto č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
7	113728.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M3	0,305


Změřeno a ověřeno:


Datum: 15.4.2020	Správce stavby	Podpis:
Datum: 15.4.2020	Zhotovitel	Podpis:

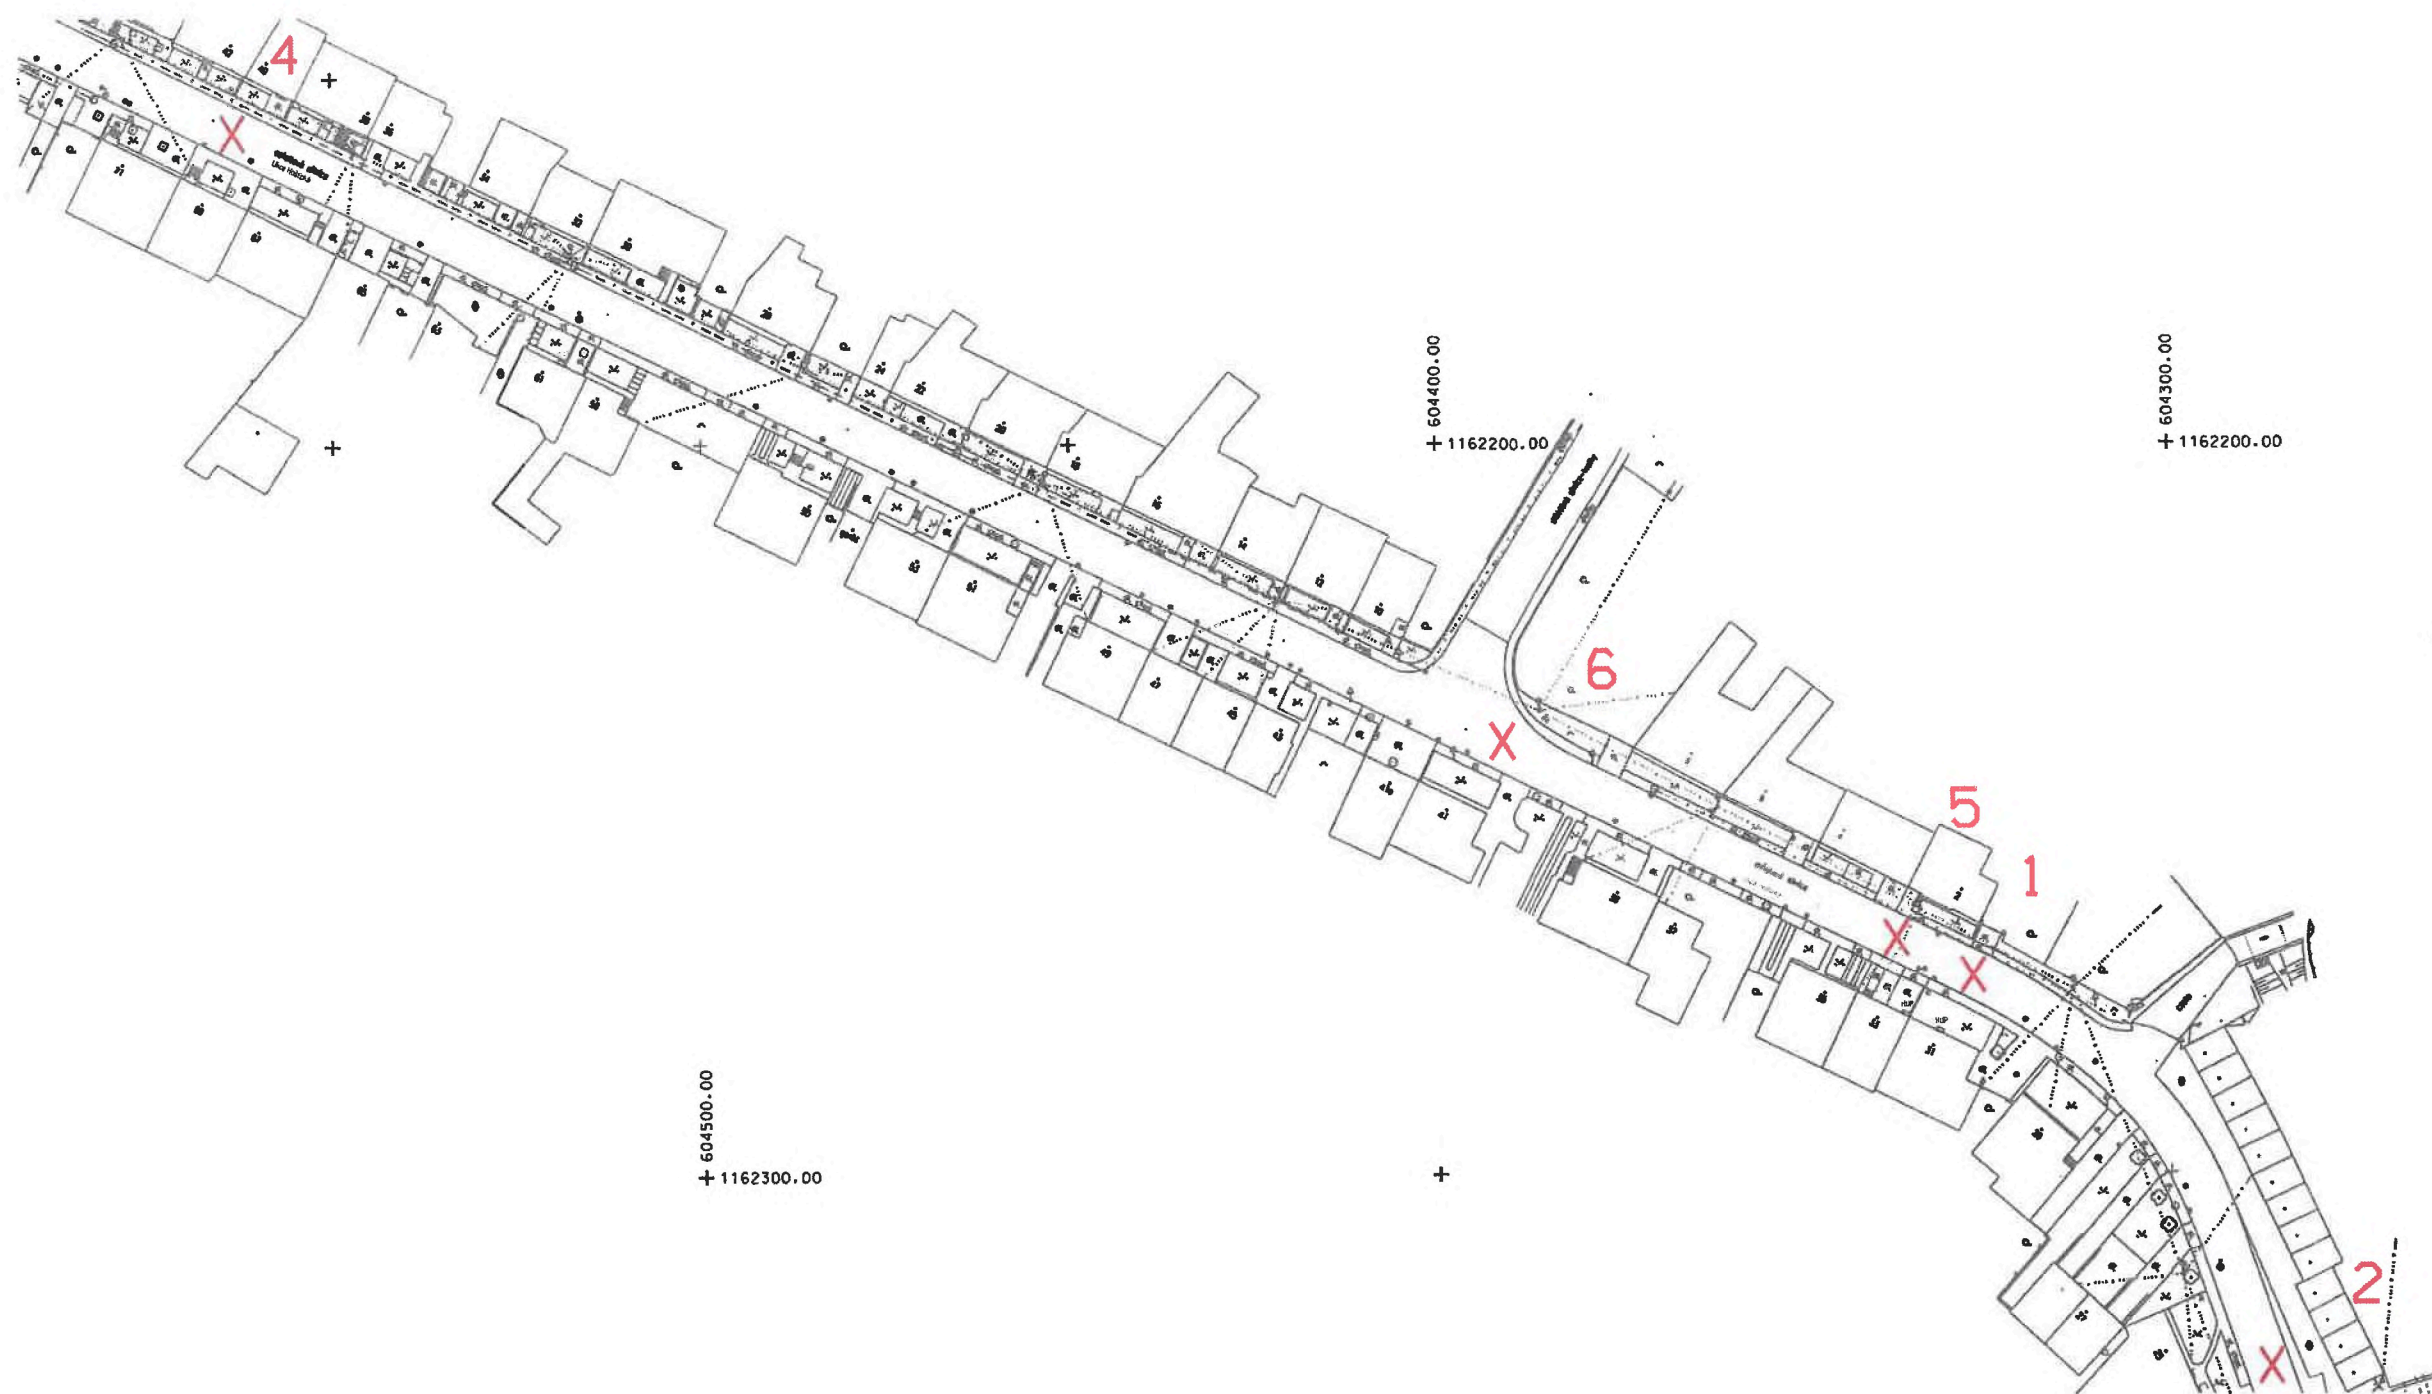

Legenda:

- X zaměřený bod
- 5 číslo zaměřeného bodu



Název stavby: Brno MČ Bosonohy III a IV etapa dostavba oddílného kanalizačního systému, stávající asphalt ul. Hoštická		ADITIS s.r.o. Rokytova 2667/20, 615 00 Brno geodetické práce, GIS projekce a služby v oblasti elektro věcná břemena ③	
Obsah: Zaměření skutečného stavu		Výškový systém: -	Zak. č. zhotovitele: 200514
Zhotovitel: ADITIS s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00 Brno		Souřad. systém: S-JTSK	měřítko: 1:1000
Objednatel: Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno			Datum zpracování: 09. 06. 2020
Kat. území: Bosonohy		Formát: A3	Číslo výkresu: 1


TECHNICKÁ ZPRÁVA - Geodetická část

Zhotovitel:
ADITIS s.r.o.
Rokytova 2667/20
615 00 Brno

Objednatel:
**Přemysl Veselý stavební a inženýrská
činnost s.r.o.**
Pražákova 1000/60
619 00 Brno

Zakázkové číslo zhotovitele: 200514

Název akce: **Brno MČ Bosonohy III a IV etapa dostavba
oddílného kanalizačního systému, stávající asphalt ul. Hoštická**

Obsah: **Zaměření skutečného stavu**
Lokalita: Bosonohy
Katastrální území: Bosonohy
Okres: Brno-město
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přístroje a pomůcky: **Totál stanice (Trimble S5), GNSS (Trimble R2)**
Zaměření provedl: 
Datum měření: 15. 04. 2020

I. Polní práce

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zaměření zadaných míst, kde byla měřena tloušťka stávajícího asfaltu.

2. Použité podklady:

Polohopis areálu, dodaný výkres: Trasy_300_BOSONOHY.dwg

3. Zaměření obsahu díla:

Zaměření vyznačených míst bylo provedeno GNSS (RTK) metodou v souřadnicovém systému S-JTSK.

Předmětem geodetického měření byly vyznačené body od stavbyvedoucího p. Kaluse.

Přesnost měření je charakterizována střední souřadnicovou chybou $\pm 0,14$ m na zpevněných plochách.

Polně - měřické práce byly prováděny 15. 04. 2020.

II. Kancelářské práce

Do výpočtu byly zavedeny korekce z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky. Digitální zpracování zakázky bylo provedeno grafickým programem MICROSTATION PowerDraft V8i v měřítku 1:500 s výstupem ve tvaru *.dgn s převodem do tvaru *.dwg.

III. Závěr

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, stanovené vyhláškou ČÚZK č. 31/95 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, a svými náležitostmi a přesností odpovídá podmínkám dohodnutým s objednatelem. Mezní odchylky, stanovené pro jednotlivé úkony, nebyly překročeny.

IV. Měřický elaborát obsahuje

- 1) Technickou zprávu se seznamem souřadnic podrobných bodů
- 2) Výkres situace v M 1:1000

Seznam souřadnic podrobných bodů

Souřadnicový systém: S-JTSK

Podrobné body

č.b.	Y [m]	X [m]
1	604326.85	1162272.86
2	604286.58	1162326.65
4	604563.26	1162157.32
5	604337.27	1162267.71
6	604391.09	1162240.60

Vypracoval:

Datum zpracování:



Foto č.1 – před objektem Hoštická, č.p. 31, bod 1 dle situace zaměření



Foto č.2 – před objektem Hořtická, č.p. 25, bod 2 dle situace zaměření



Foto č.3 – před objektem Hoštická, č.p. 25, bod 2 dle situace zaměření, detail



Foto č.4 – před objektem Hoštická, č.p. 40, bod 4 dle situace zaměření



Foto č.5 – před objektem Hořtická, č.p. 2, bod 5 dle situace zaměření



Foto č.6 – před objektem Hořtická, č.p. 40, bod 6 dle situace zaměření



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)
Sekce:	Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
Objednatel:	Statutární město Brno
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV

Název objektu:	DSO IV.06.4AN KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Sledované období:	1.7.2020 - 27.7.2020
Datum měření:	27.07.2020
Popis důvodu měření:	dodatečné měření celkové plochy položky č. 10 Bylo provedeno na základě požadavku SpSt ze dne 24.7.2020

Použité měřidlo, certifikace ocelové pásmo BMI 30 m, identifikační číslo DtM.KM-0459, výrobní číslo KL-4907, č. KL P08720/2018
kalibrační list vydáný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodech dle grafických příloh

FRÉZOVÁNÍ - zaměření celkové plochy odstraňované živičné komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
10	113728.a	FREZOVANI ZPEVNYCH PLOCH ASFALTOVYCH S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE	M2	5 022,06
		zaměření celkové plochy		

staničení	délka	šířka odstraňované živ. komunikace			Plocha (zaokrouhlena na 2 desetinná místa)	
		zacátek úseku	konec úseku	průměrná šířka		
0	57,5	57,5	6,4	6,75	6,575	378,06
57,5	75	17,5	6,75	8,5	7,625	133,44
75	108	33	8,5	8,5	8,5	280,50
108	120	12	8,5	8,5	8,5	102,00
120	165	45	10	9,1	9,55	429,75
165	175	10	9,1	6,8	7,95	79,50
175	260	85	6,8	6,5	6,65	565,25
260	325	65	6,5	6,5	6,5	422,50
325	375	50	6,5	6,5	6,5	325,00
375	425	50	6,5	6,6	6,55	327,50
425	475	50	6,6	6,8	6,7	335,00
475	550	75	6,8	7,1	6,95	521,25
550	625	75	7,1	7,35	7,225	541,88
625	650	25	7,35	7,5	7,425	185,63
650	652,4	2,4	7,5	16,5	12	28,80
652,4	659,4	7	16,5	16,5	16,5	115,50
		0				
0	6,5	6,5	4,5	4,5	4,5	29,25
0	13,5	13,5	7,5	7,5	7,5	101,25
0	10	10	6	6	6	60,00
0	10	10	10	0	5	50,00
0	4	4	4	1	2,5	10,00
celkem						5 022,06


Přílohy: situace 1-5
detaily 1-3

Změřeno a ověřeno:

Datum: 27.7.2020 Správce stavby

Datum: 27.7.2020 Zhotovitel

SITUACE 1

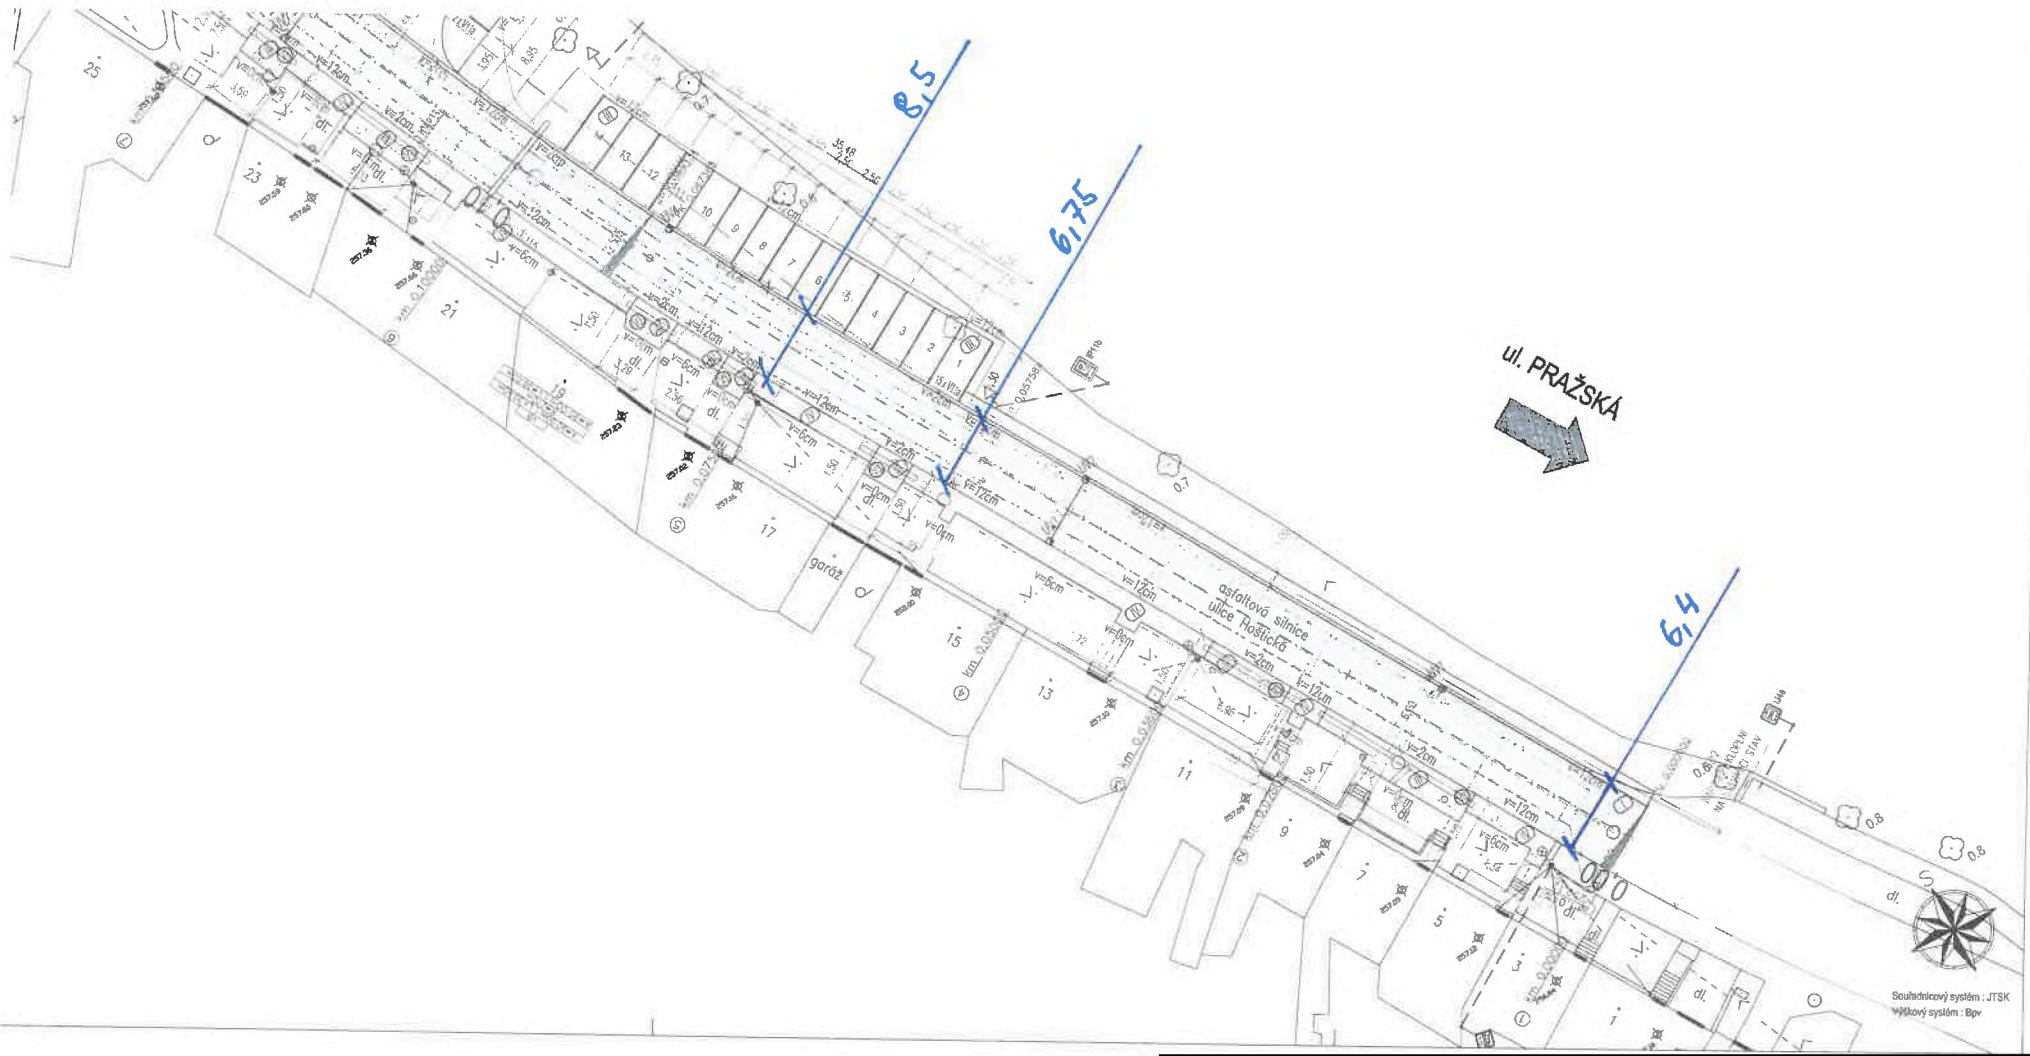

Investor:

Zhotovitel:


valbek

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Valberna 200/11
450 01 Liberec 8 - Anab

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpvr



SITUACE 2

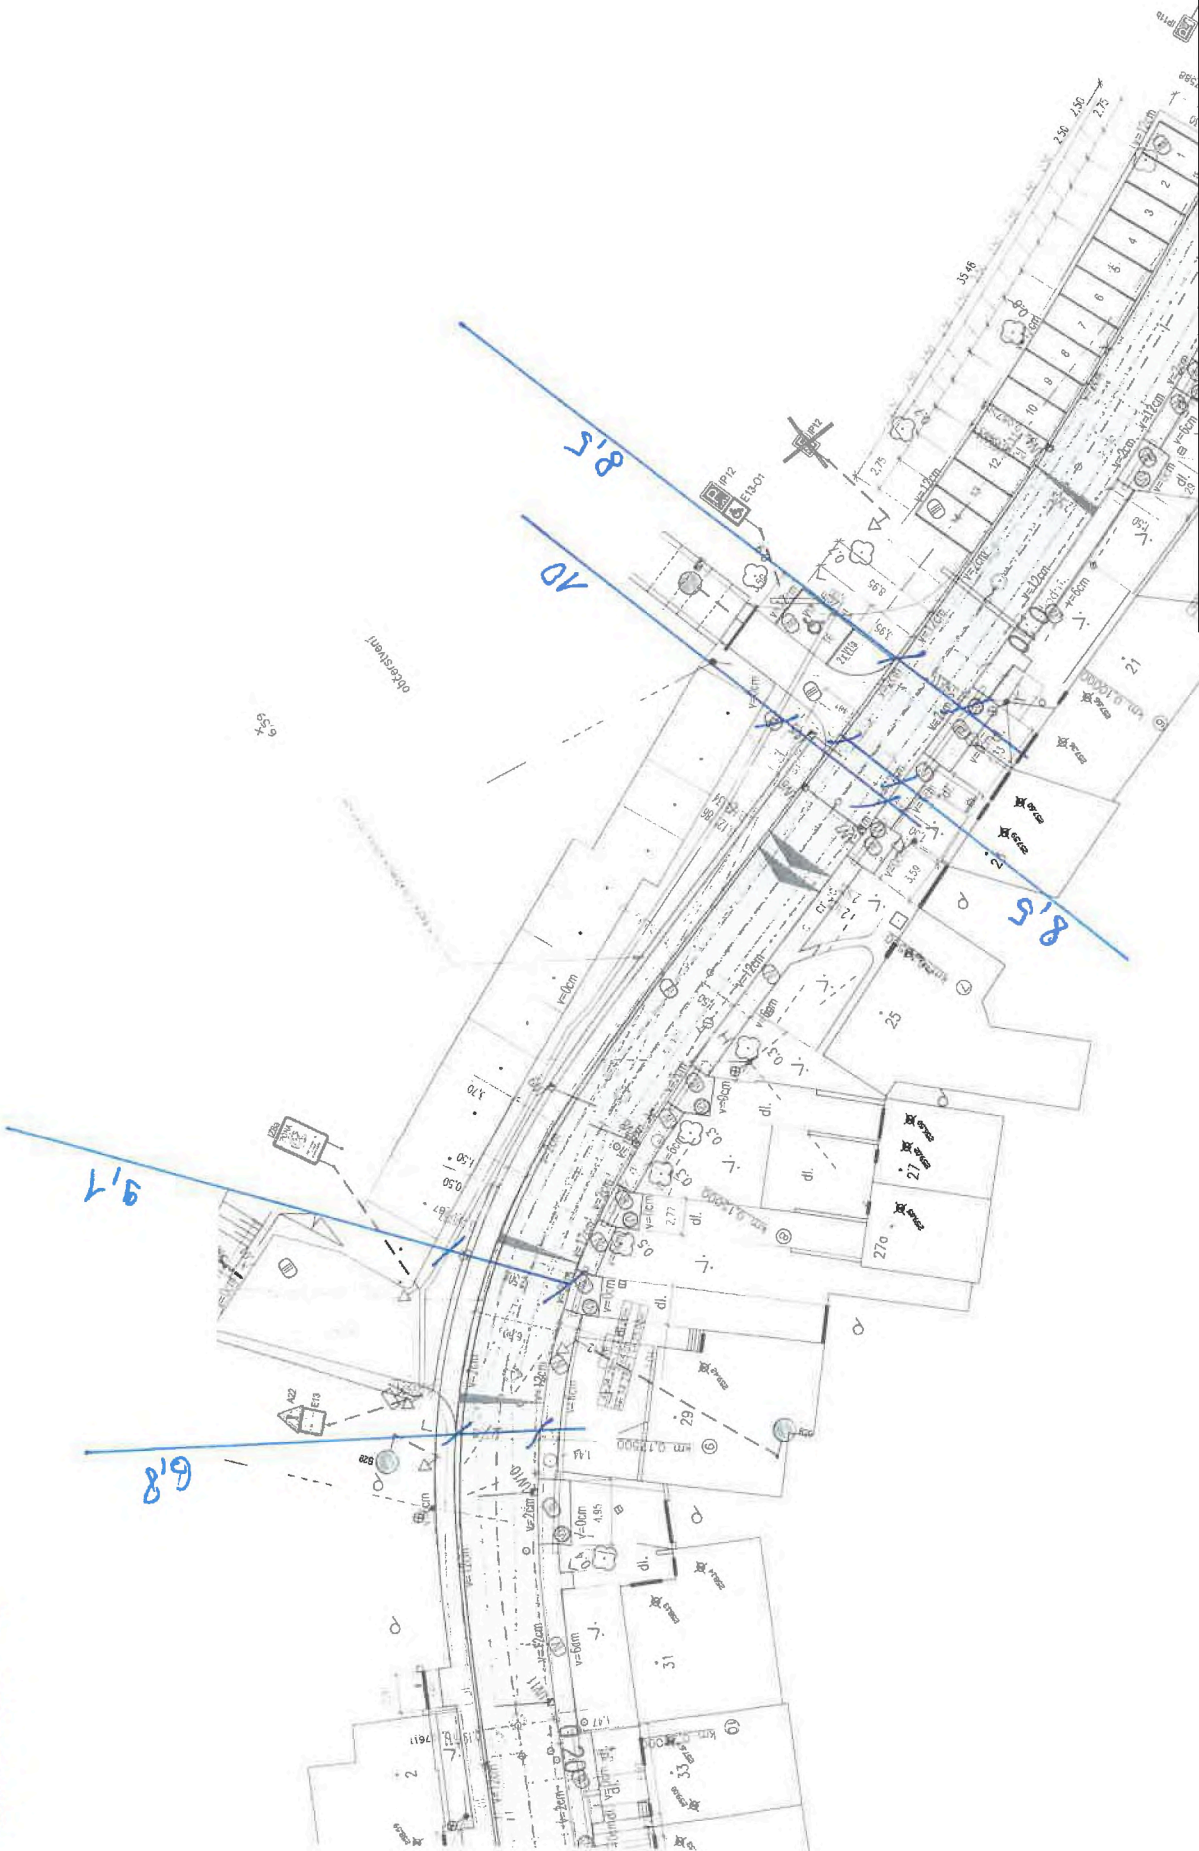

foliogram 17184

ul. U SMYČKY
část ulice Hoštice
(správce: Bměnské komun

ul. U SMYČKY



R=1000.00

-0.82% -0.37%

28.70 46.49

0.04075

PKL (6.4)



řiděná

šlá dlozba

v=8cm

6,5


6,5

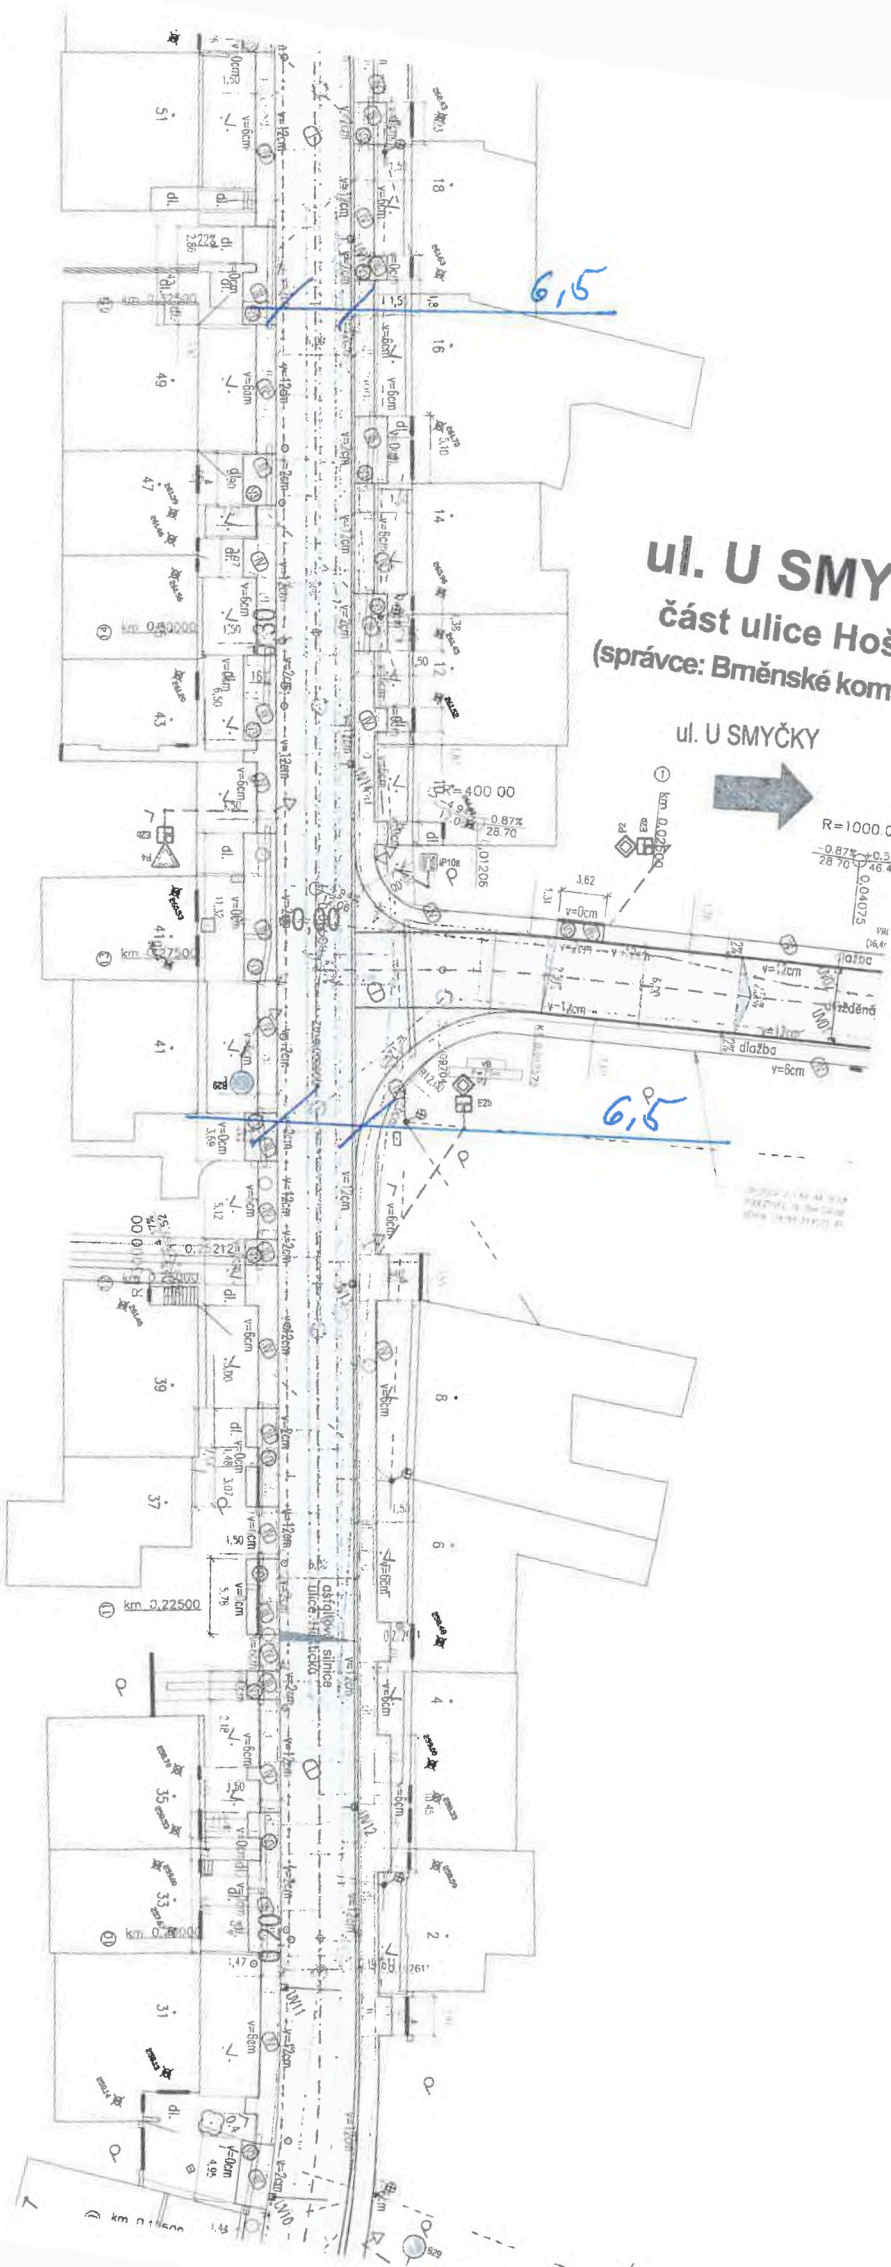

SITUACE 4




ul. HOŠTICKÁ
(správce: Brněnské komunikace a.)





SITUACE 5




DETAIL 1

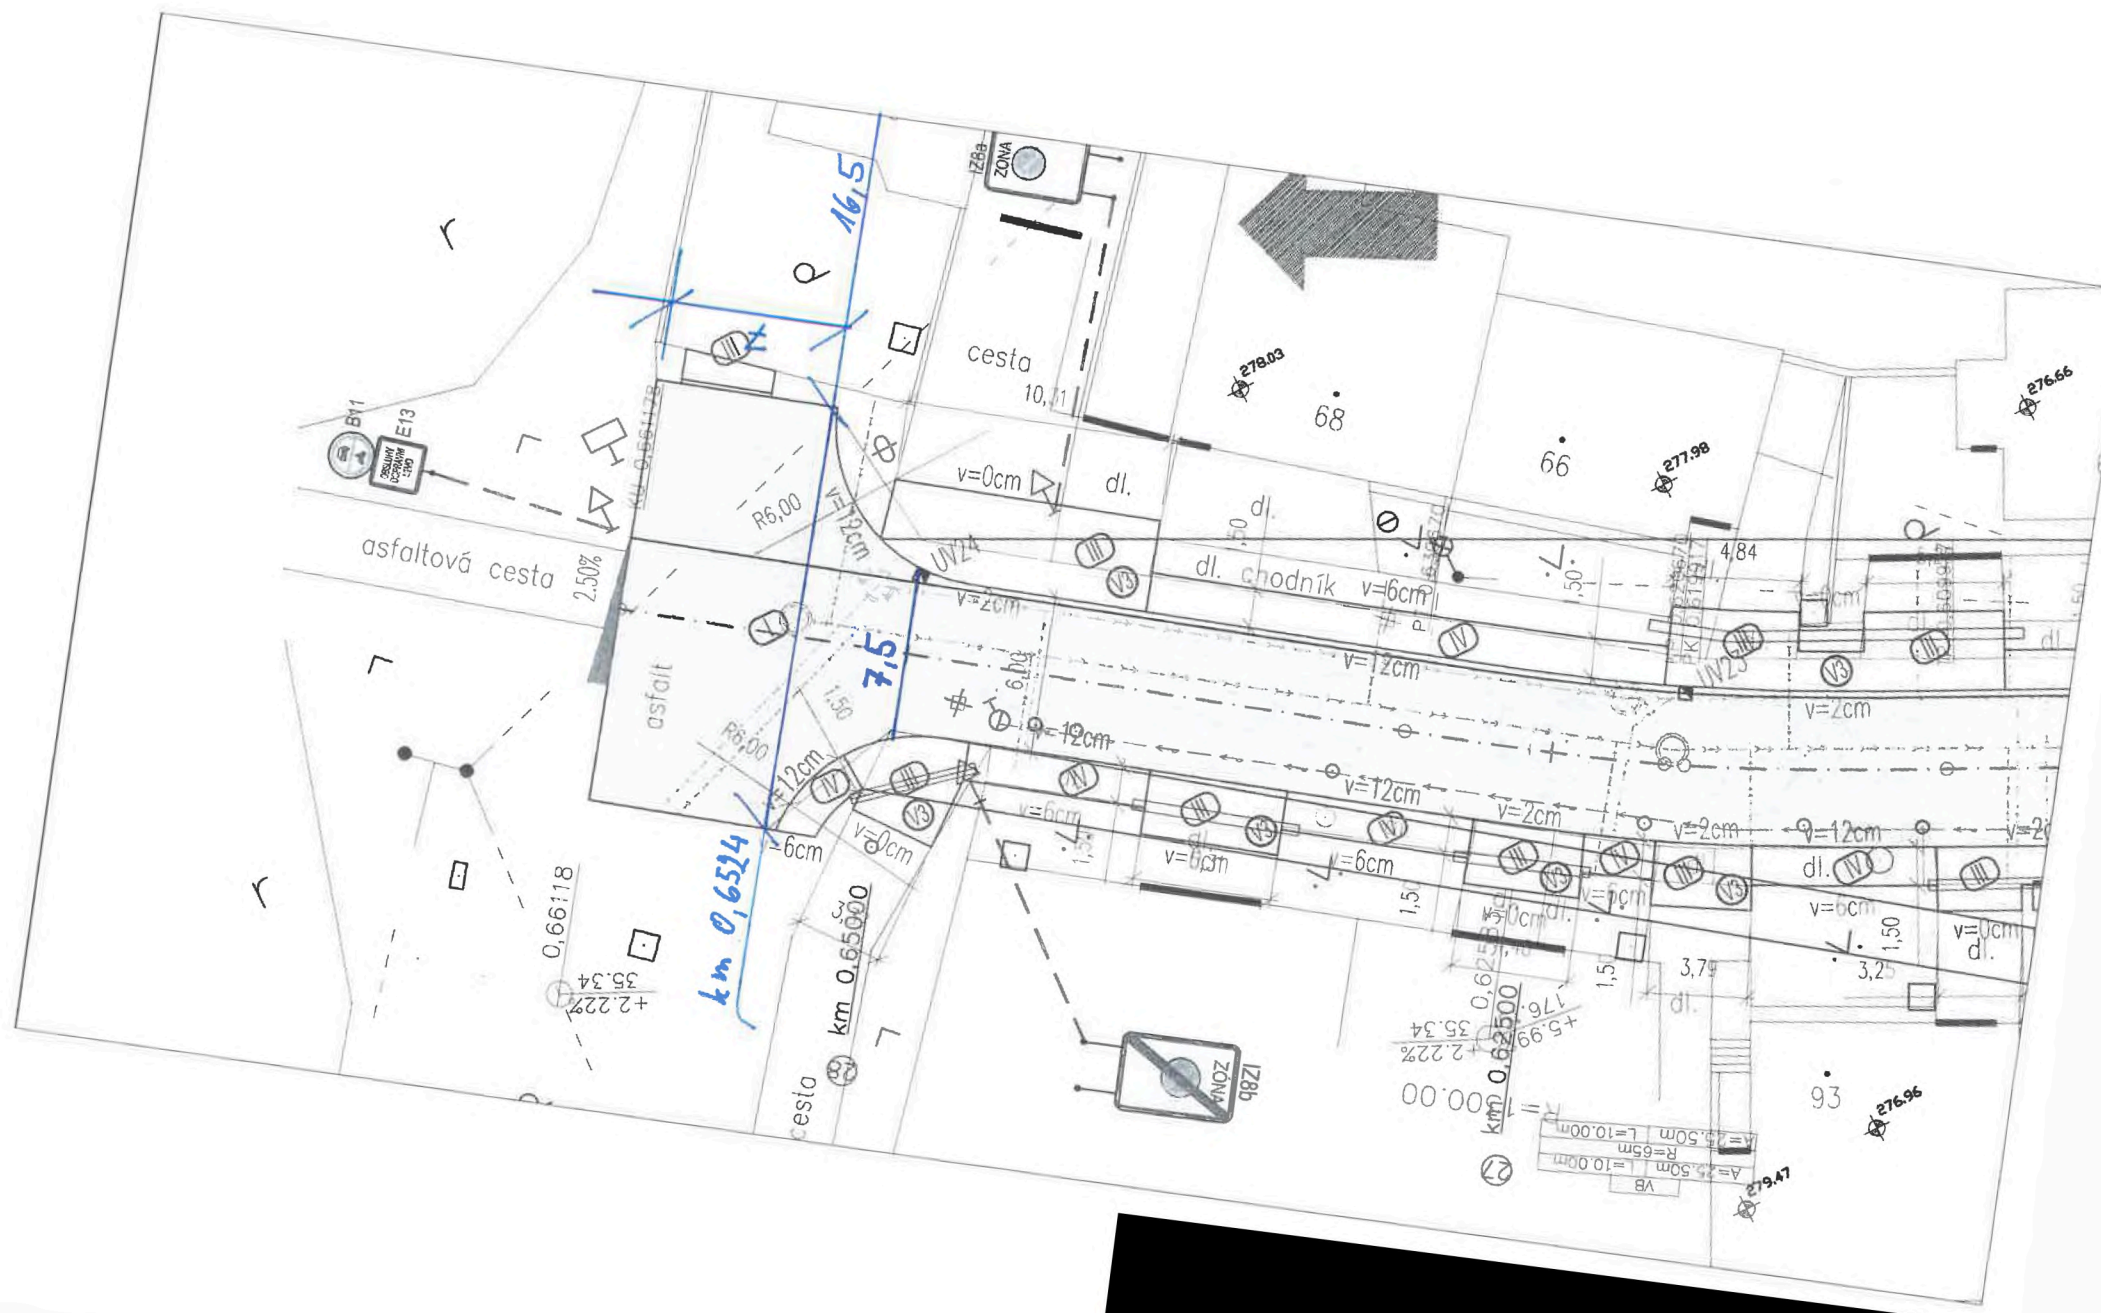

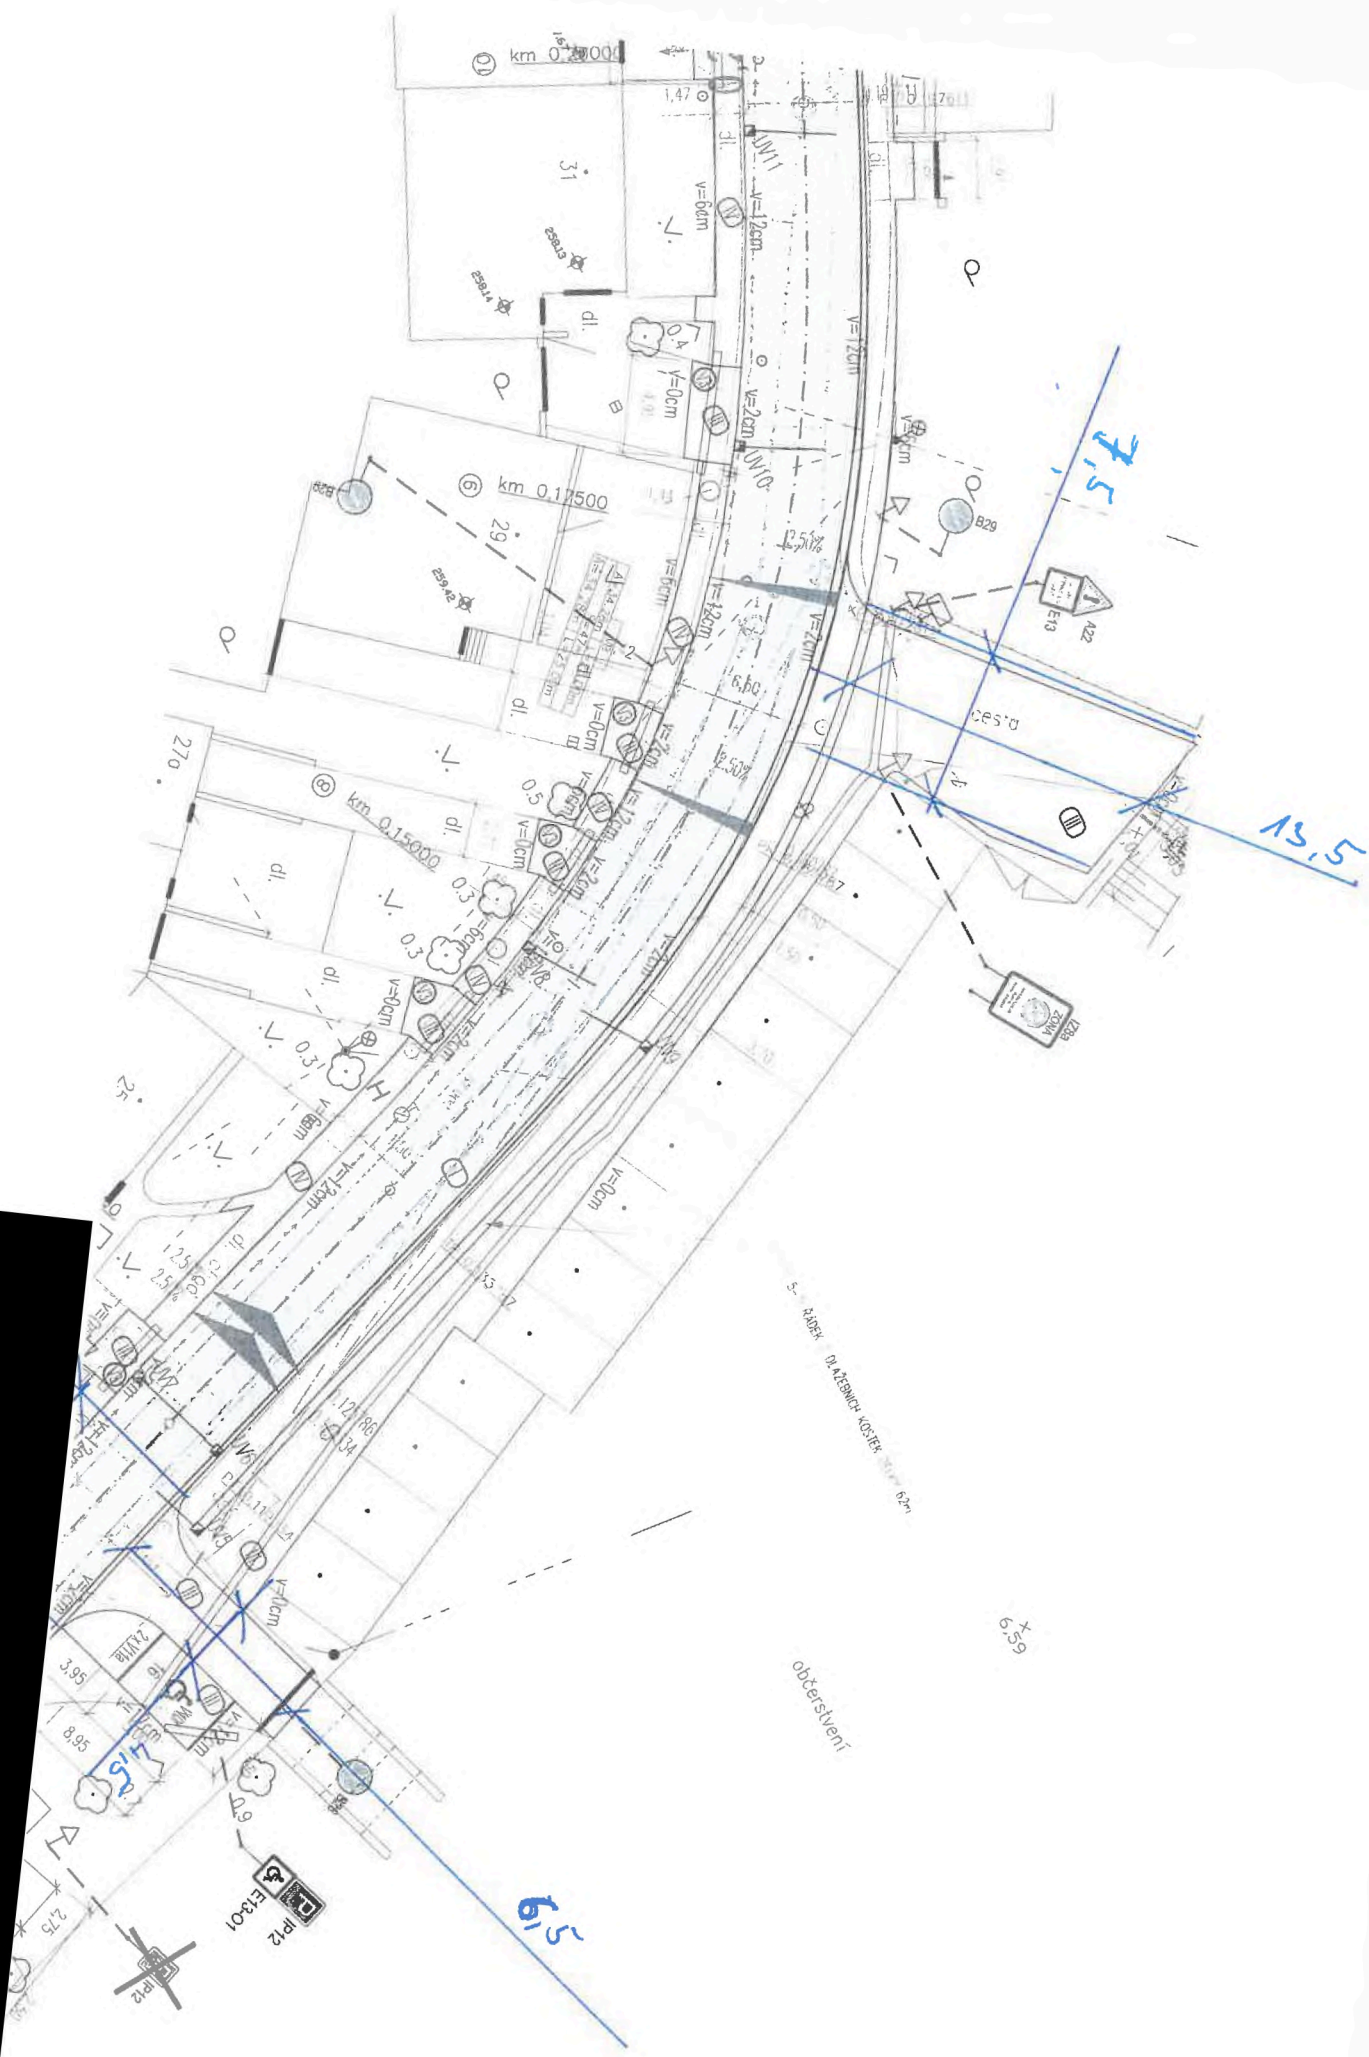

ul.
čas
(spravce: ul

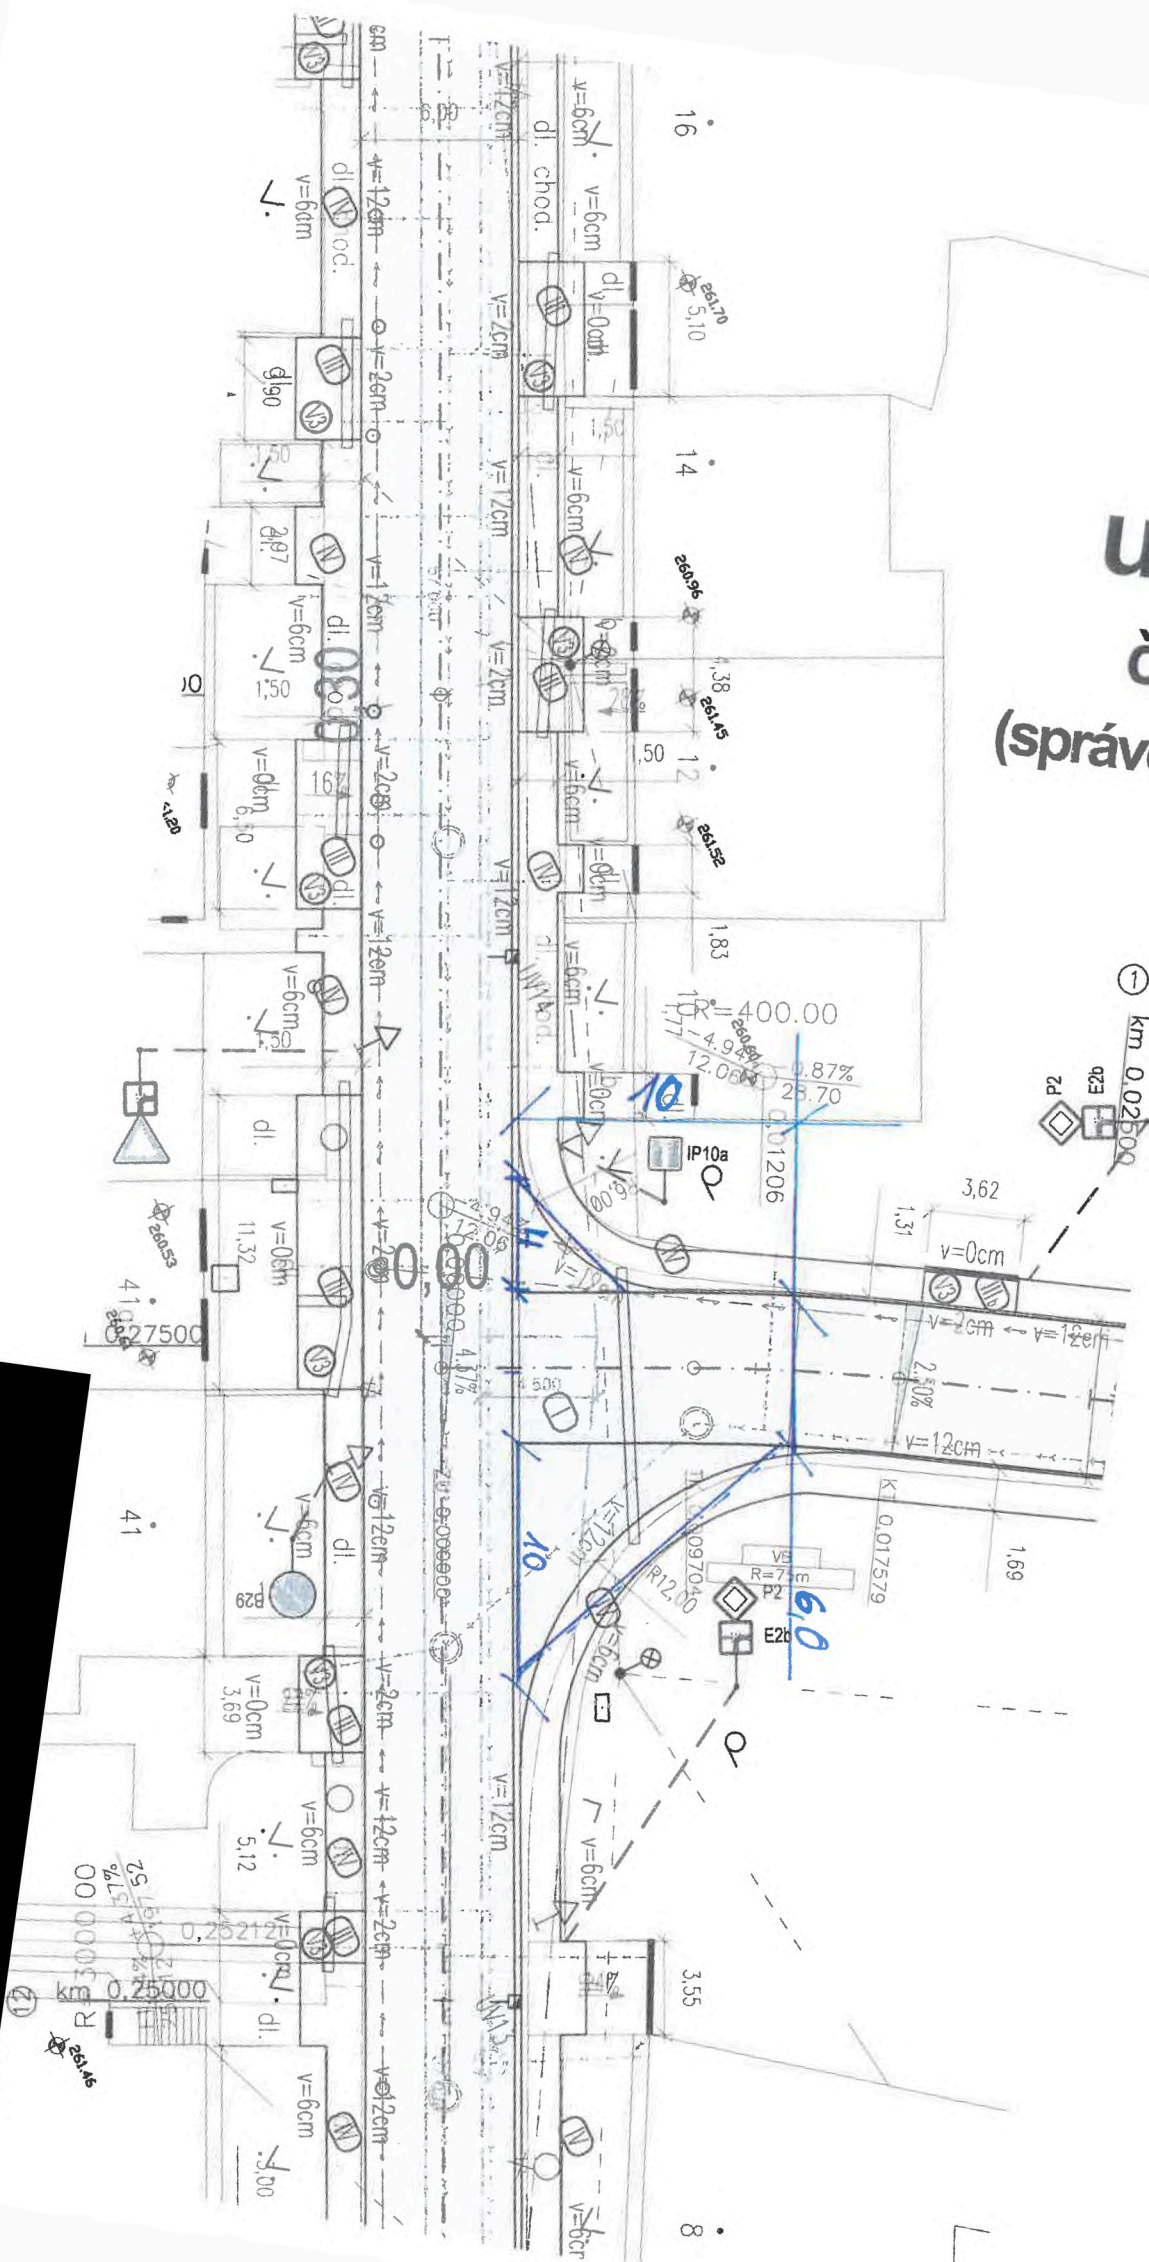



Statutární město Brno
Magistrát města Brna, odbor investiční, [REDACTED]
Kounicova 67
Brno
601 67

Akce: „BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU, SO IV.06 ULICE HOŠTICKÁ“


Věc: Vyjádření projektanta stavby ke změnovému listu č.. 01/BOS/-VH/2020

Vážení,

ve výše uvedené věci Vám sdělujeme následující: jako projektant stavby souhlasíme se změnovým listem č. č. 01/BOS/-VH/2020, který řeší větší mocnost živичné vrstvy proti projektové dokumentaci a naopak chybějící podkladní vrstvu zpevněnou cementovým pojivem, která se v reále v komunikaci nevyskytuje.

I když v jednom z vrtů, provedených v rámci geologického průzkumu na ul. Hoštická, byla zastižena tloušťka asfaltu 300mm, přesto jsme v PD uvažovali mocnost 100mm dle obvyklých standardů, které jsou v těchto případech na místních komunikacích u obrusné vrstvy 100 mm. Zastiženou tloušťku v průzkumu jsme považovali za lokální anomálii vzhledem k neexistenci podkladní vrstvy vozovky. Tloušťka 250 mm je velmi nestandartní.

S pozdravem




DSO IV. 06.1 - STOKA B3

List č.

2811002

Datum	Denní záznamy stavby
4.3.20 8-	- ZÁKONČENÍ STAVBY NA KOVCI PRK. KLÉKY
4.3.20 DT	POČET VÁNO 0:9C PRAC. DOBA 7-14 PRACOVNÍ 8xTHP PxD NEVYKLIKÁ 1x BĚR KOVOVĚ LME, 1x NÁČ. VOZIDLO POČET PRACÍ: DSO IV. 06.1 - STOKA B3; UŘEK SA1 - VAD - HODIŠENÍ A PÁRNÍ OTVĚRĚNÍHO VTKOPY - VTRAVA PÍL. PRÁČNÍ KUTKĚNÍ - MONTÁŽ DN 300 PŘE PD - POKR, PŘEDKOVÁNÍ PODVÁN
6.3.20 PA-	ZÁKAS PŘEDVĚST V PÁRNÍ HODIŠENÍ PÁV. KONSTRUKČNÍ VĚSTEV KONSTRUKCE V LUCY KOTICE BYLO ZMĚŘENO ŽE SEUTĚNÁ TLOUŠŤ ASTALOVYH VĚSTEV JE 25,0 CM A VEDROVNA PŘEDKOVÁNÍ DÁVĚ TL. 10 CM, KTERÁ JE UVEDENA V PD za spst POČET ZÁKASNO VĚST 2, 6 PRAC. DOBA 7-14, PRACOVNÍ 3xTHP PxD NEVYKLIKÁ 1x BĚR KOVOVĚ LME, 2x NÁČ. VOZ. POČET PRACÍ: DSO IV. 06.1 - STOKA B3; UŘEK SA1 - VAD - HODIŠENÍ A PÁRNÍ OTVĚRĚNÍHO VTKOPY - MONTÁŽ DN 300 PŘE PD - NĚB [REDACTED]

Босорогы, ул. Хошгика

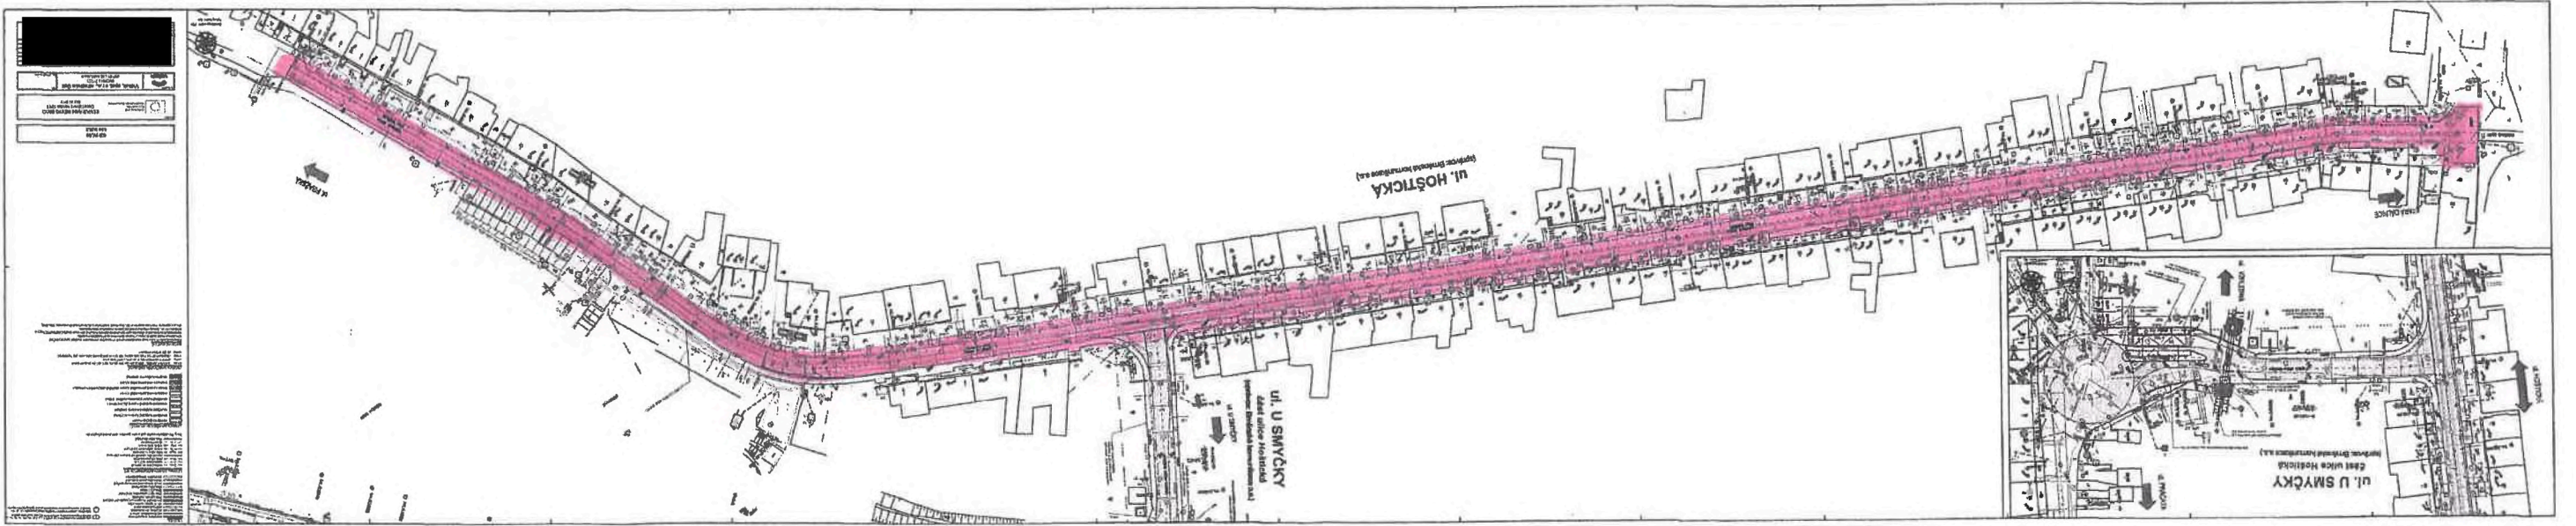

площадь территории 5018,3 м²

