



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 8

SO 08.27.a. Přeložka vodovodu – provizorní zásobování

ZM 057 - Zateplení provizorního vodovodu



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko BVK	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	8
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	10

"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


Důvodová zpráva – změnový list č. 8

Zateplení provizorního vodovodu

Provizorní vodovod byl zateplen na části vedené po povrchu v délce 357,00 bm tepelnou izolací (MW) tl 200 mm, aby nedocházelo k jeho zamrznutí v zimním období 12/2022 až 02/2023. Způsob zateplení byl odsouhlasen zástupci provozu VS BVK a.s., AD projektanta a TDS objednatele (investora).

Termín provedení: 14.12.2022 – 21.12.2022

V Brně dne :



VYJÁDŘENÍ SPRÁVY VODOVODNÍ SÍTĚ

Stavba: Nábřeží řeky Svratky – realizace PPO města Brna – etapy VII a VIII
Objekt: SO 08.27 Přeložka vodovodu a SO 08.27.a Přeložka vodovodu –
provizorní zásobování

Věc: Realizace provedení protlaku pod komunikací ul. Heršpická a
provedení tepelné izolace provizorního vodovodu DN 400 na zimní
období

Na základě místního šetření - za přítomnosti zástupců zhotovitele stavby, TDS objednatel, AD projektanta, provozu VS BVK, a.s. a zástupců KAM Brna - a závěrů z proběhlého TD stavby dne 11.10.2022 byla zvolena konečná, nejvhodnější varianta provedení přechodu vodovodu DN 500 přes komunikaci ul. Heršpická a to vsunutím ocelového potrubí DN 500 do potrubí starého vodovodu DN 600.

AD projektanta zpracuje úpravu DPS v úseku 0,177 80km – 0,440 20km staničení podélného profilu vodovodu DN 500. Na základě připomínky zástupce provozu VS BVK, a.s. AD ještě přepracuje kladečské schéma vodovodu v okolí vstupu a výstupu ocelového potrubí z chráničky DN 600.

Vzhledem ke skutečnosti, že provedení přeložky vodovodu v celé délce dle PD je možné až po dokončení realizace kmenové stoky A v úsecích Š3 - OKA 08 - DN 1800 - dl. 117,17m a OKA 08 - HKA 14V - 2 x DN 1200 - dl. 30,08 včetně Š3 a HKA 14V a realizace dokončení vodovodu bude tedy probíhat i v roce 2023 a zástupce provozu VS BVK, a.s. souhlasí s návrhem zhotovitele provést zateplení potřebné části provizorního vodovodu DN 400 na zimní období a žádá zhotovitele o předložení návrhu k odsouhlasení. Zhotovitel stavby zpracuje aktualizaci podrobného HMG stavby objektu SO 08.27 v součinnosti se zástupci vodárenského provozu a se zkoordinováním s uzavírkami komunikací.

V Brně dne: 12. 10. 2022 Vyřizuje:

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a. Pisárky. 603 00 BRNO**



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_10 – SO 08.27.a Přeložka vodovodu – provizorní zásobování		Změnový list č. 8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zateplení provizorního vodovodu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____		OD: PPO nábřeží Svratky - Brno POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____
DATUM: předání ZL OSOBNĚ: Ano		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení provizorního vodovodu DN400 DOTČENÉ MÍSTO: Štýřické nábřeží a u BKOM ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „zateplení provizorního vodovodu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Provizorní vodovod byl zateplen na části vedené po povrchu v délce 357,00 bm tepelnou izolací (MW) tl 200 mm, aby nedocházelo k jeho zamrznutí v zimním období 12/2022 až 02/2023. Způsob zateplení byl odsouhlasen zástupci provozu VS BVK a.s., AD projektanta a TDS objednatele (investora).		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 5.1.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_10 – SO 08.27.a Přeložka vodovodu – provizorní zásobování	8																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: Zateplení provizorního vodovodu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: 31.01.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">_____ _____ Mail XXXXXXXXXX</div>																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zateplení provizorního vodovodu DN400 DOTČENÉ MÍSTO: Štýřické nábřeží a u BKOM ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Odsouhlasený rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">348.381,50 Kč</td><td style="text-align: center;">73 160,11 Kč</td><td style="text-align: center;">421 541,62 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">0,00</td><td style="text-align: center;">0,00</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">348.381,50 Kč</td><td style="text-align: center;">73.160,11 Kč</td><td style="text-align: center;">421.541,62 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	348.381,50 Kč	73 160,11 Kč	421 541,62 Kč	Méněpráce:	0,00	0,00	0,00	Rozdíl:	348.381,50 Kč	73.160,11 Kč	421.541,62 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	348.381,50 Kč	73 160,11 Kč	421 541,62 Kč														
Méněpráce:	0,00	0,00	0,00														
Rozdíl:	348.381,50 Kč	73.160,11 Kč	421.541,62 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>																
VYJÁDRĚNÍ:	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>																
OD: _____ GP _____	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>																
SCHVÁLIL: _____	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>																
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK, XXXXXX	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>														

Výkaz výměr souhlasí
5.1.2023

Nabídkový rozpočet

Stavba:

Protipovodňová opatření města brna - etapa VII a VIII

Objekt:

01 - SO 08.27.a. Přeložka vodovodu - provizorní zásobování

Soupis:

Přeložka vodovodu - provizorní zásobování
Zateplení vodovodu

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

04.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena celkem							348 381,50 Kč
	D	8	Trubní vedení				
1	K	R01	Zateplení provizorního vodovodu včetně tvarovek <i>*pozn skladba: minerální vata tl. 200 mm + PE folie včetně přelepení spojů.</i>	bm	357,00	785,00	280 245,00
2	K	R02	DMTZ tepelné izolace včetně PE folie	bm	357,00	158,00	56 406,00
3	K	R03	Odvoz a likvidace vybouraných hmot (MW + PE folie)	t	8,09	1 450,00	11 730,50


bez DPH

* pozn - Nejedná se o provedení antivandal. Případné opravy budou účtovány v jednotkové ceně za 1 bm.


Rozpočet je z hlediska cenovek
v pořádku
9.1. 2023



Provizorní vodovod - zateplení na délce 357 bm DN 400, ocel

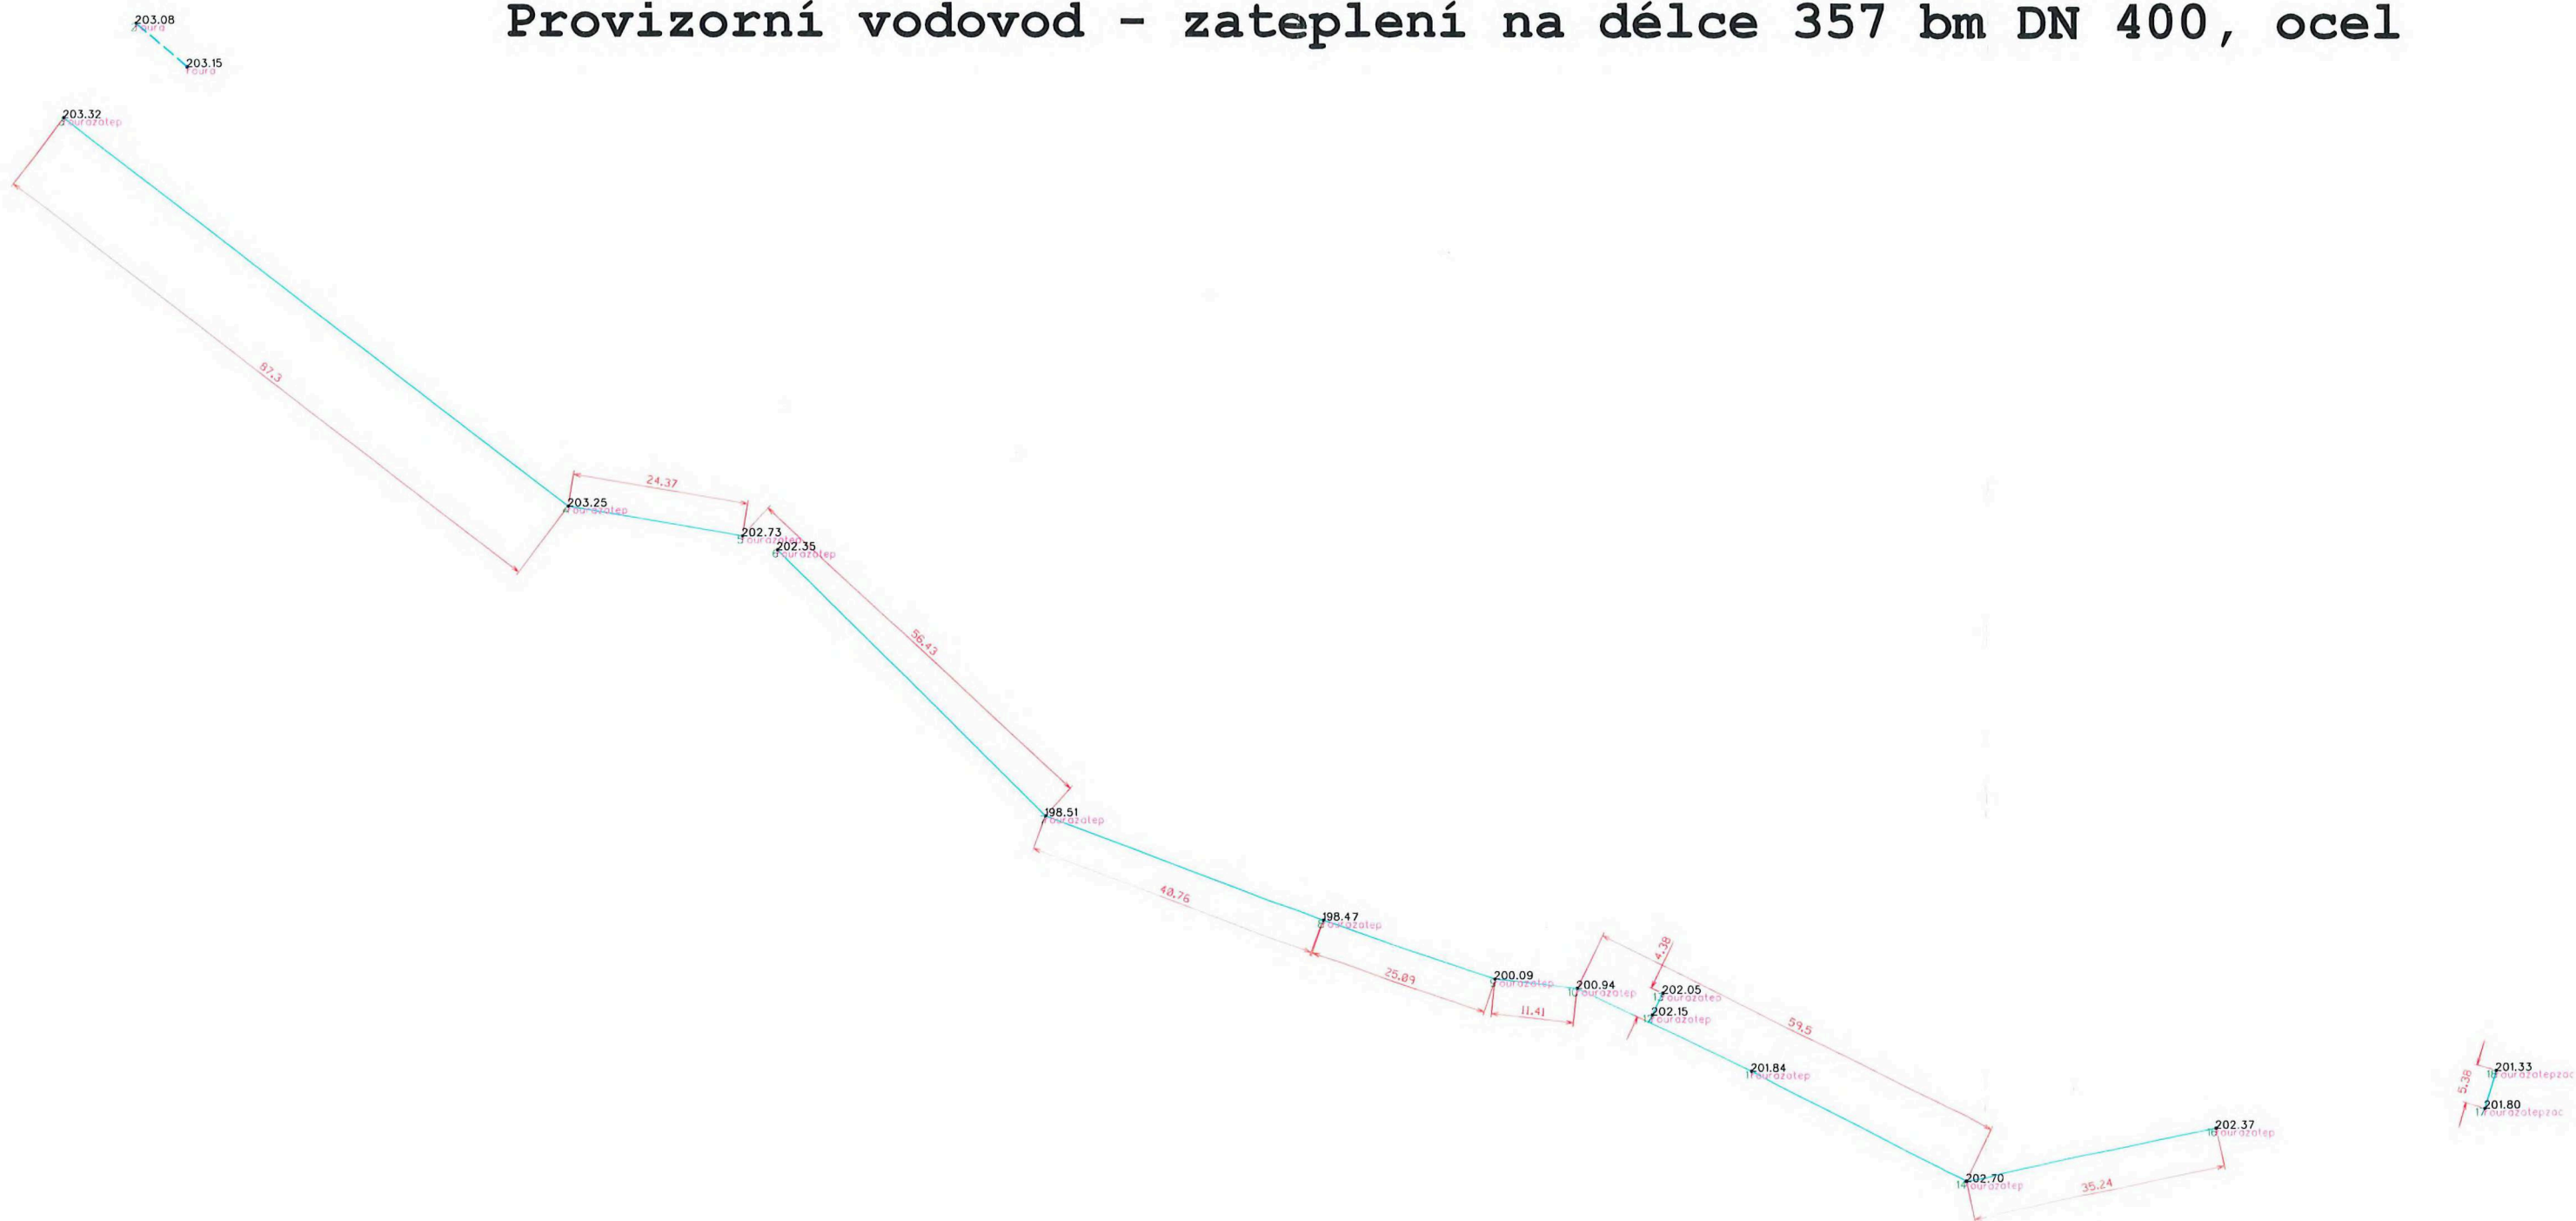


SO 07.28a. Provizorní vodovod
 Geodetické zaměření délky zateplení vodovodu
 Celková délka: 357 bm

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 08.27 - PŘELOŽKA VODOVODU

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	9,7°C	0,0 mm/h	18:00	 Polojasno	15,7°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	16,4°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
HOCHTIEF CZ, a.s.	4
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Kolový bagr Liebherr	HOCHTIEF CZ a. s.	1	Tatra Phoenix	HOCHTIEF CZ a. s.	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
1) Rozvoz potrubního materiálu po stavbě 2) Příprava armatur	HOCHTIEF CZ, a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE HOCHTIEF CZ, a.s.

Zhotovitel nemá k dnešnímu dni žádné závazné vyjádření k provádění protlaku vodovodu pod ul. Heršpická, kde byla 15.9.2022 zjištěna kolize (viz. zápis z KD). Navrhované varianty řešení problému můžou mít dopad na hloubku uložení potrubí a typy použitých armatur v úsecích kolem samotného protlaku.

Práce jsou v těchto místech zastaveny a zhotovitel čeká na vyjádření objednatele.

Zároveň zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu provádění přeložky vodovodu SO 08.27 a uhradit náklady spojené s pozastavením stavebních prací (zejména prostroje pracovních čet a mechanizace).

Vzhledem k výše uvedenému zhotovitel doporučuje objednateli provést izolaci provizorního vodovodu DN400 (z důvodu blížícího se zimního období). V případě, že objednatel tyto práce bude po zhotoviteli požadovat provést, žádáme o předání PD a VV k těmto pracím.

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE HOCHTIEF CZ a. s.

Zápis TDS k problematice provedení protlaku pod komunikací ul. Heršpická

na základě místního šetření - za přítomnosti zástupců zhotovitele stavby, TDS objednatele, AD projektanta, provozu VS BVK, a.s. a zástupců KAM - a závěru z proběhlého TD stavby dne 11.10.2022 byla zvolena konečná, nejvhodnější varianta provedení přechodu vodovodu DN 500 přes komunikaci ul. Heršpická a to vsunutím ocelového potrubí DN 500 do potrubí starého vodovodu DN 600.


AD projektanta zpracuje úpravu DPS v úseku 0,177 80km – 0,440 20km staničení podélného profilu vodovodu DN 500. Na základě připomínky zástupce provozu VS BVK, a.s. AD ještě přepracuje kladečské schéma vodovodu v okolí vstupu a výstupu ocelového potrubí z chráničky DN 600. Dále bylo projednáno, že provedení přeložky vodovodu v celé délce dle PD je možné až po dokončení realizace kmenové stoky A v úsecích Š3 - OKA 08 - DN 1800 - dl. 117,17m a OKA 08 - HKA 14V - 2 x DN 1200 - dl. 30,08 včetně Š3 a HKA 14V.

Úseky kanalizace nejsou zatím realizovány. V těchto úsecích dochází 2x ke křížení vodovodu s trasou stoky a dlouhého těsného souběhu, což by v opačném postupu výstavby hrozilo havárií.

Zhotovitel stavby zpracuje aktualizaci podrobného HMG stavby objektu SO 08.27 v součinnosti se zástupci vodárenského provozu a se zkoordinováním s uzavírkami komunikací.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude realizace dokončení vodovodu probíhat i v roce 2023 a zástupce TDS - BVK, a.s. a zástupce provozu VS BVK, a.s. souhlasí s návrhem zhotovitele provést zateplení potřebné části provizorního vodovodu DN 400 na zimním období a pověřili zhotovitele jeho návrhem.

Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 08.27 - PŘELOŽKA VODOVODU

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Déšt	9,7°C	0,1 mm/h	18:00	 Polojasno	13,4°C	0,0 mm/h
12:00	 Déšt	11,8°C	0,1 mm/h				

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE HOCHTIEF CZ a. s.

Vyjádření zástupce TDS - BVK, a.s. k zápisu zhotovitele ze dne 26.9.2022

Vzhledem ke zjištěným překážkám v trase vodovodu DN 500 v místech situování protlaku pod ul. Heršpická - v místě protlaku nového vodovodu se nachází potrubí stávajícího vodovodu DN 600 a možná komplikace s trasou nově přeložených sdělovacích kabelů Quantcomu - bude znovu prověřena možnost provedení protlaku v nové trase doplněnou sondáží zhotovitelem vodovodu a následně konzultací se zhotovitelem protlaku (OHLA ŽS, a.s.) na místě samém.

Vodárenský provoz trvá na zachování navržené hloubky vodovodu v místě podchodu ulice Heršpická.

Pro ověření, zda vodovod není uložen v chrániče provede zhotovitel sondy v blízkosti obou stran komunikace Heršpická. Navržené možnosti řešení jsou:

- 1) provedení vodovodu v ocelové chrániče
- 2) změna projektované trasy vodovodu posunem – možná kolize s nově přeloženými sdělovacími kabely Quantcomu
- 3) zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího

Po provedení doplňující sondáže bude svoláno jednání.

Pokračování prací na vodovodu je dle vyjádření AD možné mezi vytyčovacími body č.5-12.

V záležitosti návrhu zhotovitele o provedení izolace provizorního vodovodu DN 400 bude uvažováno až po zjištění relevantní příčiny nemožnosti provedení vodovodu do konce tohoto roku 2022.

Podpisy:

FIRST

STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

bulldary.online

DENÍK: SO 08.27 - PŘELOŽKA VODOVODU

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	☁ Zamračeno	-3,8°C	0,0 mm/h	18:00	☁ Zamračeno	-1,2°C	0,5 mm/h
12:00	☁ Zamračeno	-2,1°C	0,1 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
HOCHTIEF CZ, a.s.	6

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Tatra Phoenix	HOCHTIEF CZ a. s.	1	Kolové rypadlo Liebherr	HOCHTIEF CZ a. s.	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MI
1) Obalení, osazení tep. minerální vaty okolo potrubí provizorního vodovodu ocel DN 400, následné osazení, přikrytí PVC ochranou folií.	HOCHTIEF CZ, a.s.		
"Vytyčovací bod č. 3" - křižovatka Poříčí	HOCHTIEF CZ, a.s.		
1) Obsyp potrubí štěrkodrtí frakce 0-4 mm, min. 30cm na potrubí, ulice Poříčí (propoj LT DN 500)			
2) Osazení výstražné fólie pozor voda.			
3) Zásyp jámy, výkopu štěrkem frakce 0-32mm, hutněno po vrstvách min. 30cm.			

Kontrola BOZP

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
	HOCHTIEF CZ, a.s.

SO 08.27 - Přeložka vodovodu DN 600 a 500 - kontr. staveb. prací

1- Propoj vodovodu DN 500 v komunikaci křižovatky Poříčí x Nové sady x Renneská - použito nevhodné neodsouhlasené kamenivo – viz příloha. TDS žádám okamžitou opravu – odstranění kusů asfaltu a nevhodné zeminy a nahrazení zásepem ze ŠTP nebo ŠD.

2 - Ostatní propoje a položené potrubí obsypat pískem a KO na výzvu :

- propoj DN 600 před Rondem st. 0,000km ; propoj DN 500 před armaturní šachtou ul. Renneská st. 0,117 km, úsek vodovodu DN 500 st. cca 0,200 - 0,225 km PP.

PŘÍLOHY

IMG_20221214_110350510.jpg



IMG_20221214_110157176.jpg



IMG_20221214_110422982.jpg



FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 08,27 - PŘELOŽKA VODOVODU

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Zamračeno	-3,4°C	0,0 mm/h	18:00	 Zamračeno	-2,1°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	-2,1°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
HOCHTIEF CZ, a.s.	6
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Tatra Phoenix	HOCHTIEF CZ a. s.	1	Kolové rypadlo Liebherr	HOCHTIEF CZ a. s.	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
1) Obalení, osazení tep. minerální vaty okolo potrubí provizorního vodovodu ocel DN 400, následné osazení, překrytí PVC ochranou folií.	HOCHTIEF CZ, a.s.		
"Vytyčovací bod č. 1" 1) Zaizolování ocelového potrubí DN600 asfaltovými hydroizolačními pásy v místě propojení na stávající vodovodní řad DN600.	HOCHTIEF CZ, a.s.		
"Vytyčovací bod č. 3" - křižovatka Poříčí 1) Zásyp jámy, výkopu na ulici Poříčí, propoj DN500 kamenivem frakce 0-32mm, hutněno po vrstvách min. 30cm. 2) Osazení podkladních desek a poklopů šoupátkových, hydrantových. 3) Zřízení krytu vozovky na ulici poříčí z PB C20/25 vrstvy 15cm (5x5x0,15m), zhutněno.	HOCHTIEF CZ, a.s.		
Zabezpečení staveniště			

Podpisy:

FIRST

STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

buildary.online

DENÍK: SO 08.27 - PŘELOŽKA VODOVODU

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	☁ Zamračeno	-3,6°C	0,0 mm/h	18:00	☁ Polojasno	-4,4°C	0,0 mm/h
12:00	☁ Polojasno	-1,5°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
HOCHTIEF CZ, a.s.	5
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
1) Obalení, osazení tep. minerální vaty okolo potrubí provizorního vodovodu ocel DN 400, následné osazení, přikrytí PVC ochranou folií.	HOCHTIEF CZ, a.s.		

Podpisy:

Po vzájemném vyhodnocení těchto dvou podkladů projektant stanoví zda je možné a výhodné vsunout ocelové potrubí DN 500 do stávající ocel. trouby vodovodu DN 600 – v případě, že je stávající vodovod rovný. To bude známo nejdříve 5.10.2022. V případě kladného stanoviska zástupce zhotovitele požádal o písemnou specifikaci této trubky nutnou pro objednávku. Info na příštím KD.

TDS urguje po zhotoviteli požadavek na zahájení prací na více úsecích – úsek od Novosadského mostu směrem k Rondu – ul. Poříčí – viz předchozí zápisy, na kterém se dalo kontinuálně pracovat zemními pracemi i mimo čekání na přeložku dne 25.9.2022 s křížícím vodovodem DN 200.

Zástupce investora TDS zároveň upozorňuje zhotovitele, že na stavbě tohoto objektu je již delší dobu patrný nedostatečný početní stav pracovníků pro rozvinutí práce na více úsecích i přes ujišťování zhotovitele o posílení pracovních kapacit, a že investor proto nemůže brát zřetel na neoprávněné domáhání se zhotovitele na vznikající náklady s takzvanou nekontinuální činností.

Dle vyjádření provozu BVK není do doby rozhodnutí možné pokračovat na úsecích navazující na protlak do doby revize projekčního řešení. Tzn, že úsek Heršpická – Uhelná + Heršpická – Renneská ul. není možno realizovat. Zhotovitel zároveň upozorňuje na vznikající náklady spojené s nekontinuální činností a značné množství kolizí. Zhotovitel objednateli dále doporučuje prověřit potřebu zateplení provizorního vodovodu, a to vzhledem k blížícímu se zimnímu období.

18.10.2022 – na základě proběhlého TD dne 11.10.2022 byla zvolena konečná nevhodnější varianta provedení přechodu vodovodu DN 500 přes komunikaci ul. Heršpická a to vsunutím ocelového potrubí DN 500 do potrubí starého vodovodu DN 600. AD zpracoval úpravu PD v úseku 0,177 80km – 0,440 20km staničení podélného profilu. Na základě připomínky zástupce provozu VS BVK, a.s. AD ještě přepracuje kladečské schéma vodovodu v okolí vstupu a výstupu ocelového potrubí z chráničky DN 600.

AD dodá výkazy výměr předešlých změn na objektu vodovodu. Zodpovídá: AD termín 1.11.2022 – příští KD. Zhotovitel stavby zpracuje aktualizaci podrobného HMG stavby objektu SO 08.27 v součinnosti se zástupci vodárenského provozu a se zkoordinováním s uzavírkami komunikací. TDS požádal zhotovitele o návrh zateplení provizorního vodovodu v zimním období.

Zodpovídá: zhotovitel termín: 25.10.2022

23. Úprava svahu koryta řeky SO 07.07 ZM046

Dle vyjádření zhotovitele nelze práce provádět dle DPS.

Zhotovitel provedl dle pokynu AD úpravu břehu v referenčním úseku místo kamenného záhozu rovnatinou. Toto řešení vyvolá nutnost úpravy položek ve výkazu výměr a s tím spojené vícenáklady. Zhotovitel proto přerušil práce na úpravě břehů a požaduje závazné stanovisko AD a nové technické řešení úpravy břehů.

AD zašle závazné stanovisko a zpracuje změnu DPS. Info na příštím KD.

Zodpovídá AD

20.9.2022 AD zpracuje závazné stanovisko v takovém rozsahu, jak požaduje TDI, KAM a OI. Nebyl schválen referenční úsek a práce na úpravě břehu byly přerušeny. Na základě závazného stanoviska a schůzky na místě samém bude rozhodnuto, zda bude úprava břehu řešena záhozem nebo rovnatinou. Zodpovídá AD

4.10.2022 Zhotovitel informoval, že práce na úpravě koryta řeky byly přerušeny.

Byla vyhotovena referenční plocha, která byla na místě všemi účastníky odsouhlasena. AD zpracuje upravenou DPS na základě této referenční plochy. Vznikl zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel do dnešního dne obdržel 3 příčné řezy, návrh revize situačního výkresu včetně 11 vytyčovacích bodů – to se týká kamenné paty v Úseku Uhelná-Heršpická, dokumentaci AD vloží do stavebního deníku s tím, že AD předává zhotoviteli tyto upravené výkresy k realizaci, TDI tyto výkresy rovněž odsouhlasí. Následně bude zhotoviteli předána upravená dokumentace pro provádění stavby v tištěné a orazítované podobě včetně opraveného výkazu výměr, který bude sloužit jako podklad ke změnovému listu. Následně bude zhotovitel pokračovat v provádění kamenné paty podle této dokumentace.

Dále je problém s vyjádřením AD, k výše uvedené referenční ploše, které není v takové podobě, jak bylo domluveno na schůzce při provádění referenčního úseku dne 23.9.2022. Na schůzce byl přítomen i zástupce Povodí Moravy a s provedeným referenčním úsekem také souhlasil. Zhotovitel a TDI požadují opravit toto vyjádření tak, aby bylo zřejmé že práce lze provádět tak, jak v referenčním úseku. Zodpovídá AD

18.10.2022 Na KD bylo zástupci zhotovitele, AD, TDI i KAM ústně odsouhlaseno, že popis referenční plochy ve stavebním deníku je vyhovující. Zatím není jasné, zda provádění úpravy svahu řeky bude mít dopad do ceny, ale zcela určitě bude mít dopad do kubatur-výkazu výměr. Výkaz výměr na úpravu svahu koryta řeky pro celý úsek PPO VII a VIII bude zpracován do 18.11.2022. Zhotovitel dodá do 21.10.2022 své vyjádření k pokračování prací.

Zodpovídá : Zhotovitel za prověření pokračování prací a AD za výkaz výměr, závazné stanovisko a změnu DPS

Současně se tímto bodem (ZM046) bude řešen i VV pro provedení kamenné paty (ZM002 +ZM003)
Zodpovídá zhotovitel za zaměření kamenné paty a AD za VV

21. Skleněná protipovodňová stěna na ulici Poříčí ZM052

Zástupci zhotovitele oznámili skutečnost, že skleněná stěna na ulici Poříčí, která je zmiňována v DPS není obsažena v rozpočtu a proto ji zhotovitel nemá ani naceněnou. Zhotovitel požaduje od AD bližší specifikaci této stěny, nutno zpracovat výkaz výměr, který bude skleněnou stěnu obsahovat. Nutno řešit změnovým listem .
Zodpovídá AD

4.10.2022 Informace k této stěně předal AD 3.10.2022 zhotoviteli. AD prověřil, že soutěžní výkaz výměr tuto položku neobsahuje a proto bude nutné ji doplnit do rozpočtu. Bude řešeno formou ZL. Zhotovitel provede kontrolu specifikace této stěny a příště informuje, zda jsou tyto informace dostatečné.

Zodpovídá AD a zhotovitel

18.10.2022 AD zaslal zástupcům zhotovitele informace ke stěně na Poříčí. Dle vyjádření zhotovitele nejsou tyto informace dostatečné. Zástupce zhotovitele (p. Matušík) zašle do 25.10.2022 mailem požadavky na doplnění informací od AD na základě těchto požadavků AD doplní k této stěně další informace.

Zodpovídá: Zhotovitel za info k doplnění a AD za doplnění

1.11.2022 AD zaslal další specifikace ke stěně a doplní závazné stanovisko na sdílené úložiště. Bude vyhotoven výkaz výměr – 1 položka. Zhotovitel na základě zaslaných specifikací doloží 3 cenové nabídky.

Info na příštím KD.

Zodpovídá zhotovitel

15.11.2022 Zhotovitel obdržel dvě cenové nabídky a čeká na třetí. Termín : 29.11.2022

Zodpovídá zhotovitel

29.11.2022 Zhotovitel obdržel všechny 3 cenové nabídky a proběhne jednání s dodavateli. V případě nutnosti dalšího dopřesnění zhotovitel kontaktuje AD pro další informace. Kontrola na příštím KD.

Zodpovídá zhotovitel

22. WC pro invalidy na Kolonádě – chybějící signalizační systém ZM 054

U WC pro invalidy na Kolonádě chybí v DPS signalizační systém dle normy. Je potřeba do DPS signalizační systém zpracovat a dále prověřit, kam bude signalizace napojena. Bude zpracována změna DPS a prověřeno napojení daného systému .

Zodpovídá AD

1.11.2022 Dle vyjádření AD by si měl způsob napojení určit budoucí správce, který není znám. Na téma budoucího správce bude v nejbližší době svoláno jednání, pro která dodá podklady KAM.

Termín pro dodání podkladů : 4.11.2022

Zodpovídá KAM za dodání podkladů a OI za svolání jednání

15.11.2022 Jednání na téma budoucího správcovství bude svoláno cca za 14 dní. Ad začne zpracovávat signalizační systém s dálkovým přenosem.

Zodpovídá AD

29.11.2022 Změna DPS byla zadána ke zpracování subdodavateli AD . Info k termínu na příštím KD.

Zodpovídá AD

23. Úprava stezek ZM 032

Z důvodu nezbytného zachování ekologicky hodnotných stromů je nutné změnit trasu navržených stezek. S tím souvisí i úprava lávky u Alžbětinek. Dále je nutné zpracovat změnu vedení stezek v souvislosti s úpravou polohy pilotové stěny SO 07.03. Bude zpracována změna DPS. Pro zpracování této změny bude vypsána nová soutěž, kterou zajišťuje OI.

Zodpovídá OI

1.11.2022 Probíhá příprava soutěže na výběr zpracovatele PD, předpokládané ukončení soutěže bude za cca 3 měsíce.

Zodpovídá OI

15.11.2022 Trvá

Zodpovídá OI

29.11.2022 Trvá. Probíhá zpracování zadávací dokumentace. Soutěž bude vypsána do 3 týdnů. Zodpovídá OI

24. Zateplení provizorního vodovodu

15.11.2022 Zástupce TDI(BVK) obdržel od zhotovitele návrh a nákres zateplení provizorního vodovodu, včetně výkazu výměr. Probíhá kontrola VV. Termín odsouhlasení VV: 22.11.2022

Zodpovídá TDI (BVK)

29.11.2022 VV byl odsouhlasen rozpočtářem TDI. Je možné zateplení realizovat. Bod bude vypuštěn.

25. Kolize kmenové stoky A na Táborského Nábřeží s kabelovou šachtou Cetin ZM 057

Byla zjištěna kolize kmenové stoky A s kabelovou šachtou Cetin. Dle vyjádření AD jsou 2 možná řešení pokračování prací a to buď raženou štolou, nebo přeložkou šachty. Bude svoláno jednání za účasti provozu BVK, Cetin, TDI, OI MMB a zhotovitele. Jednání svolá TDI (BVK) do 29.11.2022. AD nachystá podklady pro jednání.

Zodpovídá : TDI za svolání jednání a AD za podklady pro jednání

