



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344) + (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 17

VON - VON

D_02 SO 07.07 – Revitalizace řeky-úprava dna v km 37,055-39,



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	NEOBSAZENO
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	8
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	10
Harmonogram	11
Nabídky zpracovatele PD	12
Náklady za zařízení staveniště	13
Pojistná smlouva	14

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – prodloužení termínu realizace díla

V souvislosti s nedořešenými změnami projektové dokumentace pro provádění stavby stavebních objektů SO 07.19 – Betonové gravitační zídky, SO 07.09 – Kolonáda v km 37,475 – 37,728, SO 07.10 – Vstupní objekt v km 37,490, SO 08.08 – Cyklostezka, SO 08.09 – Pěšina, SO 08.04 – Protipovodňová železobetonová stěna km 38,235 – 38,540 a dalšími úpravami na dalších stavebních objektech dochází ke zpoždění zahájení realizace na těchto SO a tím i k posunu termínu dokončení.

SO 08.04 – Protipovodňová železobetonová stěna km 38,235 – 38,540 – u tohoto stavebního objektu probíhá dopracovávání projektové dokumentace od března 2022 – viz zápisy z kontrolních dnů. V březnu 2022 zhotovitel provedl kopané sondy pro ověření hloubky založení ohradní zdi a na základě nasondovaných skutečností byla nutná úprava (dopracování) dokumentace. Po dobu dopracovávání projektové dokumentace nemohl zhotovitel zahájit stavební práce na tomto stavebním objektu a tím ani na navazujících stavebních objektech. Dokumentace v rozsahu umožňujícím zahájení realizace prací byla zhotoviteli předána v lednu 2023, následně zhotovitel zahájil práce – 02/2023. Na tomto stavebním objektu došlo ke zdržení 11 měsíců, Tento dopad je zhotovitel schopen částečně eliminovat, ale reálně generuje zpoždění dokončení díla v trvání 7 měsíců, čímž dochází k posunutí termínu dokončení stavby na 31.-8.2024.

SO 07.19 – Betonové gravitační zídky, realizace tohoto stavebního nebyla dosud zahájena z důvodu nedořešení způsobu založení těchto zídek pod mosty. K úpravám řešení bylo přistoupeno d důvodu eliminace možného ovlivnění založení mostů. Předpoklad odsouhlasení PD a následného možného zahájení prací je květen 2023 (červen 23).

SO 07.09 – Kolonáda v km 37,475 – 37,728 – zde také dochází k posunu termínu zahájení prací. Vzhledem k situaci, kdy stále chybí dopracovaná projektová dokumentace reflektující zjištěné skutečnosti na místě realizace není v tuto chvíli možné kvantifikovat dopad do termínů dokončení stavby. Doba realizace tohoto SO je 12 měsíců s následným provedením navazujících prací. Po dobu dopracovávání projektové dokumentace má zhotovitel nainstalovanou štětovnicovou jímku v korytě řeky – v současné době je doba instalace vyčíslena na 211 dní nad rámec plánovaného osazení.

SO 07.10 – Vstupní objekt v km 37,490 – tento stavební objekt přímo souvisí s objektem 07.19.

SO 08.08 – Cyklostezka, SO 08.09 – Pěšina – u těchto stavebních objektů jsou rozpracovány změny projektové dokumentace, které vyplynuly ze skutečností zjištěných při realizaci stavebních prací. Nejvýznamnějšími změnami jsou kolize trasy stezky a lávky s biologicky hodnotnými stromy, které je obecným zájmem ponechat – jilmy u Alžbětinek a u mokřadu. Dalšími místy vyžadujícím

dopracování změny řešení je bezbariérové napojení areálu Lipka a vyřešení kolize trasy stezky a přístupové cesty k lanovému centru „Jungle park“, kde je ve výškové kolizi lano přes řeku sloužící pro dopravu návštěvníků a materiálu. Tato přístupová cesta je pro samotnou existenci centra naprosto zásadní. Zde momentálně probíhá soutěž na výběr zhotovitele projektové dokumentace na základě které bude vybrán dodavatel projekčních změn a dopracování PD.

SO 08.26.a Stoky – posun termínu dokončení z důvodu změny technologie realizace stoky v úseku OK09 – Š7 – Š8 (ražba štol, dodatečné vystrojení Š7 po zprovoznění tramvajové trati).

SO 08.27 – Přeložka vodovodu – posun termínu dokončení z důvodu změny technologie realizace podchodu ulice Heršpická – kde není možné z prostorových důvodů realizovat protlak a vlivem dalších změn na trase vodovodu – kolize s vodovodem DN 200, odlišná poloha místa propojení „u Ronda“ předpokladu.

SO 08.19 – Výsadba dřevin – zde dochází k posunu termínu vlivem změny rozsahu kácení a tím následně ke změně rozsahu náhradní výsadby.


Vlivem změn generujících na těchto stavebních objektech dochází k posunu dílčích termínů i u následujících stavebních objektů – SO 07.06, 07.07, 07.08, 07.13, 07.14, 07.17, 08.01, 08.03, 08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.14.

Všechny tyto uvedené skutečnosti mají podstatný vliv do plnění časového harmonogramu výstavby.

Toto jsou nepředvídatelné okolnosti, se kterými zhotovitel nemohl dopředu kalkulovat. Mají zásadní vliv na termín realizace nejen těchto stavebních objektů, ale i ostatních navazujících prací. Zdržení vlivem této změny, dodatečných projekčních prací i následné realizace jsou zhotovitelem kvantifikovány na 7 měsíců

Dalšími okolnostmi, majícími zásadní vliv na termín dokončení díla, jsou plánované koordinované stavby, u nichž skutečnosti zjištěné při realizaci díla, způsobily posun zahájení prací (tím také i posun termínu dokončení). Jedná se zejména o realizaci plynovodu a opravy vodovodu na Tábořského nábřeží, kde dochází k posunu na rok 2024, a to až do klimaticky vhodného období a období mimo topnou sezónu a následnou kompletní opravu komunikace. Další avizovanou stavební akcí je realizace posílení horkovodu v téže lokalitě. Tato akce zasahuje do staveniště stavby „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ a tím znemožňuje dokončení prací. Dopad těchto staveb zatím není možno přesně vyčíslit, nicméně je evidentní, že jsou to další argumenty podporující nárok zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla.

Zdůvodnění změny: Nepředvídané skutečnosti vyvolané postupem realizace zmíněných SO s termínovým a finančním dopadem do postupu probíhajících prací.





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)+(ORG 2267) ÚSEK: D 02 – Revitalizace řeky + VON	17																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VON - VON D 02 – Revitalizace řeky-úprava dna v km 37,055-39,910 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: předání ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: D 02 SO 07.07 – Revitalizace řeky-úprava dna v km 37,055-39,910 + zpoždění zahájení realizace a posun termínu dokončení DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.17 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">29 127 235,05</td><td style="text-align: right;">6 116 719,36</td><td style="text-align: right;">35 243 954,41</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Celkem</td><td style="text-align: right;">29 127 235,05</td><td style="text-align: right;">6 116 719,36</td><td style="text-align: right;">35 243 954,41</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	29 127 235,05	6 116 719,36	35 243 954,41	Méněpráce:	0	0	0	Celkem	29 127 235,05	6 116 719,36	35 243 954,41
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	29 127 235,05	6 116 719,36	35 243 954,41														
Méněpráce:	0	0	0														
Celkem	29 127 235,05	6 116 719,36	35 243 954,41														
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]																	
OD: _____ G [REDACTED]																	
SCHVÁLIL: [REDACTED]																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED] BVK, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]																

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průběžná jezyčková - realizace protipovodňových opatření na řece - etapa VII a

Objekt:

Náklady vyplývající z prodloužení délky stavby, období 1.2.-31.8.2023

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

3 847 585,00

Náklady vyplývající z prodloužení délky stavby, období 1.2.-31.8.2023

25 279 650,05

celkem

29 127 235,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII*

Objekt:

Náklady vyplývající z prodloužení délky stavby, období 1.2.-31.8.2023

KSO:

CC-CZ:

Misto:

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 279 650,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 279 650,05	21,00%	5 309 726,51
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 588 376,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Podpis

Datum a podpis:

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nábreží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"
Objekt: Náklady vyplývající z prodloužení délky stavby, období 1.2.-31.8.2023

Místo: Datum: 29.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu • Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 279 650,05	5308726,511	30 588 376,56
01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	25 279 650,05		
02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady	18 244 732,76		
03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady	460 000,50		
09 - Ostatní náklady	122 091,90		
	6 452 824,89		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábreží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII*

Objekt:

Náklady vyplývající z prodloužení délky stavby, období 1.2.-31.8.2023

Místo:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 279 650,05	
d VRN Vedlejší rozpočtové náklady							25 279 650,05	
d 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							18 244 732,76	
9	K	R011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	0,292226	61 107 291,90	17 857 139,48	
Zřízení a odstavení zařízení staveniště - viz samostatný list					4 884 900,0			
provoz zařízení staveniště 22 měsíců					56 122 361,0			
celkem zařízení staveniště					61 107 261,9			
provoz na 7 měsíců (02-08 2023):					17 857 134,7			
přepčet na položku SOD					0,292226			
11	K	R01121	Průběžná obnova komunikací dotčených namístavením dopravy	soubor	0,320	1 211 229,00	387 593,28	
Projektové dokumentace - ostatní (základ)							460 000,00	
16	K	R026	Zpracování realizace dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů	kpl	0,076950	6 056 145,00	460 000,00	
Dopracování projektové dokumentace					460 000,0			
viz náklady zhotovitele projektové dokumentace								
cena dle SOD					6 056 145,0			
přepčet na položku SOD					0,076950			
d 03 Geodetické práce a vylučení - ostatní náklady							122 091,90	
21	K	R035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	0,320	381 537,20	122 091,90	
doba realizace 7 měsíců - 381 537,2/22*7					121 396,2			
celková cena dle SOD					381 537,2			
poměr změna/SOD					0,3162			
d 09 Ostatní náklady							6 452 824,89	
24	K	K236	Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud to vyžaduje technologie provádění stavebních prací	kpl	0,320	60 561,50	19 379,68	
28	K	R005	Průběžné čištění komunikací vč. zimní údržby	kpl	0,320	121 122,90	38 759,33	
29	K	R008	Pojištění včetně finančních záruk	kpl	0,320	60 561,50	19 379,68	
dle uzavření pojistky je denní sazba 4508 Kč								
možno doložit pojistnou smlouvou, celkové tedy 423 536 Kč					53 400,0			
39	K	R092	Zajištění zvláštních užívání komunikací, záborů, vstupu na pozemky včetně poplateků atd	kus	0,320	72 673,80	23 255,62	
41	K	R0953	Zajištění dopravně inženýrských opatření dle uzavření odjednávký je denní sazba 636,35 Kč	měs	0,459	381 537,20	175 125,57	
prodloužení o 111 dní					172 240,2			
cena dle SOD					381 537,2			
poměr změna/SOD					0,460			
47	K	R43	Součinnost zhotovitele s prováděním TBD	kpl	0,320	36 759,40	12 403,61	
52	K	R52 - nová položka	Náklady za realizaci tým stavby (7 měsíců)	kpl	7,000	880 646,00	6 164 522,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_02 - Revitalizace

Soupis:

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

KSO:

833 21 29

Místo:

Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Podpis:

Funkční část soupisu práce formou ujednání mezi zadavatelem a uchazečem v souvislosti s etapou práce

Cena bez DPH

3 847 585,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Upravení	3 847 585,00	21,00%	807 992,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 655 577,85

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_02 - Revitalizace

Soupis:

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

3 847 585,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 847 585,00

4 - Vodorovné konstrukce

3 847 585,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt

D 02 - Revitalizace

Soupis

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo

Nábřeží Svatky

Datum

29.05.2023

Zadavatel

Statutární město Brno

Projektant

A PLUS a.s.


Uchazeč

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							3 847 585,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 847 585,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				3 847 585,00	
36	K	RO51-1	Jímkování pro provedení úprav v toku	den	211,000	18 235,00	3 847 585,00	
Jímky jsou pro provedení úprav v toku zařízení a odstranění včetně případného materiálu předpokládaná délka ohybu jímky cca 100 m předpokládá se zaražení litkovnic a ziskovatelů do země hrázky uprostřed toku mín. ochrana jímekovaného prostoru na počtek OT předpokládaný počet jímek cca 80 způsob jímekování je přinejmenším na dodavatek stavby s prodloužení doby pronájmu zařezaných čističů o 7 měsíců (211 dní) 2605 m2 (jímka u "Rondy") x 7 Kč/den x 211 dní 16235 cena dle cenové nabídky 6,4 Kč/m2, režie + zhl. 5+5% = 7,04 Kč/m2, započítáno 7 Kč 01.02.2023								
				31.08.2023	211			

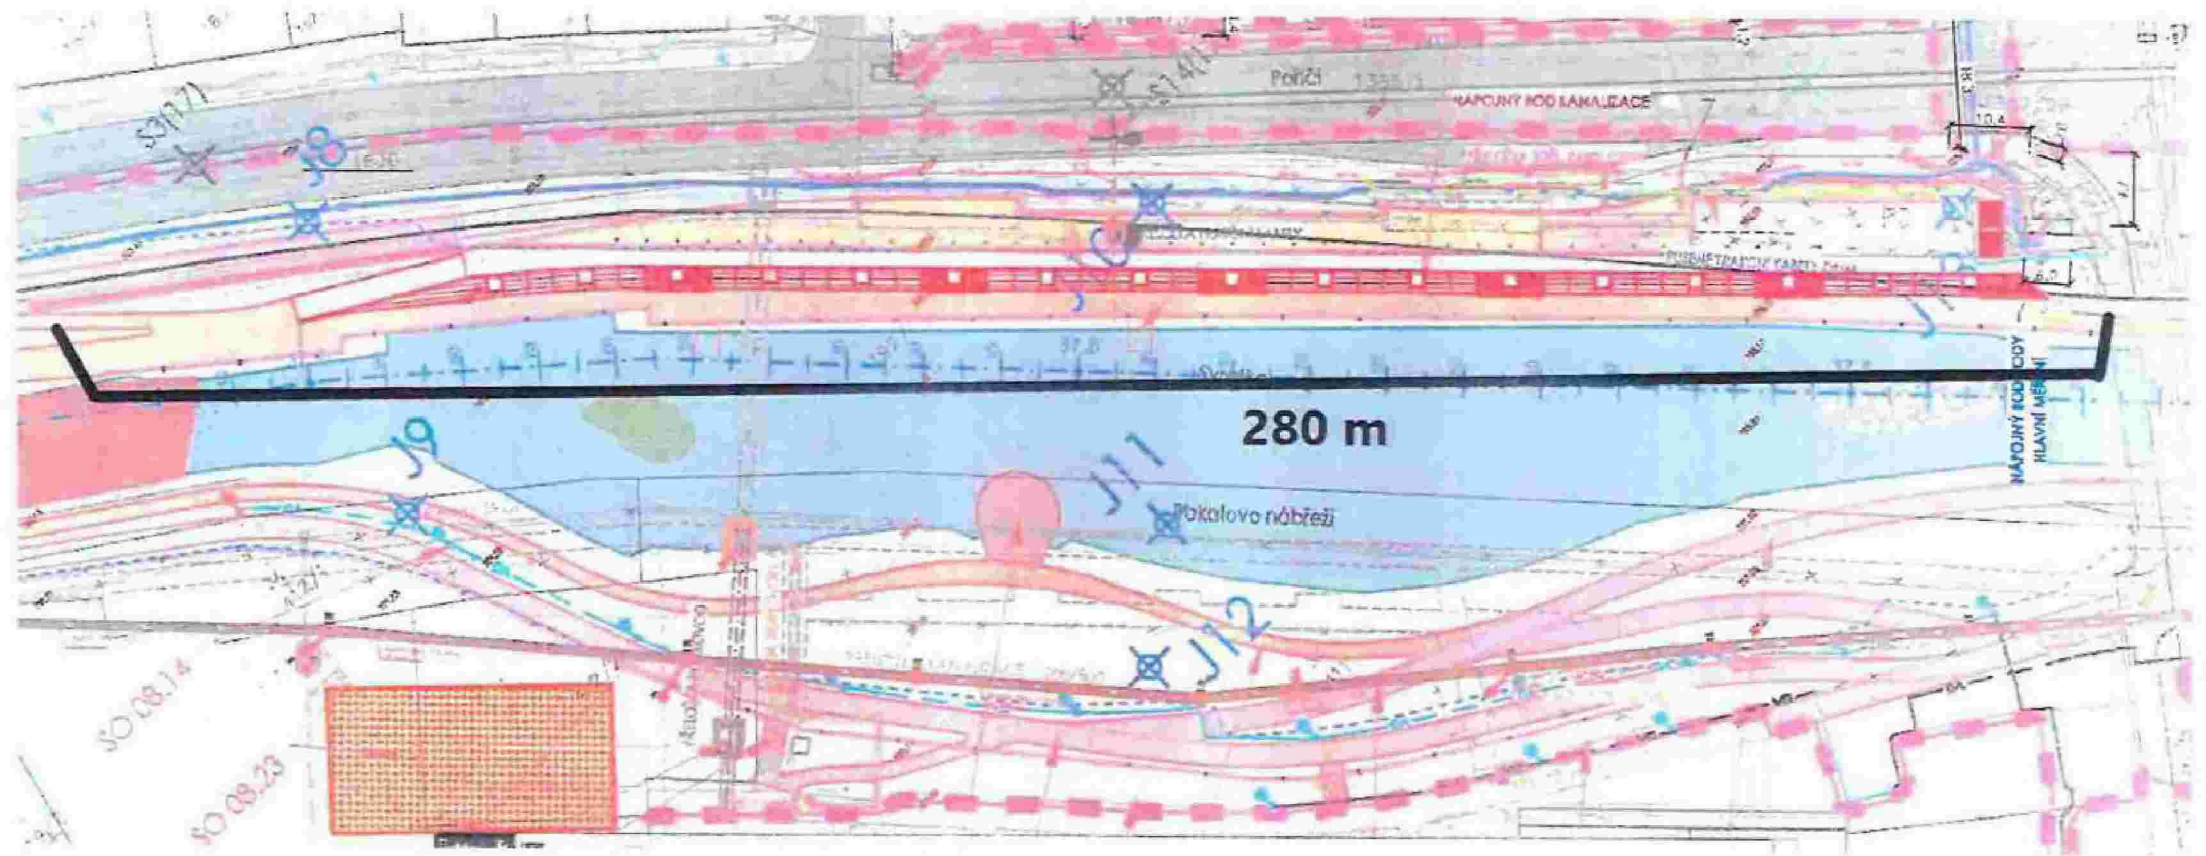

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII bulldary.online

DENÍK: SO 07.09 - KOLONÁDA V KM 37,475 - 37,728

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Jasno	17,9°C	0,0 mm/h	18:00	 Polojasno	34,1°C	0,0 mm/h
12:00	 Jasno	31,1°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
AARSLEFF CZ. s.r.o	3
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Pásové rypadlo CAT 45 t	AARSLEFF CZ. s.r.o	1	Zařízení pro beranění štětovnic Larsen	AARSLEFF CZ. s.r.o	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Pažení jímky ve st. 37,475 - 37,728	AARSLEFF CZ. s.r.o		
1) Beranění štětovnic Larsen			
2) Přeprava materiálu			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
 (Stavbyvedoucí)	

Dnešního dne byly práce na jímce ze štětovnic Larsen ukončeny.

Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Zamračeno	8,6°C	0,1 mm/h	18:00	 Polojasno	6,0°C	0,0 mm/h
12:00	 Zamračeno	9,4°C	0,1 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Kácení Šarapatka s.r.o.	8	OHLA ŽS, a.s.	6	ZNAKOM s.r.o.	6
				Intengroup	5

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Štěpkovačka větví	Kácení Šarapatka s.r.o.	1	Kolové rypadlo	Intengroup	1
Vyvážečka dřeva	Kácení Šarapatka s.r.o.	1	NA 8x4	Intengroup	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
1) Kácení stromů dle PD ve staničení 37,5-37,8 PB km	Kácení Šarapatka s.r.o.		
2) Štěpkování dřevní hmoty			
3) Odvoz dřevní hmoty			
Bourání kamenného opevnění úsek km 38,6 - 38,1	Intengroup		
Třídění, čištění lomového kamene			
1) Stavba buňkoviště	OHLA ŽS, a.s.		
1) Podpurné práce záboru (Etapa č.1)	ZNAKOM s.r.o.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR  (Koordinátor BOZP)

NÁZEV DODAVATELE Brněnské komunikace a.s.

Zápis koordinátora BOZP z kontrolní prohlídky stavby.

PŘÍLOHY

 6_PPO etapy VII a
....2.22.pdf PPO Svratka - Stav...02-
21.pdfAUTOR  (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

Zhotovitel upozorňuje na kolizní místa SO 07.03 s kanalizací a vodovodem a žádá o upřesnění PD u SO 08.04, podchycení zdi u hospice
Alžbětinky, viz zápis v příloze

PŘÍLOHY

 21.2.2022 kolizní
...08.04.pdf

Podpisy:

Matušík Petr


Od: [REDACTED]
Odesláno: 21. února 2022 12:28
Komu: Matušík Petr
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: PPO - Svratka

Dobrý den,

K níže uvedeným bodům:

1. **Kolize SO 07.03 pilotová stěna s vodovodem**
Dle obhlídky a vytyčení dochází ke kolizi. Dle poskytnutých podkladů od BVK je však vodovod v jiné poloze a nedochází tak ani ke křížení. Prosím o vyhotovení kopané sondy, která lokalizuje přesnou polohu vodovodu. Na základě sondy se stanoví další postup.
Zmenšení výkopu. Zde existuje varianta, že se změní výška převážky pilotové stěny. Zde je nutná konzultace s dodavatelem, jakou výšku převážky bude potřebovat z důvodu tahových kotev. Při zmenšení výšky dojde k prodloužení pilot, ale zmenší se potřebný výkop.
2. **Kolize SO 07.03 pilotová zeď s kanalizací.**
K této kanalizaci nejsou žádné podklady. Zřejmě se jedná o kanalizaci patřící ŘSD, protože je od uličních vpustí na komunikaci. Stěna této kanalizaci nedokáže uhnout, proto bude muset být odstraněna. Ve vzniklém – těsném – prostoru mezi pilotovou stěnou a komunikací pak bude muset být vedena kanalizace od vpustí, kabely VO a dojde nejspíš ke křížení s vodovodem. Nutné angažovat projektanta řešené části.
3. **Stěna u Alžbětinek**
Poloha protipovodňové stěny bude provedena v těsné blízkosti dle řezů. Při prozkoumání je to tak, že je rozdíl mezi katastrem a skutečnou polohou stěny.
Bylo by nejlepší plot zbourat, ale to bohužel nejde z důvodu památkově chráněné stavby. Tím pádem se bude muset stěna podchytit a sjednotit základovou spáru s novou protipovodňovou stěnou. Na základě zjištění stavu stěny navrhuji angažovat projektanta statika, k řešení dané problematiky.
4. **Železniční návěst**
Pokusíme se kontaktovat BVV a prokonzultovat to s nimi.

S pozdravem



From: [REDACTED]
Sent: Friday, February 18, 2022 3:23 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: PPO - Svratka

Dobrý den,

Dnes proběhlo na místě stavby za účasti AD pana [REDACTED] místní šetření ohledně kolizních míst a případných nejasností stavby. Z šetření posílám krátký zápis a fotodokumentaci přes úschovnu.
Prosím o vyjádření, jak dále postupovat v níže uvedených věcech.

1. **Kolize SO 07.03 pilotová zeď s vodovodem**
 - a. Ve staničení km 38,840- 38,750 je kolize s vodovodem DN800. Vodovod v souběhu cca 50m.
 - b. Dle vytyčení (foto) i ve výkrese je vidět, že v některých místech je vodovod pod obrubou. Při odkopání na úroveň založení převážky může dojít k jeho obnažení. Jak uvažuje projekt s jeho stabilizováním?

- c. Jak se celkově uvažuje se zabezpečením (pažení) prostoru pro budování převážek a při pojezdu vrtné soustavy proti sesunutí komunikace. Odkopání silnice bude přes 2m.

2. Kolize SO 07.03 pilotová zeď s kanalizací

Ve staničení km 38,840- 38,700 je kolize s kanalizací. Kanalizace v souběhu cca 100m.

3. Podchycení zděného plotu u Hospice a podchycení domu (garáže) katastrální číslo 765 (konec zdi) následná betonáž SO 08.04 opěrná zeď

Jakým stylem je plánováno podchycení základů (hřebíkování). Na stavbě byly provedeny sondy, kde je vidět, že někde je základ 30cm, někde se zdá, že je základ 1,6m, ale spoj mezi základem a plotem je nesoudržný a jde „rozhrabat klackem“

K jakému bodu je vztaženo vytyčení zdí. Na fotkách jsou vidět kolíky, kde je psáno např. 1,8m, což znamená odsazení zdí o 1,8m od stávajícího plotu, což je dle řezů špatně.

Není možné zděný plot zbourat? Četl jsem v TZ, že je památkově chráněn, ale pokud nebude nijak zavětrován směrem do Alžbětinek, mám obavy, že z podpěrného podbetonování se vyklopí do výkopů.

4. Železniční návěst v km 38,63 je třeba odstranit. Zástupci BVV s tímto nejsou seznámeni.



**Stavba: Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII**

Datum kontroly: 21.2.2022

**ZÁPIS KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENÍŠTI
Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
NA STAVENÍŠTI**

(dle zákona 309/2006 Sb., č. 262/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/05 Sb., NV č. 101/2005 Sb.)

- 1) V souladu s ustanovením příslušných právních předpisů koordinátor BOZP na staveništi vydává "Zápis z kontrolní prohlídky výše uvedené stavby."
- 2) Dne 21.2.2022 byl koordinátorem BOZP XXXXXXXXXX BKOM a.s., tel.: XXXXXX provedena kontrola uplatňování požadavků na BOZP na pracovišti převzaté zhotovitelem stavby Společnost „PPO nábřeží Svatky – Brno“, vedoucí projektu XXXXXXXXXX se zjištěním:
 - na staveništi probíhají kácení na Bakalovo nábřeží a demontážní práce na ul. Bauerova
 - zhotovitel předložil koordinátorovi BOZP:
 - analýzu rizik.....doplnit připomínky koordinátora BOZP
 - koordinátor předal zhotoviteli aktualizaci plánu BOZP a požaduje seznámení všech pracovníků, osob na staveništi a podepsání

Zaznamenal: Ing. Pavla Kasálková


1



2



3

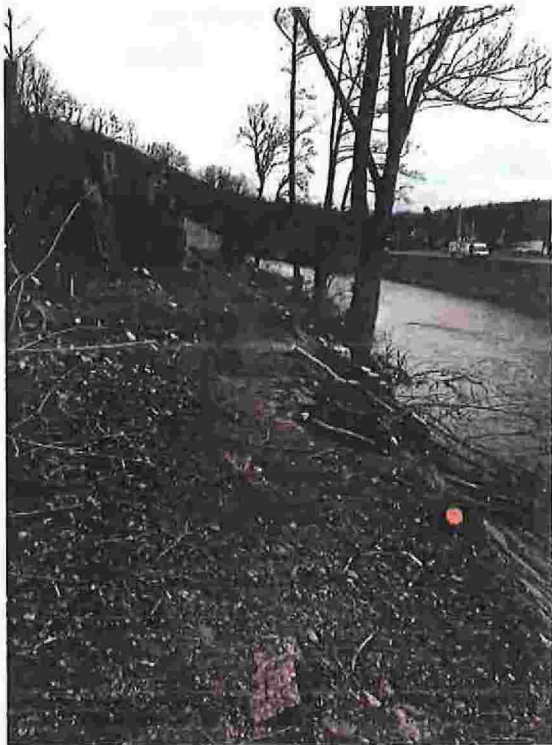

4




5



6



7

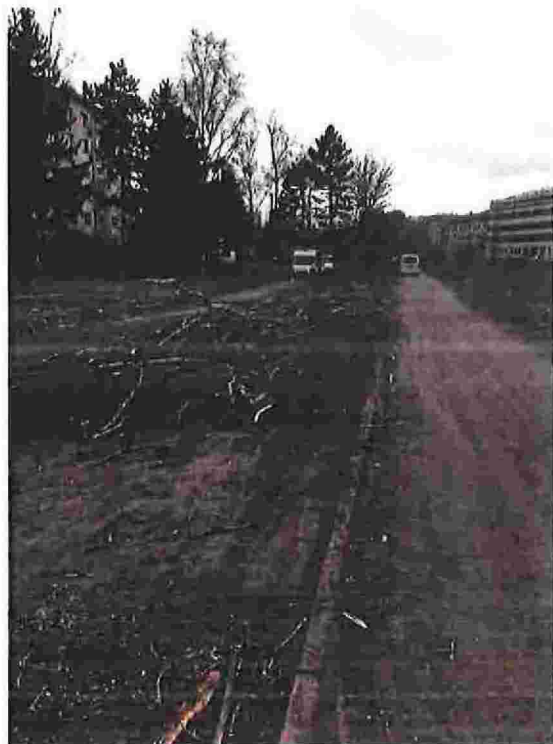

8



9




10



11



12

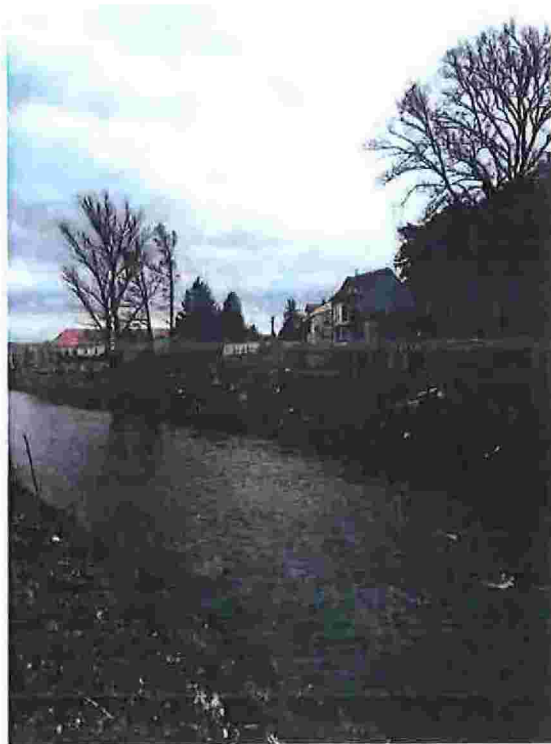

13



14




FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII bulldary.onlineDENÍK: SO 08.04 - PROTIPOVODŇOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA KM
38,235 - 38,540

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	3,5°C	0,0 mm/h	18:00	 Polojasno	8,9°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	9,7°C	0,0 mm/h				

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

 (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

Zhotovitel upozornil na nesrovnalosti v PD u SO 08.04 v únoru 2022 a to nesoulad výkresů PD s vytyčením zdi a potřebu zajištění stávající zdi u hospice, viz zápis z KD 1.3.2022. Do dnešního dne nebyl vydáno definitivní řešení této stavební části a předán rozdílový výkaz výměr k vypracování změnového listu. Práce zde nemohou být stále zahájeny.

S tímto problémem souvisí navazující objekt lávky SO 08.09a, cyklostezky, apod.

Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.onlineDENÍK: SO 08.04 - PROTIPOVODŇOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA KM
38,235 - 38,540

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	1,0°C	0,1 mm/h	18:00	 Zamračeno	9,5°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	9,3°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	7
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Dumper 6t	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	1	Lopatové pásové rypadlo 9 t	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MM	MM
Výkopové práce na obnažení základů v úseku oblast F, čištění obnažených základů od hlíny, základy jsou obnažovány v šachovnicovém pořadí, odvoz přebytečné zeminy na meziskládku, příprava na podchycení kari sítí	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR  (TDS)

NÁZEV DODAVATELE Brněnské komunikace a.s.

Provedena kontrola průběhu prací. Odkopané úseky základů z lomového kamene je nutné před připevněním Kari sítí důkladně očistit od zeminy a zbytků vegetace a to i včetně spar. Zdi z pálených cihel očistěte od zvětralé omítky.

PŘÍLOHY

IMG_20230220_140354.jpg

AUTOR  (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Dnešního dne byly započaty práce týkající se zpevnění stěny hospice sv. Alžběty stříkaným betonem dle předané a schválené projektové dokumentace.

Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.09 - KOLONÁDA V KM 37,475 - 37,728

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	☀ Jasno	17,9°C	0,0 mm/h	18:00	☁ Polojasno	34,1°C	0,0 mm/h
12:00	☀ Jasno	31,1°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENISTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
AARSLEFF CZ. s.r.o	3
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Pásové rypadlo CAT 45 t	AARSLEFF CZ. s.r.o	1	Zařízení pro beranění štětovnic Larsen	AARSLEFF CZ. s.r.o	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Pažení jímky ve st. 37,475 - 37,728	AARSLEFF CZ. s.r.o		
1) Beranění štětovnic Larsen			
2) Přeprava materiálu			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
██████████ (Stavbyvedoucí)	
Dnešního dne byly práce na jímce ze štětovnic Larsen ukončeny.	

Podpisy:

13.12.2022 AD zaslal zhotoviteli a TDI vytyčovací body a zapracoval některé připomínky. Zhotovitel požádal ještě o zapracování přesné polohy plánované lávky do výkresů. AD zašle upravenou DPS ke kontrole TDI do 20.12.2022 a TDI poté provede kontrolu.

Termín pro upravenou DPS včetně zapracované polohy plánované lávky: do 20.12.2022. Zodpovídá AD
10.1.2023 AD zaslal upravenou DPS zhotoviteli 9.1.2023, 12.1.2023 bude změna DPS zaslána TDI ke kontrole Zodpovídá AD

24.1.2023 Připomínky k DPS byly zapracovány. AD předá tištěnou verzi DPS v den konání KD a poté bude bod vypuštěn. Zodpovídá AD

14.2.2023 Změna DPS nebyla předána. Nový termín předání: 21.2.2023 Zodpovídá AD

7.3.2023 Byla odevzdána tištěná verze DPS. Probíhá kontrola TDI. Termín do: 21.3.2023

Zodpovídá AD

21.3.2023 Předložená tištěná verze neobsahovala zapracované všechny připomínky od TDI. AD svolá jednání k dořešení připomínek k této změně DPS za účasti TDI, KAM, AD, OI MMB. Zodpovídá AD

4.4.2023 Jednání k dořešení připomínek TDI proběhlo. Dle informací na KD AD připomínky TDI zapracuje a předání tištěné změnové DPS proběhne do 25.4.2023 Zodpovídá AD

18.4.2023 AD zapracuje připomínky TDI ke změnové DPS. Dále bude doplněno stanovisko ŘSD. Termín pro předání tištěné změnové DPS do : 25.4.2023. Zodpovídá AD

2.5.2023 Dokumentaci předá zhotovitel kompletní TDI ke kontrole do 16.5.2023. Zodpovídá zhotovitel

16.5.2023 Nebylo předáno. Dokumentaci předá zhotovitel kompletní do 23.5.2023. Zodpovídá zhotovitel

2. Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže (SO 08.04) ZM 006

1.3.2022 - Zhotovitel provedl kopané sondy u ohradní zdi areálu Alžbětinek pro zjištění stavu její základové konstrukce. Sondami bylo zjištěno, že v některých místech je základová konstrukce 30cm, někde se zdá, že je základ 1,6m, ale spoj mezi základem a plotem je nesoudržný a jde ho snadno i ručně odstranit. Z projektové dokumentace není možno získat informace k jakému bodu je vztaženo vytyčení zdi. Vytyčením v terénu bylo zjištěno, že poloha neodpovídá projektové dokumentaci. Tuto ohradní zeď není možné zbourat, jelikož je památkově chráněna, ale pokud nebude zajištěna např. „zavětrováním“ směrem do Alžbětinek, může dojít k jejímu sesuvu. Nelze proto tedy dodržet technické řešení navržené v projektové dokumentaci („hřebíkování“). V projektové dokumentaci je uvedeno, že v případě zjištění jiného stavu základových konstrukcí je nutné navrženou konstrukci přeposoudit. Projektant tedy svolá co nejdříve jednání za účasti statika společně se zástupci památkové péče a navrhne způsob zajištění ohradní zdi včetně způsobu provádění železobetonové stěny. Zodpovídá: projektant Termín: co nejdříve

15.3.2022 - Jednání neproběhlo – bude svoláno do 25.3.2022. Odpovídá: projektant

29.3.2022 - Projektant zpracoval způsob zajištění ohradní zdi a tento bude posouzen na svolaném jednání

dne 4.4.2022 v 13.00 hod na místě stavby za účasti zástupců projektanta, statika, zhotovitele a zástupce OPP MMB. Odpovídá: KAM

- Jednání proběhlo, zástupkyně OPP na místě informovala, že nesouhlasí s odstraňováním částí základové konstrukce ohradní zdi. Přivolaný statik prohlédl stav základové konstrukce v provedených kopaných sondách a sdělil, že své stanovisko předloží do 11.4.2022. Současně se projektant vyjádří i ke způsobu provádění opěrné stěny v místě odkloněné polohy od ohradní zdi. Stanovisko do dnešního KD nebylo předloženo.

26.4.2022 Projektant do 29.4.2022 předá na KAM návrh na úpravu hloubky založení opěrné stěny a následně vypracuje návrh na úpravu nivelity pěšiny vedoucí podél opěrné stěny. Odpovídá projektant
Projektant sdělil, že polohu opěrné stěny vůči hranici pozemku v KN je nutné dodržet, a proto navrhuje vyjmout ohradní zeď z památkové ochrany a následně ji odstranit. K této problematice bude ještě svoláno jednání. Zodpovídá: KAM

10.5.2022 Předání KAMu proběhlo, zatím elektronicky. 10.5. po KD bude předáno v tištěné podobě, KAM provede kontrolu. Nivelita pěšiny je upravena, je stanoven výchozí bod pro dřevěnou lávku a došlo k úpravě založení stěny. Zbývá řešit podchycení stávající stěny. Jsou 2 možnosti technického řešení, které AD zkonzultuje se zhotovitelem na schůzce po KD. Na příštím KD výsledek. Zodpovídá AD

24.5.2022 Zhotovitel nemá k dispozici finální verzi technického řešení – chybí řešení podchycení zdi. Dne 24.5.2022 proběhne schůzka na místě u Alžbětinek, bude řešeno odpamátování i případné podchycení zdi ze

strany u Alžbětinek. Odpamátňení zdi nebude mít vliv na samotné provádění stavby. Do 7.6. 2022 AD předloží návrh dokumentace včetně technického řešení zachycení a výkazu výměr. Zodpovídá AD

7.6.2022 Návrh technického řešení byl zhotoviteli zaslán v el. podobě, výkaz výměr bude vyhotoven do 14.6.2022. Poloha stěny zůstává dle původní DPS.

Zodpovídá AD

21.6.2022 Ve čtvrtek 23.6.2022 proběhne jednání na místě samém za účasti AD, zástupce zhotovitele a TDI ve věci dořešení statického zajištění stěny během provádění prací. Po tomto jednání proběhne schůzka se zástupcem konventu sester Alžbětinek k dořešení provádění stavby.

Ad informoval, že pohyb těžké mechanizace v areálu nebude možný. Výkaz výměr bude vyhotoven do 12.7.2022. Zodpovídá AD

12.7. 2022 Proběhlo jednání u Alžbětinek. Je připraveno technické řešení, které bylo předloženo i statikovi. Proběhla schůzka na odboru památkové péče MMB, jehož zástupce toto řešení odsouhlasil zatím pouze ústně. Pravděpodobně bude možný určitý zásah do stěny, aby se umožnilo provádění. Až zástupci památkové péče technické řešení obdrží v tištěné podobě, vznikne písemné vyjádření. Odboru památkové péče MMB bude technické řešení předáno do 15.7. 2022, po písemném odsouhlasení bude zpracován výkaz výměr.

Zodpovídá AD

26.7.2022 Technické řešení nebylo zástupcům památkové péče předáno. Bude předáno do 5.8.2022. Po písemném odsouhlasení bude zpracován výkaz výměr. Zodpovídá AD

9.8.2022 Nesplněno. Zástupcům památkové péče nebylo předáno. (AD obdržel podklady od statika a je třeba ještě dopracovat některé detaily řešení). Zhotovitel v této souvislosti upozornil, že technické řešení by měl obdržet ještě před předáním zástupcům památkové péče. Celkové technické řešení včetně statického řešení bude zhotoviteli předloženo do úterý 16.8.2022. Poté bude předáno zástupcům památkové péče.

Zodpovídá AD

23.8.2022 Nesplněno. Zástupcům památkové péče nebylo předáno, AD hledá takové technické řešení provedení opěrné stěny, aby nebylo nutné stávající ohradní zeď staticky zajišťovat. Zástupcům památkové péče bude předáno ihned po vzniku kompletní dokumentace. TDI požádal AD o předání dokumentace i výkazu výměr zhotoviteli ke kontrole ihned. Zodpovídá AD

6.9.2022 Nesplněno. 8.9.2022 proběhne schůzka se statikem. Termín zpracování dokumentace sdělí AD emailem po KD. Do 30.9.2022 bude hotová dokumentace pro podání na památkáře následně bude upravena dokumentace pro provedení stavby. Termín zpracování změny DPS doplní AD na KD 20.9.2022. Zodpovídá AD

20.9.2022 Dokumentace byla předána zástupcům památkové péče a slovně odsouhlasena, čeká se na písemné odsouhlasení. AD zpracuje do 4.10.2022 změnu DPS včetně výkazu výměr. Zodpovídá AD

4.10.2022 V den konání KD vloží AD dokumentaci (včetně výkazu výměr) na sdílené úložiště do složky k odsouhlasení. Písemné stanovisko zástupců památkové péče zatím nebylo předloženo. Zodpovídá AD

18.10.2022 Zhotovitel provedl kontrolu dokumentace a odsouhlasil ji. Zástupce TDI provede kontrolu dokumentace do technického dne 25.10.2022. Písemné stanovisko zástupců památkové péče zatím nebylo předáno. Zodpovídá: TDI za kontrolu změnové dokumentace AD za stanovisko zástupců památkové péče

1.11.2022 AD obdržel písemné souhlasné stanovisko zástupců památkové péče k sanaci zdi a provádění prací. Na základě připomínek TDI budou doplněny vytyčovací body na protipovodňové ŽB stěně. Zhotovitel neobdržel opravenou DPS zohledňující statické zabezpečení včetně rozdílového VV.

Termín pro zpracování připomínek: 8.11.2022. Výkaz výměr: 4.11.2022. Zodpovídá AD

15.11.2022 Došlo k optimalizaci výškového založení protipovodňové ŽB stěny (přiléhající k památkově chráněné stěně) - ze strany zpracovatele změny DPS. AD zapracuje posun paty opěrné zdi do změny DPS. AD informoval, že tato nová úprava DPS nevyžaduje souhlas zástupců památkové péče.

Termín zpracování změnové DPS (včetně zapracování předchozích připomínek TDI) a VV : 29.11.2022

Zodpovídá AD

29.11.2022 Nesplněno. Nový termín včetně VV : 2.12.2022 Zodpovídá AD

13.12.2022 Nesplněno. 19.12.2022 Proběhne schůzka v 10 hod na zařízení staveniště za účasti AD,TDI,OIEF, zhotovitel a KAM k dořešení VV tohoto objektu ve vztahu k soutěžnímu VV a dalším souvisejícím stavebním objektům.

Nový termín pro technické řešení: 16.12.2022 Zodpovídá AD

10.1.2023 Nesplněno. Nový termín: 24.1.2022 včetně VV Zodpovídá AD

24.1.2023 Dokumentace byla předložena a byly uplatněny připomínky ze strany zhotovitele. Ze strany TDI probíhá kontrola. Nový termín pro předání DPS včetně VV: 31.1.2023 Zodpovídá AD

14.2.2023 AD zpracoval změnu DPS. Proběhne kontrola TDI. Probíhá úprava VV Termín : chybí info od AD Zodpovídá TDI za kontrolu DPS, AD za VV

7.3.2023 Změna je zpracovaná bez oblasti G. Do 10.3.2023 proběhne schůzka AD se statikem, poté bude dokončena revize DPS. Termín pro revizi DPS, včetně VV: 21.3.2023 Zodpovídá AD

21.3.2023 AD obdržel potřebné podklady od svého statika pro zvýšení úrovně založení ŽB stěny a s tím spojené úrovně terénu a pěšiny v oblasti G, bylo zpracováno do DPS. Zbývající připomínky k DPS od TDI budou projednány na schůzce (společně s předchozím bodem ZM 004 + ZM 005), kterou svolá AD co nejdříve.

Zodpovídá AD

4.4.2023 Jednání k dořešení připomínek TDI proběhlo. Dle informací na KD AD připomínky TDI zpracuje a předání tištěné změnové DPS včetně oblasti G proběhne do 25.4.2023. Zodpovídá AD

18.4.2023 AD zpracuje připomínky TDI do DPS. Termín předání tištěné verze včetně oblasti G : do 25.4.2023

Zodpovídá AD

2.5.2023 Změnová DPS byla zaslána v elektronické podobě neúplná, TDI požádal AD aby byla předána i v elektronické podobě kompletní a zhotovitel požádal o přidání data do popisky. Změnová DPS v tištěné podobě včetně oblasti G bude předána zástupci KAM dne 3.5.2023. Kontrola příští KD. Zodpovídá AD

16.5.2023 Zhotovitel zaslal své připomínky k dokumentaci AD. TDI provede kontrolu dokumentace do

23.5.2023. Info na příštím KD. Zodpovídá AD za zpracování připomínek, TDI za kontrolu dokumentace

3. Kolize pilotové zdi se stávajícím plynovodem u viaduktu (SO 07.01) ZM 019

Dále zhotovitel upozornil na kolizi pilotové stěny SO 07.01 se stávajícím STL plynovodem. Pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti 1m než požaduje správce zařízení GaSNet. Zástupce projektanta sdělil, že v místě křížení je možné část pilot vynechat a provést pouze konstrukci převážky. Souběh plynovodu a pilotové stěny projektant prověřil. Zodpovídá: projektant Termín: do 26.4.2022

26.4.2022 Projektant předal vytyčovací body nové polohy pilotové stěny, s ohledem na požadovaný odstup 1 m od pevných konstrukcí. Projektant toto řešení projedná se správcem plynovodu. Zhotovitel požaduje v tomto kontextu i o prověření, zda nedochází ke kolizi i při ulici Rybářská s SO 07.27 (produktovod) a s SO 07.21 (přeložka plynu-lávka). Zodpovídá: projektant

10.5.2022 Byly poskytnuty nové vytyčovací body. Předání proběhne 10.5.2022 po KD. Mění se pouze poloha stěny, délka i ostatní tech. řešení včetně výkazu výměr se nemění.

AD prověřil možnou kolizi SO 07.27 a SO 07.21 s pilotovou stěnou a uvádí, že toto řešení bylo f. GASNet předloženo během zpracování projektové dokumentace a bylo f. GASNet odsouhlaseno.

24.5.2022 Zhotovitel žádá o prověření, zda u pilotové stěny S 07.01 je požadavek na převrtávané piloty. AD prověřil a výsledek oznámí zhotoviteli.

Dále zhotovitel požaduje předložit vyjádření f. Gasnet ke křížení plynovodu s pilotovou stěnou. Nejedná se o nové křížení – dle AD není třeba řešit s f. Gasnet. AD předá vyjádření firmy EMH servis, které vyloučí nutnost úpravy křížení. Kontrola na příštím KD. Zhotovitel požaduje předložit detail křížení pilotové stěny (převážky) s plynovodním potrubím. Zodpovídá AD

7.6.2022 Křížení bylo řešeno s projektantem plynovodu. Prověřuje se nutnost osazení dělené chráničky na plynovod s přesahem 1 m na každou stranu pilotové stěny. AD sdělí info do 14.6.2022

Převrtávané piloty – AD čeká na informace od firmy Šindlar dle AD pravděpodobně nebude nutnost převrtávaných pilot, info do 14.6.2022. Zodpovídá AD

21.6.2022 křížení a osazení dělené chráničky bylo řešeno s firmou Gasnet, písemné vyjádření bude do 27.6.2022 – AD zašle TDI a zhotoviteli.

AD sdělil, že převrtávané piloty nejsou nutné – je třeba zpracovat změnu DPS. Proběhne změna u převážek na základě, které zhotovitel objedná výztuže, v této souvislosti zástupce zhotovitele upozorňuje, že výztuže je potřeba objednat nejpozději 3 týdny před vlastním zahájením prací. Plán zahájení prací je 11.7.2022. AD potvrdil zpracování změny do 27.6.2022 Zodpovídá AD

AD

12.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do příštího KD, který proběhne 26.7.2022.

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika. Zodpovídá AD

26.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do 5.8.2022

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika – nesplněno. Termín do 5.8.2022.

Zodpovídá AD

9.8.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Urgence AD.

Změna DPS – převrtávané piloty. Dokumentace nebyla předána a bude zaslána neprodleně po KD.

Zodpovídá AD

23.8.2022 Vyjádření od Gasnetu bylo zhotoviteli zasláno 19.8.2022.

24.1.2023 Vzniklé technické řešení bylo odsouhlaseno provozem BVK. Celkové technické řešení je potřeba ještě doplnit o založení objektu zaústění vodovodu – AD řeší se statikem. Termín pro technické řešení včetně založení objektu zaústění vodovodu: 7.2.2023
Zodpovídá AD

14.2.2023 Technické řešení nebylo předáno. Dokumentace bude odevzdána s vynechaným prostorem pro zaústění vodovodu do: 28.2. 2023. Na tuto dokumentaci naváže dokumentace vodárenského objektu.

7.3.2023 Dokumentace byla předána, bude vložena na sdílené úložiště. Změna bude bez VV. Chybí vytyčovací body stěny. Dokumentace na vynechaný vodovod bude řešena samostatně změnou 022.03., tato část bude VV obsahovat. AD nesdělil termín pro dopracování.
Zodpovídá AD

21.3.2023 vytyčovací body nebyly předány, budou zaslány v den konání KD. Dle vyjádření zhotovitele chybí ve VV výkopy – AD tuto skutečnost prověří. Info na příštím KD.
Zodpovídá AD

4.4.2023 Vytyčovací body byly vloženy na sdílené úložiště, zhotovitel provede kontrolu. Chybějící výkopy – chybí info. Přítomný zástupce AD nebyl obeznámen zda kontrola proběhla a tedy účastníci KD nebyli informováni. Zodpovídá zhotovitel za kontrolu vytyčovacích bodů, AD za prověření výkopů ve VV

18.4.2023 Zhotovitel provedl kontrolu vytyčovacích bodů a dle jeho vyjádření jsou podklady dostačující. VV pro ZM 038 a ZM039 bude sloučen. ZM038 bude změna DPS bez dopadu do VV. Chybějící výkopy AD zapracuje do sloučeného VV.
Zodpovídá AD

2.5.2023 Přípomínky TDI k dokumentaci zaslal AD svému statikovi. Budou zapracovány do 9.5.2023. Změna DPS je bez dopadu do VV.

Zodpovídá AD

16.5.2023 Nesplněno. Nebylo předáno. Bude předáno do 23.5.2023

Zodpovídá AD

30.5.2023 AD zapracoval do DPS připomínky TDI, v den konání KD bude dokumentace se zapracovanými připomínkami zástupce TDI předána.
Zodpovídá AD

6. Změna DPS objektu pilotové stěny za kolonádou SO 07.01 ZM 034

21.6.2022 V tomto týdnu proběhlo jednání na místě samém za účasti statika. Ve staničení 37,65 – 37,84 nelze provádět vrtání pilot ani z VMO ani z koryta řeky. Bude zpracováno technické řešení umožňující provádět vrtání pilot z VMO.
Zodpovídá AD

12.7. 2022 Info AD: Pilotová stěna za kolonádou se dá realizovat ze strany VMO dle odevzdané revize 01 od mostu Renneská po proudu řeky, a to ve staničení 37,47 – 37,65 říčního toku. Ve staničení 37,65 po 37,84 bude provedení upřesněno, ale nejspíš bude nutné provádět práce ze strany vodního toku na násypu.

AD zpracuje technické řešení ve staničení 37,65 po 37,84 co nejdříve.
Zodpovídá AD

26.7.2022 Technické řešení ve staničení 37,65 – 37,84 zatím nebylo zpracováno. Změna bude zpracována co nejdříve.
Zodpovídá AD

9.8.2022 AD informoval, že práce ve staničení 37,65 – 37,84 bude nutné provádět z koryta řeky. K této problematice v příštím týdnu proběhne schůzka AD a zhotovitele na místě samém, na základě, které AD na příštím KD sdělí, do kdy bude zpracována změna DPS.
Zodpovídá AD

23.8.2022 Proběhla schůzka AD a zhotovitele na místě. AD požaduje od zhotovitele dopřesnění technologie provádění zajištění, na základě tohoto dopřesnění bude proveden statický výpočet a následně do 3 týdnů zpracováno technické řešení.
Zodpovídá zhotovitel a AD

6.9.2022 Ve čtvrtek proběhne jednání se statikem, na základě, kterého bude zpracována změna DPS. Dojde k úpravě osy pilotové stěny, část bude řešena pomocí násypu v korytě řeky. Změna DPS u objektu pilotové stěny za kolonádou bude odevzdána ve dvou krocích. Revidovaná dokumentace do 4.10.2022 a doplněná dokumentace pro zajištění do 11.10.2022. Staničení, ve kterém bude řešeno násypem a kde z koryta řeky doplní AD na KD 20.9.2022.
Zodpovídá AD

20.9.2022 Revidovaná dokumentace do 4.10.2022 a doplněná dokumentace pro zajištění do 11.10.2022. Ve staničení 37,65-37,72 bude provádění prací řešeno násypem a práce budou probíhat z VMO. Zodpovídá AD
4.10.2022 Revidovaná dokumentace bude vložena na úložiště dnes po KD a doplněná dokumentace pro zajištění bude doplněna do 11.10.2022. Poté bude předáno zhotoviteli v tištěné podobě. Kontrola na příštím KD.
Zodpovídá AD

18.10.2022 Zhotovitel opakovaně požádal doplnění změnové dokumentace. Přípomínky k dokumentaci budou s AD projednány na technickém dni 25.10.2022
Zodpovídá AD

1.11.2022 Chybí stanovisko AD. AD projednával změnu se statikem a je potřeba do řešení ještě zapracovat zajištění svahu a způsob provádění prací. Na kontrolním dni AD sdělil, že nelze stanovit termín vyhotovení změnové DPS – chybí info od statiků. Info na příštím KD.

Termín zpracování DPS: chybí info

Zodpovídá AD

15.11.2022 Termín zpracování DPS včetně VV: 29.11.2022

Zodpovídá AD

29.11.2022 Nesplněno. Nový termín včetně VV: 9.12.2022.

Zodpovídá AD

13.12.2022 Změna DPS je zpracována a AD ji dnes zašle ke kontrole. VV bude dořešen na schůzce 19.12.2022 na zařízení staveniště. Termín pro zaslání DPS ke kontrole: 13.12.2022
Zodpovídá AD

10.1.2023 Nesplněno. Změna DPS nebyla zaslána. Nový termín pro zaslání změny včetně VV: 17.1.2023
Zodpovídá AD

24.1.2023 Změna DPS je vložena na sdíleném úložišti. V den konání KD AD zaslal zhotoviteli VV ke kontrole, podle vyjádření zhotovitele ale není předložené řešení proveditelné. To bude řešeno 31.1.2023 na technickém dni za účasti AD, zhotovitele a TDI.
Zodpovídá AD

14.2.2023 Budou dořešeny technické detaily způsobu provádění prací mezi AD a zhotovitelem. Termín pro předání změny DPS pro celý usek: 24.2.2023

7.3.2023 V místě navrženého převrtávání stávající nábrežní stěny vznikne nové technické řešení. Tento týden proběhne k tomuto řešení schůzka se statikem AD. Termín pro odevzdání kompletní revize DPS včetně VV do: 9.5.2023

Zhotovitel upozornil, že dlouhé prodlevy v odevzdávání dokumentace budou mít výrazný dopad do posunu celkového termínu stavby.

Info k technickému řešení na příštím KD.

Zodpovídá AD

21.3.2023 AD zpracovává změnovou DPS. Na příštím KD bude AD informovat o postupu projekčních prací.

Termín pro odevzdání změnové DPS : 9.5.2023.

Zodpovídá AD

4.4.2023 Zástupce AD na KD potvrdil termín odevzdání změnové DPS do 9.5.2023.

Zodpovídá AD

18.4.2023 Termín pro odevzdání změnové DPS trvá. Do 9.5.2023

Zodpovídá AD

2.5.2023 Termín odevzdání změnové DPS trvá : 9.5.2023. Na KD přítomný zástupce AD přislíbil, že k vzniklému technickému řešení bude svoláno jednání za účasti AD, TDI, zhotovitel ještě před odevzdáním změnové DPS.
Zodpovídá AD

16.5.2023 12.5.2023 proběhlo jednání k navrženému technickému řešení. Řešení bylo odsouhlaseno, ale je potřeba ještě drobná úprava u zdi za kolonádou a AD předá změnu DPS do cca 3 týdnů : 6.6.2023

Zhotovitel upozornil, že se jedná o další posun termínu realizace prací a že pozdní zpracování této změny DPS bude mít dopad do termínu a případných vícenákladů. Dále zhotovitel upozornil, že tato změna DPS musí obsahovat i řešení pro ZM 022.03.

30.5.2023 Do 6.6.2023 bude předaná změnová DPS ke kontrole. V místě má dojít k demontáži veřejného osvětlení. Zhotovitel požádal na KD zástupce AD, aby demontáž projednal se správcem VO. AD svolá jednání s TSB a zhotovitelem na místě samém.
Zodpovídá AD

7. Změna DPS u objektů: Most ev.č. BM-522 Renneská přes Svratku, Lávka ev.č. BM-689 Vídeňská, Most ev.č. BM-024 Vídeňská přes Svratku ZM 039

-Na základě jednání, které proběhlo dne 19.7. 2022 za přítomnosti zástupců zhotovitele, TDI, Bkom a statika bylo zjištěno, že výše uvedené objekty vyžadují změnu DPS.

-Most ev.č. BM-522 Renneská přes Svratku

-Lávka ev.č. BM-689 Vídeňská – Poříčí

-Most ev.č. BM-024 Vídeňská přes Svratku

-u těchto objektů je třeba snížit hloubku základové spáry.

Zodpovídá AD

9.8. 2022 Na základě konzultace se statikem došlo k úpravě tvaru opěrných zídek, hloubky založení zídek, statickému posouzení. U Mostu na Vídeňské bude potřeba zmenšit patu, protože zasahuje do základu mostní konstrukce, poté bude vyhotovena revize výkresů. Dokumentaci bude poté nutné projednat se správcí mostních objektů. Revize výkresu na opěrné bude provedena do 5.9.2022.

Zodpovídá AD

23.8.2022 Trvá. Revize výkresů na opěrné zdi provedena do 5.9.2022

Zodpovídá AD

6.9.2022 Změna DPS byla zpracována, zbývá dopracovat výkaz výměr. Bude vloženo na sdílené úložiště k odsouhlasení zhotovitelem.

Za vložení zodpovídá KAM, za výkaz výměr AD, za odsouhlasení změny DPS zhotovitel

20.9.2022 AD zpracoval výkaz výměr, se kterým zhotovitel nesouhlasil, zhotovitel požádal o kontrolu položek. Dále zhotovitel požaduje od AD doplnit do dokumentace statický výpočet a řezy zdí i s výkopy (u všech mostních objektů), na jeho základě pak zhotovitel zpracuje VTD.

Zodpovídá AD

4.10.2022 Podle vyjádření zhotovitele jsou ve výkresech nesrovnalosti (výšky, základová spára atd.) a požádal AD o kontrolu těchto výkresů. AD požaduje po zástupcích zhotovitele sondáž Novosadského mostu. Kontrola na příštím KD.

Zodpovídá AD

18.10.2022 zhotovitel zasílal AD jeho připomínky k dokumentaci. Zatím nebyly zapracovány a AD ještě potřebuje doplňující informace od statika. Změnová DPS mostních objektů bude řešena na technickém dni 25.10.2022. Info na příštím KD

Zodpovídá AD



Štětovnicová stěna - Kolonáda - přehled beranících protokolů

Datum:	plocha [m2]
27.05.2022	177,30
28.05.2022	130,20
29.05.2022	44,16
30.05.2022	133,08
31.05.2022	102,90
09.07.2022	117,60
10.07.2022	81,00
11.07.2022	65,10
12.07.2022	71,70
13.07.2022	27,00
18.07.2022	64,80
19.07.2022	119,70
20.07.2022	91,20
21.07.2022	148,80
22.07.2022	118,80
23.07.2022	108,00
24.07.2022	97,20
25.07.2022	38,40
26.07.2022	151,20
27.07.2022	65,40
01.08.2022	81,60
02.08.2022	129,60
02.08.2022	54,00
03.08.2022	89,40
04.08.2022	178,20
04.08.2022	64,80
05.08.2022	54,60
Celkem plocha:	2605,74

[illegible]

177,30 m2

The diagram illustrates a two-dimensional lattice structure. It consists of a grid of points. Arrows indicate interactions between nearest and next-nearest neighbors. The lattice is labeled with 'a' for the nearest neighbor distance and 'b' for the next-nearest neighbor distance.

130,20 m2

130,20 m2

[illegible]

44,16 m2


Figure 1 is a 3D bar chart titled 'Distribution of the number of children per woman by country'. The x-axis is labeled 'Number of children' and ranges from 0 to 6. The y-axis is labeled 'Percentage of women' and ranges from 0 to 100. The z-axis represents different countries, with bars colored in shades of blue and green. The chart shows that for most countries, the majority of women have 4 or 5 children. For example, in the United States, approximately 40% of women have 4 children and 30% have 5 children. In contrast, in some countries like India, the distribution is more spread out, with a significant portion of women having 2 or 3 children.

133,08 m2

133.08 m2

102,90 m2

102,90 m2

Stavba: Project:	Brno - Svatka ězakázky 410027	Objednatel: Contractor:	Společnost „PPO nábeží Svatky - Brno“
		Smlouva ě.: Contract No.:	301498/M240/006.00/ DOD00175684
Beraníí souprava: Piling rig:	Movax SG 75	Objekt: Part of build:	Komora 3
Datum instalace ťetovnice: Date of driving:	09.07.2022	Stavbyvedoucí objednatel: Site manager of contractor:	
Výška terénu [m n. m.]: Ground level:		Stavbyvedoucí zhotovitele: Site manager of subcontractor:	
		Protokol vyhotovil: Completed by:	

[illegible]

117,60 m2

81,00 m2

100

komora 3	1	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
DHL-žs	2	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	3	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	4	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	5	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	6	7,50	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	7	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	8	7,50	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	9	7,50	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	10	7,50	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	11	7,50	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	12	7,50	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	13	7,50	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	14	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	15	7,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-


65,10 m2

Stavba: <i>Project:</i>	Brno - Svatka č. zakázky 410027	Objednatel: <i>Contractor:</i>	Společnost „PPO náběží Svatky – Brno“
		Smlouva č.: <i>Contract No.:</i>	301498/M240/006.00/ DOD00175684
Beraníci souprava: <i>Piling rig:</i>	Movax SG 75	Objekt: <i>Part of build:</i>	Komora 3
		Stavbyvedoucí objednatel: <i>Site manager of contractor:</i>	
Datum instalace štetovnice: <i>Date of driving:</i>	12.07.2022	Stavbyvedoucí zhotovitele: <i>Site manager of subcontractor:</i>	
Výška terénu [m n. m.]: <i>Ground level:</i>		Protokol vyhotovil: <i>Completed by:</i>	

71,70 m2

[illegible]

27,00 m2

Stavba: <i>Project:</i>	Brno - Svatka č.zakázky 410027	Objednatel: <i>Contractor:</i>	Společnost „PPO nábreží Svatky – Brno“
		Smlouva č.: <i>Contract No.:</i>	301498/M240/006.00/ DOD00175684
Beraníci souprava: <i>Piling rig:</i>	Movax SG 75	Objekt: <i>Port of build:</i>	Komora 3
Datum instalace stětovnice: <i>Date of driving:</i>	18.07.2022	Stavbyvedoucí objednatel: <i>Site manager of contractor:</i>	
Výška terénu [m n. m.]: <i>Ground level:</i>		Stavbyvedoucí zhotovitele: <i>Site manager of subcontractor:</i>	
		Protokol vyhotovil: <i>Completed by:</i>	

[illegible]64.80 m²

[illegible]

119,70 m2

[illegible]

91,20 m2

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	~65%
30-49	~75%
50-69	~80%
70+	~85%


		[m]			[m]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]	
komora 3	1	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
OHL-ŽS	2	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	3	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	4	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	5	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	6	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	7	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	8	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	9	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	10	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	11	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	12	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	13	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	14	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	15	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	16	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	17	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	18	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	19	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	20	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	21	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	22	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	23	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	24	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	25	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	26	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	27	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	28	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	29	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	30	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	
	31	8,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-	

148,80 m2

Stavba: <i>Project:</i>	Brno - Švratka č.zakázky 410027	Objednatel: <i>Contractor:</i>	Společnost „PPO náběží Švratky – Brno“
Beraníci souprava: <i>Piling rig:</i>	Movax SG 75	Smlouva č.: <i>Contract No.:</i>	301498/M240/006.00/ DOD00175684
Datum instalace štetovnice: <i>Date of driving:</i>	22.07.2022	Objekt: <i>Part of build:</i>	Komora 3
Výška terénu [m n. m.]: <i>Ground level:</i>		Stavbyvedoucí objednatele: <i>Site manager of contractor:</i>	
		Stavbyvedoucí zhotovitele: <i>Site manager of subcontractor:</i>	
		Protokol vyhotovil: <i>Completed by:</i>	

[illegible]

118,80 m2


[illegible]

108,00 m2

Age Group	Percentage of respondents
18-29	65%
30-49	75%
50-69	80%
70+	85%

komora 3	1	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
DHL-25	2	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	3	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	4	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	5	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	6	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	7	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	8	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	9	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	10	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	11	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	12	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	13	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	14	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	15	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	16	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	17	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-
	18	9,00	GU18 S	S270GP	0,6	-	-	-

97,20 m2

Stavba: Project:	Brno - Svratka č. zakázky 410027	Objednatel: Contractor:	Společnost „PPO nábřeží Svratky – Brno“
		Smlouva č.: Contract No.:	301498/M240/006.00/ DOD00175684
Beraníci souprava: Piling rig:	Movax SG 75	Objekt: Part of build:	Komora 3 
Datum instalace štětovnice: Date of driving:	25.07.2022	Stavbyvedoucí objednatel: Site manager of contractor:	
		Stavbyvedoucí zhotovitele: Site manager of subcontractor:	
Výška terénu [m n. m.]: Ground level:		Protokol vyhotovil: Completed by:	

[illegible]

38,40 m2

[illegible]

151,20 m2

Stavba: <i>Project:</i>	Brno - Svratka Č.žakázky 410027	Objednatel: <i>Contractor:</i>	Společnost „PPO nářezí Svratky – Brno“
		Smlouva č.: <i>Contract No.:</i>	301498/M240/006.00/ D0D00175684
Beraníci souprava: <i>Piling rig:</i>	Movax SG 75	Objekt: <i>Part of build:</i>	Komora 3
Datum instalace štětovnice: <i>Date of driving:</i>	27.07.2022	Stavbyvedoucí objednatel: <i>Site manager of contractor:</i>	
Výška terénu [m n. m.]: <i>Ground level:</i>		Stavbyvedoucí zhotovitele: <i>Site manager of subcontractor:</i>	
		Protokol vyhotovil: <i>Completed by:</i>	

[illegible]

65,40 m2

[illegible]81,60 m²

Stavba:	Brno - Svratka č.zakázky 410027	Objednatel:	Společnost: P. P. n. s. r. o.
Project:		Smlouva č.:	301458/M240/006.00/
Beranič souprava:	Movax S6 75	Objekt:	Komora 3
Piling rig:		Stavbyvedoucí objednatel:	
Datum instalace štětovnice:	02.08.2022	Stavbyvedoucí zhotovitel:	
Výška terénu [m n. m.]:		Stavbyvedoucí odborný inženýr:	
		Protokol vyhotovil:	


129.60 m2

[illegible]

54,00 m2

[illegible]

178,20 m2

Stavba: Project:	Brno - Svatka č.zakázky 410027	Objednatel: Contractor:	Společnost „PPC“ nábreží Svatky – Brno
Beraníci souprava: Piling rig:	Movax SG 75	Smlouva č.: Contract No.:	301498/M240/006.00 DOD00175684
Datum instalace štetovnice: Date of driving:	04.08.2022	Objekt: Part of build:	Komora 3
Výška terénu [m n. m.): Ground level:	vyřahovanie -komora 3	Stavbyvedouci objednatel: Site manager of contractor:	
		Stavbyvedouci zhotovitele: Site manager of subcontractor:	
		Protokol vyhotovil: Completed by:	

64,80 m2

[illegible]54,60 m²

Stránka 1

Stránka 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/15
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII - změny

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH	4 984 900,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 984 900,00	1 046 829,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 031 729,00
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/15

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII - změny

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 984 900,00	6 031 729,00
005	zřízení a likvidace ZS	4 984 900,00	6 031 729,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII - změny

Objekt:

005 - zřízení a likvidace ZS

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 984 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 130 670,00

D 1 Zemní práce 3 510 670,00

1	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	420,000	280,00	117 600,00
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000	45,10	54 120,00

vv "sjezdy do koryta" 6*50*4 1 200,000

3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10 600,000	74,90	793 940,00
---	---	-----------	---	---	------------	-------	------------

vv "kanalizace" 2*(1100+200) 2 600,000

vv "revitalizace" 2*3000 6 000,000

vv "objekty na kanalizaci" 25*50 1 250,000

vv "zabezpečení buňkoviště" 250*3 750,000

vv Součet 10 600,000

4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10 600,000	50,60	536 360,00
---	---	-----------	--	---	------------	-------	------------

5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	5 250,000	248,40	1 304 100,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------

vv "likvidace sjezdů do koryta" 6*50*(7+0)/2*5 5 250,000

6	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5 250,000	88,90	466 725,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

7	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných	m3	5 250,000	35,60	186 900,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5 250,000	9,70	50 925,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 550 400,00

9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 200,000	242,60	291 120,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------

10	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžitého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	420,000	306,00	128 520,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

vv "buňkoviště" 40*6 240,000

vv "přijezdy a sjezdy ze staveniště" 2*30*3 180,000

vv Součet 420,000

11	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus	28,000	4 670,00	130 760,00
----	---	----------	--------------------------------	-----	--------	----------	------------

vv 420/(3*1,25)/4 28,000

D 997 Přesun sutě 69 600,00

12	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	348,000	200,00	69 600,00
----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 854 230,00

D VRN3 Zařízení staveniště 854 230,00

13	K	032103000	Náklady na stavební buňky - montáž buňkoviště	...	430 000,000	1,00	430 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------------	------	------------

vv "hlavní buňkoviště 20 buněk, 3 x sklad, 2x schodiště" 295000 295 000,000

vv "díleči buňkoviště 2*3 buňky, 3x2 buňky" 2*30000+3*25000 135 000,000

vv Součet 430 000,000

14	K	032103001	Náklady na stavební buňky - demontáž buňkoviště	...	263 750,000	1,00	263 750,00
----	---	-----------	---	-----	-------------	------	------------

vv "hlavní buňkoviště 20 buněk, 3 x sklad, 2x schodiště" 185000 185 000,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "dílčí buňkoviště 2*3 buňky, 3x2 buňky" 2*15000+3*10000		60 000,000		
			W "likvidace přípojek" 50*100+2500+5*500+35*250		18 750,000		
			W Součet		263 750,000		
15	K	033103000	Připojení energií - přípojka elektro	...	65 000,000	1,00	65 000,00
			W 50*800 "přípojka		40 000,000		
			W 10000" úprava rozvaděčů		10 000,000		
			W 10000" revize		10 000,000		
			W 5000"montáž sloupu		5 000,000		
			W Součet		65 000,000		
16	K	033103001	Připojení vody, kanalizace	...	95 480,000	1,00	95 480,00
			W 5*3346"kanalizace		16 730,000		
			W 35*2250"vodovod		78 750,000		
			W Součet		95 480,000		



**Pojistná smlouva č. 7721150155
pro stavební a montážní pojištění budovaného díla
„Nábřeží řeky Svatky-Realizace protipovodňových opatření města
Brna-etapy VII a VIII“**

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Brno, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00, Slatina, Česká republika

IČO: 463 42 796

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

(dále jen „pojistník“)

zastoupený: Ing. Roman Kocůrek, generální ředitel a 1. místopředseda představenstva

Paolo Bee, MBA, finanční ředitel a 2. místopředseda představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

PS ASSISTANCE s. r. o.

se sídlem: Pražákova 888/66b, 639 00 Brno, Česká republika

IČO: 255 80 736

tel.: [REDACTED]

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele je totožná s výše uvedenou adresou samostatného zprostředkovatele.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení
pojišťovacího makléře

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) **Objednatel: Statutární město Brno, se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno, 602 00, IČO: 44992785**
 - b) **Zhotovitel: Společnost PPO nábreží Svatky-Brno.**
Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00, Slatina, IČO: 463 42 796,
Společník:
 - **HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5, 150 00, IČO: 46678468**
 - **FIRESTA-Fíšer, rekonstrukce stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, Brno 602 00, IČO: 25317628**
 - c) **Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21.**
2. **Počátek pojištění: 10. 1. 2022**
3. **Konec pojištění: 31. 7. 2024, včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku.**
4. **Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21.**
5. **Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/21 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.**

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: „Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ – dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.**
2. **Místo pojištění je staveniště: : k.ú. Pisárky, Staré Brno a Štýřice, po obou březích Svatky až po Riviéru, km 37,055-39,990, dále dle smlouvy o dílo.**
3. **K pojištění se vztahují:**
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (dále jen „VPP P-777/21“)

a

Doložky

D 002	Křížová odpovědnost (2101)
D 004	Rozšířené pojištění záruční doby (2101)
D 006	Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (2101)
D 011, D 114	Sériové škody (2101)
D 102, D 208	Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101)
D 106	Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101)
D 107, D 207	Podmínka pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101)
D 108	Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (2101)
D 109	Podmínka pro skladování materiálu (2101)
D 110, D 221	Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101)
D 111	Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy (2101)
D 112, D 206	Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101)
D 115	Pojištění rizika projektanta (2101) - 50 mil. Kč
D 116	Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (2101)
D 117, D 217	Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101)
D 119	Stávající majetek (2101)
D 120	Chvění, odstranění nebo zeslabení nosného prvku (2101) - 5 mil. Kč
D 200	Riziko výrobce (2101) - 1 mil. Kč
D 202	Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (2101)
D 250	Odcizení (2101)
DCE 4	Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (2101)

4. Přehled sjednaných pojištění

4.1. Oddíl I. – Pojištění věci

Poř. číslo	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ¹⁾
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	1 258 500 000,- ²⁾	200.000,- Kč
	1.1. Cena dle smlouvy o dílo	1 258 500 000,- ²⁾	
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem	Není předmětem pojištění	
2.	Stávající majetek ⁴⁾	50.000.000,- ³⁾	200.000,- Kč
3.	Zařízení a vybavení staveniště ⁴⁾	5.000.000,- ³⁾	20.000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ⁴⁾	10.000.000,- ³⁾	20.000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ⁴⁾	50.000.000,- ³⁾	200.000,-

¹⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

²⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.

³⁾ Limit pojistného plnění.

⁴⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.2. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	200 000 000,-	100 000,- Kč Pro újmu na životě a zdraví člověka se spoluúčast nesjednává.
2.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000,- ⁵⁾	50 000,-

⁵⁾ Sublimit v rámci limitu pojistného plnění

5. Limity pojistného plnění pro pojistné události způsobené uvedenými pojistnými nebezpečími

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se ujednávají limity pojistného plnění a spoluúčasti. Ustanovení tohoto bodu se však neuplatní pro pojištění dle Oddílu II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě.

Poř. číslo	Pojistné nebezpečí	Limit pojistného plnění [Kč] 1)	Spoluúčast [Kč] 2)
1.	Povodeň, záplava	200 000 000,-	200 000,-
2.	Vichřice, krupobití	300 000 000,-	200 000,-
3.	Sesuv	300 000 000,-	200 000,-
4.	Odcizení	10 000 000,-	20 000,-

1) Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

2) Od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události v jednom místě pojištění se odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro toto pojistné nebezpečí sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v tomto bodu).

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou pojistnou dobu činí:

Oddíl I. – Pojištění věci a Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojistné 4,300.000,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové a bude na základě dohody smluvních stran hrazeno ve splátkách takto:

1. splátka je 1.075.000,- Kč a bude zaplacen do 01.02.2022
2. splátka je 1.075.000,- Kč a bude zaplacen do 01.06.2022
3. splátka je 1.075.000,- Kč a bude zaplacen do 01.01.2023
4. splátka je 1.075.000,- Kč a bude zaplacen do 01.06.2023

Ujednává se, že v případě prodloužení pojistníka s kteroukoli platbou je pojistitel oprávněn v upomínce požadovat zaplacení celého nezaplaceného jednorázového pojistného (ztráta výhody splátek).

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7721150155. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání na výše uvedený účet.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Motorová vozidla při doložce D202

1. Odchylně od čl. 17 odst. 1) písm. g) VPP P-777/21 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební nebo montážní stroje při jejich výkonu činnosti jako pracovních strojů používaných v době vzniku pojistné události na staveništi jako stavební/montážní stroje k výstavbě/montáži budovaného díla a která jsou současně pojištěná touto pojistnou smlouvou dle Oddílu I. – Pojištění věci.

Toto pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži.

2. Pasportizace při doložce D120

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění z doložky D 120 pouze za předpokladu, že pojištěný vypracoval před zahájením prací na pojištěném budovaném díle na své vlastní náklady zprávu o stavu jakékoli ohrožené stavby a tuto zprávu předal pojistiteli, pokud o ni kdykoliv požádal.

3. Doložka LEG 3/06 Výluka vylepšení vadné části

Výluky uvedené v článku 11 odst. 1) písm. c) a odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21 se ruší a ujednává se následující:

Z pojištění jsou vyloučeny náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené chybou v projektové dokumentaci, vadou materiálu nebo vadným provedením prací.

Dojde-li však v důsledku vady k poškození nebo zničení pojištěné věci (nebo její části), omezuje se tato výluka pouze na dodatečné náklady na změny a vylepšení původní projektové dokumentace, vady materiálu nebo vadně provedených prací.

Pro účely tohoto pojištění, a to nejen s ohledem na tuto výluku, nejsou pojištěné věci považovány za zničené nebo poškozené pouze na základě existence chyby projektové dokumentace, vady materiálu nebo vadně provedených prací na pojištěných věcech nebo jejich částech.

Limit pojistného plnění: 5 000 000,- Kč.

Spoluúčast: 200 000,- Kč.

Pro případ pojištění zkušebního provozu nebo pro pojištění dle doložky D 003 nebo doložky D 004 nebo pro pojištění ušlého hrubého zisku investora (ALOP) se na toto ujednání hledí, jako by nebylo sjednáno, tzn., že pro tato pojištění platí výluky uvedené v článku 11 odst. 1) písm. c) a odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.4.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.5.** Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušného zákona.

2. Zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. Informace o zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 30 VPP P-777/21 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany

dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli

6. Pojistník, pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléř obdrží originál této pojistné smlouvy.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy

Výčet příloh: příloha č. 1 - Doložky
příloha č. 2 - Individuální způsob zabezpečení.

Podepsáno dne*

Podepsáno dne*

*Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
- b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného, než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno
Czech Republic

Datum: 19. leden 2023

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA č.3210/36-04**

Akce: „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Vyřizuje:

e-mail:

Tel.:

Na základě požadavku na vypracování revize dokumentace pro provedení stavby v rámci projektu „**Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII**“ zpracovávanou sdružením Svratka, vám níže zasíláme cenovou nabídku na požadované stavební objekty či části.

Revize dokumentace se týká části osy 23B stavebního objektu SO 07.14 – Pěšina v km 37,055-40,180 – cesta s dopadem do dopravní částí. Dokumentace řeší pouze část revize dokumentace DPS na daný objekt či část a ne případné vyhotovení ZSPD a projednání změny, pokud bude potřeba.

Změna spočívá v úpravě polohy osy, situace + vytyčení, výšková změna osy – podélný profil, charakteristické řezy a vzorové řezy.

Termíny plnění:

Dokumentace bude vypracována do 30 dnů po obdržení veškerých potřebných podkladů.

Cena:

- | | |
|---|-------------------|
| • SO 07.14. – osa 23B | 50.000 Kč bez DPH |
| • Soupis stavebních prací pro danou změnu | 10.000 Kč bez DPH |

Jsme ochotni jednat o podmínkách a termínech tak aby Váš záměr mohl být realizován dle Vašich potřeb. Cenová nabídka je platná 1 měsíce

Vyhotovil:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b

627 00 Brno

Czech Republic

Datum: 17. leden 2023

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA č.3210/36-03**

Akce: „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Vyřizuje:

e-mail:

Tel.:

Na základě požadavku na vypracování revize dokumentace pro provedení stavby v rámci projektu „**Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII**“ zpracovávanou sdružením Svratka, vám níže zasíláme cenovou nabídku na požadované stavební objekty či části.

Revize dokumentace se týká stavebního objektu SO 08.09a – Lávka u Alžbětinek s dopadem do části ocelové a dřevěné konstrukce a dále do betonových konstrukcí. Dokumentace řeší pouze část revize dokumentace DPS na daný objekt či část a ne případné vyhotovení ZSPD a projednání změny, pokud bude potřeba.

Termíny plnění:

Dokumentace bude vypracována do 30 dnů po obdržení veškerých potřebných podkladů.

Cena:

- SO 08.09a

400.000 Kč bez DPH

Jsme ochotni jednat o podmínkách a termínech tak aby Váš záměr mohl být realizován dle Vašich potřeb. Cenová nabídka je platná 1 měsíce

Vyhotovil:

