

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Akce : Rekonstrukce páteřní komunikace v areálu ÚD Hostivař (vozovna + garáž Hostivař)

Číslo stavby: 20-0-2492

Pořadové číslo změnového listu:

1



Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Číslo (pod) objektu:	Název: Topný kanál- nefunkční
<b>Popis změny:</b> Při provádění zemních prací byl zjištěn starý topný kanál, který nebyl v ploše mezi objektem STK, zeleným ostrůvkem a v blízkosti haly 2 při zpracování PDPS pro výběr zhotovitele znám a uvažován.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu této nepředvídatelné okolnosti a výškového uložení bylo nutné odstranit starý nefunkční topný kanál pro budoucí komunikaci. Více v souvisejících přílohách této změny.		
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> Sinpps s.r.o. Inženýr projektu:  Souhlasím s použitými vymeřeními, materiály i výše uvedeným zdůvodněním. 		

Stavba: Rekonstrukce pátevní komunikace v areálu ÚD Hostivař (vozovna + garáž Hostivař)	Číslo smlouvy: 001046-00-22	SO	Změnový list č: 1
---	--------------------------------	----	----------------------

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

#### DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	ANO	zvýšení o:	82 984,08 Kč
		snížení o:	Kč

#### NAVRHOVATEL ZMĚNY:

PORR a.s.

Podpis:

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: PORR a.s.	Obstaravatel / Příkazník: KOMOVIA s.r.o. Technický dozor stavebník	Souhlasím Pod:
--------------------------	--	-------------------

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Petr Škvařil PORR a.s.	Obstaravatel / Příkazník: KOMOVIA s.r.o. Technický dozor stavebník	Souhlasím
--	--	-----------

#### TECHNICKÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

PORR a.s.

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke

Za Obstaravatele / Příkazníka: KOMOVIA s.r.o. Technický dozor stavebník	Za Objednatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Projektový manažer
Za Objednatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí odboru Investice Povrch	Za Objednatele: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Technický ředitel Povrch

**Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:**


Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Soupis prací - rozpočet	1 x A4
Příloha č. 2	Zápis z KD č. 4	1 x A4
Příloha č. 3	Fotodokumentace	2x A4
Příloha č. 4	Geodetické zaměření plochy topného kanálu	1x A4
	<b>Celkem počet listů návrhu změny stavby</b>	<b>5 x A4</b>

# Rekonstrukce areálové komunikace v areálu ÚD Hostivař

Příloha č. 1

## Topný kanál

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
						<b>82 984,08</b>	
1	723150806	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D 219	m			33 223,20	URS 2023/I
2	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3			49 760,88	URS 2023/I
		116,7 *0,08 =9,336					



Datum: 11.04.2023 8.00 hod Ústřední dílny DP - Hostivař, U vozovny 6, Praha 10

Věc: ZÁZNAM z KONTROLNÍHO DNE č. 4, stavby.

Akce: "Rekonstrukce páteřní komunikace v areálu DP ÚD Hostivař", č. z. 1000292930

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, Praha 9 - Vysočany

Zastoupený: 

Zhotovitel: Společnost PORR + ZEPRIŠ areál ÚD Hostivař

Zastoupená: 

TDI: KOMOVIA s.r.o., středisko Praha, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Autorský dozor: SINPPS s.r.o., Dobrušská 1805, 147 00 Praha 4-Braník

Zastoupený: 

Přítomni: Viz prezenční listina v příloze

#### Průběh jednání:

Zúčastnění zástupci Objednatele, Zhotovitele, TDS, Autorského dozoru a zástupců TSO ÚD Hostivař se sešli na místě stavby u objektu STK, na plochách, kde probíhají dokončovací práce na úpravě pláně komunikací, a prošli místa, kde byly evidovány změny po provedení bouracích prací, a případně navržené úpravy, které jsou popsány v jednotlivých bodech zápisu z KD č. 3. Na místě byl též upřesňován rozsah bouraných ploch, a jejich případné úpravy v plochách podél pozemních objektů přístaveb, objektu „C“ a objektu STK.

Dále se pak účastníci odebrali do zasedací místnosti v budově „C“, 2. patro, kde byly projednány body z minulých KD č. 1-3, a zaznamenány nové body vznesené na KD č. 4.


Dále byli zúčastnění vyzváni, k vznesení případných připomínek a doplnění souvisejících se zjištěnými skutečnostmi při zahájení realizace stavebních prací. Na to pak bylo navázáno kontrolou zjištěných skutečností a nesrovnalostí vůči projektové dokumentaci:


#### Kontrola stavu plnění úkolů z minulých KD č. 1 – 3 a výrobního výboru č. 1:

- 2/1 Topný kanál – v ploše mezi objektem STK a zeleným ostrůvkem. Tato větev potrubí v topném kanálu je nefunkční potvrzeno Ing. Novákovou z TSO. Na základě toho bylo rozhodnuto, že dojde k demontáži potrubí a k úpravě prostoru topného kanálu. Návrh potřebných úprav ve 2. etapě a jejich rozsah určí projektant na základě získaných údajů o stávajícím stavu a trase kanálu. **Projektant zpracuje detaily zpětných úprav topného kanálu zejména v místech kde zaklopení topného kanálu je v malé hloubce pod aktivní zónou konstrukce vozovky komunikace.**

Zapsal:  TDI

Příloha č. 3 Fotodokumentace

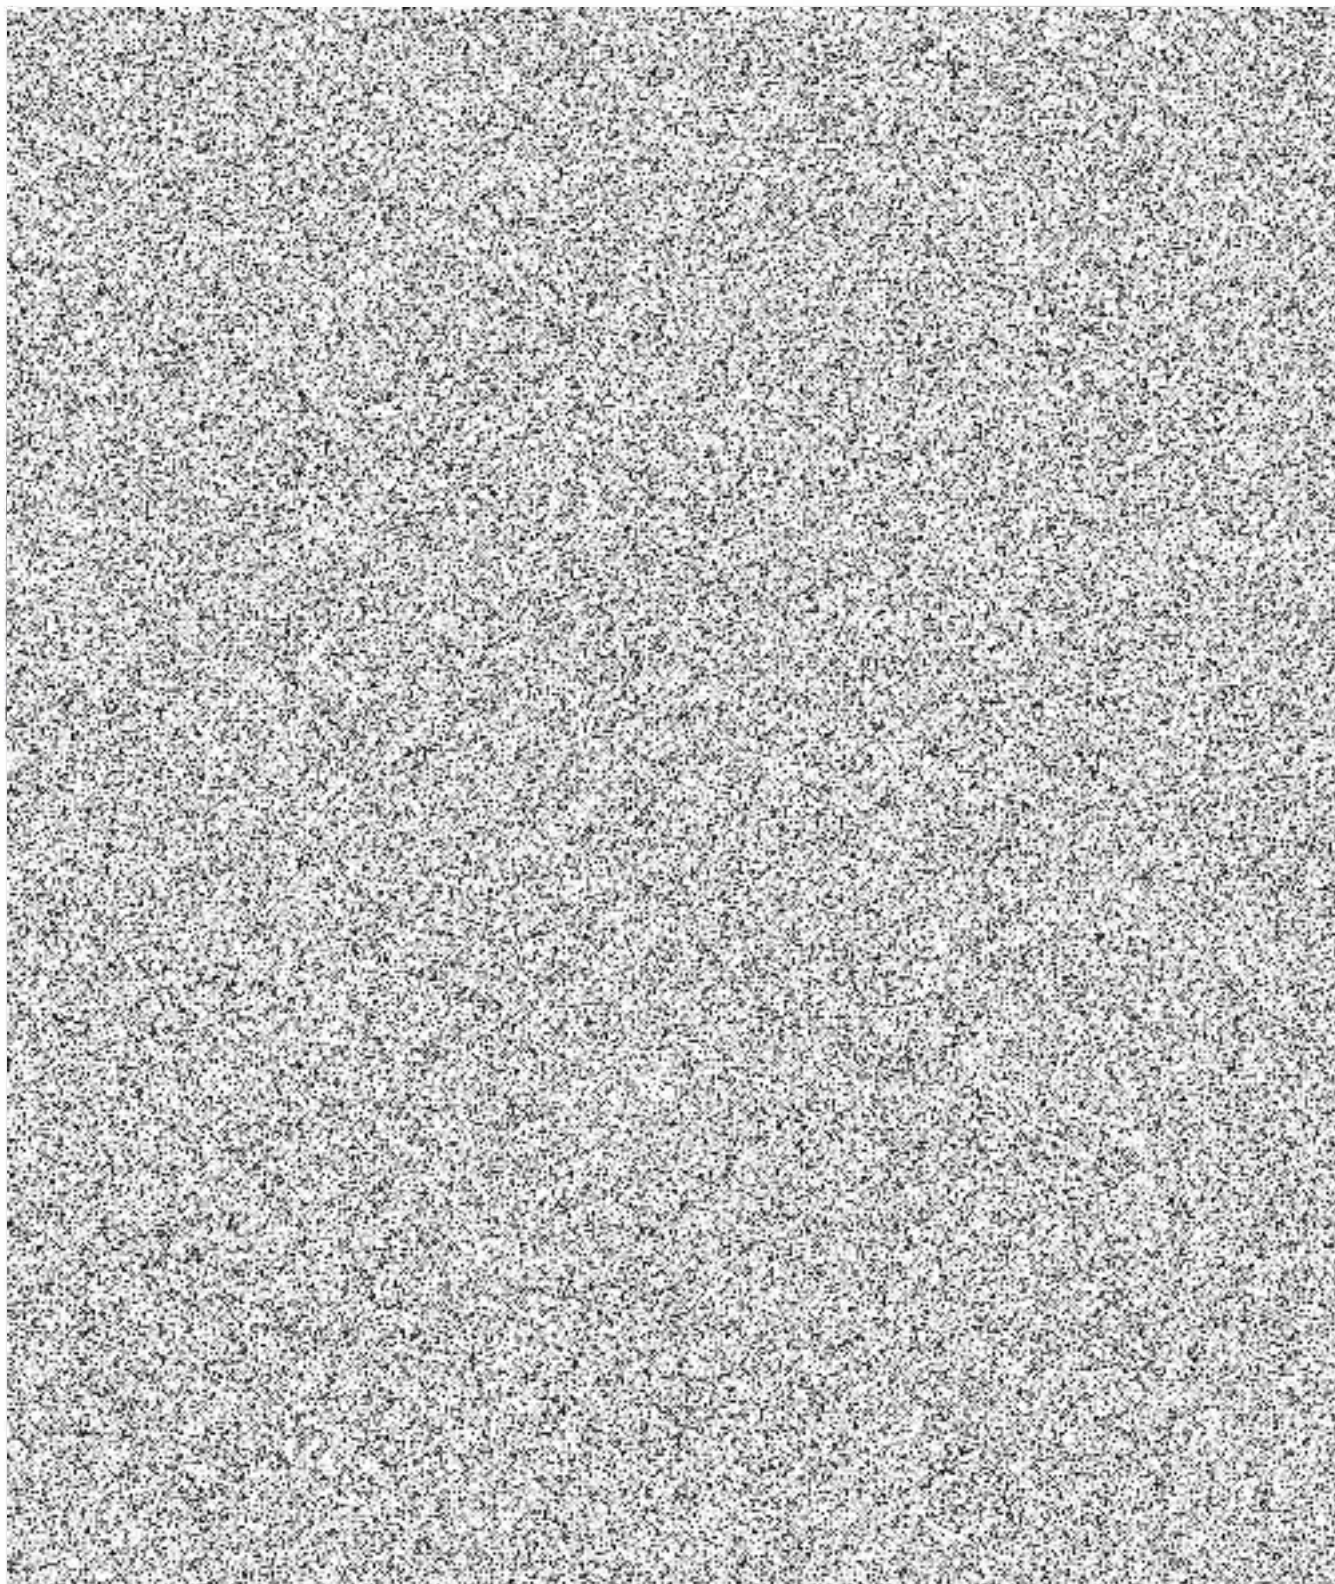

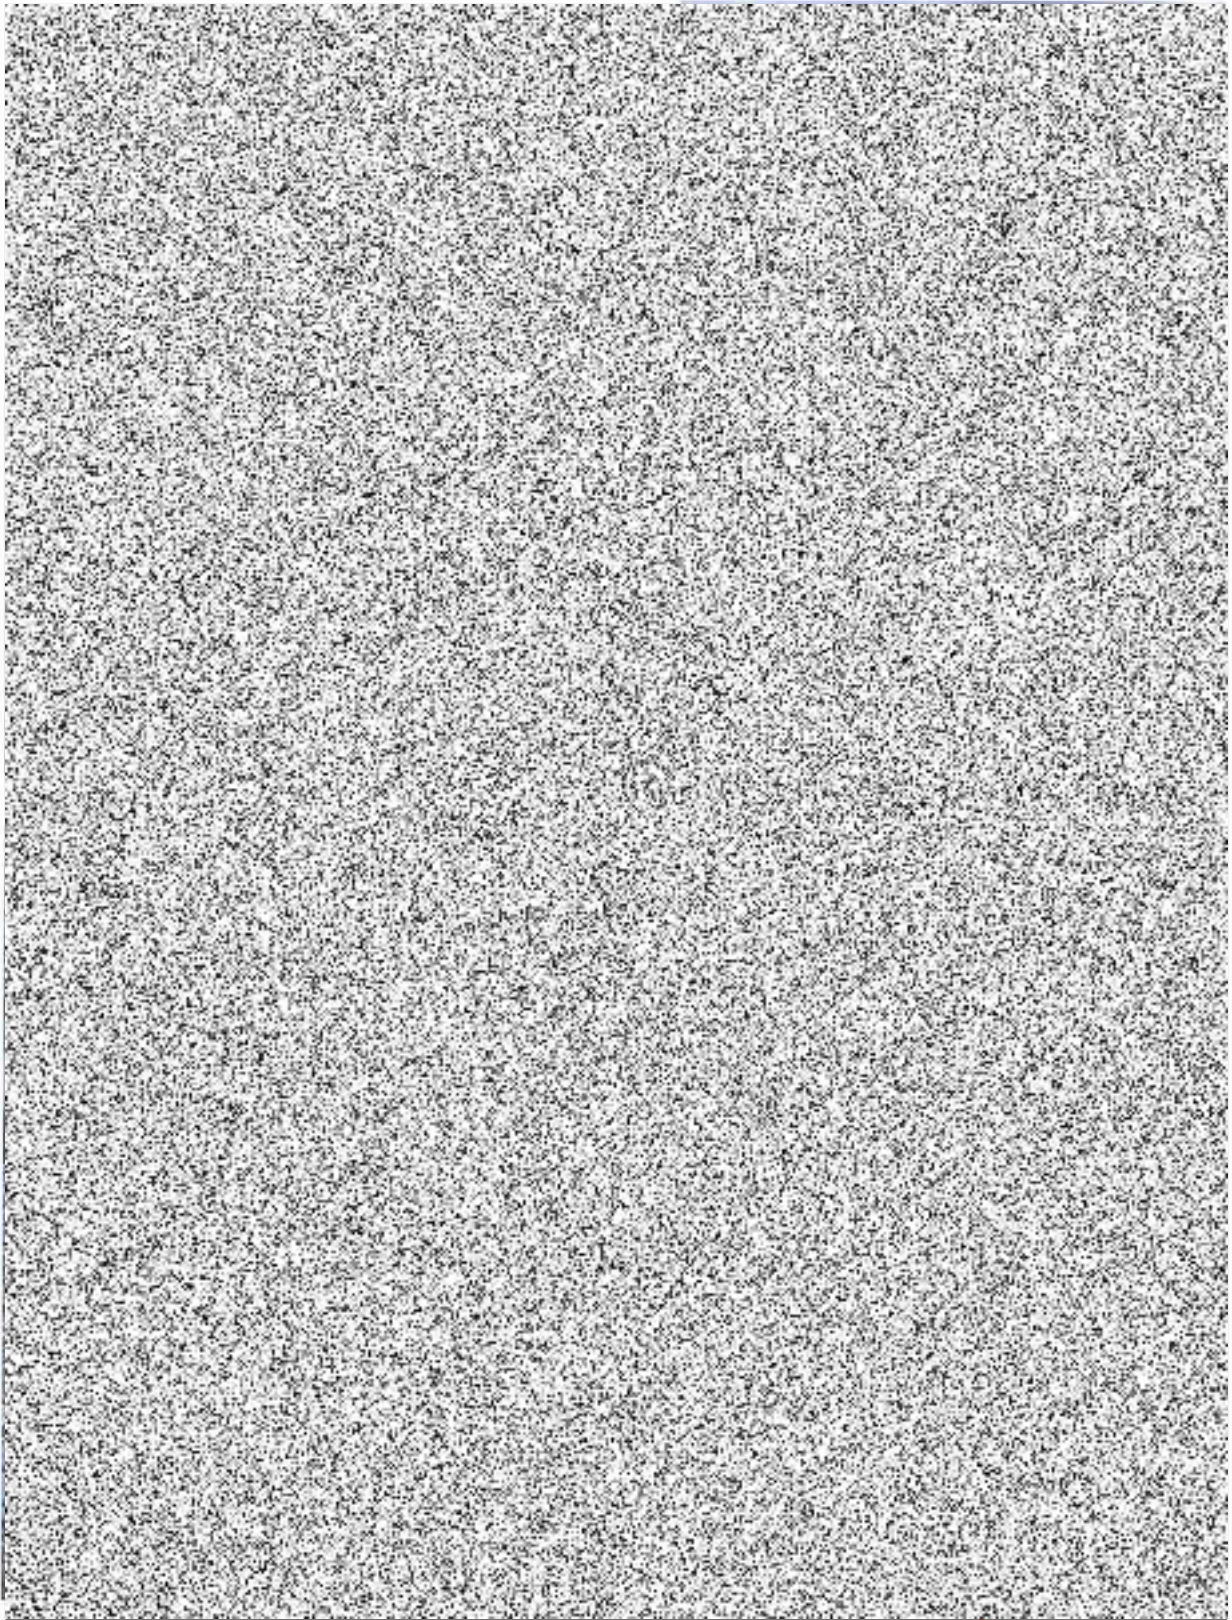

80 mm

autorizovaný zeměměřičský inženýr  
Geodetický atelier GIS listopad 2023

zámková
