



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 36

D_03 SO 07.01 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

- ZM 019 Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 36
ZM 019 _ Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu**

Na základě zjištěné kolize pilotové stěny SO 07.01 se stávajícím STL plynovodem (zjištěna nová poloha plynu), tj. stěna je navržena v menší vzdálenosti než 1,0 m od plynovodu.

AD předložil opravenou DPS se zapracovanými připomínkami a dále byly předloženy vytyčovací výkresy pro jednotlivé piloty.

V Brně dne :




[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 25. dubna 2022 9:16
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: PPO Svratka_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu
Přílohy: SVR-DPS-D.03-01_VYTYCENI STEN_ad.dwg; SVR_DPS_D03_01_601_01_VYTYČOVACÍ SCHÉMA_SO 07.01.pdf

Dobrý den,
V příloze zasílám v závislosti na zjištěnou polohu plynu úpravu vytyčovacího výkresu. Došlo ke zrušení body 1 a doplnění bodů B68 a B69. Výkres je jak v dwg tak i pdf. Tato úprava nemá vliv na výkaz výměr daného stavebního objektu SO 07.01. Došlo k přidání lomového bodu na ŽB stěně.

Jen pro info, níže obrázek zobrazuje polohu plynu dle poskytnutých podkladů (modrá barva) a zaměření na stavbě (červená barva).

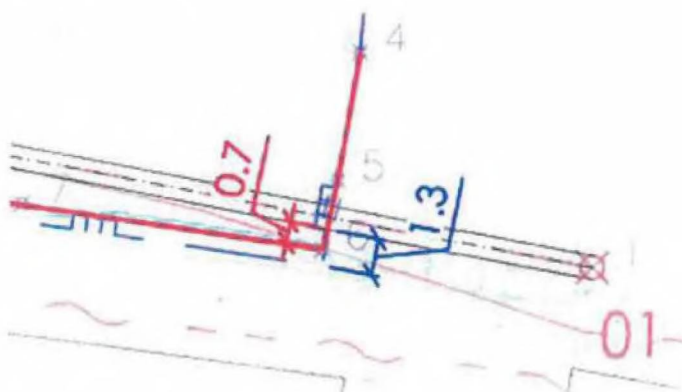

S pozdravem



[REDACTED]
vedoucí projekce



A PLUS a.s.
Česká 12, 602 00 Brno
www.aplus.cz

From: [REDACTED]

Sent: Monday, April 25, 2022 12:24 AM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Subject: FW: PPO Svratka_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu

Dobrý den,

děkuji za informaci. Bude projednáno na KD v úterý 26.4.2022.

S pozdravem
Bibiana Janebová

██████████
Městská infrastruktura – vedoucí týmu protipovodňových opatření

M ██████████



Kancelář
architekta
města Brna

Náš projekt? Brno!
Lidé, územní plán, veřejný prostor.

From: ██████████
Sent: Friday, April 22, 2022 1:54 PM
To: ██████████
Cc: ██████████
Subject: PPO Svatka_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu



Vážená paní inženýrko,

dovoluji si Vás informovat o kolizi stávající trasy plynu STL s navrženou pilotovou stěnou, která je součástí SO 07.01. Kolize byla zjištěna 6.4.2022 a byla postoupena GP, TDI, stejně tak byla řešena v rámci minulých kontrolních dnů.

V příloze Vám zasílám emailovou korespondenci mezi námi jako zhotovitelem a GP.
V posledním emailu jsme obdrželi informaci od p. Zelinky, že zřejmě dojde k posunu samotné stěny.

Bez změny PD není možno pilotovou stěnu provést.

S pozdravem

██████████
Stavbyvedoucí
HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika
Mobil: ██████████
██████████
www.hochtief.cz

Stavební firma HOCHTIEF CZ zaměstnává v České republice a na Slovensku 1 100 lidí a v dodavatelském řetězci zprostředkovává práci dalším zhruba 3 000 firmám. HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámorí. Zajímají vás naše stavby? Podívejte se na <http://www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz/> nebo <http://www.statnioperavrekonstrukci.cz/>. Více na www.hochtief.cz.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 03 – Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	Změnový list č. 36																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: SO 07.01 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: - ZM 019 Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kolize pilotové stěny SO 07.01. se stávajícím STL plynovodem, pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti než požaduje GaSNet DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.01. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.36 vícepráce, ZL č.36 méněpráce, ZL č.36 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">329 796,15 Kč</td><td style="text-align: right;">69 257,19 Kč</td><td style="text-align: right;">399 053,34 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 816 186,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-381 399,15 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 197 585,59 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-1 486 390,29 Kč</td><td style="text-align: right;">-312 141,96 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 798 532,25 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	329 796,15 Kč	69 257,19 Kč	399 053,34 Kč	Méněpráce:	-1 816 186,44 Kč	-381 399,15 Kč	-2 197 585,59 Kč	Rozdíl:	-1 486 390,29 Kč	-312 141,96 Kč	-1 798 532,25 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	329 796,15 Kč	69 257,19 Kč	399 053,34 Kč														
Méněpráce:	-1 816 186,44 Kč	-381 399,15 Kč	-2 197 585,59 Kč														
Rozdíl:	-1 486 390,29 Kč	-312 141,96 Kč	-1 798 532,25 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: 																	
VYJÁDRĚNÍ: 																	
OD: 																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna Ol, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII



D_03 (07.01) Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
PPO Svratka

Projektant:

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH			-1 486 390,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 486 390,29	-312 141,96
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 798 532,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 486 390,29	
D_03 (07.01)	Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)	-1 486 390,29	-1 798 532,25
		-1 486 390,29	-1 798 532,25
D_03 (07.01)MP	ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu - méněpráce	-1 816 186,44	-2 197 585,59
D_03 (07.01)VP	ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu - vícepráce	329 796,15	399 053,34

SOUPIS PRACÍ

STAGA

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01) - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

Místo: Nábřeží Svatky
 Zadavatel: Statutární město Brno
 Uchazeč: PPO Svatka

Datum: 6. 9. 2022
 Projektant: A PLUS a.s.
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 486 390,29	
D HSV Práce a dodávky HSV							-1 486 390,29	
D 1 Zemní práce							33 720,41	
67	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	357,308	394,10	140 815,08	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					
	W		Zemní práce - výkop (dl * š * v)					
	W		SO 07.01 - převážka					
	W		(11,42*33,16)*0,80*2,00		71,328			
	W		(31,00)*0,80*2,00		49,600			
	W		(17,85)*0,80*2,00		28,560			
	W		rozšíření					
	W		(207,82)		207,820			
	W		Součet		357,308			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-117,744	60,10	-7 076,41	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					
	W		Zemní práce - přesun po stavbě (obj)					
	W		Převážka					
	W		SO 07.01 - nevyz pilota					
	W		(pilota_620_1_dl)*(P*0,31*0,31)		-117,744			
	W	vývrtek_obj	Mezisoučet		-117,744			
	W		Součet		-117,744			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-117,744	9,70	-1 142,12	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					
	W		Zemní práce - skládka na stavbě (obj)					
	W		(vývrtek_obj)		-117,744			
	W		Součet		-117,744			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-117,744	72,10	-8 489,34	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					
	W		Zemní práce - nakládání na stavbě (obj)					
	W		(vývrtek_obj)		-117,744			
	W		Součet		-117,744			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-117,744	252,10	-29 683,26	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					
	W		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
	W		(vývrtek_obj)		-117,744			
	W		Součet		-117,744			
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	-1 177,440	6,10	-7 182,38	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					
	W		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
	W		(vývrtek_obj)		-117,744			
	W		Součet		-117,744			
	W		-117,744*10 *Přepočtené koeficientem množství		-1 177,440			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-211,939	300,00	-63 581,70	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					
	W		Zemní práce - skládkové (obj)					
	W		(vývrtek_obj)		-117,744			
	W		Součet		-117,744			
	W		-117,744*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		-211,939			
68	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	149,488	67,30	10 060,54	CS ÚRS 2020 02
	W		Viz PD D.03-01-001-701					

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-117,744*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		-211,938			
68	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	149,488	67,30	10 060,54	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Zemní práce - zásyp (dl * š * v)					
VV			SO 07.01 - převážka					
VV			(11,42+33,16)*0,80*2,00		71,328			
VV			(31,00)*0,80*2,00		49,600			
VV			(17,85)*0,80*2,00		28,560			
VV			Součet		149,488			
D 2			Zakládání				-1 452 197,61	
21	K	226212113	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	-390,000	2 196,30	-856 557,00	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Piloty - vývrt (dl * p)					
VV			SO 07.01 - nevyz pilota					
VV			-(3,00)*130)		-390,000			
VV			Součet		-390,000			
27	K	231211312	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-390,000	384,10	-149 799,00	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Piloty (dl)					
VV			SO 07.01 - nevyz pilota					
VV			(piloty_620_1_dl)		-390,000			
VV			Součet		-390,000			
33	M	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	-129,518	3 108,40	-402 593,75	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Piloty - beton (dl * průměr)					
VV			SO 07.01 - nevyz pilota					
VV			(piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)		-117,744			
VV			Součet		-117,744			
VV			-117,744*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-129,518			
36	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-2,204	4 020,50	-8 861,18	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Piloty - převážka (dl * š * v)					
VV			SO 07.01 - převážka					
VV			-(93,44)*0,80*2,07)		-154,737			
VV			(11,42+33,16)*0,80*2,41		85,950			
VV			-(2,30)*0,80*0,50		-0,920			
VV			(31,00)*0,80*1,91		47,368			
VV			(17,85)*0,80*1,41		20,135			
VV			Součet		-2,204			
37	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-179,307	672,10	-120 512,23	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Piloty - převážka, bednění (dl * v * p)					
VV			SO 07.01 - převážka					
VV			-(93,44)*(3,00*2))		-560,640			
VV			(11,42+33,16)*2,41*2		214,876			
VV			-(2,30)*0,50*2		-2,300			
VV			(31,00)*1,91*2		118,420			
VV			(17,85)*1,41*2		50,337			
VV			Součet		-179,307			
38	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-179,307	132,10	-23 686,45	CS ÚRS 2020 02
69	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	30,000	3 660,40	109 812,00	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Opěrné stěny - pata, podklad (dl * š * v)					
VV			SO 07.01					
VV			(100,00)*3,00*0,10		30,000			
VV			Součet		30,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 323,90	
56	K	953241211	Osazení smykových tmů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	84,000	60,10	5 048,40	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Smykové tmy - SD01 (p)					
VV			SO 07.01					
VV			84		84,000			
VV			Součet		84,000			
57	M	54879272	tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 20mm	kus	84,000	424,00	35 616,00	CS ÚRS 2020 02
59	K	953333324	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spár vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuží šířky 320 mm	m	-2,000	540,10	-1 080,20	CS ÚRS 2020 02
VV			Viz PD D.03-01-001-701					
VV			Těsnící pás - L02 (dl)					
VV			SO 07.01					
VV			-(22,00)		-22,000			
VV			20,00		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			Součet		-2,000			
60	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm	m	-3,000	420,10	-1 260,30	CS ÚRS 2020 02
vv			Viz PD D.03-01-001-701					
vv			Bobtnavý pásek (dl)					
vv			SO 07.01					
vv			-(225,00)		-225,000			
vv			222,00		222,000			
vv			Součet		-3,000			
D 998			Přesun hmot				-106 236,99	
66	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	-252,885	420,10	-106 236,99	CS ÚRS 2020 02

VP		Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PPO Svratka

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH	-1 816 186,44
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 816 186,44	-381 399,15
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 197 585,59
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svatka Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-1 816 186,44

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO
(07.01) 07.01)

-1 816 186,44 -2 197 585,59

D_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
(07.01)M méněpráce

-1 816 186,44 -2 197 585,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01)M - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) - méněpráce

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: PPO Svratka

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 816 186,44

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 816 186,44

D 1 Zemní práce -117 155,21

14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-117,744	60,10	-7 076,41	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------

VV Viz PD D.03-01-001-701
 VV Zemní práce - přesun po stavbě (obj)
 VV Piloty
 VV SO 07.01 - nevyz pilota
 VV (piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)
 VV vývrtek_obj Mezisoučet -117,744
 VV Součet -117,744

15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-117,744	9,70	-1 142,12	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	----------	------	-----------	----------------

VV Viz PD D.03-01-001-701
 VV Zemní práce - skládka na stavbě (obj)
 VV (vývrtek_obj)
 VV Součet -117,744

16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-117,744	72,10	-8 489,34	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------

VV Viz PD D.03-01-001-701
 VV Zemní práce - nakládání na stavbě (obj)
 VV (vývrtek_obj)
 VV Součet -117,744

17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-117,744	252,10	-29 683,26	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

VV Viz PD D.03-01-001-701
 VV Zemní práce - přesun na skládku (obj)
 VV (vývrtek_obj)
 VV Součet -117,744

18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 177,440	6,10	-7 182,38	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------	----------------

VV Viz PD D.03-01-001-701
 VV Zemní práce - přesun na skládku (obj)
 VV (vývrtek_obj)
 VV Součet -117,744
 VV -117,744*10 'Přepočtené koeficientem množství -1 177,440

19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-211,939	300,00	-63 581,70	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	----------------

VV Viz PD D.03-01-001-701
 VV Zemní práce - skládkovné (obj)
 VV (vývrtek_obj)
 VV Součet -117,744
 VV -117,744*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -211,939

D 2 Zakládání -1 562 009,61

21	K	226212113	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	-390,000	2 196,30	-856 557,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	----------	----------	-------------	----------------

VV Viz PD D.03-01-001-701
 VV Piloty - vývrt (dl * p)
 VV SO 07.01 - nevyz pilota
 VV -(3,00)*130
 VV piloty_620_1_dl Součet -390,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	231211312	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-390,000	384,10	-149 799,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty (dl)					
	VV		SO 07.01 - nevýz pilota					
	VV		(piloty_620_1_dl)		-390,000			
	VV		Součet		-390,000			
33	M	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	-129,518	3 108,40	-402 593,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - beton (dl * průměr)					
	VV		SO 07.01 - nevýz pilota					
	VV		(piloty_620_1_dl)*(P*0,31*0,31)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
	VV		-117,744*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-129,518			
36	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tf. C 30/37	m3	-2,204	4 020,50	-8 861,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - převázka (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01 - převázka					
	VV		-(93,44)*0,80*2,07		-154,737			
	VV		(11,42+33,16)*0,80*2,41		85,950			
	VV		-(2,30)*0,80*0,50		-0,920			
	VV		(31,00)*0,80*1,91		47,368			
	VV		(17,85)*0,80*1,41		20,135			
	VV		Součet		-2,204			
37	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-179,307	672,10	-120 512,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - převázka, bednění (dl * v * p)					
	VV		SO 07.01 - převázka					
	VV		-(93,44)*(3,00*2))		-560,640			
	VV		(11,42+33,16)*2,41*2		214,876			
	VV		-(2,30)*0,50*2		-2,300			
	VV		(31,00)*1,91*2		118,420			
	VV		(17,85)*1,41*2		50,337			
	VV		Součet		-179,307			
38	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-179,307	132,10	-23 686,45	CS ÚRS 2020 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-2 340,50	
59	K	953333324	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm	m	-2,000	540,10	-1 080,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Těsnící pás - L02 (dl)					
	VV		SO 07.01					
	VV		-(22,00)		-22,000			
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		-2,000			
60	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm	m	-3,000	420,10	-1 260,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Bobtnavý pásek (dl)					
	VV		SO 07.01					
	VV		-(225,00)		-225,000			
	VV		222,00		222,000			
	VV		Součet		-3,000			
D 998 Přesun hmot							-134 681,12	
66	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	-320,593	420,10	-134 681,12	CS ÚRS 2020 02

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
vicepráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

PPO Svratka

Projektant:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Cena bez DPH	329 796,15
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	329 796,15	69 257,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	399 053,34
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

329 796,15

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO
(07.01) 07.01)

329 796,15

399 053,34

D_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
(07.01)P vícepráce

329 796,15

399 053,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01)P - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) - vícepráce

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: PPO Svratka

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

329 796,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

329 796,15

D 1

Zemní práce

150 875,62

67	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	357,308	394,10	140 815,08	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV	Viz PD D.03-01-001-701							
VV	Zemní práce - výkop (dl * š * v)							
VV	SO 07.01 - převážka							
VV	(11,42+33,16)*0,80*2,00				71,328			
VV	(31,00)*0,80*2,00				49,600			
VV	(17,85)*0,80*2,00				28,560			
VV	rozšíření							
VV	(207,82)				207,820			
VV	Součet				357,308			

68	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	149,488	67,30	10 060,54	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV	Viz PD D.03-01-001-701							
VV	Zemní práce - zásyp (dl * š * v)							
VV	SO 07.01 - převážka							
VV	(11,42+33,16)*0,80*2,00				71,328			
VV	(31,00)*0,80*2,00				49,600			
VV	(17,85)*0,80*2,00				28,560			
VV	Součet				149,488			

D 2

Zakládání

109 812,00

69	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	30,000	3 660,40	109 812,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

VV	Viz PD D.03-01-001-701							
VV	Opěrné stěny - pata, podklad (dl * š * v)							
VV	SO 07.01							
VV	(100,00)*3,00*0,10				30,000			
VV	Součet				30,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 664,40

56	K	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	84,000	60,10	5 048,40	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

VV	Viz PD D.03-01-001-701							
VV	Smykové trny - SD01 (p)							
VV	SO 07.01							
VV	84				84,000			
VV	Součet				84,000			

57	M	54879272	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm	kus	84,000	424,00	35 616,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot

28 444,13


66	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	67,708	420,10	28 444,13	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

VP Vícepráce

0,00

K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	
K							0,00	

5/2

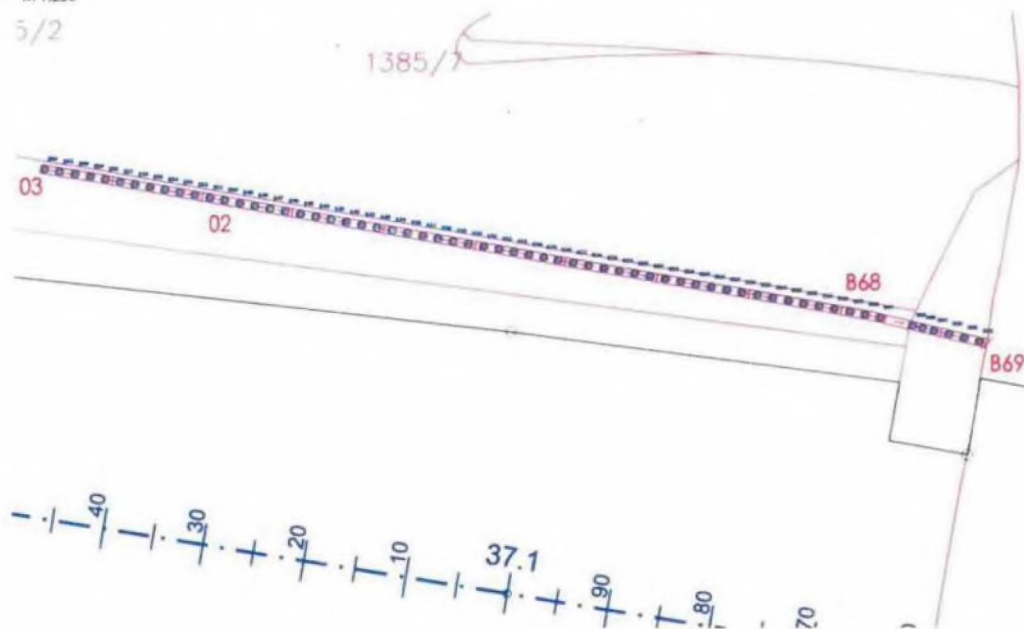

VÝTVYČOVÉ BODY PLOŠI						
Číslo bodu	Průběh 1	Průběh 2	SRP plochy	SRP výšky	SRP úklonu	Číslo bodu
001	110.00.1.212	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	001
002	110.00.1.75.7	110.00.1.8.5	100.00.1	1.00m	0.00m	002
003	110.00.1.238	110.00.1.238	100.00.1	1.00m	0.00m	003
004	110.00.1.8.75	110.00.1.8.75	100.00.1	1.00m	0.00m	004
005	110.00.1.100	110.00.1.100	100.00.1	1.00m	0.00m	005
006	110.00.1.76	110.00.1.400	100.00.1	1.00m	0.00m	006
007	110.00.1.76.17	110.00.1.400	100.00.1	1.00m	0.00m	007
008	110.00.1.262	110.00.1.262	100.00.1	1.00m	0.00m	008
009	110.00.1.8.10	110.00.1.114	100.00.1	1.00m	0.00m	009
010	110.00.1.8.10	110.00.1.262	100.00.1	1.00m	0.00m	010
011	110.00.1.76.7	110.00.1.262	100.00.1	1.00m	0.00m	011
012	110.00.1.262	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	012
013	110.00.1.76.7	110.00.1.262	100.00.1	1.00m	0.00m	013
014	110.00.1.120	110.00.1.100	100.00.1	1.00m	0.00m	014
015	110.00.1.120	110.00.1.15.11	100.00.1	1.00m	0.00m	015
016	110.00.1.120	110.00.1.262	100.00.1	1.00m	0.00m	016
017	110.00.1.8.8.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	017
018	110.00.1.212	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	018
019	110.00.1.262	110.00.1.27.5	100.00.1	1.00m	0.00m	019
020	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	020
021	110.00.1.212	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	021
022	110.00.1.27.5	110.00.1.262	100.00.1	1.00m	0.00m	022
023	110.00.1.27.5	110.00.1.262	100.00.1	1.00m	0.00m	023
024	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	024
025	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	025
026	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	026
027	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	027
028	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	028
029	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	029
030	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	030
031	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	031
032	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	032
033	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	033
034	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	034
035	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	035
036	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	036
037	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	037
038	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	038
039	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	039
040	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	040
041	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	041
042	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	042
043	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	043
044	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	044
045	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	045
046	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	046
047	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	047
048	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	048
049	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	049
050	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	050
051	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	051
052	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	052
053	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	053
054	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	054
055	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	055
056	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	056
057	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	057
058	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	058
059	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	059
060	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	060
061	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	061
062	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	062
063	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	063
064	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	064
065	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	065
066	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	066
067	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	067
068	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	068
069	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	069
070	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	070
071	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	071
072	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	072
073	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	073
074	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	074
075	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	075
076	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	076
077	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	077
078	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	078
079	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	079
080	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	080
081	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	081
082	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	082
083	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	083
084	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	084
085	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	085
086	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	086
087	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	087
088	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	088
089	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	089
090	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	090
091	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	091
092	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	092
093	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	093
094	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	094
095	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	095
096	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	096
097	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	097
098	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	098
099	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	099
100	110.00.1.27.5	110.00.1.212	100.00.1	1.00m	0.00m	100

VÝTVÝVOVÁČÍ ROD	Pateta X	Pateta Y	
01	0461.01.010	0461.01.010	010 - 100%
02	0461.01.011	0461.01.011	010 - 100%
03	0461.01.012	0461.01.012	010 - 100%
04	0461.01.013	0461.01.013	010 - 100%
05	0461.01.014	0461.01.014	010 - 100%
06	0461.01.015	0461.01.015	010 - 100%
07	0461.01.016	0461.01.016	010 - 100%
08	0461.01.017	0461.01.017	010 - 100%
09	0461.01.018	0461.01.018	010 - 100%
10	0461.01.019	0461.01.019	010 - 100%
11	0461.01.020	0461.01.020	010 - 100%
12	0461.01.021	0461.01.021	010 - 100%
13	0461.01.022	0461.01.022	010 - 100%
14	0461.01.023	0461.01.023	010 - 100%
15	0461.01.024	0461.01.024	010 - 100%
16	0461.01.025	0461.01.025	010 - 100%
17	0461.01.026	0461.01.026	010 - 100%
18	0461.01.027	0461.01.027	010 - 100%
19	0461.01.028	0461.01.028	010 - 100%
20	0461.01.029	0461.01.029	010 - 100%
21	0461.01.030	0461.01.030	010 - 100%
22	0461.01.031	0461.01.031	010 - 100%
23	0461.01.032	0461.01.032	010 - 100%
24	0461.01.033	0461.01.033	010 - 100%
25	0461.01.034	0461.01.034	010 - 100%
26	0461.01.035	0461.01.035	010 - 100%
27	0461.01.036	0461.01.036	010 - 100%
28	0461.01.037	0461.01.037	010 - 100%
29	0461.01.038	0461.01.038	010 - 100%
30	0461.01.039	0461.01.039	010 - 100%
31	0461.01.040	0461.01.040	010 - 100%
32	0461.01.041	0461.01.041	010 - 100%
33	0461.01.042	0461.01.042	010 - 100%
34	0461.01.043	0461.01.043	010 - 100%
35	0461.01.044	0461.01.044	010 - 100%
36	0461.01.045	0461.01.045	010 - 100%
37	0461.01.046	0461.01.046	010 - 100%
38	0461.01.047	0461.01.047	010 - 100%
39	0461.01.048	0461.01.048	010 - 100%
40	0461.01.049	0461.01.049	010 - 100%
41	0461.01.050	0461.01.050	010 - 100%
42	0461.01.051	0461.01.051	010 - 100%
43	0461.01.052	0461.01.052	010 - 100%
44	0461.01.053	0461.01.053	010 - 100%
45	0461.01.054	0461.01.054	010 - 100%
46	0461.01.055	0461.01.055	010 - 100%
47	0461.01.056	0461.01.056	010 - 100%
48	0461.01.057	0461.01.057	010 - 100%
49	0461.01.058	0461.01.058	010 - 100%
50	0461.01.059	0461.01.059	010 - 100%
51	0461.01.060	0461.01.060	010 - 100%
52	0461.01.061	0461.01.061	010 - 100%
53	0461.01.062	0461.01.062	010 - 100%
54	0461.01.063	0461.01.063	010 - 100%
55	0461.01.064	0461.01.064	010 - 100%
56	0461.01.065	0461.01.065	010 - 100%
57	0461.01.066	0461.01.066	010 - 100%
58	0461.01.067	0461.01.067	010 - 100%
59	0461.01.068	0461.01.068	010 - 100%
60	0461.01.069	0461.01.069	010 - 100%
61	0461.01.070	0461.01.070	010 - 100%
62	0461.01.071	0461.01.071	010 - 100%
63	0461.01.072	0461.01.072	010 - 100%
64	0461.01.073	0461.01.073	010 - 100%

LEGENDA

- [illegible]

VITYCOVAGISCHMA

NABÍDEŽÍ KUPY SVRATKY

chybí vložit na úložiště revize statického výpočtu. AD doplní požadované a termín předání tištěné dokumentace je do 7.10.2022

Zástupce zhotovitele dále upozornil, že na viaduktu momentálně probíhají sanační práce – dojde k domluvě mezi zhotovitelem PPO a zhotovitelem sanačních prací ohledně prostoru staveniště.

Za předání dokumentace zodpovídá AD

18.10.2022 VTD byla doplněna a odsouhlasena zhotovitelem i TDI. Termín pro předání tištěné dokumentace je 25.10.2022. Včetně revize VV

Za předání dokumentace zodpovídá AD

1.11.2022 dokumentace v tištěné podobě včetně revize VV předá AD v den konání KD zástupci KAM. Předání tištěné dokumentace: 1.11.2022

Zodpovídá AD

15.11.2022 Nesplněno. Dokumentace byla předána neúplná, chybí VV.

Termín: 15.11.2022

Zodpovídá AD

29.11.2022 Výkaz výměr byl předán ke kontrole TDI a vložen na sdílené úložiště. Probíhá kontrola. Info na příštím KD

13.12.2022 Kontrola VV rozpočtářem BKom proběhne do 16.12.2022. Dořešení VV proběhne na schůzce na zařízení staveniště 19.12.2022

Za kontrolu ZL zodpovídá TDI

10.1.2023 Kontrola VV rozpočtářem proběhla. V den konání KD byly zhotoviteli zaslány připomínky k zapracování do VV. Info na příštím KD.

Za zapracování připomínek zodpovídá zhotovitel

24.1.2023 VV se zapracovanými připomínkami byl zaslán rozpočtáři ke kontrole. Info k tomuto VV je od rozpočtáře (Bkom) přislíbeno na 25.1.2023. TDI upozornil zástupce AD, že chybí rozdílový rozpočet, který je nutný.

Zodpovídá TDI (Bkom) Za kontrolu VV, Za vyhotovení rozdílového VV odpovídá AD

14.2.2023 20.2.2023 proběhne schůzka k dořešení VV, za účasti rozpočtáře BKom, TDI a zástupce zhotovitele.

7.3.2023 Zástupce TDI na KD informoval, že VV byl rozpočtářem Bkom schválen. Zástupci zhotovitele nebyli informováni – schůzka k potvrzení schválení VV proběhne 8.3.2023. Info na příštím KD

21.3.2023 Viz předchozí bod. VV bude dořešen na schůzce na zařízení staveniště 22.3.2023. AD doplní dokladovou část.

Zodpovídá TDI(Bkom) za dořešení VV a AD za dokladovou část

4.4.2023 VV byl rozpočtářem BKom schválen. Tištěnou verzi DPS AD předá do 18.4.2023.

Zodpovídá AD

18.4.2023 Dokumentace nebyla předána. Chybí pouze dokladová část. Bude předána do 2.5.2023.

Zodpovídá AD

2.5.2023 Dokumentace nebyla předána, stále chybí dokladová část. Bude předána do 16.5.2023.

Zodpovídá AD

16.5.2023 Nesplněno. K předání dokumentace nedošlo, není kompletní dokladová část, přítomný zástupce

AD na KD přislíbil předání změny DPS do 23.5.2023

Zodpovídá AD

30.5.2023 Přítomný zástupce AD na KD informoval, že tuto dokumentaci předá kompletní, včetně dokladové části nejpozději do 6.6.2023.

Zodpovídá AD

13.6.2023 Dokumentace nebyla předána. Dokumentaci předá přítomný zástupce KAM dnes po skončení KD.

Za předání zodpovídá KAM

27.6.2023 Nebylo předáno. Předání dokumentace proběhne dnes po skončení KD.

Za předání zodpovídá KAM

4. Kamerový systém na kolonádě – Napojení kamer na kolonádě na městský kamerový systém ZM 029

-Aktuálně je navrženo dle metodiky 23 stacionárních kamer, návrh umožňuje napojení na MKDS, současně může fungovat jako autonomní. Ve VV chybí licence a HW (dle požadavku budoucího správce).

-Dle informací MP nelze provedení dle PD napojit na MKDS. V případě požadavku investora (doposud nerozhodnuto), aby byl objekt kolonády napojen na MKDS, je doporučeno dle informací MP, BKOM a zhotovitele provést revizi PD.

Dne 10.5.2022 se uskutečnilo jednání na KAMu, byly vysvětleny skutečnosti, které brání napojení na MKDS.

Bylo ujednáno, že KAM osloví svého projektanta CCTv, aby upravil svoji PD. Úprava PD pro CCTv by měla proběhnout co nejdříve z důvodů schvalování u MP a dlouhých dodacích lhůt komponentů CCTv.

Zodpovídá KAM

7.6.2022 Proběhlo vstupní jednání mezi BKOM a AD. Na základě jejich domluvy proběhne nacenění. Zatím není oficiálně stanoveno napojení kamer na MKDS. Info KAM: bude řešeno v červenci, ale je předpoklad napojení na MKDS.

AD čeká zadání od BKOM. Bude ugovat zástupce Bkom. Kontrola na příštím KD.

Zodpovídá AD

21.6.2022 - Do 1.7.2022 proběhne jednání za účasti AD a jeho subdodavatele, BKOM (p. [redacted]) a TDI na základě kterého bude napojení kamer na MKDS dále řešeno a proběhne úprava PD.

Za svolání

jednání odpovídá AD

3. Kolize pilotové zdi se stávajícím plynovodem u viaduktu (SO 07.01) ZM 019

Dále zhotovitel upozornil na kolizi pilotové stěny SO 07.01 se stávajícím STL plynovodem. Pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti 1m než požaduje správce zařízení GaSNet. Zástupce projektanta sdělil, že v místě křížení je možné část pilot vynechat a provést pouze konstrukci převázky. Souběh plynovodu a pilotové stěny projektant prověří.

Zodpovídá: projektant Termín: do 26.4.2022

26.4.2022 Projektant předal vytyčovací body nové polohy pilotové stěny, s ohledem na požadovaný odstup 1 m od pevných konstrukcí. Projektant toto řešení projedná se správcem plynovodu. Zhotovitel požaduje v tomto kontextu i o prověření, zda nedochází ke kolizi i při ulici Rybářská s SO 07.27 (produktovod) a s SO 07.21 (přeložka plynu-lávka).

Zodpovídá: projektant

10.5.2022 Byly poskytnuty nové vytyčovací body. Předání proběhne 10.5.2022 po KD. Mění se pouze poloha stěny, délka i ostatní tech. řešení včetně výkazu výměr se nemění.

AD prověřil možnou kolizi SO 07.27 a SO 07.21 s pilotovou stěnou a uvádí, že toto řešení bylo f. GASNet předloženo během zpracování projektové dokumentace a bylo f. GASNet odsouhlaseno.

24.5.2022 Zhotovitel žádá o prověření, zda u pilotové stěny S 07.01 je požadavek na převrtávané piloty. AD prověří a výsledek oznámí zhotoviteli.

Dále zhotovitel požaduje předložit vyjádření f. Gasnet ke křížení plynovodu s pilotovou stěnou. Nejedná se o nové křížení – dle AD není třeba řešit s f. Gasnet. AD předá vyjádření firmy EMH servis, které vyloučí nutnost úpravy křížení. Kontrola na příštím KD. Zhotovitel požaduje předložit detail křížení pilotové stěny (převázky) s plynovodním potrubím.

Zodpovídá AD

7.6.2022 Křížení bylo řešeno s projektantem plynovodu. Prověřuje se nutnost osazení dělené chráničky na plynovod s přesahem 1 m na každou stranu pilotové stěny. AD sdělí info do 14.6.2022

Převrtávané piloty – AD čeká na informace od firmy Šindlar dle AD pravděpodobně nebude nutnost převrtávaných pilot), info do 14.6.2022.

Zodpovídá AD

21.6.2022 Křížení a osazení dělené chráničky bylo řešeno s firmou Gasnet, písemné vyjádření bude do 27.6.2022 – AD zašle TDI a zhotoviteli.

AD sdělil, že převrtávané piloty nejsou nutné – je třeba zpracovat změnu DPS. Proběhne změna u převázek na základě, které zhotovitel objedná výztuže, v této souvislosti zástupce zhotovitele upozorňuje, že výztuže je potřeba objednat nejpozději 3 týdny před vlastním zahájením prací. Plán zahájení prací je 11.7.2022. AD potvrdil zpracování změny do 27.6.2022

Zodpovídá

AD

12.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do příštího KD, který proběhne 26.7.2022.

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika.

Zodpovídá AD

26.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do 5.8.2022

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika – nesplněno. Termín do 5.8.2022.

Zodpovídá AD

9.8.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Urgence AD.

Změna DPS – převrtávané piloty. Dokumentace nebyla předána a bude zaslána neprodleně po KD.

Zodpovídá AD

23.8.2022 Vyjádření od Gasnetu bylo zhotoviteli zasláno 19.8.2022.

Změna DPS-AD zapracovává připomínky od TDI (Bkom) a poté bude dokumentace vložena na sdílené úložiště.

Změna obsahuje i vynechání převrtávaných pilot. Na místě probíhá demontáž sloupů VO, z nichž jeden je ve správě CTP. Zhotovitel oznámí odstranění tohoto sloupu VO přímo správci (CTP).

Zodpovídá: zhotovitel za oznámení demontáže sloupu VO správci, AD za úpravu DPS a KAM za vložení na sdílené úložiště.

6.9.2022 AD provedl revizi DPS a nejpozději 7.9.2022 bude vložena na sdílené úložiště i se zpracovaným výkazem výměr. Zhotovitel zadá výztuž do výroby až poté co bude DPS schválena.

Za vložení na sdílené úložiště zodpovídá KAM

20.9.2022 Projekční řešení bylo zhotoviteli zasláno 19.9.2022. Zhotovitel zaslal k tomuto řešení připomínky, TDI vyzval zástupce AD k jejich zapracování a předložení dokumentace v tištěné podobě.

Zodpovídá AD

4.10.2022 Dle vyjádření AD byly připomínky k VTD zapracovány a dokumentace je již opravená. Zhotovitel upozorňuje, že byly zaslány vytyčovací výkresy na jednotlivé piloty, ale chyběl detail navázání na viadukt, dále
