



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 36

D_03 SO 07.01 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

- ZM 019 Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO



"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 36 ZM 019 _ Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu

Na základě zjištěné kolize pilotové stěny SO 07.01 se stávajícím STL plynovodem (zjištěna nová poloha plynu), tj. stěna je navržena v menší vzdálenosti než 1,0 m od plynovodu.

AD předložil opravenou DPS se zapracovanými připomínkami a dále byly předloženy vytyčovací výkresy pro jednotlivé piloty.

V Brně dne :




Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:

Předmět:
Přílohy:

RE: PPO Svratka_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu
SVR-DPS-D.03-01_VYTYCENI STEN_ad.dwg; SVR_DPS_D03_01_601_01_VYTYČOVACÍ
SCHÉMA_SO 07.01.pdf

Dobrý den,
V příloze zasílám v závislosti na zjištěnou polohu plynu úpravu vytyčovacího výkresu. Došlo ke zrušení body 1 a doplnění bodů B68 a B69. Výkres je jak v dwg tak i pdf. Tato úprava nemá vliv na výkaz výměr daného stavebního objektu SO 07.01 . Došlo k přidání lomového bodu na ŽB stěně.

Jen pro info, níže obrázek zobrazuje polohu plynu dle poskytnutých podkladů (modrá barva) a zaměření na stavbě (červená barva).

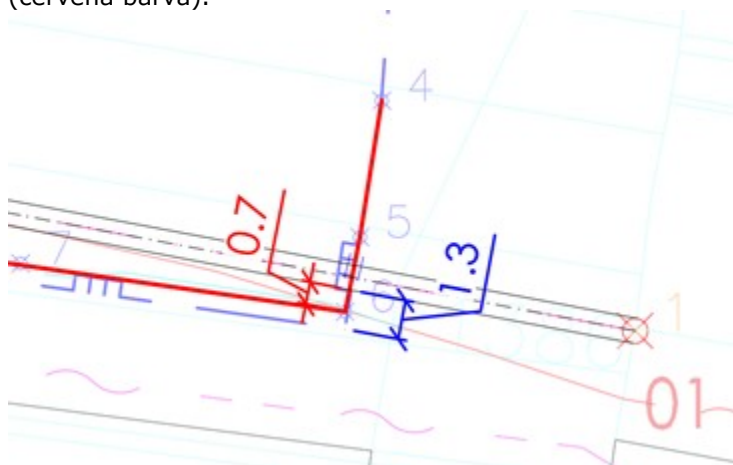

S pozdravem



vedoucí projekce

A PLUS a.s.
Česká 12, 602 00 Brno
www.aplus.cz

From:
Sent: Monday, April 25, 2022 12:24 AM
To:
Cc:

Subject: FW: PPO Svratka_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu

Dobrý den,

děkuji za informaci. Bude projednáno na KD v úterý 26.4.2022.

S pozdravem



Městská infrastruktura – vedoucí týmu protipovodňových opatření



Náš projekt? Brno!
Lidé, územní plán, veřejný prostor.

From: [Redacted]
Sent: Friday, April 22, 2022 1:54 PM
To: [Redacted]
Cc: [Redacted]
Subject: PPO Svratka_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu



Vážená paní inženýrko,

dovoluji si Vás informovat o kolizi stávající trasy plynu STL s navrženou pilotovou stěnou, která je součástí SO 07.01. Kolize byla zjištěna 6.4.2022 a byla postoupena GP, TDI, stejně tak byla řešena v rámci minulých kontrolních dnů.

V příloze Vám zasílám emailovou korespondenci mezi námi jako zhotovitelem a GP.

V posledním emailu jsme obdrželi informaci od [Redacted] že zřejmě dojde k posunu samotné stěny.

Bez změny PD není možno pilotovou stěnu provést.

S pozdravem



Stavbyvedoucí
HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika



www.hochtief.cz

Stavební firma HOCHTIEF CZ zaměstnává v České republice a na Slovensku 1 100 lidí a v dodavatelském řetězci zprostředkovává práci dalším zhruba 3 000 firmám. HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Zajímají vás naše stavby? Podívejte se na <http://www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz/> nebo <http://www.statnioperavrekonstrukci.cz/>. Více na www.hochtief.cz.



The construction company HOCHTIEF CZ has 1,100 employees in the Czech Republic and Slovakia and in the supplier chain, it provides work to approximately 3,000 companies. Since 1999, HOCHTIEF CZ has been part of a major supranational company HOCHTIEF AG and it has been cooperating with its branches from Europe and overseas as well. Are you interested in our projects? Visit <http://www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz/> or <http://www.statnioperavrekonstrukci.cz/>. More on www.hochtief.cz.

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. prohlašuje, že jednání učiněné elektronickými prostředky, které není podepsané zaručeným elektronickým podpisem, není právním jednáním a společnost HOCHTIEF CZ a. s. jím není vázána. Tento e-mail nelze považovat za nabídku, přijetí nabídky a adresát bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednávání o smlouvě v jakékoliv fázi, a to i bez vážného důvodu nelze vyvozovat žádné následky.

The company HOCHTIEF CZ a. s. declares that an act made via electronic means that is not signed with advanced electronic signature is not a legal act and the company HOCHTIEF CZ a. s. shall not be bound by it. This e-mail cannot be deemed an offer, acceptance of an offer, and the addressee acknowledges that no consequences can be inferred from a possible termination of contract negotiations in any stage, namely even without a serious reason.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 03 – Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	Změnový list č. 36
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.01 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce ZM 019 Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kolize pilotové stěny SO 07.01. se stávajícím STL plynovodem, pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti než požaduje GaSNet DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.01. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.36 vícepráce, ZL č.36 méněpráce, ZL č.36 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.01. zhotovitel upozornil na kolizi pilotové stěny se stávajícím STL plynovodem. Pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti než 1,0 m, tj. menší než požaduje správce zařízení GasNet. Souběh pilotové stěny s plynovodem projektant prověřil a předal nové vytyčovací body polohy pilotové stěny, s ohledem na požadovaný odstup od pevných konstrukcí POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII



D_03 (07.01) Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PPO Svratka

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 486 390,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 486 390,29	-312 141,96
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 798 532,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-1 486 390,29

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO
(07.01) 07.01)

-1 486 390,29 -1 798 532,25

-1 486 390,29 -1 798 532,25

D_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
(07.01)MP méněpráce

-1 816 186,44 -2 197 585,59

D_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
(07.01)VP vícepráce

329 796,15 399 053,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01) - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

PPO Svratka

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

DIČ:

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

-1 486 390,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 486 390,29	21,00%	-312 141,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 798 532,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01) - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč: PPO Svratka

Datum: 6. 9. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 486 390,29

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 486 390,29

1 - Zemní práce

33 720,41

2 - Zakládání

-1 452 197,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 323,90

998 - Přesun hmot

-106 236,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01) - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: PPO Svatka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 486 390,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 486 390,29	
D	1		Zemní práce				33 720,41	
67	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	357,308	394,10	140 815,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - výkop (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01 - převážka					
	VV		(11,42+33,16)*0,80*2,00		71,328			
	VV		(31,00)*0,80*2,00		49,600			
	VV		(17,85)*0,80*2,00		28,560			
	VV		rozšíření					
	VV		(207,82)		207,820			
	VV		Součet		357,308			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-117,744	60,10	-7 076,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - přesun po stavbě (obj)					
	VV		Piloty					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					
	VV		(piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)		-117,744			
	VV	vývrtk_obj	Mezisoučet		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-117,744	9,70	-1 142,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - skládka na stavbě (obj)					
	VV		(vývrtk_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-117,744	72,10	-8 489,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - nakládání na stavbě (obj)					
	VV		(vývrtk_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-117,744	252,10	-29 683,26	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
	VV		(vývrtk_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 177,440	6,10	-7 182,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
	VV		(vývrtk_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
	VV		-117,744*10 'Přepočtené koeficientem množství		-1 177,440			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-211,939	300,00	-63 581,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - skládkovné (obj)					
	VV		(vývrtk_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
	VV		-117,744*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		-211,939			
68	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	149,488	67,30	10 060,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zemní práce - zásyp (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01 - převážka					
	VV		(11,42+33,16)*0,80*2,00		71,328			
	VV		(31,00)*0,80*2,00		49,600			
	VV		(17,85)*0,80*2,00		28,560			
	VV		Součet		149,488			
D 2			Zakládání				-1 452 197,61	
21	K	226212113	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	-390,000	2 196,30	-856 557,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - vývrt (dl * p)					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					
	VV		-((3,00)*130)		-390,000			
	VV	piloty_620_1_dl	Součet		-390,000			
27	K	231211312	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-390,000	384,10	-149 799,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty (dl)					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					
	VV		(piloty_620_1_dl)		-390,000			
	VV		Součet		-390,000			
33	M	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	-129,518	3 108,40	-402 593,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - beton (dl * průměr)					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					
	VV		(piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
	VV		-117,744*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-129,518			
36	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-2,204	4 020,50	-8 861,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - převážka (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01 - převážka					
	VV		-((93,44)*0,80*2,07)		-154,737			
	VV		(11,42+33,16)*0,80*2,41		85,950			
	VV		-(2,30)*0,80*0,50		-0,920			
	VV		(31,00)*0,80*1,91		47,368			
	VV		(17,85)*0,80*1,41		20,135			
	VV		Součet		-2,204			
37	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-179,307	672,10	-120 512,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - převážka, bednění (dl * v * p)					
	VV		SO 07.01 - převážka					
	VV		-((93,44)*(3,00*2))		-560,640			
	VV		(11,42+33,16)*2,41*2		214,876			
	VV		-(2,30)*0,50*2		-2,300			
	VV		(31,00)*1,91*2		118,420			
	VV		(17,85)*1,41*2		50,337			
	VV		Součet		-179,307			
38	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-179,307	132,10	-23 686,45	CS ÚRS 2020 02
69	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	30,000	3 660,40	109 812,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Opěrné stěny - pata, podklad (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01					
	VV		(100,00)*3,00*0,10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 323,90	
56	K	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	84,000	60,10	5 048,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Smykové trny - SD01 (p)					
	VV		SO 07.01					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
57	M	54879272	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm	kus	84,000	424,00	35 616,00	CS ÚRS 2020 02
59	K	953333324	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládany doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm	m	-2,000	540,10	-1 080,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Těsnící pás - L02 (dl)					
	VV		SO 07.01					
	VV		-(22,00)		-22,000			
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		-2,000			
60	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm	m	-3,000	420,10	-1 260,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Bobtnavý pásek (dl)					
	VV		SO 07.01					
	VV		-(225,00)		-225,000			
	VV		222,00		222,000			
	VV		Součet		-3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				-106 236,99	
66	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	-252,885	420,10	-106 236,99	CS ÚRS 2020 02

VP		Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PPO Svratka

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Cena bez DPH

-1 816 186,44

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 816 186,44	-381 399,15
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-2 197 585,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-1 816 186,44

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO
(07.01) 07.01)

-1 816 186,44 -2 197 585,59

D_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
(07.01)M méněpráce

-1 816 186,44 -2 197 585,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_03 (07.01)M - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) -
méněpráce**

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

PPO Svratka

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

DIČ:

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

-1 816 186,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 816 186,44	21,00%	-381 399,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 197 585,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01)M - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) - méněpráce

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

6. 9. 2022

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:


í

Uchazeč:

PPO Svratka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 816 186,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 816 186,44

1 - Zemní práce

-117 155,21

2 - Zakládání

-1 562 009,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 340,50

998 - Přesun hmot

-134 681,12

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_03 (07.01)M - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) - méněpráce

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

6. 9. 2022

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

PPO Svatka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 816 186,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 816 186,44	
D	1		Zemní práce				-117 155,21	
14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-117,744	60,10	-7 076,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - přesun po stavbě (obj)					
	VV		Piloty					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					
	VV		(piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)		-117,744			
	VV	vývrtek_obj	Mezisoučet		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-117,744	9,70	-1 142,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - skládka na stavbě (obj)					
	VV		(vývrtek_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-117,744	72,10	-8 489,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - nakládání na stavbě (obj)					
	VV		(vývrtek_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-117,744	252,10	-29 683,26	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
	VV		(vývrtek_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 177,440	6,10	-7 182,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
	VV		(vývrtek_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
	VV		-117,744*10 'Přepočtené koeficientem množství		-1 177,440			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-211,939	300,00	-63 581,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - skládkovné (obj)					
	VV		(vývrtek_obj)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
	VV		-117,744*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		-211,939			
D	2		Zakládání				-1 562 009,61	
21	K	226212113	Velkopřímé vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	-390,000	2 196,30	-856 557,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - vývrt (dl * p)					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					
	VV		-((3,00)*130)		-390,000			
	VV	piloty_620_1_dl	Součet		-390,000			
27	K	231211312	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-390,000	384,10	-149 799,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty (dl)					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(piloty_620_1_dl)		-390,000			
	VV		Součet		-390,000			
33	M	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	-129,518	3 108,40	-402 593,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - beton (dl * průměr)					
	VV		SO 07.01 - nevyz pilota					
	VV		(piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)		-117,744			
	VV		Součet		-117,744			
	VV		-117,744*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		-129,518			
36	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	-2,204	4 020,50	-8 861,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - převázka (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01 - převázka					
	VV		-((93,44)*0,80*2,07)		-154,737			
	VV		(11,42+33,16)*0,80*2,41		85,950			
	VV		-(2,30)*0,80*0,50		-0,920			
	VV		(31,00)*0,80*1,91		47,368			
	VV		(17,85)*0,80*1,41		20,135			
	VV		Součet		-2,204			
37	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-179,307	672,10	-120 512,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Piloty - převázka, bednění (dl * v * p)					
	VV		SO 07.01 - převázka					
	VV		-((93,44)*(3,00*2))		-560,640			
	VV		(11,42+33,16)*2,41*2		214,876			
	VV		-(2,30)*0,50*2		-2,300			
	VV		(31,00)*1,91*2		118,420			
	VV		(17,85)*1,41*2		50,337			
	VV		Součet		-179,307			
38	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-179,307	132,10	-23 686,45	CS ÚRS 2020 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 340,50	
59	K	95333324	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm	m	-2,000	540,10	-1 080,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Těsnící pás - L02 (dl)					
	VV		SO 07.01					
	VV		-(22,00)		-22,000			
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		-2,000			
60	K	95334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm	m	-3,000	420,10	-1 260,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Bobtnavý pásek (dl)					
	VV		SO 07.01					
	VV		-(225,00)		-225,000			
	VV		222,00		222,000			
	VV		Součet		-3,000			
D		998	Přesun hmot				-134 681,12	
66	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	-320,593	420,10	-134 681,12	CS ÚRS 2020 02
VP		Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII



D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PPO Svratka

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH	329 796,15
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	329 796,15	69 257,19
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	399 053,34
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

329 796,15

D_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO
(07.01) 07.01)

329 796,15

399 053,34

D_03 ZM U19 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -
(07.01)P vícepráce

329 796,15

399 053,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_03 (07.01)P - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) -
vícepráce**

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

PPO Svratka

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

DIČ:

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Cena bez DPH

329 796,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 796,15	21,00%	69 257,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

399 053,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_03 (07.01)P - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) -
vícepráce**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

6. 9. 2022

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

PPO Svratka

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

329 796,15

HSV - Práce a dodávky HSV

329 796,15

1 - Zemní práce

150 875,62

2 - Zakládání

109 812,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 664,40

998 - Přesun hmot

28 444,13

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_03 (07.01)P - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) -
vícepráce**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

6. 9. 2022

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

PPO Svratka

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

329 796,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				329 796,15	
D	1		Zemní práce				150 875,62	
67	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	357,308	394,10	140 815,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - výkop (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01 - převážka					
	VV		(11,42+33,16)*0,80*2,00		71,328			
	VV		(31,00)*0,80*2,00		49,600			
	VV		(17,85)*0,80*2,00		28,560			
	VV		rozšíření					
	VV		(207,82)		207,820			
	VV		Součet		357,308			
68	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	149,488	67,30	10 060,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Zemní práce - zásyp (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01 - převážka					
	VV		(11,42+33,16)*0,80*2,00		71,328			
	VV		(31,00)*0,80*2,00		49,600			
	VV		(17,85)*0,80*2,00		28,560			
	VV		Součet		149,488			
D	2		Zakládání				109 812,00	
69	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	30,000	3 660,40	109 812,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Opěrné stěny - pata, podklad (dl * š * v)					
	VV		SO 07.01					
	VV		(100,00)*3,00*0,10		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 664,40	
56	K	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	84,000	60,10	5 048,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.03-01-001-701					
	VV		Smykové trny - SD01 (p)					
	VV		SO 07.01					
	VV		84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
57	M	54879272	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 20mm	kus	84,000	424,00	35 616,00	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				28 444,13	
66	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	67,708	420,10	28 444,13	CS ÚRS 2020 02

VP		Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
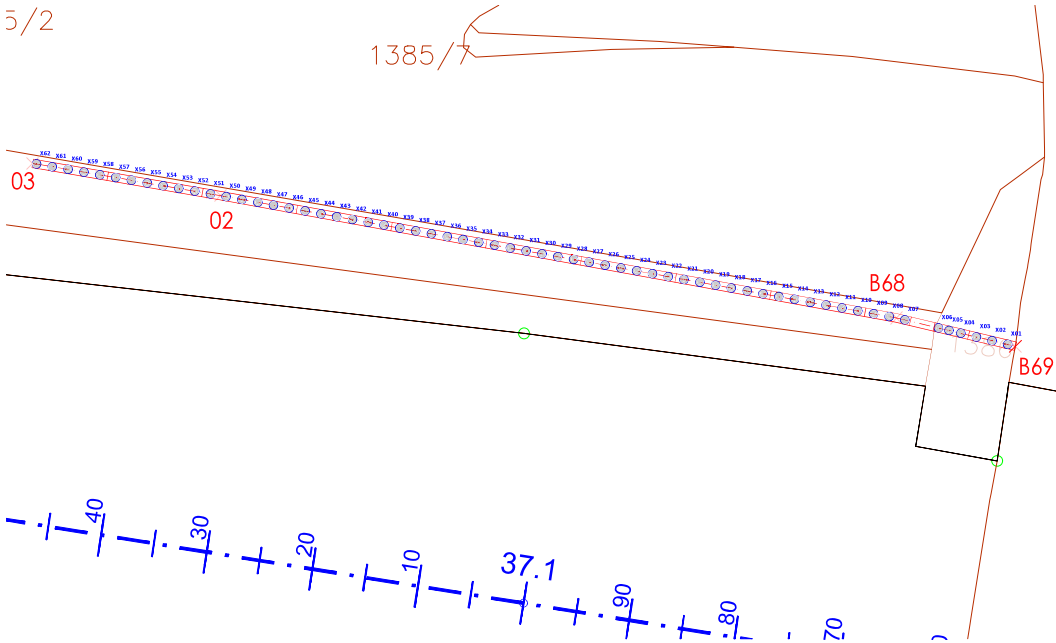
$$5/2$$


WYŚCIGOWY BIEG PIŁOT					
Comar(s) / bzd(s)	polaka x	polityka x	ten polity	Półka polity	Chłost
X01	108:36:27.708	1:16:02:04.235	108:64	5,00 m	A
X02	108:36:32.757	1:16:02:04.235	108:64	5,00 m	A
X03	109:36:24.215	1:16:02:04.266	109:64	5,00 m	A
X04	108:36:35.675	1:16:02:04.131	108:64	5,00 m	A
X05	108:36:38.708	1:16:02:01.673	108:64	5,00 m	A
X06	108:36:37.766	1:16:02:01.440	108:64	5,00 m	A
X07	108:37:30.917	1:16:02:04.688	108:64	5,00 m	A
X08	108:37:32.987	1:16:02:02.388	108:64	5,00 m	A
X09	108:37:35.834	1:16:02:04.114	108:64	5,00 m	A
X10	108:37:35.316	1:16:02:09.848	108:64	5,00 m	A
X11	108:37:36.790	1:16:02:09.581	108:64	5,00 m	A
X12	108:37:36.698	1:16:02:02.388	108:64	5,00 m	A
X13	108:37:35.742	1:16:02:09.046	108:64	5,00 m	A
X14	108:38:51.218	1:16:02:08.780	108:64	5,00 m	A
X15	108:38:18.694	1:16:02:08.513	108:64	5,00 m	A
X16	108:38:44.176	1:16:02:08.248	108:64	5,00 m	A
X17	108:38:55.646	1:16:02:07.970	108:64	5,00 m	A
X18	108:38:57.122	1:16:02:07.712	108:64	5,00 m	A
X19	108:39:46.329	1:16:02:07.443	108:64	5,00 m	A
X20	108:39:40.075	1:16:02:17.339	108:64	5,00 m	A
X21	108:39:51.551	1:16:02:09.611	108:64	5,00 m	A
X22	108:39:54.027	1:16:02:06.644	108:64	5,00 m	A
X23	108:39:54.503	1:16:02:06.377	108:64	5,00 m	A
X24	108:39:55.978	1:16:02:06.130	108:64	5,00 m	A
X25	108:39:57.951	1:16:02:05.843	108:64	5,00 m	A
X26	108:39:59.931	1:16:02:05.576	108:64	5,00 m	A
X27	108:40:00.407	1:16:02:05.309	108:64	5,00 m	A
X28	108:40:01.889	1:16:02:05.049	108:64	5,00 m	A
X29	108:40:03.359	1:16:02:04.775	108:64	5,00 m	B
X30	108:40:04.835	1:16:02:04.508	109:14	5,00 m	B
X31	108:40:06.311	1:16:02:04.242	109:14	5,00 m	B
X32	108:40:07.782	1:16:02:03.974	109:14	5,00 m	B
X33	108:40:10.262	1:16:02:03.707	109:14	5,00 m	B
X34	108:40:12.740	1:16:02:03.440	109:14	5,00 m	B
X35	108:40:15.217	1:16:02:03.173	109:14	5,00 m	B
X36	108:40:13.691	1:16:02:02.906	109:14	5,00 m	B
X37	108:40:15.167	1:16:02:02.639	109:14	5,00 m	B
X38	108:40:16.643	1:16:02:02.372	109:14	5,00 m	B
X39	108:40:18.120	1:16:02:02.105	109:14	5,00 m	B
X40	108:40:19.596	1:16:02:01.838	109:14	5,00 m	B
X41	108:40:21.072	1:16:02:01.571	109:14	5,00 m	B
X42	108:40:22.548	1:16:02:01.304	109:14	5,00 m	B
X43	108:40:24.024	1:16:02:01.037	109:14	5,00 m	B
X44	108:40:25.500	1:16:02:00.770	109:14	5,00 m	B
X45	108:40:26.976	1:16:02:00.503	109:14	5,00 m	B
X46	108:40:28.452	1:16:02:00.237	109:14	5,00 m	B
X47	108:40:29.928	1:16:02:00.970	109:14	5,00 m	B
X48	108:40:31.404	1:16:02:00.703	109:14	5,00 m	B
X49	108:40:32.880	1:16:02:00.436	109:14	5,00 m	B
X50	108:40:34.356	1:16:02:00.169	109:14	5,00 m	B
X51	108:40:35.832	1:16:02:00.902	109:14	5,00 m	B
X52	108:40:37.307	1:16:02:00.635	109:14	5,00 m	C
X53	108:40:38.780	1:16:02:00.368	109:14	5,00 m	C
X54	108:40:40.256	1:16:02:00.10	109:14	5,00 m	C
X55	108:40:41.727	1:16:02:00.887	109:14	5,00 m	C
X56	108:40:43.203	1:16:02:00.620	109:14	5,00 m	C
X57	108:40:44.675	1:16:02:00.380	109:14	5,00 m	C
X58	108:40:46.151	1:16:02:00.113	109:14	5,00 m	C
X59	108:40:47.622	1:16:02:00.880	109:14	5,00 m	C
X60	108:40:49.100	1:16:02:00.628	109:14	5,00 m	C
X61	108:40:50.577	1:16:02:00.372	109:14	5,00 m	C
X62	108:40:52.054	1:16:02:00.105	109:14	5,00 m	C

VYTÝČOVACÍ _B00	Poloha X	Poloha Y	
02	-59B418.829	-1952029.082	OSA - LOM
03	-59B452.431	-1952026.045	OSA - KONEC
B08	-59B131.696	-1952040.508	OSA STĚNY - LOM
B03	-59B160.568	-1952043.508	OSA STĚNY - KONEC

LEGENDA STAVBY ACH OBJEKTŮ

- OPĚRA NA ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA – PLOTOVÁ STĚNA
- OPĚRA NA ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA – ŽB MOHOHŮ
- ARMOVANÁ PLOTOVÁ STĚNA SO 0,07 DI V ROSTECÍCH MAX 1 500 mm
- HEŘKOVANÁ PLOTA STĚNY SO 0,07 DI, ROSTEC 300 mm

LEGENDA KATASTRU A MĚROVITOSTI

- HRAŇICE POČEMŮ KIN
- VNĚŘNÍ KRESBA KIN
- PARCELČÍ ČÍSLO

912/18

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY



chybí vložit na úložiště revize statického výpočtu. AD doplní požadované a termín předání tištěné dokumentace je do 7.10.2022

Zástupce zhotovitele dále upozornil, že na viaduktu momentálně probíhají sanační práce – dojde k domluvě mezi zhotovitelem PPO a zhotovitelem sanačních prací ohledně prostoru staveniště.

Za předání dokumentace zodpovídá AD

18.10.2022 VTD byla doplněna a odsouhlasena zhotovitelem i TDI. Termín pro předání tištěné dokumentace je

25.10.2022. Včetně revize VV

Za předání dokumentace zodpovídá AD

1.11.2022 dokumentace v tištěné podobě včetně revize VV předá AD v den konání KD zástupci KAM. Předání tištěné dokumentace: 1.11.2022

Zodpovídá AD

15.11.2022 Nesplněno. Dokumentace byla předána neúplná, chybí VV.

Termín: 15.11.2022

Zodpovídá AD

29.11.2022 Výkaz výměr byl předán ke kontrole TDI a vložen na sdílené úložiště. Probíhá kontrola. Info na příštím KD

13.12.2022 Kontrola VV rozpočtářem BKom proběhne do 16.12.2022. Dořešení VV proběhne na schůzce na zařízení staveniště 19.12.2022

Za kontrolu ZL zodpovídá TDI

10.1.2023 Kontrola VV rozpočtářem proběhla. V den konání KD byly zhotoviteli zaslány připomínky k zapracování do VV. Info na příštím KD.

Za zapracování připomínek zodpovídá zhotovitel

24.1.2023 VV se zapracovanými připomínkami byl zaslán rozpočtáři ke kontrole. Info k tomuto VV je od rozpočtáře (Bkom) příslibeno na 25.1.2023. TDI upozornil zástupce AD, že chybí rozdílový rozpočet, který je nutný.

Zodpovídá TDI (Bkom) Za kontrolu VV, Za vyhotovení rozdílového VV odpovídá AD

14.2.2023 20.2.2023 proběhne schůzka k dořešení VV, za účasti rozpočtáře BKom, TDI a zástupce zhotovitele.

7.3.2023 Zástupce TDI na KD informoval, že VV byl rozpočtářem Bkom schválen. Zástupci zhotovitele nebyli informováni – schůzka k potvrzení schválení VV proběhne 8.3.2023. Info na příštím KD

21.3.2023 Viz předchozí bod. VV bude dořešen na schůzce na zařízení staveniště 22.3.2023. AD doplní dokladovou část.

Zodpovídá TDI(Bkom) za dořešení VV a AD za dokladovou část

4.4.2023 VV byl rozpočtářem BKom schválen. Tištěnou verzi DPS AD předá do 18.4.2023. Zodpovídá AD

18.4.2023 Dokumentace nebyla předána. Chybí pouze dokladová část. Bude předána do 2.5.2023.

Zodpovídá AD

2.5.2023 Dokumentace nebyla předána, stále chybí dokladová část. Bude předána do 16.5.2023.

Zodpovídá AD

16.5.2023 Nesplněno. K předání dokumentace nedošlo, není kompletní dokladová část, přítomný zástupce

AD na KD příslibil předání změny DPS do 23.5.2023

Zodpovídá AD

30.5.2023 Přítomný zástupce AD na KD informoval, že tuto dokumentaci předá kompletní, včetně dokladové části nejpozději do 6.6.2023.

Zodpovídá AD

13.6.2023 Dokumentace nebyla předána. Dokumentaci předá přítomný zástupce KAM dnes po skončení KD.

Za předání zodpovídá KAM

27.6.2023 Nebylo předáno. Předání dokumentace proběhne dnes po skončení KD.

Za předání zodpovídá KAM

4. Kamerový systém na kolonádě – Napojení kamer na kolonádě na městský kamerový systém ZM 029

-Aktuálně je navrženo dle metodiky 23 stacionárních kamer, návrh umožňuje napojení na MKDS, současně může fungovat jako autonomní. Ve VV chybí licence a HW (dle požadavku budoucího správce).

-Dle informací MP nelze provedení dle PD napojit na MKDS. V případě požadavku investora (doposud nerozhodnuto), aby byl objekt kolonády napojen na MKDS, je doporučeno dle informací MP, BKOM a zhotovitele provést revizi PD.

Dne 10.5.2022 se uskutečnilo jednání na KAMu, byly vysvětleny skutečnosti, které brání napojení na MKDS.

Bylo ujednáno, že KAM osloví svého projektanta CCTv, aby upravil svoji PD. Úprava PD pro CCTv by měla proběhnout co nejdříve z důvodů schvalování u MP a dlouhých dodacích lhůt komponentů CCTv.

Zodpovídá KAM

7.6.2022 Proběhlo vstupní jednání mezi BKOM a AD. Na základě jejich domluvy proběhne nacenění. Zatím není oficiálně stanoveno napojení kamer na MKDS. Info KAM: bude řešeno v červenci, ale je předpoklad napojení na MKDS.

AD čeká zadání od BKOM. Bude ugovat zástupce Bkom. Kontrola na příštím KD.

Zodpovídá AD

21.6.2022 - Do 1.7.2022 proběhne jednání za účasti AD a jeho subdodavatele, BKOM (p. Nebenführ) a TDI na základě kterého bude napojení kamer na MKDS dále řešeno a proběhne úprava PD.

Za svolání

jednání odpovídá AD

3. Kolize pilotové zdi se stávajícím plynovodem u viaduktu (SO 07.01) ZM 019

Dále zhotovitel upozornil na kolizi pilotové stěny SO 07.01 se stávajícím STL plynovodem. Pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti 1m než požaduje správce zařízení GaSNet. Zástupce projektanta sdělil, že v místě křížení je možné část pilot vynechat a provést pouze konstrukci převážky. Souběh plynovodu a pilotové stěny projektant prověří.

Zodpovídá: projektant Termín: do 26.4.2022

26.4.2022 Projektant předal vytyčovací body nové polohy pilotové stěny, s ohledem na požadovaný odstup 1 m od pevných konstrukcí. Projektant toto řešení projedná se správcem plynovodu. Zhotovitel požaduje v tomto kontextu i o prověření, zda nedochází ke kolizi i při ulici Rybářská s SO 07.27 (produktovod) a s SO 07.21 (přeložka plynu-lávka).

Zodpovídá: projektant

10.5.2022 Byly poskytnuty nové vytyčovací body. Předání proběhne 10.5.2022 po KD. Mění se pouze poloha stěny, délka i ostatní tech. řešení včetně výkazu výměr se nemění.

AD prověřil možnou kolizi SO 07.27 a SO 07.21 s pilotovou stěnou a uvádí, že toto řešení bylo f. GASNet předloženo během zpracování projektové dokumentace a bylo f. GASNet odsouhlaseno.

24.5.2022 Zhotovitel žádá o prověření, zda u pilotové stěny S 07.01 je požadavek na převrtávané piloty. AD prověří a výsledek oznámí zhotoviteli.

Dále zhotovitel požaduje předložit vyjádření f. Gasnet ke křížení plynovodu s pilotovou stěnou. Nejedná se o nové křížení – dle AD není třeba řešit s f. Gasnet. AD předá vyjádření firmy EMH servis, které vyloučí nutnost úpravy křížení. Kontrola na příštím KD. Zhotovitel požaduje předložit detail křížení pilotové stěny (převážky) s plynovodním potrubím.

Zodpovídá AD

7.6.2022 Křížení bylo řešeno s projektantem plynovodu. Prověřuje se nutnost osazení dělené chráničky na plynovod s přesahem 1 m na každou stranu pilotové stěny. AD sdělí info do 14.6.2022

Převrtávané piloty – AD čeká na informace od firmy Šindlar dle AD pravděpodobně nebude nutnost převrtávaných pilot), info do 14.6.2022.

Zodpovídá AD

21.6.2022 Křížení a osazení dělené chráničky bylo řešeno s firmou Gasnet, písemné vyjádření bude do 27.6.2022 – AD zašle TDI a zhotoviteli.

AD sdělil, že převrtávané piloty nejsou nutné – je třeba zpracovat změnu DPS. Proběhne změna u převážek na základě, které zhotovitel objedná výstuže, v této souvislosti zástupce zhotovitele upozorňuje, že výstuže je potřeba objednat nejpozději 3 týdny před vlastním zahájením prací. Plán zahájení prací je 11.7.2022. AD potvrdil zpracování změny do 27.6.2022

Zodpovídá

AD

12.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do příštího KD, který proběhne 26.7.2022.

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika.

Zodpovídá AD

26.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do 5.8.2022

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika – nesplněno. Termín do 5.8.2022.

Zodpovídá AD

9.8.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Urgence AD.

Změna DPS – převrtávané piloty. Dokumentace nebyla předána a bude zaslána neprodleně po KD.

Zodpovídá AD

23.8.2022 Vyjádření od Gasnetu bylo zhotoviteli zasláno 19.8.2022.

Změna DPS-AD zapracovává připomínky od TDI (Bkom) a poté bude dokumentace vložena na sdílené úložiště.

Změna obsahuje i vynechání převrtávaných pilot. Na místě probíhá demontáž sloupů VO, z nichž jeden je ve správě CTP. Zhotovitel oznámí odstranění tohoto sloupu VO přímo správci (CTP).

Zodpovídá: zhotovitel za oznámení demontáže sloupu VO správci, AD za úpravu DPS a KAM za vložení na sdílené úložiště.

6.9.2022 AD provedl revizi DPS a nejpozději 7.9.2022 bude vložena na sdílené úložiště i se zpracovaným výkazem výměr. Zhotovitel zadá výstuž do výroby až poté co bude DPS schválena.

Za vložení na sdílené úložiště zodpovídá KAM

20.9.2022 Projekční řešení bylo zhotoviteli zasláno 19.9.2022. Zhotovitel zaslal k tomuto řešení připomínky, TDI vyzval zástupce AD k jejich zapracování a předložení dokumentace v tištěné podobě.

Zodpovídá AD

4.10.2022 Dle vyjádření AD byly připomínky k VTD zapracovány a dokumentace je již opravená. Zhotovitel upozorňuje, že byly zaslány vytyčovací výkresy na jednotlivé piloty, ale chyběl detail navázání na viadukt, dále
