



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 48

D_09 Úprava na stokách

SO 07.18 – úpravy na levobřežní kmenové stoce

- SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB-14 -bourání štoly na stávajícím potrubí

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


Důvodová zpráva – změnový list č. 48 Hradidlová komora HKB14 – bourání štolý na stávajícím potrubí

V rámci hloubení hradidlové komory HKB 14 bylo zjištěno v prostoru hloubené jámy, že ŽB kanalizační potrubí je uloženo v ražené štolě, kterou je nutné vybourat - bude vybouráno cca 13 m³ železobetonu s důlní výztuží, pažnicemi, pražci a kolejemi.

Projekt předpokládal vybourání potrubí stávající stoky provedené technologií otevřeného výkopu s uložením potrubí pouze v sedle.

Tyto práce budou provedeny nad rámec rozpočtu – vícepráce.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

-

Naše značka

-

Vyřizuje



Hradec Králové

4.3.2024

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“


Stanovisko projektanta k bourání vystrojení a výplně štol pro hradidlovou komoru HKB 14

Vážení,

Během provádění stavebních prací při hloubení stavební jámy bylo zjištěno, že stávající potrubí je zalito betonem v ražené štolě. Pro vybudování hradidlové komory je potřeba zdemontovat vystrojení štol a vybourat obetonování potrubí v množství cca 13 m³.

Na základě odsouhlasení TDI a AD bude zpracován výkaz výměr.

Vypracoval:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 09 – Úprava na stokách SO 07.18 -úpravy na levobřežní kmenové stoce		Změnový list č. 48
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 07.18.f – Hradidlová komora HKB-14 - bourání štol na stávajícím potrubí		PŘÍKAZ Č.:
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: předání příkazu ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání ŽB potrubí v ražené štole DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.48 vícepráce, ZL č.48 méněpráce, ZL č.48 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V rámci hloubení hradidlové komory HKB 14 bylo zjištěno v prostoru hloubené jámy, že ŽB kanalizační potrubí je uloženo v ražené štole, kterou je nutné vybourat. Bude vybouráno cca 13 m3 železobetonu s důlní výztuží, pažnicemi, pražci a kolejemi. NAVRHL: [REDACTED] DATUM: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s., [REDACTED]		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 09 – Úprava na stokách SO 07.18 -úpravy na levobřežní kmenové stoce	48																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.18.f – Hradidlová komora HKB-14 - bourání štol na stávajícím potrubí Bylo zjištěno, že v prostoru hloubené jámy je železobetonové kanalizační potrubí uloženo v ražené štolě, kterou je nutné vybourat.																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: předání ZL ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ Mail _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání ŽB potrubí v ražené štolě DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18.f. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.48 vícepráce, ZL č.48 méněpráce, ZL č.48 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">269 061,75 Kč</td><td style="text-align: right;">56 502,97 Kč</td><td style="text-align: right;">325 564,72 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 32 464,91 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 817,63 Kč</td><td style="text-align: right;">-39 282,54 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">236 596,84 Kč</td><td style="text-align: right;">49 685,34 Kč</td><td style="text-align: right;">286 282,18 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	269 061,75 Kč	56 502,97 Kč	325 564,72 Kč	Méněpráce:	- 32 464,91 Kč	-6 817,63 Kč	-39 282,54 Kč	Rozdíl:	236 596,84 Kč	49 685,34 Kč	286 282,18 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	269 061,75 Kč	56 502,97 Kč	325 564,72 Kč														
Méněpráce:	- 32 464,91 Kč	-6 817,63 Kč	-39 282,54 Kč														
Rozdíl:	236 596,84 Kč	49 685,34 Kč	286 282,18 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ Ing. Roman Bárta _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s., _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce
Soupis: Změnový list: ZL č.48
Úroveň 3:

SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 - bourání štol na stávajícím potrubí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	28. 9. 2020
Zadavatel:		IČ:	449 92 785
	Statutární město Brno	DIČ:	CZ44992785
Zhotovitel:		IČ:	
	SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO	DIČ:	
Projektant:		IČ:	262 36 419
		DIČ:	CZ26236419
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
		DIČ:	CZ25333046

Poznámka:
Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			236 596,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 236 596,84	Výše daně 49 685,34
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			286 282,18

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20MT085c1		
Stavba:	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII		
	SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 - bourání štoly na stávajícím potrubí		
Místo:	Nábřeží Svratky	Datum:	28. 9. 2020
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		236 596,84	286 282,18
D_09	Úprava na stokách	236 596,84	286 282,18
01	SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce	236 596,84	286 282,18
	SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 - bourání štoly na stávajícím potrubí -MÉNĚPRÁCE	-32 464,91	-39 282,54
	SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 - bourání štoly na stávajícím potrubí -VÍCEPRÁCE	269 061,75	325 564,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_09 - Úprava na stokách

Soupis: 01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3: 06 (2) - SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 - bourání štolý pro stávající potrubí

Místo: Nábřeží Svatky Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							236 596,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							236 596,84	
D 1 Zemní práce							200 382,99	
61	K	133312821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	11,174	3 250,00	36 315,50	URS 2023/2
vv						-2,47*(3,2+2,45)/2*2,88*bourání štolý	-20,096	
vv						2,61*4,16*2,88 *ruční hloubení u štolý+bouraná štolá	31,270	
vv						Součet	11,174	
10	K	133354104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3	m3	-31,270	721,80	-22 570,69	
vv						-2,61*4,16*2,88 *ruční hloubení u štolý+bouraná štolá	-31,270	
58	K	139911123	Bourání kol v hloubených výkopávkách ze zdíva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	12,340	12 900,00	159 186,00	URS 2023/2
vv						(3,2+2,45)/2*2,88*2,47 *celkem těleso štolý a potrubí	20,096	
vv						~(1*1*3,14)*2,47*odpočet potrubí	-7,756	
vv						Součet	12,340	
60	K	153111115	Podélné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	m	44,460	840,00	37 346,40	URS 2023/2
vv						postupné odřezávání pažnic, postup 30 cm, 9 postupů		
vv						(2,88/0,3=9,6)		
vv						9*2*2,47	44,460	
20	K	162451126	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-12,340	82,20	-1 014,35	
vv						~(3,2+2,45)/2*2,88*2,47 *celkem těleso štolý a potrubí	-20,096	
vv						~(1*1*3,14)*2,47*vytlačení objem potrubí	7,756	
vv						Součet	-12,340	
21	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-12,340	239,20	-2 951,73	
vv						přebytečná zemina		
vv						-12,34	-12,340	
22	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-123,400	6,70	-826,78	
vv						10 příplateků		
vv						-10*12,34	-123,400	
24	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-12,340	44,50	-549,13	
vv						přebytečná zemina z meziskládky		
vv						-12,34	-12,340	
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-22,212	200,00	-4 442,40	
vv						-12,34*1,8	-22,212	
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-12,340	8,90	-109,83	
vv						-12,34	-12,340	
D 8 Trubní vedení							21 601,90	
36	K	820571811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 1200 do 1650	m	1,220	1 741,50	2 124,63	
vv						2,47-1,25	1,220	
62	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,722	3 804,20	14 159,23	
vv						přil. D.09.106		
vv						-2*(1,85+2,8)*0,3*5,17*2 *přil. D.09.106, koef. 2 stěny	-28,849	
vv						5,17*(2,45*4-2,8*1,25)*skutečnost	32,571	
vv						Součet	3,722	
63	K	352351131	Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky přes 1500 do 2000 mm otevřený výkop	m2	10,053	529,00	5 318,04	
vv						2*2*π*0,8	10,053	
D 997 Přesun sutě							14 611,95	
50	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	32,471	450,00	14 611,95	
vv						34,471	23,471	

J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	0,08555		32,47080
	0,08555		32,47080
	0,01467		29,61600
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	2,40000	29,61600
0,00033	0,01467	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	2,34000	2,85480
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00705	0,07087	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000		0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_09 - Úprava na stokách

Soupis: 01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3: SO 07.18.f - Hradidlová komora HKB -14 - bourání štolý na stávajícím potrubí -MÉNĚPRÁCE

Místo: Nábřeží Svatky Datum: 28. 9. 2020
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-32 464,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							-32 464,91	
D 1 Zemní práce							-32 464,91	
61	K	133312821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	11,174	0,00	0,00	URS 2023/2
vv						-2,47*(3,2+2,45)/2*2,88*bourání štolý	-20,096	
vv						2,61*4,16*2,88 *ruční hloubení u štolý+bouraná štolá	31,270	
vv						Součet	11,174	
10	K	133354104	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3	m3	-31,270	721,80	-22 570,69	
vv						-2,61*4,16*2,88 *ruční hloubení u štolý+bouraná štolá	-31,270	
58	K	139911123	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdíva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	12,340	0,00	0,00	URS 2023/2
vv						(3,2+2,45)/2*2,88*2,47 *celkem těleso štolý a potrubí	20,096	
vv						~(1*1*3,14)*2,47*odpočet potrubí	-7,756	
vv						Součet	12,340	
60	K	153111115	Podélné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	m	44,460	0,00	0,00	URS 2023/2
vv						postupně odřezávání pažnic, postup 30 cm, 9 postupů		
vv						(2,88/0,3=9,6)		
vv						9*2*2,47	44,460	
20	K	162451126	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-12,340	82,20	-1 014,35	
vv						~(3,2+2,45)/2*2,88*2,47 *celkem těleso štolý a potrubí	-20,096	
vv						~(1*1*3,14)*2,47*vyláčený objem potrubí	7,756	
vv						Součet	-12,340	
21	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-12,340	239,20	-2 951,73	
vv						přebytečná zemina		
vv						-12,34	-12,340	
22	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-123,400	6,70	-826,78	
vv						10 příplateků		
vv						-10*12,34	-123,400	
24	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-12,340	44,50	-549,13	
vv						přebytečná zemina z meziskládky		
vv						-12,34	-12,340	
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-22,212	200,00	-4 442,40	
vv						-12,34*1,8	-22,212	
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-12,340	8,90	-109,83	
vv						-12,34	-12,340	
D 8 Trubní vedení							0,00	
36	K	820571811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 1200 do 1650	m	1,220	0,00	0,00	
vv						2,47-1,25	1,220	
62	K	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,722	0,00	0,00	
vv						přil. D.09.106		
vv						-2*(1,85+2,8)*0,3*5,17*2 *přil. D.09.106, koef. 2 stěny	-28,849	
vv						5,17*(2,45*4-2,8*1,25)*skutečnost	32,571	
vv						Součet	3,722	
63	K	352351131	Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky přes 1500 do 2000 mm otevřený výkop	m2	10,053	0,00	0,00	
vv						2*2*π*0,8	10,053	
D 997 Přesun sutě							0,00	
50	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	32,471	0,00	0,00	
vv						34,471	23,471	

J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	0,08555		32,47080
	0,08555		32,47080
	0,01467		29,61600
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	2,40000	29,61600
0,00033	0,01467	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	2,34000	2,85480
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00705	0,07087	0,00000	0,00000
	0,00000		0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: D_09 - Úprava na stokách
Soupis: 01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	28. 9. 2020
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO	Zpracovatel:	

D	1	Zemní práce	232 847,90
---	---	-------------	------------

J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
	0,08555		32,47080
	0,08555		32,47080
	0,01467		29,61600
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	2,40000	29,61600
0,00033	0,01467	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,07087		2,85480
0,00000	0,00000	2,34000	2,85480
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00705	0,07087	0,00000	0,00000
	0,00000		0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000


Denní záznamy stavby

ЗАПИС ЗНАЮЩИТЕ:

1. Prüfung : AKKURATENI HEB TH B

ЗАДАЧА 2. РАВНОСТРУЖИ ТРАПАЗ И ЕГО СВОЙСТВА

Právník: T. CUKR KLADIVCI 23,2 M³ PRÁVNICE
 ZETOML PRÁVNICE
 KUKAJETI.

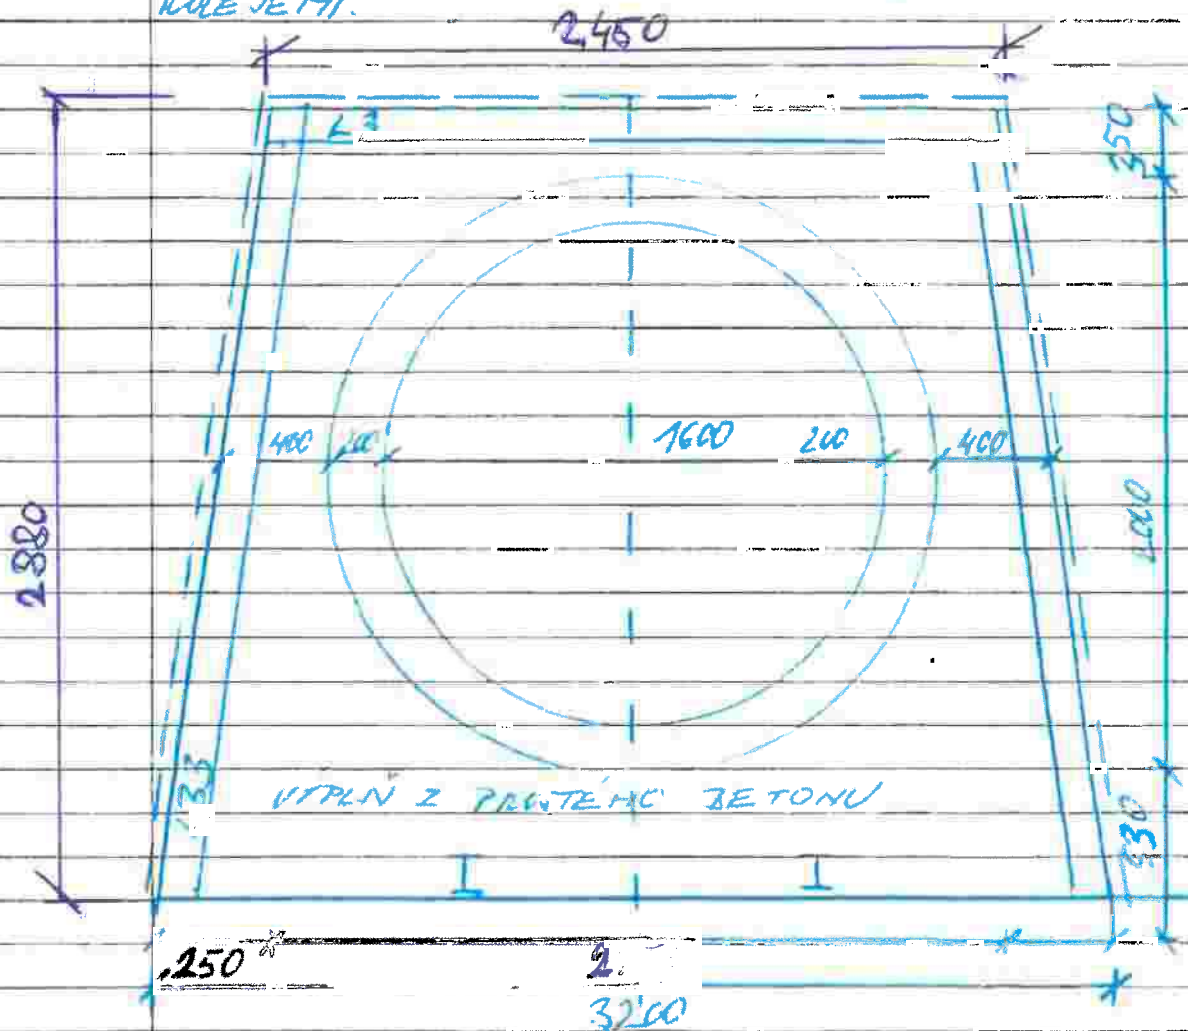

PLOCHA VÝRUBU:

8, 136 m²

PLAHA DN 160C =

2

PLCĤHA + ÝPLNĚ =

$$6.126 \text{ m}^3$$

DÉLEKŐ I. ÁLLAM:

 2.47 m^3

PLURITY ACTION

23.1.2024 AD obdržel od zhotovitele požadované zaměření. Info na příštím KD. Patky pro vodáky budou řešeny na koordinacích na KAMu.

13.2.2024 Zástupce zhotovitele zašle podklady k již realizovaným pracím v místě v den konání KD zástupcům KAM a KAM svolá na základě zaslaného výrobní výbor za účasti AD.

Koryto bylo navraceno do původního tvaru. Bod bude vypuštěn.

9. Pilotová stěna SO 07.01 nemožnost vrtání pilot části A-4

23.1.2024 u objektu SO 07.01 v části A-4 bylo zjištěno, že nelze vrtat piloty z důvodu nalezené betonové konstrukce, která je zřejmě součástí vnitřní části nábrežní zdi. V tomto týdnu proběhne schůzka za účasti AD, TDI, Zhotovitel na místě. Info na příštím KD.

13.2.2024 Probíhá vrtání pilot v pousnuté poloze. AD přislíbil zaslat co nejdříve navazující části a závazné stanovisko, kde bude uvedeno, do kterých další SO má této změna dopad. Zodpovídá AD

10. Kompletace veškeré dokumentace potřebné pro kolaudaci a kolaudační souhlasy či užívání stavebních objektů Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII (PPO)

13.2.2024 Na dnešním KD technický poradce z VRV požádal o svolání vstupního jednání potřebného pro koordinaci kompletace veškeré dokumentace, která bude v budoucnu potřeba pro kolaudace, kolaudační souhlasy či užívání jednotlivých stavebních objektů akce PPO. Jednání se zúčastní jednotliví stavbyvedoucí zhotovitele, TDI, KAM, VRV. Jednání svolá zástupce VRV a proběhne do konce 2/2024.

Za svolání jednání zodpovídá zástupce VRV

11. Bourání stávajícího potrubí DN 1600 v HKB 14 zalitého ve staré štolě.

13.2.2024 Bylo zjištěno, že bude potřeba odbourat větší množství železobetonu v HKB 14 než s jakým bylo uvažováno v DPS. Dále je nutná změna provádění. Zhotovitel zpracuje ZL do 27.2.2024. Zodpovídá zhotovitel

12. Biologický dozor na stavbě PPO

13.2.2024 Na dnešním KD zástupce KAM informoval, že bylo se zástupci zhotovitele domluveno, že biologický dozor stavby (Pan Prášek) se bude pravidelně účastnit kontrolních dní a předkládat pravidelně zprávy o své činnosti na stavbě PPO. Za účast biologického dozoru na KD a předložené zprávy zodpovídá zhotovitel

13. Aktualizace havarijního a povodňového plánu

13.2.2024 Dnes před konáním KD proběhlo jednání v zasedací místnosti na zařízení staveniště za účasti KAM, TDI, Zhotovitel, OI MMB, VRV a.s. Z jednání vznikne zápis, který KAM rozešle. Dojde k doplnění povodňového plánu, který bude poté předložen na PMO a to včetně aktuálního harmonogramu, který byl součástí dodatku č.3. Další info na příštím KD po zpracování zápisu z tohoto jednání a jeho doplnění o přesná místa, která by bylo v případě průtoku více jak 120m3 potřeba ochránit pomocí mobilního hrazení.

14. Prohlídka stavby PPO účastníky HZS

13.2.2024 Na dnešním KD zástupce KAM informoval, že zástupci HZS mají zájem o prohlídku stavby PPO, především na místech, kde by v budoucnu byla nutnost použití mobilních čerpadel. Zástupce KAM ověří termín a ten oznámí TDI. Prohlídky se zúčastní KAM, TDI a zástupce zhotovitele. Zodpovídá KAM

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.

Zodpovídá: zhotovitel

2. Paní [redacted] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a
