



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 45

D_05 – Komunikace

D_05.2 – SO 07.13.2 – Stezka a promenádní komunikace
v km 37,055-38,830 – místní komunikace

- ZM 060 -úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


Důvodová zpráva – změnový list č. 45

ZM 060 -úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty

Z důvodu vedení stezek či pěšin nad kamennou patou bude nutné provést úpravu v místě kamenné paty - kámen frakce 200–500 kg zpevňující břeh v části revitalizace bude ukončeno 200 mm pod úrovní pláně a následně prosypán frakcí 0-125 pro srovnání roviny. Nad touto úpravou bude dále skladba tvořena vrstvou štěrkodeřtě 0-63 pro zabezpečení rovinatosti pláně. Na toto souvrství bude navazovat vozovkové souvrství s první vrstvou štěrkodeřti v rámci skladby komunikace oddělenou geotextilií od srovnávací vrstvy ze štěrkodeřtě 0-63. Tato úprava bude provedena v místech souběhu stezek a paty v místě mezi Renneskou a Heršpickou.

V Brně dne :





Datum: 14. listopadu 2023

Věc: ZM 060 – ÚPRAVA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ V MÍSTĚ KAMENNÉ PATY


Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Z důvodu vedené stezek či pěšin nad kamennou patou bude nutné provést úpravu v místě kamenné paty následovně.

Kámen frakce 200–500 kg zpevňující břeh v části revitalizace bude ukončeno 200 mm pod úrovní pláňe a následně prosypán frakcí 0-125 pro srovnání roviny. Nad touto úpravou bude dále skladba tvořena vrstvou štěrkodeřtě 0-63 pro zabezpečení rovinatosti pláňe. Na toto souvrství bude navazovat vozovkové souvrství s první vrstvou štěrkodeřti v rámci skladby komunikace oddělenou geotextilií od srovnávací vrstvy ze štěrkodeřtě 0-63.

Tato úprava bude provedena v místech souběhu stezek a paty v místě mezi Renneskou a Heršpickou. Zbylé souběhy jsou odstraněny změnou ZM 046 v rámci změny sklonu revitalizovaných částí.


V místě souběhu se nebude realizovat vápnění a tato vrstva bude nahrazena prosypem kamenné paty v celkové výměře 249 m².

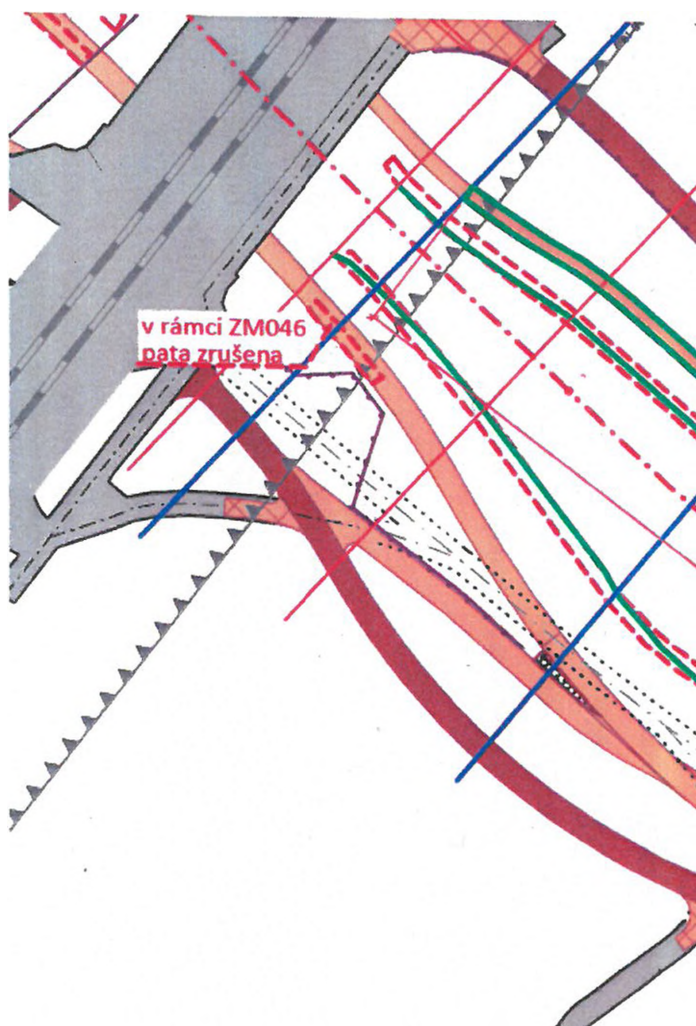




Úsek mezi Renneskou a Heršpickou

Jedná se o souběh v délce 138 m a výměře 249 m².

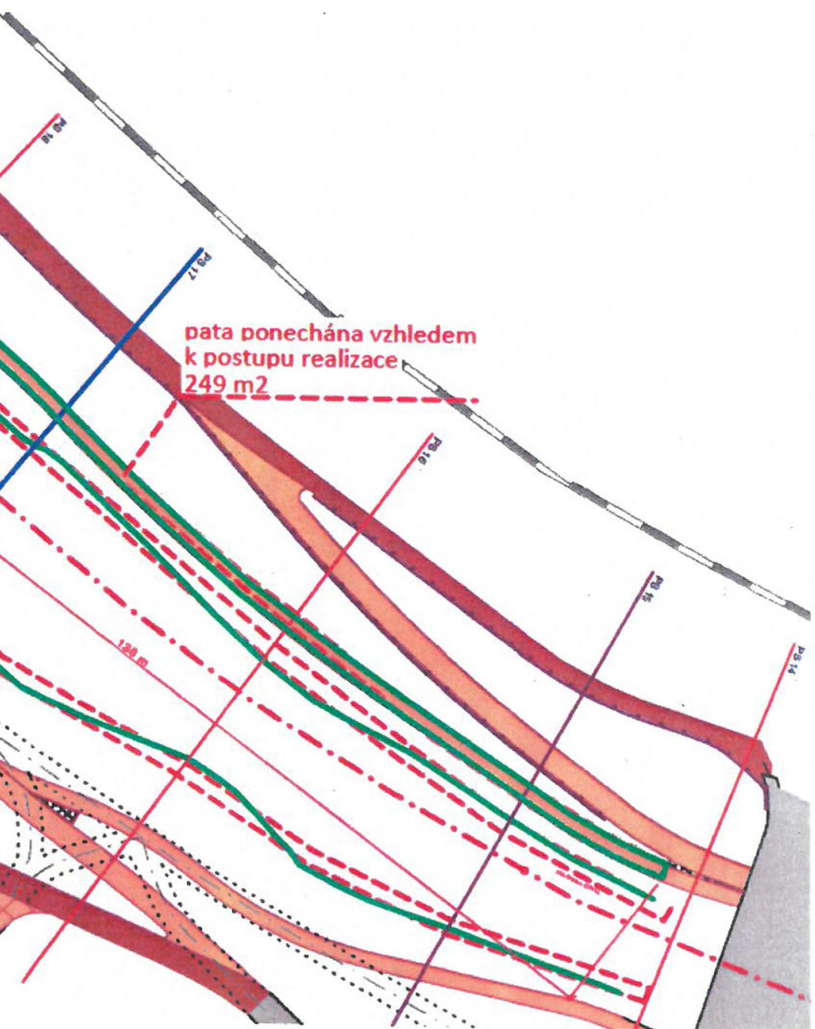

Detail řešení paty

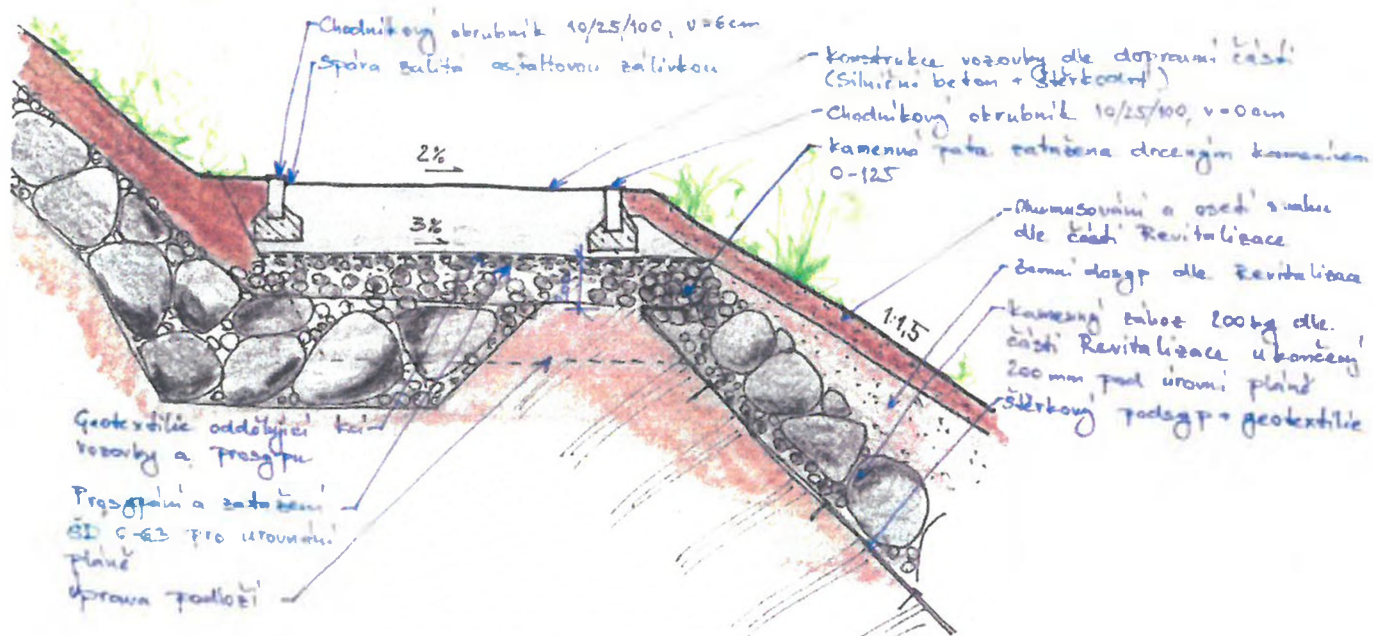

Vyhotoval:

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_05 Komunikace	Změnový list č. 45						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY</td><td style="width: 50%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr><tr><td colspan="2">D_05.2 – SO 07.13.2-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 -místní komunikace ZM 060 -úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:	D_05.2 – SO 07.13.2-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 -místní komunikace ZM 060 -úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty			
OZNÁMENÍ ZMĚNY	PŘÍKAZ Č.:						
D_05.2 – SO 07.13.2-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 -místní komunikace ZM 060 -úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 060 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.45 vícepráce - méněpráce, ZL č.45 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Kámen frakce 200–500 kg zpevňující břeh v části revitalizace bude ukončeno 200 mm pod úrovní pláňe a následně prosypán frakcí 0-125 pro srovnání roviny. Nad touto úpravou bude dále skladba tvořena vrstvou šterkodrtě 0-63 pro zabezpečení rovinatosti pláňe. Na toto souvrství bude navazovat vozovkové souvrství s první vrstvou šterkodrti v rámci skladby komunikace oddělenou geotextilií od srovnávací vrstvy ze šterkodrtě 0-63. NAVRHL: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____							
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____						

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_05 Komunikace	45																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: D_05.2 – SO 07.13.2-Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 -místní komunikace ZM 060 -úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 060 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.45 vícepráce, ZL č.45 méněpráce, ZL č.45 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">303 900,66 Kč</td><td style="text-align: right;">63 819,14 Kč</td><td style="text-align: right;">367 719,80 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 122 857,67 Kč</td><td style="text-align: right;">-25 800,11 Kč</td><td style="text-align: right;">- 148 657,78 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">181 042,99 Kč</td><td style="text-align: right;">38 019,03 Kč</td><td style="text-align: right;">219 062,02 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	303 900,66 Kč	63 819,14 Kč	367 719,80 Kč	Méněpráce:	- 122 857,67 Kč	-25 800,11 Kč	- 148 657,78 Kč	Rozdíl:	181 042,99 Kč	38 019,03 Kč	219 062,02 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	303 900,66 Kč	63 819,14 Kč	367 719,80 Kč														
Méněpráce:	- 122 857,67 Kč	-25 800,11 Kč	- 148 657,78 Kč														
Rozdíl:	181 042,99 Kč	38 019,03 Kč	219 062,02 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____																	
VYJÁDŘENÍ: _____																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - realizace PPO města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05 23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419

DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			181 042,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	181 042,99	38 019,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			219 062,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 20MT085

Stavba: Nábřeží řeky Svratky - realizace PPO města Brna – etapa VII a VIII

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace
ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

181 042,99 219 062,02

D_05.2	SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 - místní komunikace	181 042,99	219 062,02
01	ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty	181 042,99	219 062,02
	ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty - MÉNĚPRÁCE	-122 857,67	-148 657,78
	ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty - VÍCEPRÁCE	303 900,66	367 719,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Protipovodňové opatření města Brno – etapa VII a VIII

Objekt

D_05 - Komunikace

Soupis

D_05 23 - Dopravní řešení

Uroveň 3:

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

13/6/2024

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]
Náklady soupisu celkem							181 042,99			239,24508
D HSV Práce a dodávky HSV							181 042,99			239,24508
D 5 Komunikace pozemní							172 334,47			239,24508
1	K	171151131	Uložení sypání z hornin nesoudržných a soudržných sřídavě do násypů zhutněných	m3	191,667	35,60	6 823,35	SO 07.08	0,00000	0,00000
PP				Uložení sypání do násypů a rozprostření sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných sřídavě do násypů						
W				pracyplnění kamenné paty kamenným 0-125, tl. 200						
W				346t / 1,8m3						
W				191,667						
2	K	462511370	Zához z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	-49,680	2 395,30	-118 998,50	SO 07.07	2,13408	-106,02109
PP				Zához z lomového kamene neupraveného záhozu váha bez prošťkování z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg						
PP				1,8*0,2*138						
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapážené v hornině třídy těžnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné	m3	16,560	248,40	4 113,50	SO 07.13.2	0,00000	0,00000
PP				Odkopávky a prokopávky nezapážené strojní v hornině třídy těžnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
W				"odkopávky po zemi plát"						
W				(2,4-1,8)*138*0,2 -výkop						
W				16,560						
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,560	254,40	4 212,86	SO 07.13.2	0,00000	0,00000
PP				Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, ověření se složením bez rozhraní z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m						
W				"odvoz přebytkové zeminy na skládku do 10 km"						
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	29,808	200,00	5 961,60	SO 07.13.2	0,00000	0,00000
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04						
W				16,56*1,8						
W				29,808						
6	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezioklady	m3	16,560	9,70	160,63	SO 07.13.2	0,00000	0,00000
PP				Uložení sypání na skládce nebo mezioklady bez hrubšího s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru						
7	M	58344228	Štěrka frakce 0/125	t	345,000	472,00	162 840,00	CS ÚRS 2023 02	1,00000	345,00000
8	K	584861111	Podklad ze štěrky SD tl. 200 mm	m2	331,200	242,60	80 349,12	SO 07.13.2	0,00000	0,00000
PP				Podklad ze štěrky SD a rozprostření a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
W				"vrstva SD 0/03 v tl. 200mm"						
W				vynovnění vrstva						
W				138*2,4						
W				331,200						
9	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextílie o sklonu přes 10° do 35° a do 3 m	m2	331,200	38,40	12 718,08	SO 07.08	0,00028	0,09227
PP				Zřízení vrstvy z geotextílie a přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dotlačením včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextílie do 3 m						
W				138*2,4						
W				347,760						
10	M	69311175	geotextílie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	347,760	40,70	14 153,83	SO 07.08	0,00050	0,17388
PP				geotextílie PP s UV stabilizací 500g/m2						
W				331,2*1,05 "ztrátě 5%"						
W				347,760						
D 998 Přesun hmot							8 708,52			8,80000
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	239,245	36,40	8 708,52	SO 07.13.2	0,00000	0,00000
PP				Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenosti do 200 m jakékoliv délky objektu						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05 23 - Dopravní řešení

Uroveň 3.

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty - MĚNĚPRÁCE

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutami město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J surf [t]	Surf Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							-122 857,67					
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-122 857,67			-106,02108		0,00000
0	5		Komunikace pozemní				-118 998,50			-106,02108		0,00000
2	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	-49,680	2 395,30	-118 998,50	SO 07 07	2,13408	-106,02109	0,00000	0,00000
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 1,8*0,2*138												
0	998		Přesun hmot				-3 859,17			0,00000		0,00000
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-106,021	36,40	-3 859,17	SO 07 13.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene v monolitickým betonovým nebo živičným dopravě vzdálenosti do 200 m jakéhokoli směru objektu												

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05 23 - Dopravní řešení

Uroveň 3

D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 - místní komunikace

ZM 060 - úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty - VÍCEPRÁCE


Místo: Nábřeží Svratky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							303 900,66			345,26615		0,00000
D HSV Práce a dodávky HSV							303 900,66			345,26615		0,00000
D 5 Komunikace pozemní							291 332,97			345,26615		0,00000
1	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržitých a soudržitých střídaně do náspů zhrutněných	m3	191,667	35,60	6 823,35	SO 07 08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Uložení sypaniny do náspů a rozprostření sypaniny ve vřstách a s hrubým urovněním zhrutněných z hornin nesoudržitých a soudržitých střídaně ukládaných pracování kamenné paty kamenným 0-125, tl. 200 345,1 / 1,80/m3												
					191,667							
2	K	462511370	Zához z lomového kamene bez prořezávání z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	-49,680	0,00	0,00	SO 07 07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prořezávání z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 1,8*0,2*138												
PP												
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžkosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné	m3	16,560	248,40	4 113,50	SO 07.13.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžkosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 "odkopávky po zemní pláti" 12,4*1,8*138*0,2 - výkop												
					16,560							
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,560	254,40	4 212,86	SO 07.13.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na svislém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez ručních a horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "odvoz přebytkové zeminy na skládku do 10 km"												
PP												
VV												
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy s kameni kód odpadu 17 05 04	t	29,808	200,00	5 961,60	SO 07.13.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy s kameni zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 16,56*1,8												
					29,808							
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	16,560	9,70	160,63	SO 07.13.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru												
PP												
7	M	58344229	šetrková frakce Q125	t	345,000	472,00	162 840,00	CS ÚRS 2023 02	1,00000	345,00000	0,00000	0,00000
8	K	564861111	Podklad ze šetrkovité ŠD tl 200 mm	m2	331,200	242,60	80 349,12	SO 07.13.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Podklad ze šetrkovité ŠD s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl 200 mm "vrstva ŠD tl 0/63 v tl 200mm" vyrovnávací vrstva 138*2,4												
					331,200							
9	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° a do 3 m	m2	331,200	38,40	12 718,08	SO 07 08	0,00028	0,09227	0,00000	0,00000
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zajištěním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m 138*2,4												
PP												
VV												
					347,760							
10	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	347,760	40,70	14 153,83	SO 07 08	0,00050	0,17388	0,00000	0,00000
geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2 331,2*1,05 "ztrátě 5%"												
PP												
VV												
D 998 Přesun hmot							12 567,69			0,00000		0,00000
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	345,266	36,40	12 567,69	SO 07.13.2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu												
PP												

Úsek mezi Renneskou a Heršpickou

Jedná se o souběh v délce 138 m a výměře 249 m².

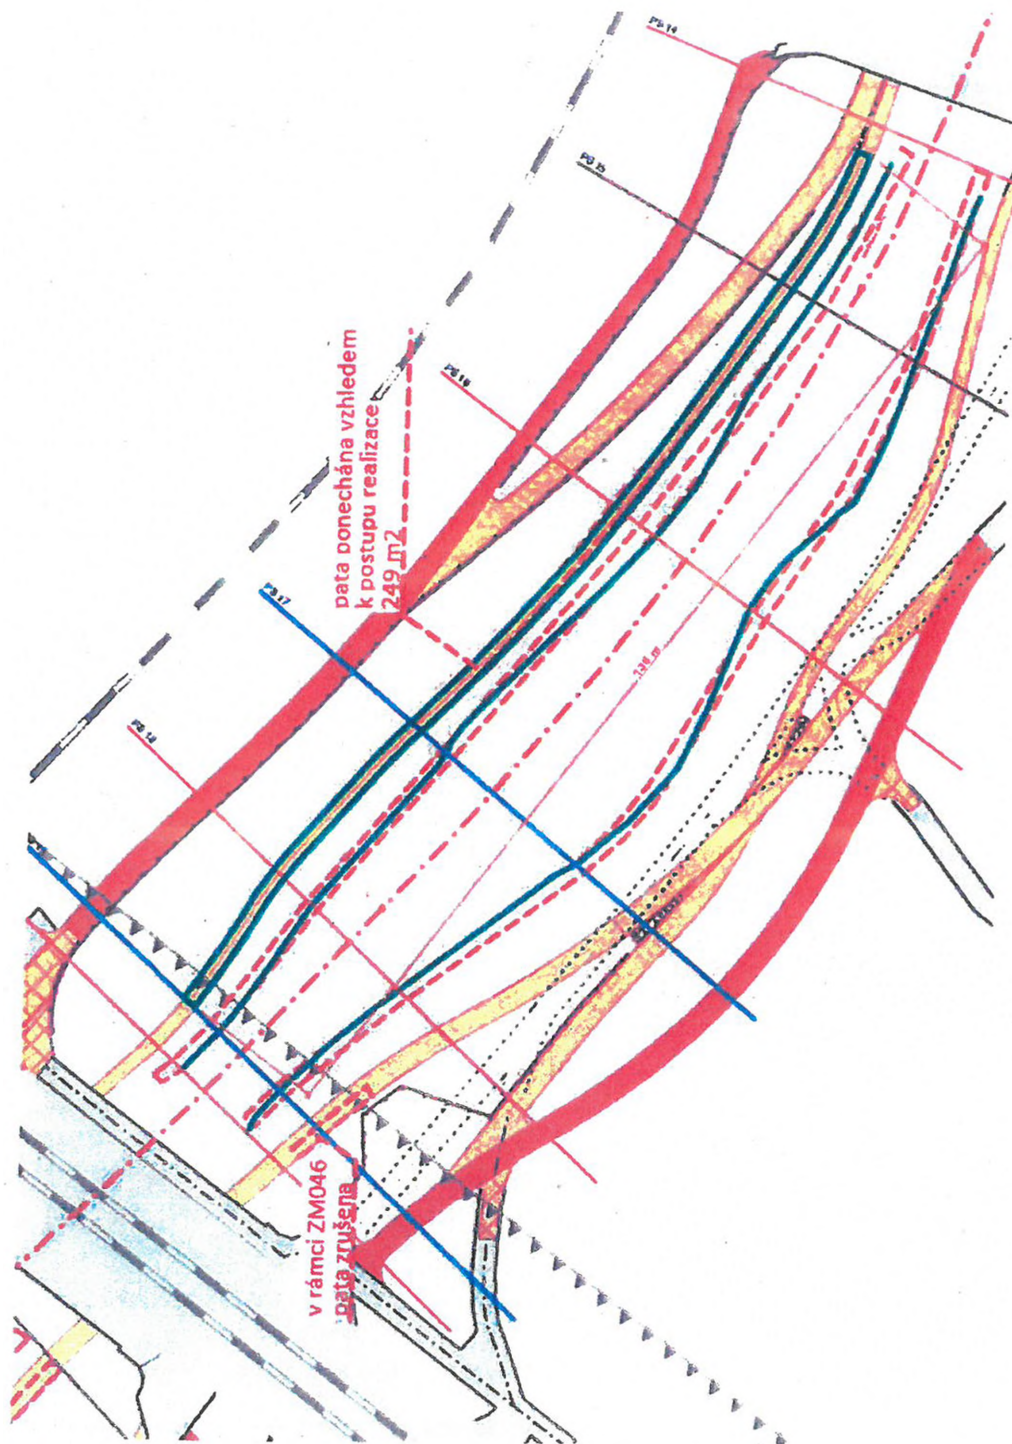

Detail řešení paty

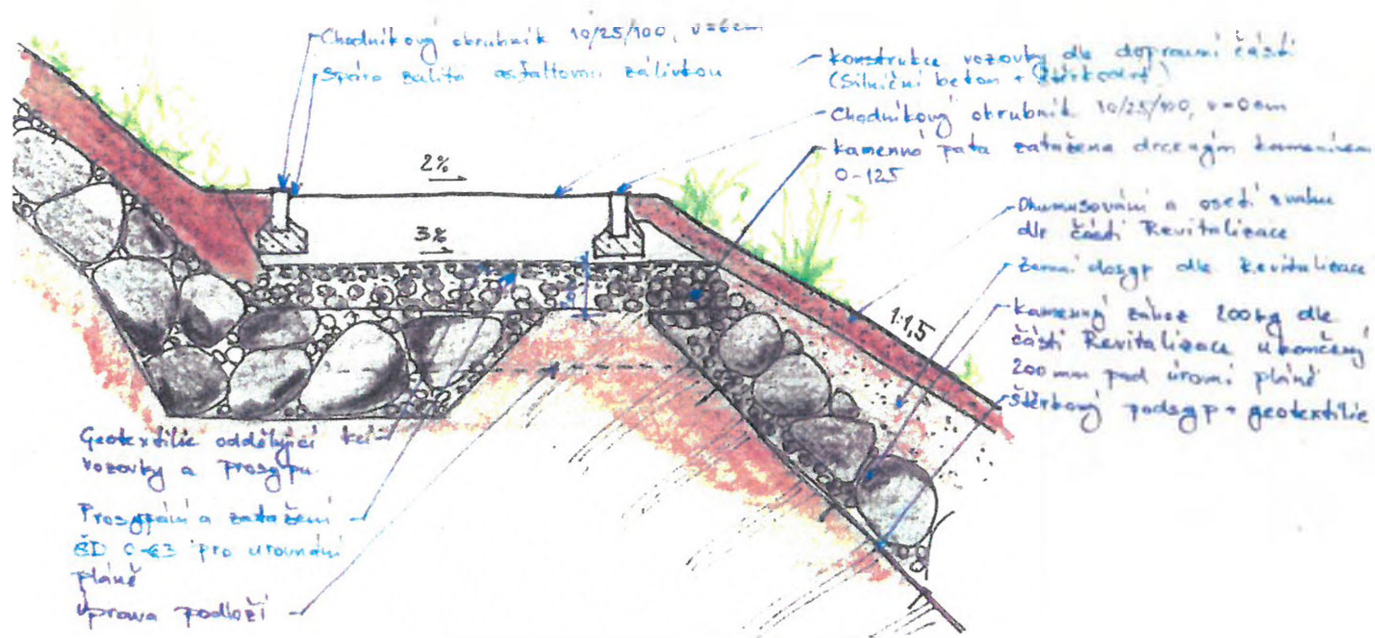

Vyhotovil:

SO 08.01 – Protipovodňová zemní homogenní hráz km 37,512-37,765 – provádění zemních prací, dokončovací práce

SO 08.02 – Protipovodňová železobetonová stěna – dokončeno

SO 08.26 - stavební úpravy na kmenové stoce A – vystrojení šachet

Úsek 6_ 37,773 - 38,010

SO 07.01 – Protipovodňová železobetonová stěna – provádění mikropilot spodních převážek, vázání výztuže a betonáž spodních převážek.

SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava koryta – úsek 37,773 - 38,010 práce v jímce – čerpání vody, zemní práce, kamenné paty, záhozy, brody, jesepty – pravý břeh.

SO 07.18 – Úpravy na levobřežní kmenové stoce – HKB 09b – Provádění vyústění do koryta řeky.

SO 08.02 – Protipovodňová železobetonová stěna – Vázání výztuže a betonáž základu a stěny. Hutnění zásypy stěny, provádění mikropilot.

SO 08.06 Odtěžení břehu v km 37,754-38,545 – zemní práce

SO 08.21 – Úpravy na pravobřežní kmenové stoce. - HKA 16 – kosmetika bet. Konstrukcí, dokončovací práce

SO 08.26 - stavební úpravy na kmenové stoce A - OKA 10 – provádění kynet, provádění vyústění do koryta řeky.

Úsek 7_ 38,010 - 38,160

SO 07.02 – Protipovodňová železobetonová stěna. Montáž výztuže a betonáž převážek.

SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava koryta - úsek 38,01 - 38,16 práce v jímce – čerpání vody, zemní práce, kamenné paty, záhozy, brody, jesepty

SO 07.19 – betonové gravitační zídky – Provádění zemních prací. Podkladní betony, základová deska

SO 08.21 – Úpravy na pravobřežní kmenové stoce – HKA 18v – propoj s rozdělovací šachtou, provádění stěn rozdělovací šachty

SO 08.26 - stavební úpravy na kmenové stoce A – OKA 11 – provádění kynet, stropní deska

SO 08.06 Odtěžení břehu v km 37,754-38,545 – zemní práce, okamenování

Úsek 8_ 38,160 - 39,200

SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava koryta - úsek 38,16 - 38,4 provádění prací v jímce na pravém břehu – odčerpání vody, zemní práce, kamenné paty, záhozy, brody. Demontáž jímky úsek 38,320-38,160. Provádění revitalizace na pravém břehu úsek 39,0-39,2

SO 07.02 Protipovodňová železobetonová zeď – vázání výztuže základu a betonáž

SO 07.03 – Protipovodňová železobetonová stěna – provádění kotev prosklené stěny

07.13 – Stezka a promenádní komunikace – sanace podloží, provádění štěrkových vrstev

07.14 – Pěšina - sanace podloží, provádění štěrkových vrstev

SO 07.17 Úprava konstrukcí – provádění nových říms

SO 07.18.e – Hradidlová komora HKB 10V – vázání výztuže stěn a betonáž

SO 08.04 Protipovodňová železobetonová zeď – vázání výztuže stěny a betonáž

SO 08.09 Schodiště Kamenná – zemní práce

SO 08.26b – Odlehčovací komory: OKA 11 – stropní deska

Úsek 9_ 39,200 - 39,510

SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava koryta – provádění jímky

Úsek 10_ 39,510 - 39,750

Nebudou probíhat žádné práce

Úsek 11_ 39,750 - 39,870

SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava koryta - úsek 39,750 - 39,870 provádění prací v jímce – dokončovací práce.

Úsek 12_ 39,870 - 40,170

SO 07.18.f – Hradidlová komora – dokončovací práce

SO 08.20 – Drobná doprovodná opatření – montáž oplocení u riviéry

4) Změny PD

1. Úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty ZM060

14.2.2023 DPS předpokládá v některých místech ukládání konstrukčních vrstev komunikací přímo na konstrukci kamenné paty. Vzhledem k tomu, že kamenná pata je tvořena kameny velké frakce o hmotnosti 250 kg, není v tomto případě možné realizovat podkladní vrstvu ŠD 0-32. AD dodá závazné stanovisko ke způsobu provádění navržené vrstvy ŠD 0-32 na kamennou patu v oblasti cyklostezky a pěšiny. Zodpovídá AD

7.3.2023 AD dodá závazné stanovisko k navrženým materiálům. Dle Vyjádření AD zatím není možné říci, zda dojde k úpravě kamenné paty – tyto informace bude mít AD do 10.3.2023. Zodpovídá AD

21.3.2023 Neproběhlo . Nový termín do 24.3.2023 Zodpovídá AD

4.4.2023 Neproběhlo . Přítomný zástupce AD nebyl obeznámen a tedy účastníci KD nebyli informováni.

Zodpovídá AD

18.4.2023 Přítomný zástupce AD na KD informoval o obsahu závazného stanoviska, které zašle pro vložení na sdílené úložiště. Dojde k úpravě DPS. Info k termínu AD přislíbil zaslat. Zatím nebylo zasláno.

Zodpovídá AD

2.5.2023 Závazné stanovisko nebylo zasláno. Bude zasláno do 5.5.2023 společně s informací, zda dojde k úpravě DPS, nebo zda bude mít tato úprava dopad do VV. Zodpovídá AD

16.5.2023 AD navrhuje prosypání kamenné paty frakcí 0/250 nebo 0/125 na kterou bude následně realizována vrstva stezky ŠD 0/32, tato změna bude mít dopad do VV. Ad zpracuje VV do : přítomný zástupce AD na KD neměl k tomuto bodu info. Zodpovídá AD

30.5.2023 Proběhne jednání se subdodavatelem AD za účasti TDI, AD, zhotovitel . Jednání svolá AD

Zodpovídá AD

13.6.2023 Neproběhlo. Chybí info od AD. Zodpovídá AD

27.6.2023 Je potřeba určit množství prosypu kamenné paty nejen pro tuto oblast, ale pro celou etapu PPO - pro stanovení množství materiálu a případný dopad do VV. Na KD bylo domluveno, že zhotovitel provede zkušební úsek (frakci určil subdodavatel AD) a poté proběhne místní šetření za účasti AD a TDI. Místní šetření svolá zhotovitel po provedení zkušebního úseku. Za provedení zkušebního úseku zodpovídá zhotovitel

11.7.2023 Zhotovitel provedl referenční úsek a nechá ho kontrolně geodeticky zaměřit. Proběhne kontrola na místě za účasti TDI a AD. Info na příštím KD.

25.7.2023 Schůzka na místě proběhla bez účasti TDI. TDI požádal zástupce zhotovitele o schůzku na místě u referenčního úseku pro dořešení úpravy pro pokládku další vrstvy ŠD. Zodpovídá zhotovitel

8.8.2023 Referenční úsek ještě nebyl vyhotoven, až bude vyhotoven, zhotovitel vyzve AD a TDI ke kontrole. Zodpovídá zhotovitel

22.8.2023 Zhotovitel přislíbil vyhotovit referenční úsek v termínu od 4.9.2023. Poté zhotovitel vyzve TDI a AD ke kontrole. Zodpovídá zhotovitel

5.9.2023 Kontrola referenčního úseku proběhne na výzvu zhotovitele. Zodpovídá Zhotovitel

19.9.2023 Zástupce TDI zatím referenční úsek neodsouhlasil a požádal zástupce zhotovitele o provedení dostatečné vrstvy/mocnosti zásypu. Úprava frakcí 0/125 bude provedena až po úroveň budoucí pláň. Další kontrola proběhne po domluvě TDI a zhotovitele. Dojde k úpravě VV a příčného řezu . Ten bude upraven na základě kubatur referenčního úseku. Zodpovídá zhotovitel

3.10.2023 Zástupce zhotovitele zaslal kubatury AD k zapracování . Bude upraven VV .Termínu úpravy v den konání KD AD nesdělil. Za úpravu VV a příčného řezu zodpovídá AD

17.10.2023 Zástupce AD(Šindlar) poskytne potřebné podklady zástupci AD (Aplus) a ten vyhotoví závazné stanovisko. K termínu úpravy VV přítomní zástupci AD na KD neměli info. Zodpovídá AD

31.10.2023 Zástupce AD (Aplus) obdržel potřebné podklady od zástupce AD(Šindlar). Termín pro upravený VV : do 7.11.2023. Zástupce TDI požádal ještě o vyhotovení vzorového příčného řezu obsahujícího všechny vrstvy. Ten AD přislíbil také do 7.11.2023 Zodpovídá AD

14.11.2023 V den konání KD zaslal AD opravený řez emailem. AD provede ještě úpravu tohoto řezu, aby byl čitelný. Zhotovitel zkontroluje zaslání řešení a poté informuje TDI, zda VV zpracuje sám.

Tato oblast není zapracována do ZM046.

Zodpovídá zhotovitel a AD

Po vzniku zápisu zhotovitel informoval, že tento VV zpracuje do 20.12.2023

28.11.2023 Zhotovitel na dnešním KD informoval, že má veškeré potřebné podklady pro zpracování VV a termín 20.12.2023 pro VV platí. Za VV zodpovídá zhotovitel

12.12.2023 VV do 20.12.2023

Za VV zodpovídá zhotovitel

9.1.2024 Zhotovitel zaslal VV v elektronické podobě, připomínky TDI budou řešeny v den konání KD.

Za zapracování připomínek zodpovídá zhotovitel

23.1.2024 Jednání k dořešení po KD proběhlo, ale ještě nebylo odsouhlaseno. Zhotovitel a AD přislíbili zapracovat připomínky do 26.1.2024. Zodpovídá AD a zhotovitel

13.2.2024 Připomínky TDI k VV bude řešit zástupce zhotovitele a zástupce TDI po skončení dnešního KD.

Zodpovídá TDI a zhotovitel

27.2.2024 Schůzka k dořešení VV po minulém KD proběhla. Nacenený VV obdržel zástupce TDI od zhotovitele

26.2.2024. Dle vyjádření TDI obsahuje VV nové položky, které nebyly projednány a nedošlo k zapracování domluveného. Zhotovitel na KD přislíbil, že tento VV s TDI dořeší do 1.3.2024.

Zodpovídá zhotovitel a TDI

12.3.2024 Schůzka proběhla. Zhotovitel provede sondu založení kamenné paty a následně zapracuje připomínky TDI do VV. Termín : Do 19.3.2024 Zodpovídá zhotovitel

26.3.2024 Dle vyjádření TDI zasláný VV opět neobsahuje všechny položky dle domluvy. Po konání KD proběhne další schůzka TDI a zhotovitele k dořešení. Zodpovídá zhotovitel

16.4.2024 Schůzka proběhla. VV byl doplněn a odsouhlasen TDI. Probíhá kontrola rozpočtářem Bkom. Termín: 30.4.2024

Zodpovídá TDI

30.4.2024 Kontrola rozpočtáře probíhá. Nový termín : do 7.5.2024

Zodpovídá TDI

14.5.2024 Rozpočtář Bkom zaslal své připomínky k VV, které zhotovitel zapracuje. Termín : 21.5.2024

Zodpovídá zhotovitel

2. Zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu ZM062

21.3.2023 V rámci PPO etapy IX a X. probíhá zpracování změny polohy cyklostezky na levém břehu u železničního viaduktu. Tato nová cyklostezka bude navazovat na nově budovanou cyklostezku v rámci etap VII, VIII přibližně v prostoru lávky CTP. Stávající cyklostezka v tomto prostoru zůstane zachována. Změna DPS bude. Změna DPS bude zpracována do 4.4.2021. Zodpovídá AD

4.4.2023 Neproběhlo. Nový termín do : 11.4.2023 Zodpovídá AD

18.4.2023 Nebylo předáno. Dle informací zástupce KAM bude předáno do 2.5.2023 Zodpovídá AD

2.5.2023 Změna DPS bude předána zástupci KAM po skončení KD. Info na příštím KD. Zodpovídá AD

16.5.2023 AD zpracovává změnu DPS, je potřeba ještě dořešit některé technické detaily. Dojde k úpravě, která se bude týkat obou etap PPO (VII-VIII i IX-XI). Pěšina v místě zůstává v původní poloze. Zodpovídá AD

30.5.2023 Dojde k úpravám v návaznosti na etapu IX-XI. Zbývá dořešit polohu spodní pěšiny a stanovit nápojně místo na stávající polohu stezky, doplnit příčné řezy na levém břehu. Zpracovatel PD pro etapu IX-XI projednával řešení se SŽ a obdržel k řešení od SŽ připomínky. Komplettní řešení AD (Šindlar) zpracuje za 14 dní po návratu z dovolené. Zodpovídá AD

13.6.2023 Řešení bylo projednáno se SŽ a dle vyjádření AD s ním SŽ souhlasí. Výkresová část bude předána kompletní do konce týdne. Dle informace zástupců KAM bude navazující etapa IX, X, XI začínat cca 10m před viaduktem Uhelná. V rámci koordinace etap budou prováděné etapy VII, VIII ukončeny v místě začátku etap IX, X, XI. Výkresová část zpracovaná v rámci ZM 062 bude tyto koordinace obsahovat. Výkaz výměr upravující rozdíl v objemu prací bude součástí výkazu výměr ZM 046, který bude obsahovat kompletní změny v úpravě břehů koryta řeky.

27.6.2023 AD zašle elektronickou verzi dokumentace v den konání KD, v tištěné verzi bude předána do 30.6.2023. VV je zahrnut do ZM046. Zodpovídá AD

11.7.2023 Připomínky TDI byly AD zaslány. Kontrolu provede i zhotovitel. AD zapracuje připomínky. Zodpovídá : zhotovitel za kontrolu AD za zpracování připomínek

25.7.2023 Kontrola zhotovitele proběhla. AD Předá jedno paré v tištěné podobě k finální kontrole. Zodpovídá AD

8.8.2023 Zástupce AD předal zástupcům KAM jedno paré změnové DPS ke kontrole. Dle domluvy z dnešního KD ověří AD variantu snížení nivelity stezky a vliv na délku opření paty v podélném směru a případný vliv této varianty na posun stezky. Detail řešení AD poté projedná se SŽ.

Termín : do 11.8.2023

Zodpovídá AD

22.8.2023 Detail řešení, včetně doplnění jímky a sypané hrázky do situačního výkresu byl zaslán TDI, KAM, zástupcům SŽ a dle informací od AD i zástupcům ČD. Info na příštím KD

5.9.2023 Zhotovitel přislíbil své vyjádření k dokumentaci, která byla již zaslána na SŽ do 6.9.2023. Stanovisko SŽ k tomuto řešení zatím nebylo zasláno, AD bude stanovisko urgovat. TDI upozornil na dopad do VV.

Info na příštím KD

19.9.2023 AD včera obdržel souhlasné stanovisko od SŽ pro ZM062. Souhlasné stanovisko od ČD je přislíbeno do konce 9/2023. VV bude pro ZM062 samostatně. Změna DPS bude zpracována kompletní, včetně VV do 29.9.2023. Zodpovídá AD

3.10.2023 AD zatím neobdržel stanovisko od ČD pro ZM062 a provede další urgencye na ČD. Probíhá další kontrola VV v souvislosti se změnou stezek. Zástupce TDI požádal o předání technického řešení alespoň v elektronické podobě pro potřeby zhotovitele. Elektronickou verzi zašle AD do 6.10.2023, případně prověří, zda je již v aktuální podobě vložena na sdíleném úložišti. Zodpovídá AD

17.10.2023 AD zaslal souhlasné stanovisko ČD. Technické řešení je zpracované a kompletně vloženo na úložiště. AD (Aplus) zpracuje VV. Přítomní zástupci AD na KD neměli k termínu zpracování informace.

