



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 66

D_13 Přeložka elektrických kabelů

SO 07.24 Přeložka VN – ochrana kabelů E.ON

- ochrana kabelů Heršpická + Táborského nábřeží



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
Vyjádření EG.D	3
Vyjádření Puttner s.r.o.	4
příloha č. 7	5
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	6
Rozpočet	7
Výkresová část	8
Stavební deník	9
Zápis z Kontrolního dne	10
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


**Důvodová zpráva – změnový list č. 66
- Ochrana kabelů Heršpická + Táborského nábřeží**

Na základě požadavku EG.D bude provedena ochrana kabelů nad rámec Projektové dokumentace – kabely NN-Táborského nábřeží, kabely VN-Heršpická

- V rámci realizace prací dle PD je prováděno ochránění stávajících sítí v úseku Poříčí-Heršpická. Po odkrytí byly zjištěny dvě trasy sdělovacího vedení HDPE, které se rozdělují. Z tohoto důvodu nelze použít společnou chráničku, a proto EG.D požaduje ochránit každé vedení zvlášť
- V rámci PD je na Táborského nábřeží provedena ochrana kabelů VN, požadavkem EG.D je zajistit také ochranu kabelů NN ve stejné trase s kabely VN

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic


Datum: 01. srpen 2024

Věc: **Ochrana kabelů na ulici Heršpická a Táborského nábřeží**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Doplnění ochrany NN kabelů v rámci stavebního objektu SO 07.24 je nutné provést z důvodu pohybu stavební techniky a z důvodu zhotovení konstrukčních vrstev stezky. V projektu se uvažovalo prvotně jen s ochranou kabelů VN a NN kabelů pouze v souběhu s kabely VN, dle vyjádření projektanta části firmy Puttner, s.r.o..

Vyhotovil:



EG.D, a.s. - Lidická 1873/36 602 00 Brno

Brixton-stavatelství, s.r.o.

Tkalcovská 904/6a
602 00 Brno

EG.D, a.s.

Řízení výstavby a správa lokalit
Lidická 1873/36
602 00 Brno
www.egd.cz

20393

9.3.2023

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII

V rámci realizace akce „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“, objekt S007.24 Přeložka VN je realizována, v souladu s vyjádřením EG.D, a.s. zn. T6779-16306648, ochrání stávajících vedení a založení rezervních chráničků EG.D, a.s.. V úseku stavby na ul. Poříčí, Heršpická byla při odkrytí vedení zjištěna skutečnost, že dvě trasy (a s nimi společně pokládané sdělovací vedení HDPE) nevedou v celé délce ve společné trase, ale tyto trasy se rozdělují. Z tohoto důvodu nelze pro obě sdělovací vedení HDPE použít jednu společnou půlenou chráničku 110mm, ale požadujeme každou chráničku založit zvlášť. Jedná se o celý úsek ochrání v tomto místě, to je cca 56m.

S pozdravem

EG.D a.s.

Řízení výstavby a správa lokalit

Předseda dozorčí rady:

Představenstvo:

Sídlo společnosti:

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 11. března 2024 15:55
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Ochrana kabelů - Tábořského nábřeží

Dobrý den,

Dohledával jsem k tomu nějaké podklady a prvotně se uvažovalo jen s ochranou kabelů VN. Následně (nejspíš na základě osobní/telefonické komunikace) přibyla i ochrana kabelů NN, které vedou u kabelu VN – ochranu ostatních kabelů NN jsem nedohledal.

Nicméně určitě by měly být také ochráněny (kvůli pohybu stavební techniky zejména při sníženém krytí z důvodu zhotovení konstrukčních vrstev stezky).

S pozdravem

[REDACTED]
Puttner, s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 11, 2024 1:02 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: Ochrana kabelu - Taborskeho nabrezi

Dobrý den,

Za mě by měly být ochráněny.

Z jakého důvodu nejsou kabely ochráněny v rámci projektu PPO bych požádal o vyjádření pana [REDACTED] z firmy Puttner.

S pozdravem




A PLUS, a.s.
Česká 12, 602 00 Brno
www.aplus.cz

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 11, 2024 12:09 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Ochrana kabelů - Tábořského nábřeží

Dobrý den pane [REDACTED]

dnes jsem měl na stavbě nepříjemný rozhovor se zástupci EG.D, z jakého důvodu nemáme v rámci projektu ochrany elektrických kabelů zahrnuty i dva NN kabely vyznačené žlutou barvou viz níže, když povedou taky pod stezkou. Prosím tedy v co nejkratším možném čase o informaci, zda kabely doochránit nebo nikoliv. Momentálně se tam ty práce provádí, takže se to dá dodělat.

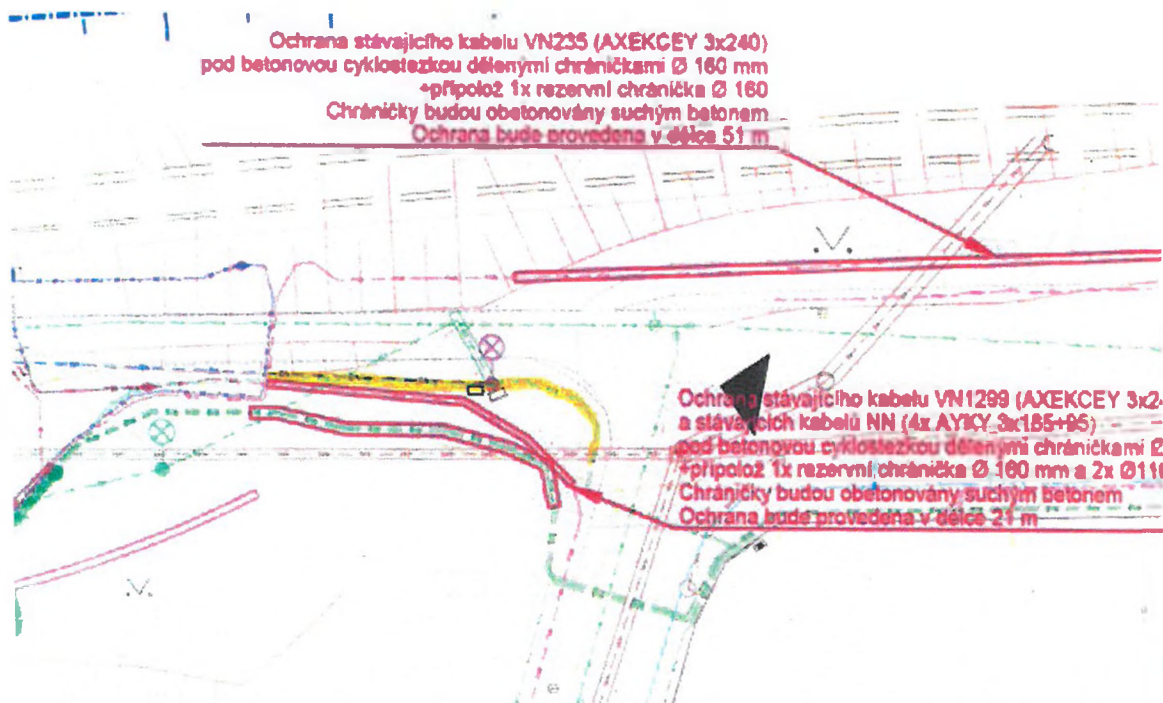

Do přílohy pro přehlednost přikládám i situaci z projektu elektoripřipojek pro hradidlové komory, která není součástí naší stavby PPO, ale je tam viditelná i trasa stezky.

Děkuji.

S pozdravem,

asistent SV, stř. 16



firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
mobil: [redacted]
tel.: [redacted]
www.firesta.cz



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 13_Přeložka elektrických kabelů		Změnový list č. 66
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.24 Přeložka VN -ochrana kabelů E.on Ochrana kabelů VN+NN – Heršpická+Táborského nábřeží		
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Na základě požadavku EG.D bude provedena ochrana kabelů nad rámec PD – kabely NN-Táborského nábřeží, kabely VN-Heršpická DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.24 ODKAZ NA VÝKRESY: Požadavek EG.D ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.66 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: 1. V souvislosti s ochráněním stávajících sítí v úseku Poříčí-Heršpická byly zjištěny dvě trasy sdělovacího vedení HDPE, proto EG.D požaduje ochránit každé vedení zvlášť 2. V rámci PD je na Táborského nábřeží provedena ochrana kabelů VN, požadavkem EG.D je zajistit také ochranu kabelů NN ve stejné trase s kabely VN		
POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED]		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]	

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

MP-TÚ1100-01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH	201 167,61
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	201 167,61	42 245,20
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	243 412,81
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		201 167,61	243 412,81
D_13	Přeložka elektrických kabelů	201 167,61	243 412,81
SO 07.24	Přeložka VN – Ochrana kabelů E.ON - práce nad rámcem	201 167,61	243 412,81
(1)	SOD		

Stavba

Protipovodňové opatření nížší Brna – etapa VII a VIII

Objekt

D_13 - Přeložka elektrických kabelů

Soupis:

SO 07.24 (1) - Přeložka VN – Ochrana kabelů E.ON - práce nad rámec SOD

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Montáž	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							201 167,61
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 466,81
D	997		Přesun sítě				10 466,81
1	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	19,872	220,00	4 371,84
	W		46°0,3'0,8"1,8		19,872		
2	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	19,873	229,70	4 554,83
3	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	198,720	7,70	1 530,14
	W		19,872		19,872		
	W		19,872*10 "Přepočtené koeficientem množství"		198,720		
D	M		Práce a dodávky M				190 700,80
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				190 700,80
8	K	460150883	Hloubení kabelových zářezů v nezářezaných rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v homině tř 3	m	46,000	1 679,70	77 266,20
	W		25°NN roh Ludmily Konečné, dodatečně ochraňované kabely		25,000		
	W		21°NN roh Ludmily Konečné, větší vzdálenost kabelů		21,000		
	W		Součet		46,000		
13	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	138,000	16,80	2 318,40
	W		25°3°NN roh Ludmily Konečné, dodatečně ochraňované kabely, 3 fólie vedle sebe		75,000		
	W		21°3°NN roh Ludmily Konečné, větší vzdálenost kabelů, 3 fólie vedle sebe		63,000		
	W		Součet		138,000		
14	K	460510075	Kabelové průstupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	150,000	400,80	60 120,00
	W		50° dodatečně ochránící Herpíkové - kabely ve vzdálenosti neumožňující uložení do jedné chráničky		50,000		
	W		25°2°NN roh Ludmily Konečné, dodatečně ochraňované kabely		50,000		
	W		25°2°NN roh Ludmily Konečné, osazení rezervních chráničků		50,000		
	W		Součet		150,000		
15	M	34571355	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	50,000	88,70	4 435,00
16	M	M1	Dělené chránička pr. 110mm	m	100,000	280,70	28 070,00
22	K	460560883	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z hominy třídy 3	m	46,000	369,80	17 010,80
25	K	P1	Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou	kus	8,000	108,50	868,00
26	M	M3	Montážní pěna	kus	2,000	306,20	612,40

Část : D.13 - PŘELOŽKY ELEKTRICKÝCH KABELŮ, 02 OCHRANA KABELŮ E.ON


Úsek : 103_Křižovatka Heršpická x Poříčí

Na tomto úseku vznikl rozdíl mezi projektovanými pracemi a skutečně provedenými tím, bylo nutné založit jednu dělenou chráničku pr. 110mm pro ochranění samostatně vedoucího sdělovacího vedení EG.D. v délce 50m (viz. Vyjádření EG.D k vícepracím-úsek Heršpická x Poříčí, emailová korespondence). Toto je v rozpočtu v položce č. 16.

Úsek : 101_Táborského nábreží

Na tomto úseku vznikl rozdíl mezi projektovanými pracemi a skutečně provedenými tím, že :

- 1) Při odkrytí zeminy bylo zjištěno dotčení další trasy vedení NN na rohu ul. Ludmily Konečné a Táborského nábreží (2 kabely NN). EG.D požadovalo ochranění i tohoto vedení standardním způsobem. Bylo tedy nutné odkryt vedení výkopem š. 80cm, hl. 120cm v délce 25m, vedení ochránit půlenými chráničkami pr. 110 (položka č. 16) a vedle nich založit 2 rezervní chráničky pr. 110mm (položka č. 15). Celkem tedy 50m půlených chrániček pr. 110 a 50m dvouplášťové chráničky 110mm (položka č. 14). Pro zakrytí vedení na potřebnou šířku rýhy (pro 80cm a délce 25m byly vedle sebe položeny 3 výstražné fólie (š. 34cm) o celkové délce 75m (položka č. 13). Odvezeno a uloženo na skládku bylo $6 \text{ m}^3 = 10,8$ (počítáno $1 \text{ m}^3 = 1,8 \text{ t}$) zeminy (položka č. 2). To odpovídá 30cm kabelové rýhy, kde se namísto zeminy chráničky obetonovaly. Chráničky se na obou stranách utěsnily pěnou = 8případů (položka č. 25 a 26).
- 2) Při odkrytí zeminy bylo zjištěno, že vedení VN1299 a NN na rohu ul. Ludmily Konečné a Táborského nábreží vedou v takové vzdálenosti od sebe, že nebude možné vedení ochránit v jednom výkopu. Bylo tedy nutné navíc, proti PD, odkryt vedení VN1299 výkopem š. 80cm, hl. 120cm v délce 21m (položka č. 8 a 22). Pro zakrytí vedení na potřebnou šířku rýhy (pro 80cm a délce 21m byly vedle sebe položeny 3 výstražné fólie (š. 34cm) o celkové délce 63m (položka č. 13). Odvezeno a uloženo na skládku bylo $5,04 \text{ m}^3 = 9,072 \text{ t}$ (počítáno $1 \text{ m}^3 = 1,8 \text{ t}$) zeminy (položka č. 2). To odpovídá 30cm kabelové rýhy, kde se namísto zeminy chráničky obetonovaly. Pro vedení NN byl proveden výkop v původním projektovaném rozsahu, vzhledem k jejich vzdálenosti od sebe a požadavku uložení rezervních chrániček vedle sebe a ne nad sebou ve dvou řadách.

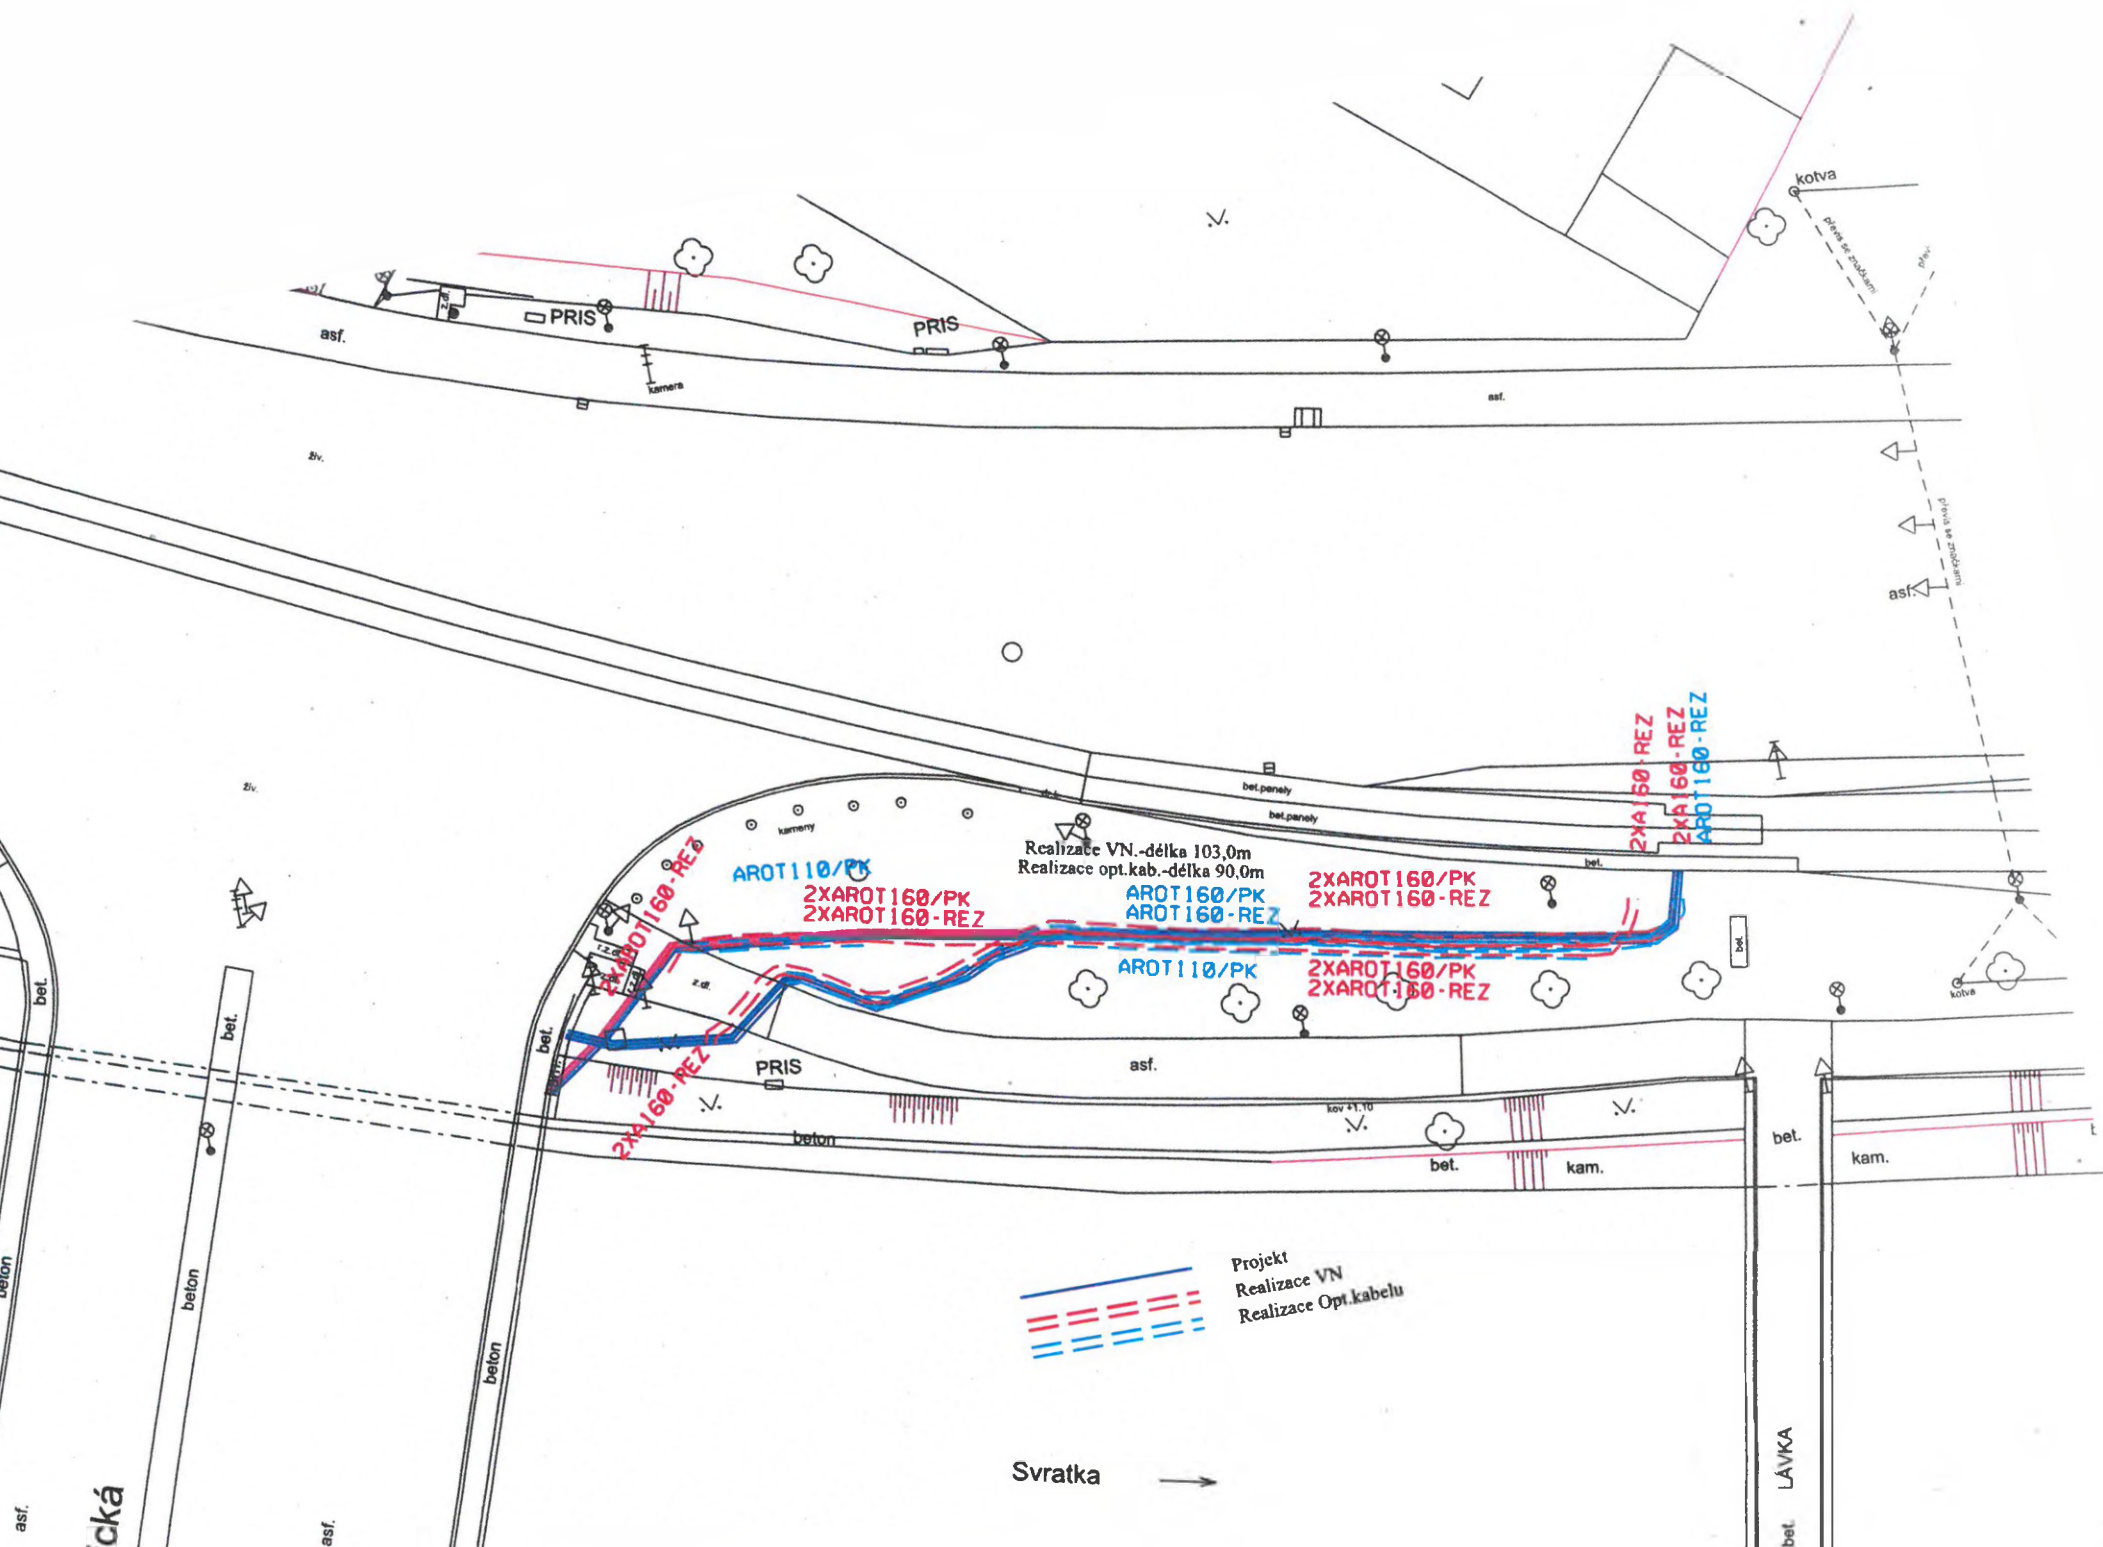

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.24 - PŘELOŽKA VN

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	9,2°C	0,0 mm/h	18:00	 Déšt	9,5°C	1,0 mm/h
12:00	 Polojasno	13,0°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE

POČ.

Brixton stavitelství s.r.o.

4

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU

NÁZEV DODAVATELE

POČ.

Pásové minirypadlo

Brixton stavitelství s.r.o.

1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS

NÁZEV DODAVATELE

MN MJ

Dodatečná ochrana VN a NN kabelů (Táborského nábreží):
- výkop a obnažení NN kabelů

Brixton stavitelství s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

[REDACTED] Stavbyvedoucí)


NÁZEV DODAVATELE

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zhotovitel upozorňuje AD na požadavek správce sítě e.gd na dodatečné doochránění dvou NN kabelů na ulici Táborského nábreží, které nejsou zahrnuty v PD. NN kabely vedou ve stejné trase s ostatními pod navrhovanou stezkou viz výkres v příloze (vyznačeno žlutě). Žádáme o stanovisko zda kabely doochránit či nikoliv.

PŘÍLOHY

1.jpg



Podpisy:

ZÁZNAM ZE DNE: PO 11.03.2024


AUTOR

(Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zhotovitel upozorňuje AD na požadavek správce sítě e.gd na dodatečné doochránění dvou NN kabelů na ulici Tábořského nábreží, které nejsou zahrnuty v PD. NN kabely vedou ve stejné trase s ostatními pod navrhovanou stezkou viz výkres v příloze (vyznačeno žlutě). Žádáme o stanovisko zda kabely doochránit či nikoliv.

PŘÍLOHY

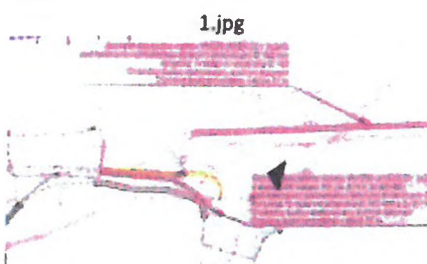

Niže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonůch a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění).

Podpisy:

Vlákno reakcí na další záznam

Autor: [REDACTED]
(Stavbyvedoucí)

Ze dne: 11.3.2024

Zhotovitel upozorňuje AD na požadavek správce sítě e.gd na dodatečné doochránění dvou NN kabelů na ulici Táborského nábřeží, které nejsou zahrnuty v PD. NN kabely vedou ve stejné trase s ostatními pod navrhovanou stezkou viz výkres v příloze (vyznačeno žlutě). Žádáme o stanovisko zda kabely doochránit či nikoliv.

Název dodavatele: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Autor: [REDACTED]
(Autorský dozor)

Ze dne: 2.8.2024

Reakce na záznam: 11.3.2024 od [REDACTED] (Stavbyvedoucí): Zhotovitel upozorňuje AD na požadavek správce sí...

S doochráněním NN kabelů v daném místě souhlasíme.

Název dodavatele: A PLUS a.s.

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.24 - PŘELOŽKA VN

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	6,5°C	0,0 mm/h	18:00	 Polojasno	10,6°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	11,8°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE

POČ

Brixton stavitelství s.r.o.

4

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU

NÁZEV DODAVATELE

POČ

Pásové minirypadlo

Brixton stavitelství s.r.o.

1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS

NÁZEV DODAVATELE

MN MJ

Dodatečná ochrana VN a NN kabelů (Táborského nábreží):

Brixton stavitelství s.r.o.

- výkop a obnažení NN kabelů

- ochránění NN kabelů chráničkami

PŘÍLOHY

a130fc80-edbc-46c1...d421f.jpg



Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.online

DENÍK: SO 07.24 - PŘELOŽKA VN

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Zamračeno	0,7°C	0,0 mm/h	18:00	 Jasno	4,0°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	5,9°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Brixton stavitelství s.r.o.	4
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Pásové minirypadlo	Brixton stavitelství s.r.o.	1

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Dodatečná ochrana VN a NN kabelů (Táborského nábreží): - ochrana dvou NN kabelů mimo rozsah PD + připojení rezervních chráničků	Brixton stavitelství s.r.o.		

PŘÍLOHY

e6af6794-6585-4ea0...19750.jpg



Podpisy:

EG D a s - Lidická 1873/36 602 00 Brno

Brixton-stavatelství, s.r.o.
Tkalcovská 904/6a
602 00 Brno

IČ: 262 42 451
DIČ: CZ26242451

EG.D, a.s.
Správa sítě Morava Jih
Hněvkovského 740/83b
617 00 Brno
www.egd.cz

11. května 2024
Značka:
MK/15062024

Žádost o ochranění kabelů mimo PD akce Tábořského nábřeží.

Na stavbě „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“, v části Tábořského nábřeží, požadujeme, nad rámec PD, ochranění vedení NN (2 kabely) a založení 2x rezervní chráničky. Jedná se o vedení na rohu ul. Ludmily Konečné a Tábořského nábřeží.
Předpokládané délka trasy, kterou bude nutné ochránit, je 25m.

Děkuji za pochopení

S přátelským pozdravem

Za EG.D, a.s.

Správa sítě Morava Jih
EG.D, a.s.


Předseda dozorčí rady:

Představenstvo:

(Předseda)

Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Brně, v oddílu B, vložce 8477

Svratka

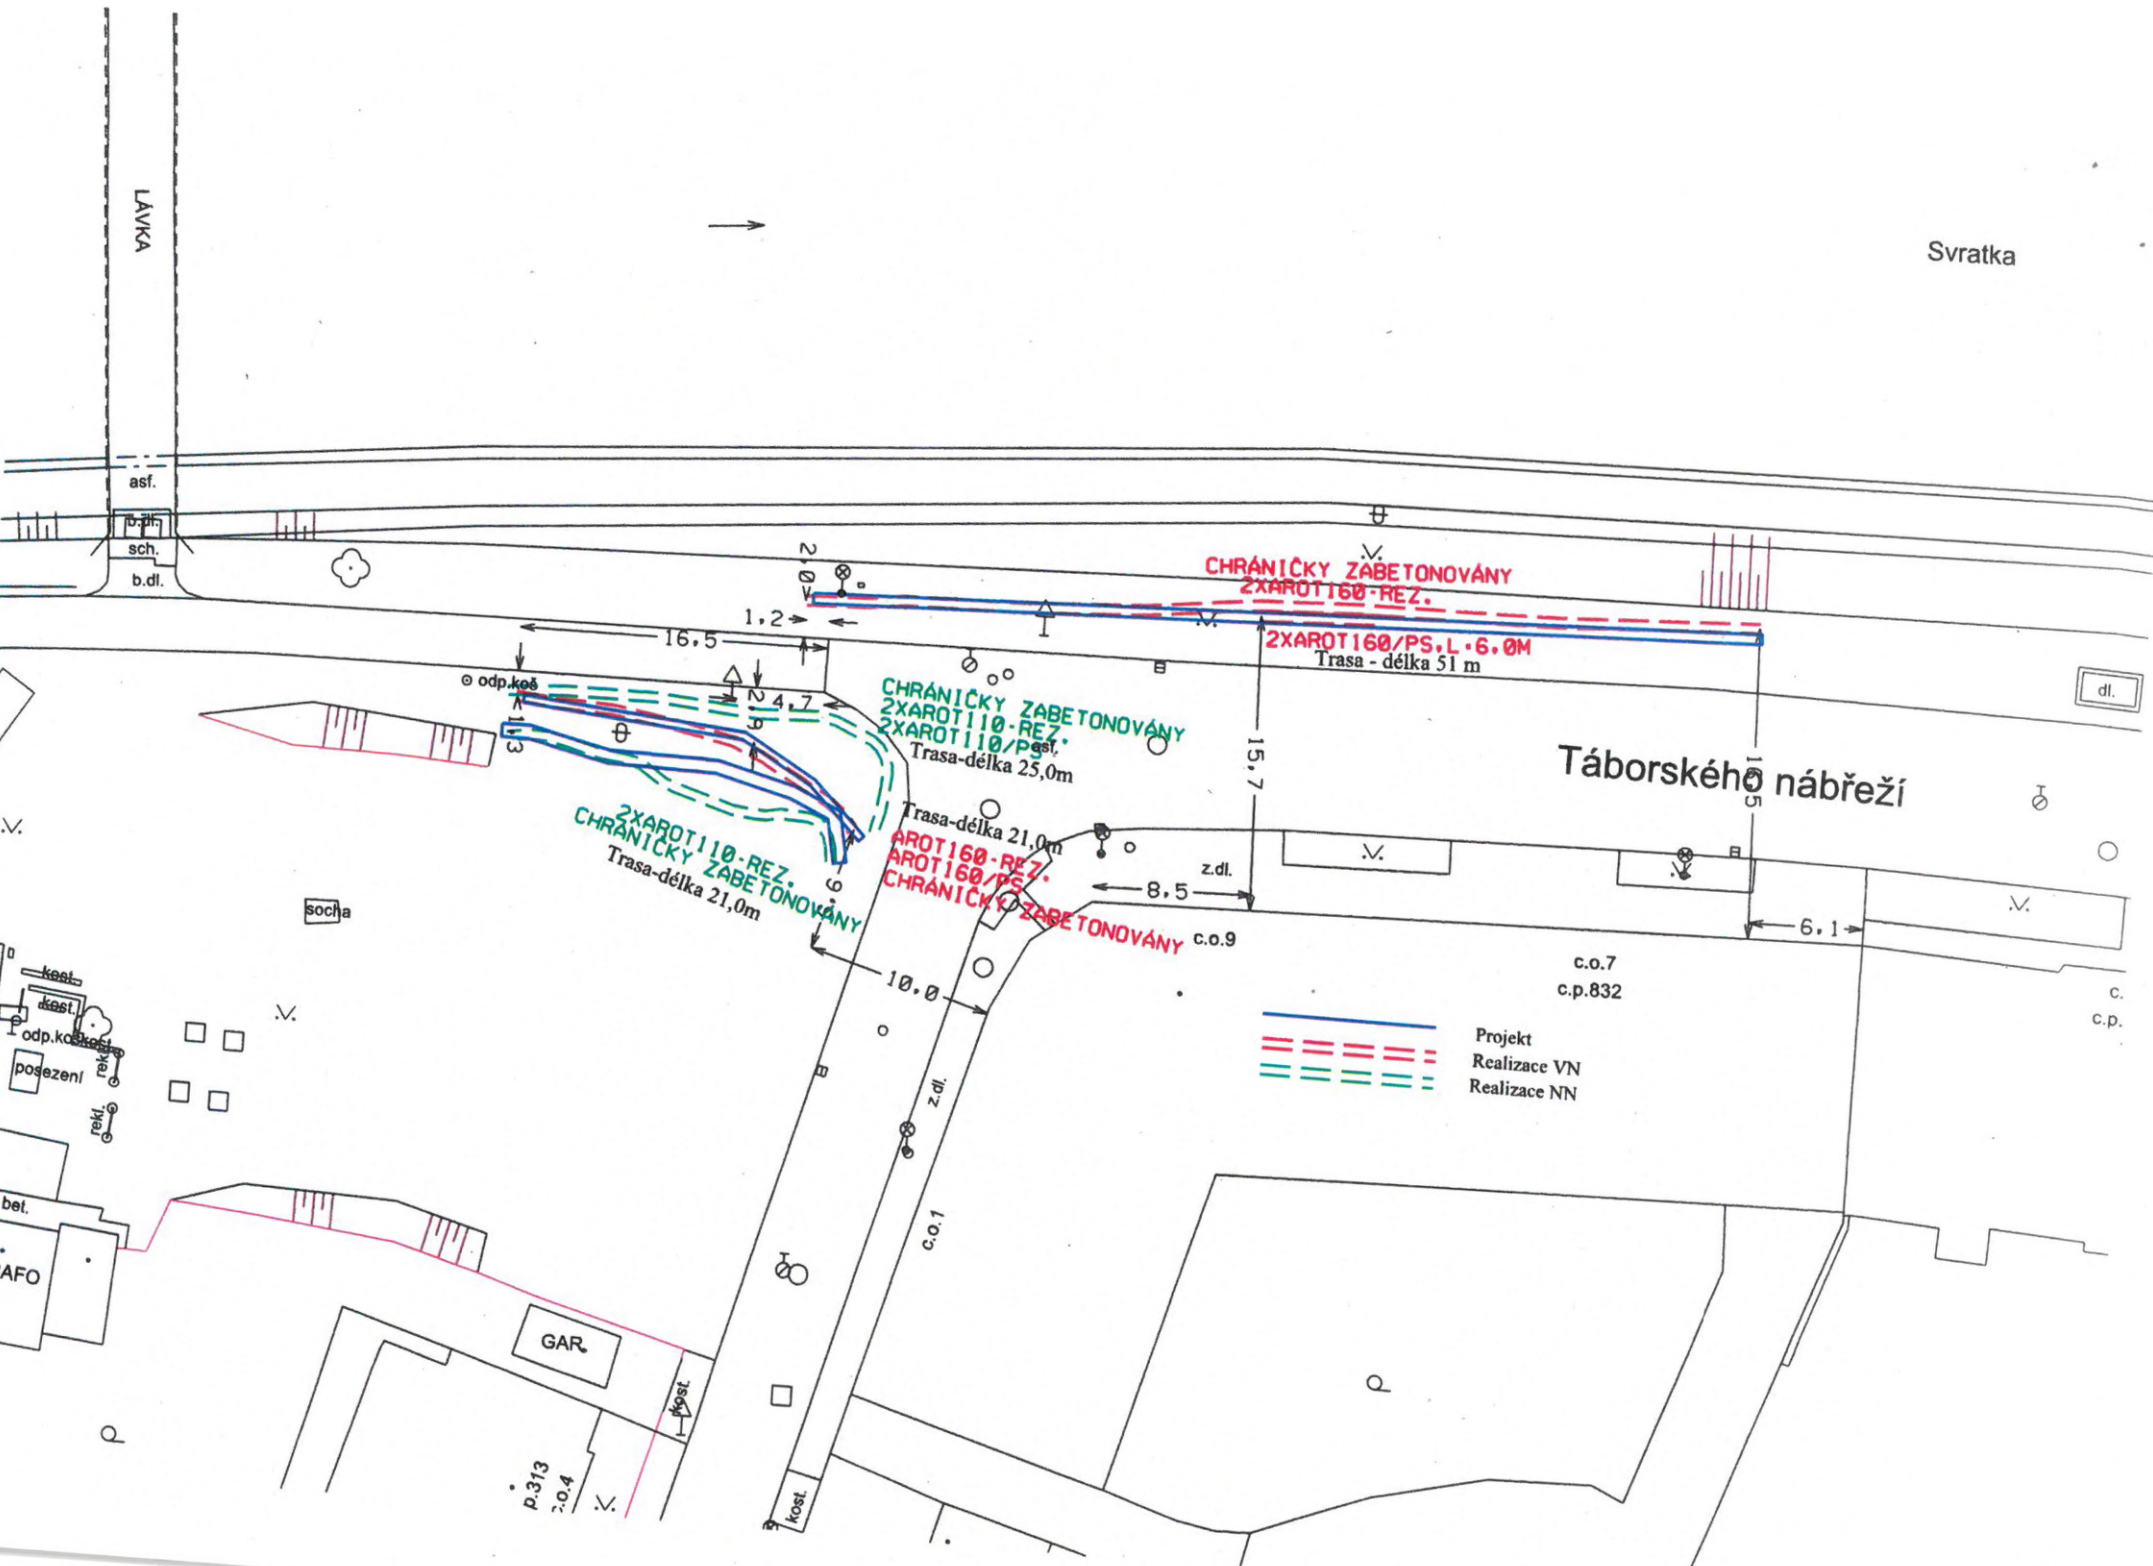

Protokol o provedení ochrany distribučního kabelového vedení EG.D

Název stavby: Nábřeží Svratky – realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy VII a VIII – D.8 – přeložky sdělovacích kabelů a kabelů elektrického napětí


Investor stavby: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno

Místo stavby: Brno, křižovatka Heršpická x Poříčí, Táborského nábřeží, křižovatka Renneská třída x Poříčí, k.ú. Staré Brno, k. ú. Pisárky


Ochrana distribučního kabelového vedení EG.D, a.s. byla provedena zhotovitelem EG.D, a.s. s působností RS Brno dle podmínek uvedených ve vyjádření č. T6779-16306648.

Ochrana distribučního kabelového vedení byla řádně geodeticky zaměřena a zaměření předáno na Technickou evidenci..

Dne: 4.7.2024

.....


Podpis investora stavby



Podpis zhotovitele

Souhlasíme s kolaudací stavby

Za F. ON Česká republika, s.r.o. dne:



Regionální správa Brno
EG.D, a.s.

0920-G40

TABORSKÉ NABŘEŽÍ

Místo kontroly (lokalizace místa kontroly – obec, místní část, objekt)

BAKTON s.r.o.

Kontrolovaná firma / osoba

OCHRANĚNÍ KVN V ÚSEKU CCA 50 M

Akce (název akce) nebo činnost vykonávaná kontrolovaným subjektem (rekonstrukce NN a TS, lezecká revize linka VN XYZ apod.).

Předmětem kontroly je:

☐ ŘPÚ

☐ Oprava

☐ Investice

☒ Ostatní

☒ kvalita prováděných prací, rozsah prací, zjištění závad

☐ dodržování technologických postupů, materiálových standardů

☐ dodržování BOZP, MPBP, dodržování smluvních podmínek dodávek prací

☐ úplnost a kvalita odstranění závad

☐ různé (poškození zařízení DS, škody na nemovitostech, jednání se třetí osobou, zásah do ochranného pásma, škody na spotřebičích, ...)

Zjištění: KONTROLA PŘED ZÁHOZEM VLOŽENÍ 2x REZ. AROT 100 V DELCE CCA 50 M UL. TAB. NABŘEŽÍ 7-9 ZABETONOVÁNÍ DLE PD. STAV. VN VLOŽENO VE STAV ZLADĚCH BEZ ZÁVAD.

6.3.2024

Záznam vyhotovil (podpis)


Datum

Vyjádření ke zjištění:

Jméno a příjmení hůlkovým písmem, podpis

Číslo:

000004

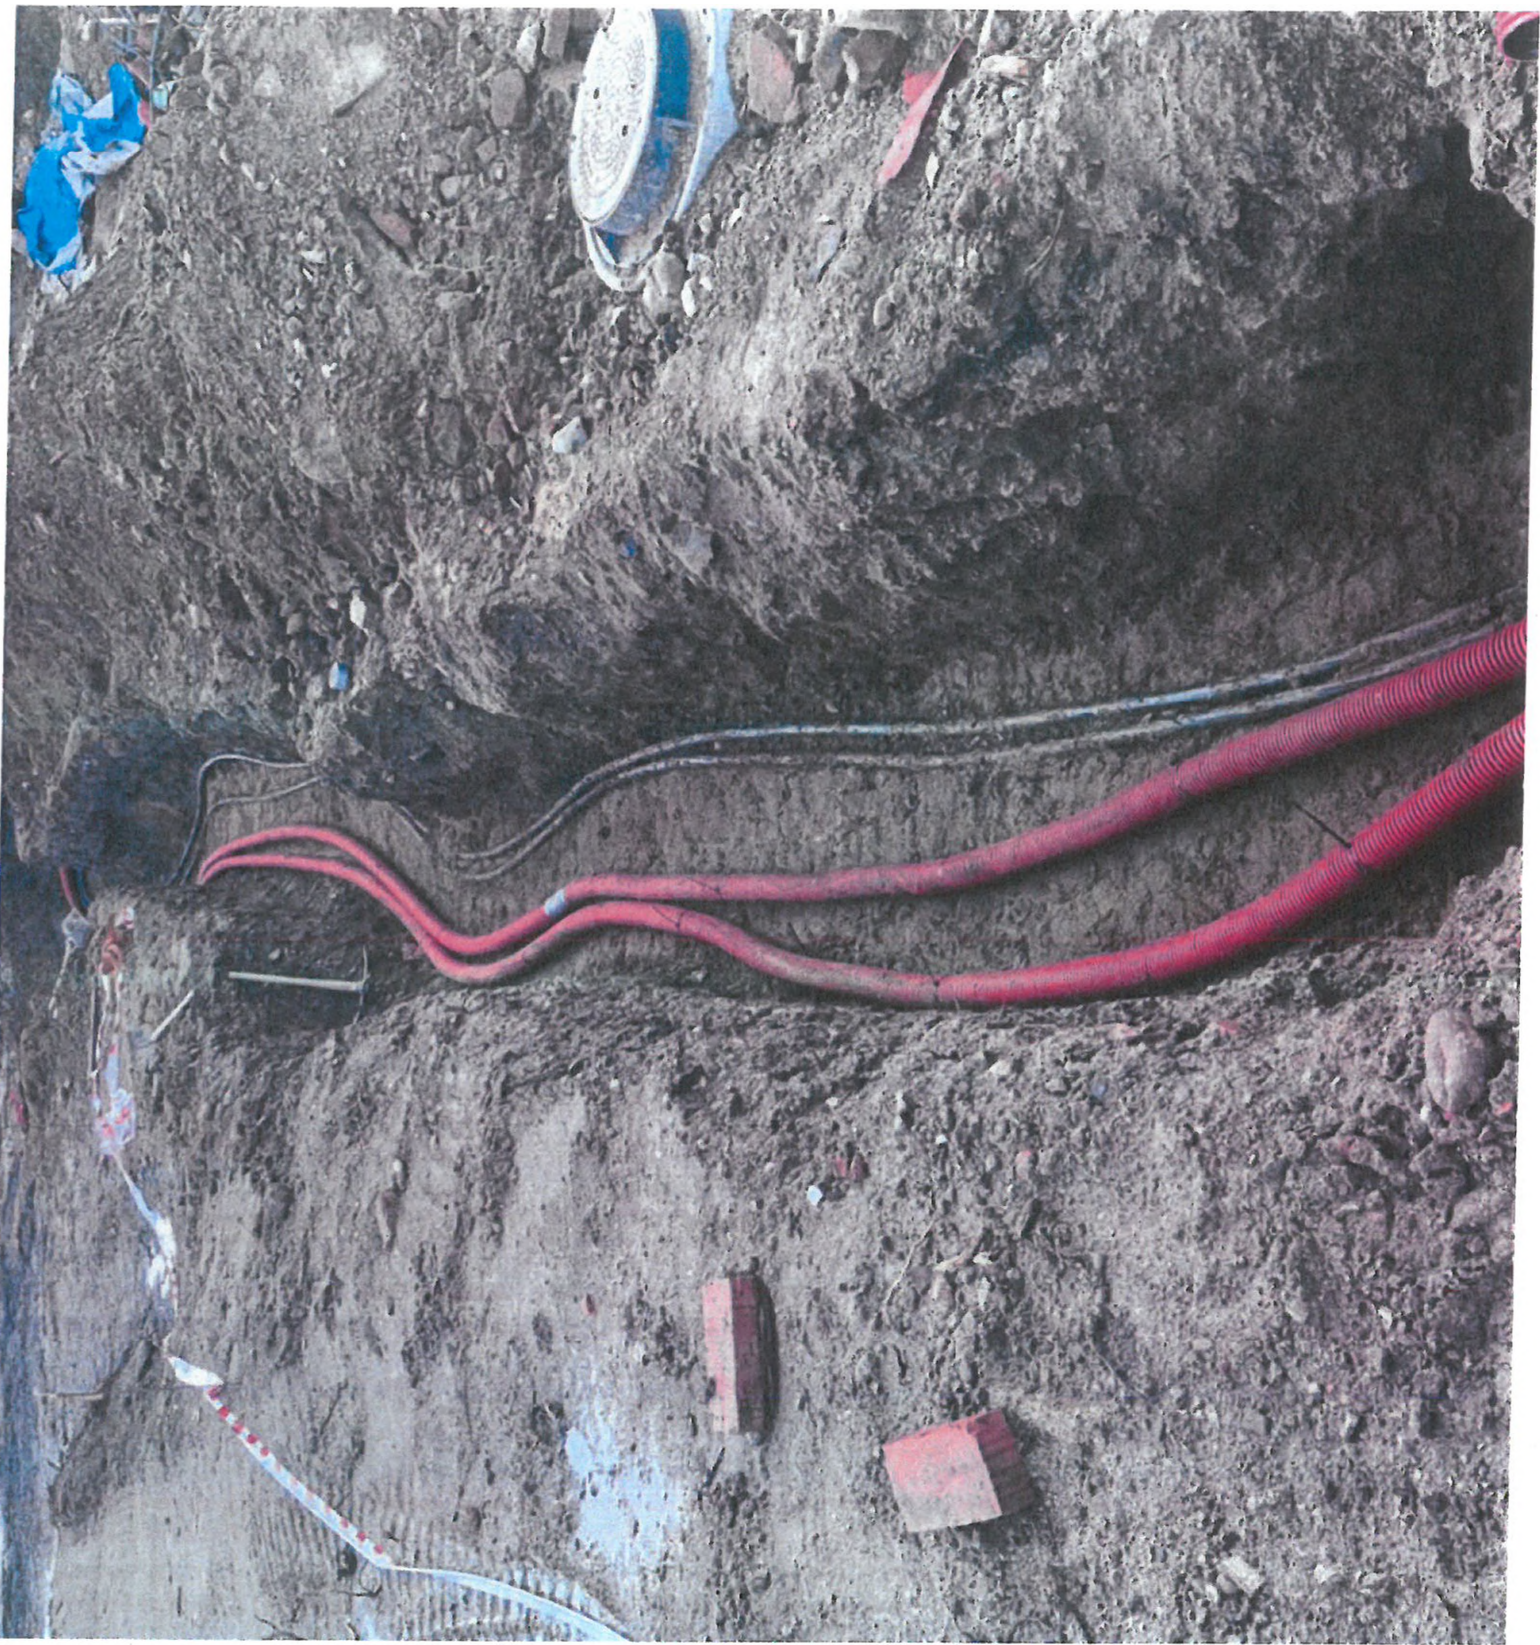

9.1.2024 Projektant lávky se k zaslanému řešení ještě nevyjádřil. AD vyhotoví zápis do stavebního deníku, kde bude popsán způsob opravy. Předpoklad provádění opravy je 2/2024. Zodpovídá AD a Zhotovitel

23.1.2024 Zápis do stavebního deníku nebyl proveden. AD provede zápis neprodleně a informuje TDI.

Zodpovídá AD

13.2.2024 Zápis byl již proveden a to ke dni 13.10.2023 u objektu SO 08.05

27.2.2024 Zhotovitel informuje KAM před plánovanou opravou. Z této části bude bod vypuštěn a bude vedeno v trvalých úkolech.

16.4.2024 Na dnešním KD zástupce KAM seznámil přítomné s následující skutečností: Zhotovitel informoval

15.3.2024 o provádění oprav, která proběhne 21.3.2024. KAM přizval k provádění prací zástupce CTP, se kterými to bylo domluveno. Ti se však již z časových důvodů nemohli zúčastnit, a přítomní zástupci CTP neměli dostatek informací. Autor lávky [redacted] poté písemně zaslal připomínky ke zvolenému řešení. KAM požádal zástupce zhotovitele [redacted] o odložení úprav cca do konce dubna, aby byl prostor k vyjasnění připomínek, s ohledem na zachování dobrých vztahů mezi investorem a CTP. Zástupce zhotovitele potvrdil, že tento odklad ho v pracích nebrzdí. KAM též požádal o včasné informování o zahájení oprav – min. 14 dní předem.

30.4.2024 Zástupce zhotovitele informoval, že zahájení opravy je plánováno na 13.5.2024

11. SO 07.18.a - Hradidlová komora HKB - 09.a u Ronda

ZL č. 60 - bourání betonu v trase odlehčovací stoky DN 400

Z důvodu výskytu betonových bloků v trase odlehčovací stoky DN 400 směrem ke spadišřové šachtě bylo nutno vybourat 33 m3 betonu.

VCP byly odsouhlaseny TDS v zápise do SD. Zhotovitel dodá podklady ke ZL č.60.

Termín : 30.4.2024

Zodpovídá: zhotovitel

30.4.2024 Proběhlo. Zhotovitel zkompletuje ZL. Bod bude vypuštěn.

12. Doplnění detailů výtokového objektu v oblasti revitalizace nivy SO 07.08.

30.4.2024 Na dnešním KD zástupce zhotovitele požádal AD o dopřesnění výtokového objektu.

Jedná se o Lavičku výtokového objektu, výtokový žlab a výtokové čelo.

Zodpovídá

AD

13. Ochrana kabelů na Tábořského nábřeží

30.4.2024 Zástupce zhotovitele na dnešním KD informoval, že v rámci postupu prací byla zjištěna chybějící ochrana dvou kabelů na Tábořského Nábřeží. Zástupci EGD požadují doplnění. Zhotovitel připraví ZL.

14. Kamerový systém na kolonádě a přenos signálu na dispečink MP

30.4.2024 Zhotovitel oznámil, že dle požadavku Bkom je nutné, aby připojení kamerového systému na dispečink MP realizoval BKom.

Proběhne jednání za účasti : TDI, zhotovitel, Bkom, VRV. Info na příštím KD. Jednání svolá zhotovitel.

15. Změna okamenování za jezem u Riviéry

30.4.2024 Při realizaci pěšiny SO 07.14, osa 23B bylo zjištěno, že pěšina v místě jezu u Riviéry výškově nenavazuje na stávající okamenování. Okamenování je nutné vybourat a upravit tak, aby zůstalo zajištěno plynulé odtékání srážkové vody z tělesa pěšiny mimo prostor jezu. Zhotovitel zkompletuje ZL. Zodpovídá zhotovitel

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.

