



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 108

D 05 – Komunikace

SO 07.13.2 -stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-místní komunikace

D 15 – Přeložka veřejného osvětlení

SO 08.14f – Pilotová stěna

- Neprovedené práce - svodidla + VO – ul. Poříčí



SEZNAM PŘÍLOH


Důvodová zpráva	1
Pokyn OI MMB	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9

"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

**Důvodová zpráva – změnový list č. 108
- Neprovedené práce - svodidla + VO -ul. Poříčí**

Na základě jednání ve věci zpětné montáže svodidel a VO na ul. Poříčí bylo sděleno zástupcem OI MMB, že svodidla a veřejné osvětlení budou vyjmuty ze stavby „PPO“ a jejich případná montáž bude řešena v rámci stavby „odstranění vlečky na Poříčí“.

V Brně dne :



[REDACTED]

Od:

Odesláno:

středa 5. března 2025 14:26

Komu:

Kopie:

Předmět:

FW: PPO Svratka * Potvrzení změny rozsahu prací – svodidla a veřejné osvětlení

Upozornění: Externí

Dobrý den,

Dnes proběhlo jednání ve věci zpětné montáže svodidel na Poříčí. Na základě tohoto jednání sděluji, že svodidla a veřejné osvětlení budou vyjmuty ze stavby „PPO“ a jejich případná montáž bude řešena v rámci stavby „odstranění vlečky na Poříčí“.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí odboru

Odbor investiční

Magistrát města Brna | Kounicova 67a | 601 67 Brno

www.bрно.cz | [facebook](https://www.facebook.com/magistratbrno) | [twitter](https://twitter.com/magistratbrno)

[REDACTED]
Sent: Tuesday, March 4, 2025 9:15 AM

[REDACTED]
Subject: RE: PPO Svratka * Potvrzení změny rozsahu prací – svodidla a veřejné osvětlení

Dobrý den,

Jak jsem již sdělil ústně, záměrem je, aby se některá část svodidel a VO vyjmula ze stavby PPO a eventuálně přeřadila do stavby ŘSD „odstranění vlečky na Poříčí“. Nejdříve je však nutné znát vyjádření PČR a JMK. Jiné než toto vyjádření, Vám zatím bohužel nemohu dát.

S pozdravem

[Redacted signature]

Odbor investiční
Magistrát města Brna | Kounicova 67a | 601 67 Brno

[Redacted contact information]

From: [Redacted]
Sent: Monday, March 3, 2025 1:27 PM

[Redacted email body]

Subject: RE: PPO Svratka * Potvrzení změny rozsahu prací – svodidla a veřejné osvětlení

Dobrý den,

omlouvám se všem za tento @, ale stále nemáme žádné vyjádření. Pokud je někde problém, můžete nám někdo zareagovat,.....alespoň nebudu Vás všechny obtěžovat svými dotazy,.....

S pozdravem



[redacted]
vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b,
[redacted]

www.ohla-zs.cz

From: [redacted]
Sent: Thursday, February 27, 2025 1:08 PM

[redacted]
Subject: RE: PPO Svratka * Potvrzení změny rozsahu prací – svodidla a veřejné osvětlení

Žádost o písemné potvrzení rozsahu prací – svodidla a veřejné osvětlení (PPO Svratka)

Vážený pane [redacted]

Jelikož stále dochází k rozdílným názorům ve Vašem vyjádření (,kdy zástupce TDS* [redacted] má rozdílné informace než zhotovitel stavby) dovoluji si Vás touto cestou opětovně požádat o písemné **potvrzení rozsahu prací týkajících se svodidel a veřejného osvětlení** v rámci stavby PPO Svratka.

Na základě dosavadních informací by měly být tyto prvky zahrnuty pod novou investiční akci „Rekonstrukce ulice Bauerova“, která bude následovat po dokončení stavby PPO, přičemž objednatelem těchto prací bude ŘSD a Magistrát města Brna. S touto informací pracuje zhotovitel, osobně jsem s Vámi hovořil *nebude se realizovat příslušná část prací.

Vzhledem k tomu, že v této věci dochází k rozdílným výkladům mezi zúčastněnými stranami, žádám objednatele o jednoznačné písemné vyjádření, zda:

1. **práce nebudou prováděny v rámci stavby PPO a související stavební činnosti budou odečteny.**
2. **práce budou prováděny dle platné projektové dokumentace.**

Prosím o jasné a závazné potvrzení, které pomůže sjednotit výklad této problematiky mezi všemi účastníky výstavby.

Děkuji .

S pozdravem



vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b,
CZ - 627 00 Brno,

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, February 26, 2025 2:09 PM

Subject: PPO Svratka * Potvrzení změny rozsahu prací – svodidla a veřejné osvětlení

PPO Svratka * Potvrzení změny rozsahu prací – svodidla a veřejné osvětlení

Dobrý den ,

dovoluji si Vás požádat a rád bych si tímto písemně potvrdil informace vyplývající z dnešního telefonického rozhovoru mezi zhotovitelem [REDACTED] a zástupcem objednatele [REDACTED] (jak mě bylo dnes ráno sděleno zástupcem objednatele), že osazení svodidel a veřejné osvětlení budou zahrnuty pod nový projekt „Rekonstrukce ulice Bauerova“, který řeší ŘSD a Magistrát města Brna – jako společnou investiční akci.

Z tohoto důvodu je zřejmé, že uvedené práce nebudou součástí realizace protipovodňových opatření, a tím pádem budou odečteny z rozsahu prací zhotovitele. Do dnešního dne jsem chápal, že jakékoliv sdělení, byť telefonické, mezi objednatelem a zhotovitelem je pro mě závazné a jasné. Nicméně vzhledem k různým interpretacím a výkladům, jsem nucen požadovat opětovné písemné potvrzení této skutečnosti.

Žádám tedy objednatele o jednoznačné potvrzení této informace – stačí jednoduché vyjádření ve smyslu:

“Ano, souhlasíme s tím, že nebudou prováděny práce spojené s osazením svodidel a instalací veřejného osvětlení.”

Prosím o písemnou odpověď, aby byl všem zúčastněným stranám zcela jasný rozsah prací v rámci stavby protipovodňových opatření

Děkuji za spolupráci a prosím o zpětnou vazbu.

S pozdravem



vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b,
CZ - 627 00 Brno,

www.ohla-zs.cz

Upozornění:

Tento e-mail a všechny k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a určeny pouze jeho adresátům. Jeho obsah je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Šíření, zpřístupnění jeho obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem tohoto e-mailu, nešířte ani jinak s ním a jeho přílohami nenakládejte, okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste tento e-mail obdrželi, a odstraňte jej a jeho přílohy ze svého systému. Odesílatel e-mailu, resp. společnost OHLA ŽS, a.s. (dále jen „OHLA“), informuje adresáta, že (i) tento e-mail nepředstavuje závaznou nabídku a je pouze informativní povahy, ledaže by z něho výslovně vyplývalo jinak, (ii) k platnému uzavření smlouvy (rozuměno tím i jakékoliv její změny) dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran po výslovném dosažení shody na všech náležitostech smlouvy a do té doby si OHLA vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, kdykoliv jednání o uzavření smlouvy ukončit, a to i bez spravedlivého důvodu, a nemá v úmyslu z toho být nijak vázána. Adresát e-mailu tak nemůže důvodně očekávat uzavření smlouvy, považovat jakékoliv úkony či jednání odesílatele za příslib uzavření smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy, (iii) nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ani uzavření smlouvy odkazující na obchodní podmínky, které si vzájemně odporují, (iv) vylučuje použití § 1757 občanského zákoníku a obchodních zvyklostí při jednání o smlouvě, a (v) při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za OHLA odsouhlasena nebo schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci, případně také orgány OHLA či jinými osobami, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednávají obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby OHLA navržené znění smlouvy neodsouhlasí a OHLA v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy. Odesílatel e-mailu informuje, že není za OHLA oprávněn uzavírat jakékoliv smlouvy, s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen ze strany OHLA a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známa.

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace D 15 – Přeložka veřejného osvětlení		Změnový list č. 108
OZNÁMENÍ ZMĚNY D_05.23 – Dopravní řešení-SO 07.13.2 -stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-místní komunikace SO 08.14 – Přeložka sloupů el.osvětlení a kabelů el.osvětlení-SO 08.14f – Pilotová stěna - Neprovedené práce - svodidla + VO – ul. Poříčí		
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Na základě pokynu OI MMB nebudou prováděny práce – svodidla a VO na ul. Poříčí DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.2, SO 08.14f ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.108 méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě jednání ve věci zpětné montáže svodidel a VO na ul. Poříčí bylo sděleno zástupcem OI MMB, že svodidla a veřejné osvětlení budou vyjmuty ze stavby „PPO“ a jejich případná montáž bude řešena v rámci stavby „odstranění vlečky na Poříčí“.		
NAVRHL: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____ BKOM, _____ BKOM, _____ _____		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace D 15 – Přeložka veřejného osvětlení	108																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: D_05.23 – Dopravní řešení-SO 07.13.2 -stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-místní komunikace SO 08.14 – Přeložka sloupů el.osvětlení a kabelů el.osvětlení-SO 08.14f – Pilotová stěna - Neprovedené práce - svodidla + VO – ul. Poříčí																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Na základě pokynu OI MMB nebudou prováděny práce – svodidla a VO na ul. Poříčí DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.2, SO 08.14f ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 108 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.108 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 3 484 317,36 Kč</td><td style="text-align: right;">- 731 706,65 Kč</td><td style="text-align: right;">- 4 216 024,01 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 3 484 317,36 Kč</td><td style="text-align: right;">- 731 706,65 Kč</td><td style="text-align: right;">- 4 216 024,01 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0	0	0	Méněpráce:	- 3 484 317,36 Kč	- 731 706,65 Kč	- 4 216 024,01 Kč	Rozdíl:	- 3 484 317,36 Kč	- 731 706,65 Kč	- 4 216 024,01 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0	0	0														
Méněpráce:	- 3 484 317,36 Kč	- 731 706,65 Kč	- 4 216 024,01 Kč														
Rozdíl:	- 3 484 317,36 Kč	- 731 706,65 Kč	- 4 216 024,01 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:																	
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/24
Stavba: Nábřeží řeky Svratky-Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII
Objekt: ZL 108 - Neprovedené práce - svodidla+VO -ul. Poříčí

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky
Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -3 484 317,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-3 484 317,36	-731 706,65
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -4 216 024,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/24

Stavba: Nábřeží řeky Svratky-Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt: ZL 108 - Nprovedené práce - svodidla+VO -ul. Poříčí

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 15. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 484 317,36	-4 216 024,01
ZL 108	Nprovedené práce-svodidla+VO -ul.Poříčí	-3 484 317,36	-4 216 024,01
SO 07.13.2	-stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830-místní komunikace	-2 137 555,80	-2 586 442,52
SO 08.14f	VO pilotová stěna	-1 346 761,56	-1 629 581,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_15 - Přeložka veřejného osvětlení

ZL 108 - Nprovedené práce - svodidla+VO -ul. Poříčí

Soupis:

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení

Úroveň 3:

SO 08.14f - Pilotová stěna

Místo:

Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVATKY - BRNO

Datum:

28. 9. 2020

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 346 761,56

D M

Práce a dodávky M

-1 346 761,56

D 21-M

Elektromontáže

-874 905,96

11	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm ²	kus	-40,000	121,40	-4 856,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x10až16 mm ²	kus	-20,000	2 724,20	-54 484,00	CS ÚRS 2019 02
13	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	-20,000	2 228,90	-44 578,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	-20,000	681,10	-13 622,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-20,000	1 609,70	-32 194,00	CS ÚRS 2019 02
16	M	M1	stožár osvětlovací 10m v provedení "Brno" s termoplastickou manžetou	kus	-20,000	13 620,60	-272 412,00	
17	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-20,000	681,10	-13 622,00	CS ÚRS 2019 02
18	M	34844471	výložník obloukový pro svítidlo jednoduchý	kus	-20,000	2 971,80	-59 436,00	CS ÚRS 2019 02
19	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	-20,000	681,10	-13 622,00	CS ÚRS 2019 02
20	M	M3	Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy	kus	-20,000	1 981,20	-39 624,00	
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	-527,000	38,40	-20 236,80	CS ÚRS 2019 02
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	-393,340	44,60	-17 542,96	CS ÚRS 2019 02
23	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	-998,000	32,20	-32 135,60	CS ÚRS 2019 02
24	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	-998,000	194,50	-194 111,00	CS ÚRS 2019 02
25	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč včetně revize a vyhotovení revizní zprávy	kus	-1,000	10 525,00	-10 525,00	CS ÚRS 2019 02
26	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	-1,000	3 095,60	-3 095,60	CS ÚRS 2019 02
27	K	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	-1,000	8 048,50	-8 048,50	CS ÚRS 2019 02
28	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	-1,000	8 048,50	-8 048,50	CS ÚRS 2019 02
29	K	P1	Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 mm	kus	-240,000	136,30	-32 712,00	

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-471 855,60

37	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	-20,000	1 362,10	-27 242,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	-16,000	1 362,10	-21 793,60	CS ÚRS 2019 02
39	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	-20,000	4 457,70	-89 154,00	CS ÚRS 2019 02
41	M	28610563	trubka drenážní systému inženýrských liniových staveb celoperforovaná flexibilní tyčová PE-HD SN4 DN100 300 TP 6,0m šířka štěrbin 1,2mm	m	-20,000	439,60	-8 792,00	CS ÚRS 2019 02
43	K	460150243	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	-214,000	439,60	-94 074,40	CS ÚRS 2019 02
44	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	-158,000	439,60	-69 456,80	CS ÚRS 2019 02
45	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	-372,000	109,00	-40 548,00	CS ÚRS 2019 02
46	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	-9,000	476,80	-4 291,20	CS ÚRS 2019 02
47	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	-9,000	476,80	-4 291,20	CS ÚRS 2019 02
48	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	-372,000	19,90	-7 402,80	CS ÚRS 2019 02
49	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	-568,000	27,30	-15 506,40	CS ÚRS 2019 02
50	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	-568,000	44,60	-25 332,80	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	-214,000	68,20	-14 594,80	CS ÚRS 2019 02
56	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	-158,000	68,20	-10 775,60	CS ÚRS 2019 02
57	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	-16,000	284,80	-4 556,80	CS ÚRS 2019 02
58	K	P2	Uložení kabelu v chrániče voděsnnou pěnou	kus	-8,000	192,00	-1 536,00	
59	M	M4	Montážní pěna	kus	-2,000	185,80	-371,60	
60	K	220180201	Zatažení do tvárniceové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	-998,000	32,20	-32 135,60	CS ÚRS 2019 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

ZL 108 - Nprovedené práce - svodidla+VO -ul. Poříčí

Soupis:

D_05.23 - Dopravní řešení

Úroveň 3:

**D 05.2 - SO 07.13.2 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 -
38,830 - místní komunikace**

Místo:

Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

1/4/2025


Projektant:


A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 137 555,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 137 555,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 137 555,80	
33	K	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	-774,000	2 761,70	-2 137 555,80	SO 07.13.2
PP			Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné					
VV			"svodidla ocel. při silnici I. třídy ul. Poříčí"					
VV			"osa 4" 215		-215,000			
VV			"osa 5" 559		-559,000			
VV			Součet		-774,000			

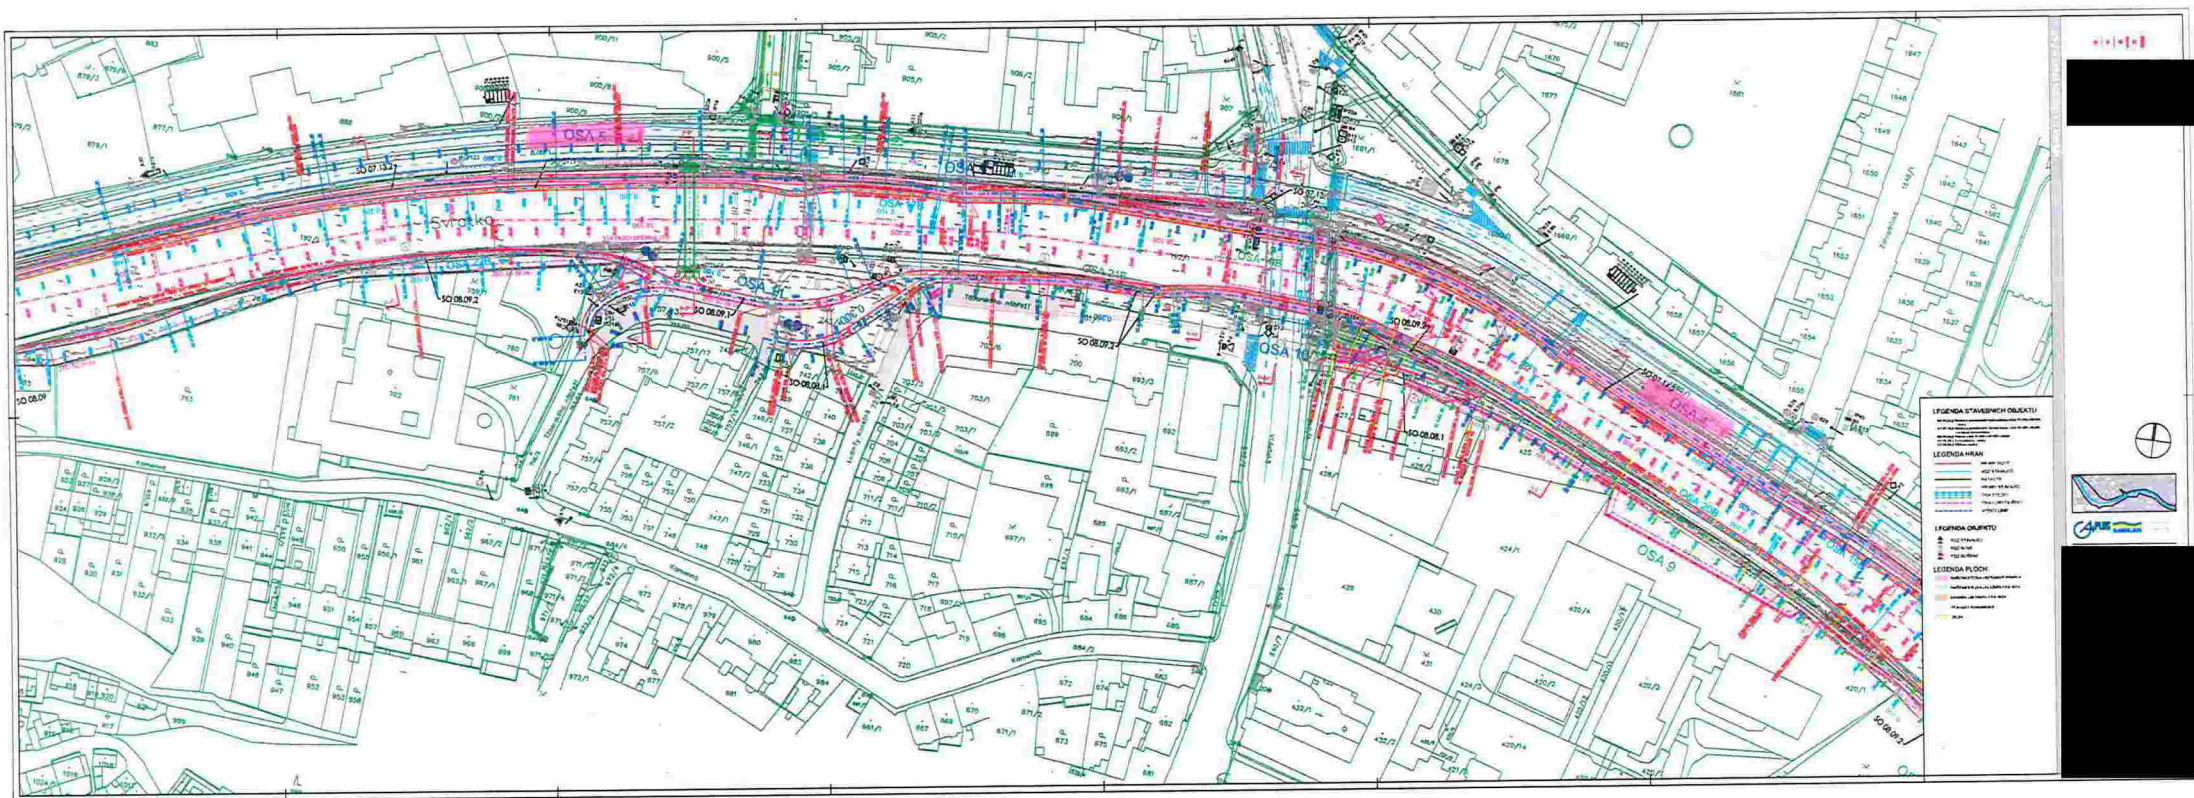

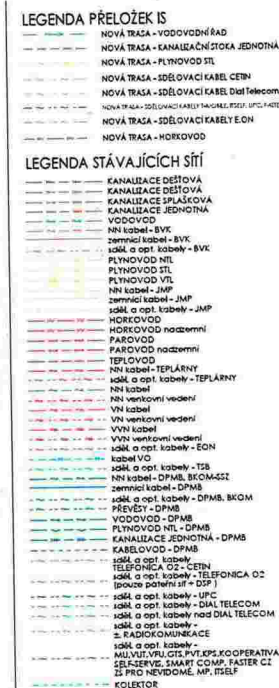

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



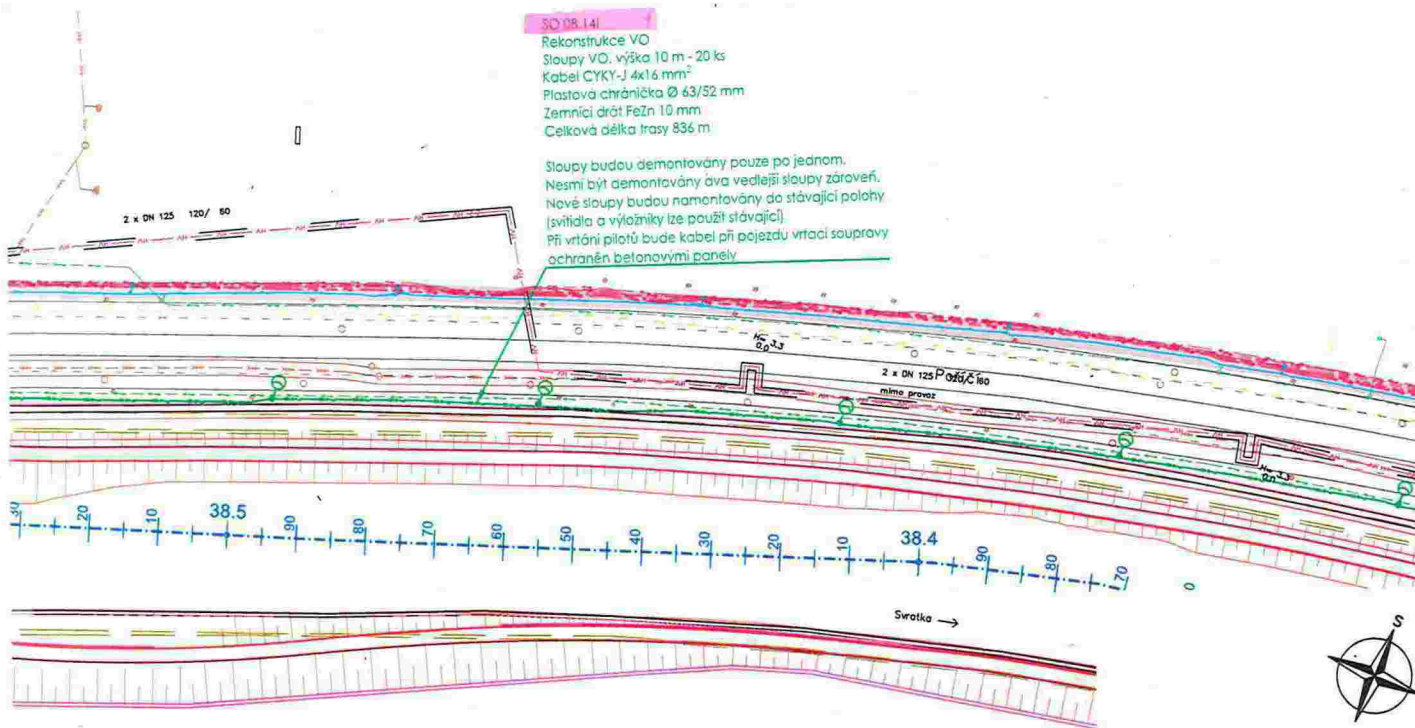

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- KABELOVÉ VEDENÍ VN - RUŠENÉ
- KABELOVÉ VEDENÍ VN - RUŠENÉ
- KABELOVÉ VEDENÍ NN (PŘÍPOJKA)
- KABELOVOD DPMB
- TRAKČNÍ KABELY - RUŠENÉ
- KABELOVÉ VEDENÍ VO - DOPLNĚNÍ NOVÉHO
- KABELOVÉ VEDENÍ VO - PŘELOŽKA
- KABELOVÉ VEDENÍ VO - RUŠENÉ

LEGENDA PŘELOŽEK IS


- NOVÁ TRASA - VODOVODNÍ ŘAD
- NOVÁ TRASA - KANALIZAČNÍ STOKA JEDNOTNÁ
- NOVÁ TRASA - PLYNOVOD STL
- NOVÁ TRASA - SDBLOVACÍ KABEL CETIN
- NOVÁ TRASA - SDBLOVACÍ KABEL Dial Telecom
- NOVÁ TRASA - SDBLOVACÍ KABEL TANGBLE, ITSELF, UPC, FASTER
- NOVÁ TRASA - SDBLOVACÍ KABELY EON
- NOVÁ TRASA - HORKOVOD

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLÁŠKOVÁ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VODOVOD
- NN kabel - BVK
- zemní kabel - BVK
- sděl. a opt. kabely - BVK
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- NN kabel - JMP
- zemní kabel - JMP
- sděl. a opt. kabely - JMP
- HORKOVOD
- HORKOVOD nadzemní
- PAROVOD
- PAROVOD nadzemní
- TEPLOVOD
- NN kabel - TEPLÁRNÍ
- sděl. a opt. kabely - TEPLÁRNÍ
- NN kabel
- NN venkovní vedení
- VN kabel
- VN venkovní vedení
- VVN kabel
- VVN venkovní vedení
- sděl. a opt. kabely - EON
- kabel VO
- sděl. a opt. kabely - TSB
- NN kabel - DPMB, BKOM-SSZ
- zemní kabel - DPMB
- sděl. a opt. kabely - DPMB, BKOM
- PŘEVĚSY - DPMB
- VODOVOD - DPMB
- PLYNOVOD NTL - DPMB
- KANALIZACE JEDNOTNÁ - DPMB
- KABELOVOD - DPMB
- sděl. a opt. kabely
- TELEFONICA O2 - CETIN
- sděl. a opt. kabely - TELEFONICA O2 (pouze páteří síť + DSP)
- sděl. a opt. kabely - UPC
- sděl. a opt. kabely - DIAL TELECOM
- sděl. a opt. kabely nad DIAL TELECOM
- sděl. a opt. kabely -
- ±. RADIOKOMUNIKACE
- sděl. a opt. kabely -
- MU, VUT, VFU, GTS, PVT, KPS, KOOPERATIVA, SELF-SERVIS, SMART COMP, FASTER CZ
- ZS PRO NEVIDOMÉ, MP, ITSELF
- KOLEKTOR

B | R | N | O |

INVESTOR / OWNER/DEVELOPER
 PROJECT MANAGER / PROJECT MAN



4PLUS SINDLAR

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY



STAVBA	STAVBA	KAPITOL	STAVBA	STAVBA	STAVBA
SVR	DPS	D.15	-	102	00
STAVBA	STAVBA	STAVBA	STAVBA	STAVBA	STAVBA

Koordinátní situace výkres - Pilotová stěna, část B

25.2.2025 Trvá

2. Vyjmutí části přeložky VO z PPO a neosazování svodidel do původní polohy

11.2.2025 Zhotovitel na dnešním KD požádal o závazné vyjádření zástupců objednatele, zda má nebo nemá dojít k osazení svodidel do původní polohy dle DPS. PK Ossedorf na základě žádosti objednatele posoudilo možnost, že v místě bude pouze PPO stěna. Závěr: Navržená výztuž bezpečně vyhoví na ohybové i smykové namáhání způsobené mimořádným zatížením po nárazu těžkého vozidla dle ČSN EN 1991-1-7. Na základě statického výpočtu není nutné osazovat silniční svodidlo mezi posuzovanou zdí a přilehlou komunikací. Dále zástupce zhotovitele žádá o vyjádření, zda dojde k vyjmutí části přeložky VO z projektu PPO v rozsahu, jaký byl domluven na jednání na OI MMB dne 6.1.2025.

25.2.2025 Zástupce OI MMB zašle své stanovisko k vyjmutí části přeložky VO do 28.2.2025. Zástupce TDI informoval, že kvůli neosazování svodidel do původní polohy dle DPS je třeba změna stanovení. Zástupce TDI (pan Dobrovolný) přislíbil prověřit změnu případnou změnu stanovení a info zašle také do 28.2.2025. V případě, že bude potřeba změna stanovení, dojde pravděpodobně k osazení svodidel dle platné DPS kvůli případnému dopadu do HMG.

7) Ostatní

1. Prohlídka stavby po mimořádné události

1.10.2024 Dne 30.10.2024 proběhla prohlídka stavby za účasti : zhotovitel, VRV, TDI, KAM, AD pro zhodnocení rozsahu škod po mimořádné události. Zhotovitel zašle zápis.

Zhotovitel dále zdokumentoval stav na stavbě PPO a mimořádnou událost řeší s likvidátorem pojišťovny.

15.10.2024 Probíhají další pochůzky s likvidátorem pojišťovny, zhotovitel ještě nemá dokončený monitoring dna.

29.10.2024 Trvá. Zhotovitel bude informovat na příštím KD.

19.11.2024 Trvá. Zhotovitel řeší tuto událost se zástupci pojišťovny.

3.12.2024 Trvá.

17.12.2024 Trvá

14.1.2025 Proběhne poslední návštěva likvidátora, zhotovitel zkompletuje podklady ke škodní události cca do konce 1/2025.

28.1.2025 Trvá

11.2.2025 Zhotovitel zaslal slíbené info ke kubaturám zástupcům objednatele.

2. Výšková kolize se stávajícími skříněmi CETIN

3.12.2024 Byla zjištěna výšková kolize s nově budovaným svahem přiléhajícím k dlážděné manipulační ploše odlehčovací komory OKA 10 se stávajícími rozvodnými skříněmi CETIN. Na místo přizvaní pracovníci CETIN přislíbili prověření možné výškové úpravy rozvodných skříní. Info na příštím KD.

17.12.2024 Servisní organizace CETIN (firma Vegacom) provede sondáž kabelů v místě. TDI požádal o nutnou součinnost zhotovitele. Info na příštím KD.

14.1.2025 Proběhla schůzka na místě s pracovníky firmy Vegacom za účasti TDI a zhotovitel. Sondy budou realizovány nejpozději začátkem příštího týdne. Info na příštím KD.

28.1.2025 Vzhledem ke klimatickým podmínkám a množství poruch, které v této souvislosti Vegacom řešil sondy ještě neproběhly. Předpoklad provedení je do konce týdne.

11.2.2025 Zástupce TDI informoval, že dle informací od zástupce Vegacom proběhne sondáž do 14.2.2025.

25.2.2025 Sondáž neproběhla kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Trvá

3. Řešení detailu napojení břehu a nábrežních zdí u lávky CTP ZM088

28.5.2024 Do dokumentace k opravě zdí u CTP AD doplní žlaby, které budou sloužit pro odvodnění. Termín pro výkresovou část i VV : do 7.6.2024. Zodpovídá AD

11.6.2024 AD zaslal VV, v den konání KD proběhne schůzka k dořešení dozdění i za přítomnosti zástupců CTP. Info ze schůzky na příštím KD
