

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby:

ID 24-0-1984

Pořadové číslo změnového listu:

16

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo objektu:	21	Název:	Modernizace podchodu a vestibulu
Popis změny: Nové prosklené dělicí stěny ve vestibulu: V rámci dopracování PDPS do podoby RDS byl vyhodnocen stav stávající ocelové dělicí konstrukce oddělující veřejnou část podchodu od vestibulu. MDT nové omítky v místnosti č. 418 a 419: Změna spočívá v demontáži stávajících SDK předstěn v míst č. 418 a 419 a provedení nových omítek včetně výmalby. Provizorní místnost pro rozvaděče přestup B: Změna spočívá v dodatečné výstavbě provizorní místnosti pro rozvaděče pro 3. etapu. Kanál VZT výstup Na Florenci: Popisované změny zahrnují odsouhlasené technické řešení v rámci dopracování realizační dokumentace stavby. Technicky upřesněné řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci jednotlivých komponent. Jedná se zejména o úpravy zámečnických konstrukcí, betonových konstrukcí a izolací. Stavební úpravy a vybavení PM v UV: Popisované změny zahrnují odsouhlasené technické řešení v rámci dopracování realizační dokumentace stavby. Jedná se zejména o úpravy dispozice zázemí PM ve vestibulu – wc, kuchyňka, zázemí pro službu PM					
Zdůvodnění změny: Nové prosklené dělicí stěny ve vestibulu: Při přípravných pracích byla provedena diagnostika stávající ocelových konstrukcí obchodních vybaveností a dělicí stěny vestibulu (příloha č.2). na základě vyhodnocení skutečného stavu s původně zamýšleným záměrem bylo rozhodnuto o provedení nové dělicí stěny do vestibulu (příloha č. 3). MDT nové omítky v místnosti č. 418 a 419: Na základě zhodnocení skutečného stavu stávajících SDK předstěn v míst č. 418 a 419, bylo zástupci DPP rozhodnuto o kompletní demontáži stávajících předstěn v míst č. 419 a provedení nových omítek včetně malby (Příloha č.4). V místnosti č. 418 v souvislosti s požadavkem jednotky DPP 810 110 (příloha č.5) na výměnu pevného zasklení a výměnu vstupních dveří, bylo nezbytné kompletně demontovat předstěnu a po výměně původního zasklení za nové provést novou předstěnu. Provizorní místnost pro rozvaděče přestup B: V rámci dopracování dokumentace DPS do podoby RDS (příloha č.6) a dle postupu výstavby v souvislosti s postupným otevíráním podchodu, bylo nezbytné vybudovat další provizorní místnost pro rozvaděče při přestupu na trasu B. Kanál VZT výstup Na Florenci: V rámci dopracování dokumentace DPS do podoby RDS (příloha č.7) a v souladu s požadavkem na odvětrání OV byl dopracován vzduchotechnický kanál nad stropní deskou výstupu z metra Na Florenci a vyústění vzt kanálu při obvodové podezdívce přístřešku směr ul. Na Florenci. Stavební úpravy a vybavení PM v UV: V rámci dopracování dokumentace DPS do podoby RDS v souladu s požadavkem zástupce DPP bylo navrženo nové dispoziční řešení zázemí obsluhy PM ve vestibulu. Oproti původnímu záměru v PDPS (příloha č. 8) byly zapracovány tyto změny: nová místnost wc, nová místnost s kuchyňkou, stavební úpravy pro místnost bankomatu. Tyto stavební úpravy byly zapracovány do RDS (příloha č.9)					
METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu					

Stavba: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy: 10120021	SO 21	Změnový list č: 16
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	Ano		
Do časového plánu stavby:	Ne		
Do ceny stavby:	Ano	zvýšení o:	3 948 105,61 Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY:			
"Společnosti Metrostav DIZ - [redacted] Podp [redacted] zástupce vedoucího projektu		stropní desky metra Florenc"	
TECH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel: Souř [redacted] Podp [redacted] zástupce vedoucího projektu	Příkazník: [redacted] Podp [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatele		
CECH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel: Souř [redacted] Podp [redacted] zástupce vedoucího projektu	Příkazník: [redacted] Podp [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatele		
OVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
[redacted] Podp [redacted] zástupce ředitele závodu o		[redacted]	
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Za Příkazníka: [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objedn	Za Objednatele: [redacted] Dopravní podnik hl. vedoucí odboru Inve		
Za Objednatele: [redacted] Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost projektový manažer	Za Objednatele: [redacted] Dopravní podnik hl. technický ředitel - M		

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:


Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	2 x A4
Příloha č. 2	Diagnostika stávajících ocelových konstrukcí obchodní vybavenosti a dělicích stěn (výňatek pro dělicí stěny vestibulu)	4 x A4
Příloha č. 3	Zápis z v.v. ze dne 5.6.2023 a odsouhlasení návrhu za DPP	4 x A4
Příloha č. 4	Zápis z KD ze dne 5.3.2024, fotodokumentace	13 x A4
Příloha č. 5	Žádost DPP o výměnu stávajících o výměnu stávajících výplní (oken) v místnosti obstuhy MDT + fotodokumentace	4 x A4
Příloha č. 6	RDS provizorní místnosti pro rozvaděče v podchodu - směr přestup trasa B + fotodokumentace	2 x A4
Příloha č. 7	RDS - VZT kanál pro odvětrání OV + fotodokumentace	4 x A4
Příloha č. 8	Zápis z v.v ze dne 19.6.2023	2 x A4
Příloha č. 9	RDS - úprava místnosti PM vestibul,	11 x A4
Příloha č. 10	Vyhodnocení CN + cenové nabídky	4 x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	50 x A4


VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby
Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C


Změnový 16


SO/PS	SO 21	Modernizace vestibulu a podchodu											
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem			poznámka	výpočet	
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl			
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace											
	1	Nové prosklené dělicí stěny ve vestibulu											
1	NV-001	Montáž žulové dlažby včetně podkladních vrstev	m2					792 145,24	545 485,22	-246 660,02			
2	NV-052	Zpětná montáž repasované vstupní prosklené stěny – mimo plochy prostupu konstrukcí pro vedení inženýrských sítí, včetně provizorního začistění prostupu pomocí SDK konstrukce	m2					504 120,81	545 485,22	41 364,41	j.c dle SoD - So 21		
								101 302,94	0,00	-101 302,94	j.c dle SoD - So 21		
3	NV-052a	Finální montáž repasované vstupní prosklené stěny po demontáži provizorních konstrukcí pro vedení inž. sítí, včetně demontáže SDK začistění prostupu, odvozu a skládkování	m2					186 721,49	0,00	-186 721,49	j.c dle SoD - So 21		
	2	MDT nové omítky v místnosti č. 418 a 419											
4	NK-019	Malba stěn a stropů	m2					2 338 386,76	2 395 187,94	56 801,18			
								987 588,58	1 001 678,77	14 090,19	j.c dle SOD - SO 21		
5	NK-021	Vápenocementové omítky - vyspravení a doplnění	m2					1 331 759,00	1 372 071,06	40 312,06	j.c dle SOD - SO 21		
6	NK-032	Zazdění dveřního otvoru v obvodové stěně tl.375mm	m3					19 039,18	21 438,11	2 398,93	j.c dle SOD - SO 21		
	3	Provizorní místnost pro rozvaděče přestup B											
7	PP-009	Ocel.dveře jednokřídle otvírávé plně prachotěsné 900/1970 - UN, vč. zárubně, kování a ostatních prvků	ks					398 740,86	797 481,73	398 740,87			
								73 700,00	147 400,00	73 700,00	j.c dle SOD - SO 21		
8	PP-010	Ocel.dveře jednokřídle otvírávé plně prachotěsné 900/1970 - UN, vč. zárubně, kování a ostatních prvků	ks					13 511,66	27 023,32	13 511,66	j.c dle SOD - SO 21		
9	PK-007	Trapézový plech místnosti pro rozvaděče, TR85/260/1 ocel S320GD	kg					28 006,00	56 012,00	28 006,00	j.c dle SOD - SO 21		
10	PK-008	Trapézový plech místnosti pro rozvaděče, TR85/260/1 ocel S320GD	kg					5 367,50	10 735,00	5 367,50	j.c dle SOD - SO 21		
11	PK-011	Betonové věnce C25/30 provizorní místnost rozvaděče	m3					48 636,10	97 272,21	48 636,11	j.c dle SOD - SO 21		
12	PK-012	Betonové věnce C25/30 provizorní místnost rozvaděče	m3					12 381,60	24 763,20	12 381,60	j.c dle SOD - SO 21		
13	PK-013	Porobetonové zdívko tl.200mm. Požární odolnost REI180min.	m3					120 278,40	240 556,80	120 278,40	j.c dle SOD - SO 21		
14	PK-014	Bourání zdiva	m3					44 114,59	88 229,18	44 114,59	j.c dle SOD - SO 21		
15	PK-015	Omítky vnitřní a vnější porobetonového zdiva	m2					52 745,01	105 490,02	52 745,01	j.c dle SOD - SO 21		
	4	Kanál VZT výstup Na Florenci											
16	PD-011	Chem kotva M10 hl 120 mm	ks					82 911,00	84 845,59	1 934,59			
								82 911,00	84 845,59	1 934,59	j.c dle SOD - SO 21		
	5	Stavební úpravy a vybavení PM v UV											
17	NK-002	Zdvojená rozebiratelná podlaha + krytina PVC (místnost PM)	m2					15 564 349,51	17 116 891,23	1 552 541,72			
								28 521,56	41 396,62	12 875,06	j.c dle SOD - SO 21		
18	NK-006	Nové dveře 900x2000 vč. Zárubně, kování a ostatních prvků	ks					33 410,67	100 232,01	66 821,34	j.c dle SOD - SO 21		
19	NK-019	Malba stěn a stropů	m2					987 588,58	1 011 234,58	23 646,00	j.c dle SOD - SO 21		
20	NK-029	Příčky zděné tl.150mm vč. překladů	m2					1 329 934,74	1 413 394,46	83 459,72	j.c dle SOD - SO 21		
21	NK-022	Nové omítky na dozdívkách a nových stěnách	m2					1 086 783,56	1 141 187,27	54 403,71	j.c dle SOD - SO 21		
22	NV-037	Rastrový minerální akustický podhled 600x600mm vč. nosného systému (metro) - dodávka a montáž	m2					66 429,89	96 417,36	29 987,47	j.c dle SOD - SO 21		
23	NV-053	Dodávka a montáž VZT žaluziových dveří - nerez v podchodu	m2					286 152,52	476 003,70	189 851,18	j.c dle SOD - SO 21		
24	NV-026	Montáž obkladu keramického	m2					84 016,23	103 007,79	18 991,56	j.c dle SOD - SO 21		
25	NV-027	Obklady keramické Poštorná - dodávka	m2					117 017,73	143 469,16	26 451,43	j.c dle SOD - SO 21		
26	PD-006	Ocelové profily viz výkresy a tabulka prvků	kg					10 708 749,60	11 679 076,49	970 326,89	j.c dle SOD - SO 21		
27	PD-008	Spojovací prostředky a materiál - ocel	kg					835 744,43	911 471,79	75 727,36	j.c dle SOD - SO 21		
		Mezisoučet						19 176 533,37	20 939 891,71	1 763 358,34			
		Položky vyvolané zpracováním RDS											
	1	Nové prosklené dělicí stěny ve vestibulu						0,00	1 132 208,03	1 132 208,03			

1	N_051_01	Demontáž stávajícího obkladu, demontáž, prořezání spár, očištění, uložení na palety.		m2		0,00	43 531,43	43 531,43	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinace 13%
2	N_051_02	Dodávka a montáž dřevních křidel a zárubní povrchová úprava RAL.	bez požadavku na PO	ks		0,00	973 833,00	973 833,00	nejvýhodnější CN č. 1 + koordinace 13%
3	N_051_02	Ocelové profily - ukotvení prosklené stěny do nosné konstrukce	dodávka a montáž vč. protikoročních a povrchových úprav	kg		0,00	114 843,60	114 843,60	j.c dle SoD - So 21 nejbližší možné zatřídění
	2	MDT nové omítky v místnosti č. 418 a 419				0,00	46 813,78	46 813,78	
4		Demontáž stávající SDK předstěny	demontáž, odvoz a likvidace	m2		0,00	15 504,64	15 504,64	j.c dle SOD - SO 21 nejbližší možné zatřídění
5		Sádrokartonové předstěna u PM	dodávka a montáž	m2		0,00	31 309,14	31 309,14	j.c dle SOD - SO 21 nejbližší možné zatřídění
	3	Kanáli VZT výstup Na Florenci				4 318 390,00	4 535 350,06	216 960,06	
6	OZ-002	Konstrukce z železobetonu-beton C30/37	vč. bednění	m3		2 679 677,86	2 725 927,69	46 249,83	j.c dle SOD 20 - nejbližší možné zatřídění
7	OZ-003	Výztuž železobetonu ocel B500B		t		982 764,95	987 896,51	5 131,56	j.c dle SOD 20 - nejbližší možné zatřídění
8	OZ-004	Ocelové konstrukce- ocel S235	dodávka a montáž vč. kotvení a protikoročních a povrchových úprav	t		655 947,19	772 275,83	116 328,64	j.c dle SOD 20 - nejbližší možné zatřídění
9	MM-029	Živčná izolace proti zemní vlhkosti	dodávka a montáž	m2		0,00	49 250,03	49 250,03	j.c dle SOD 20 - nejbližší možné zatřídění
	4	Stavební úpravy a vybavení PM v UV				0,00	788 765,40	788 765,40	
10	N076_01	Bourání cihelného zdiva tl.150 mm, včetně překladů	včetně odvozu a likvidace	m2		0,00	16 915,55	16 915,55	j.c dle SOD - SO 23 nejbližší možné zatřídění
11	N076_02	Teplná izolace stěn u PM - minerální vlna tl.100mm	dodávka a montáž	m2		0,00	137 247,83	137 247,83	j.c dle SOD - SO 21 nejbližší možné zatřídění
12	N076_03	Sádrokartonové předstěna u PM	dodávka a montáž	m2		0,00	76 309,79	76 309,79	j.c dle SOD - SO 21 nejbližší možné zatřídění
13	N076_04	Sádrokartonové příčka	dodávka a montáž	m2		0,00	13 860,48	13 860,48	j.c dle SOD - SO 21 nejbližší možné zatřídění
14	N076_05	Teplná izolace podlahy, podhled - minerální vlna tl. 100	dodávka a montáž	m2		0,00	78 601,05	78 601,05	j.c dle SOD - SO 21 nejbližší možné zatřídění
15	N076_06	Ocelová konstrukce - ukotvení stěny PM a výtahu	dodávka a montáž	kg		0,00	99 841,08	99 841,08	j.c dle SOD - SO 21 nejbližší možné zatřídění
16	N076_07	WC kombi, vč. prkénka		kus		0,00	4 053,50	4 053,50	j.c dle SOD - SO 23
17	N076_08	Umyvadlo, vč. sifonu, kotvicích prvků a flexohadiček		kus		0,00	2 088,17	2 088,17	j.c dle SOD - SO 23
18	N076_09	Nový pult manipulanta		kpl		0,00	119 436,50	119 436,50	nejvýhodnější CN č.1 + koordinace 13%
19	N076_10	Kuchyňská linka + vybavení nábytek		kpl		0,00	240 411,45	240 411,45	nejvýhodnější CN č.1 + koordinace 13%
		Nové položky mezisoučet				4 318 390,00	6 503 137,27	2 184 747,27	
Objekt celkem						23 494 923,37	27 443 028,98	3 948 105,61	









Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



5.6.2023

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.

Projednávaný SO/PS (označení a název): **SO 21/01-05 Modernizace podchodu a vestibulu - Stavební řešení – Etapa 2**

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): **vstupní**

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel):

- Byly předloženy rozpracování výkresy HSV+PSV, se kterými je vidět rozdělení stropní desky podlaží do Etapy 2.
- Průběžně PDPS byly dořešeny VZT čarou a OV z souvisejícího obrazu po položení celkové konstrukce podlaží na nový strop. Z technického hlediska je třeba provést celou přestavbu a poté ji opět zhotovit. Součástí Etapy 2 bude celá stropní deska i boje část budovky do Etapy 3.
- Stupňové posílení bude provedeno napětím v seřadě. O jejím provedení se rozhodne po posílení celkové konstrukce. Bude dokončeno na úrovni IV.
- Součástí tohoto posílení bude také dodatečné inženýrské a civilizační stropní stropy výstupů z ulice na Florenci.
- Dalším záměrem je úprava uvažovaná jinou dispozicí přepravního manipulantu (PM Florenci).**

Zapsal:

Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz


Záznam z jednání 1/1

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

KONANÉHO DNE: 5.6.2023 v budově METROPROJEKTU Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – dopracování PDPS – výrobní výbor

jméno	organizace	Telefon/E-MAIL	Odpovědný za objekty	podpis
-------	------------	----------------	----------------------	--------

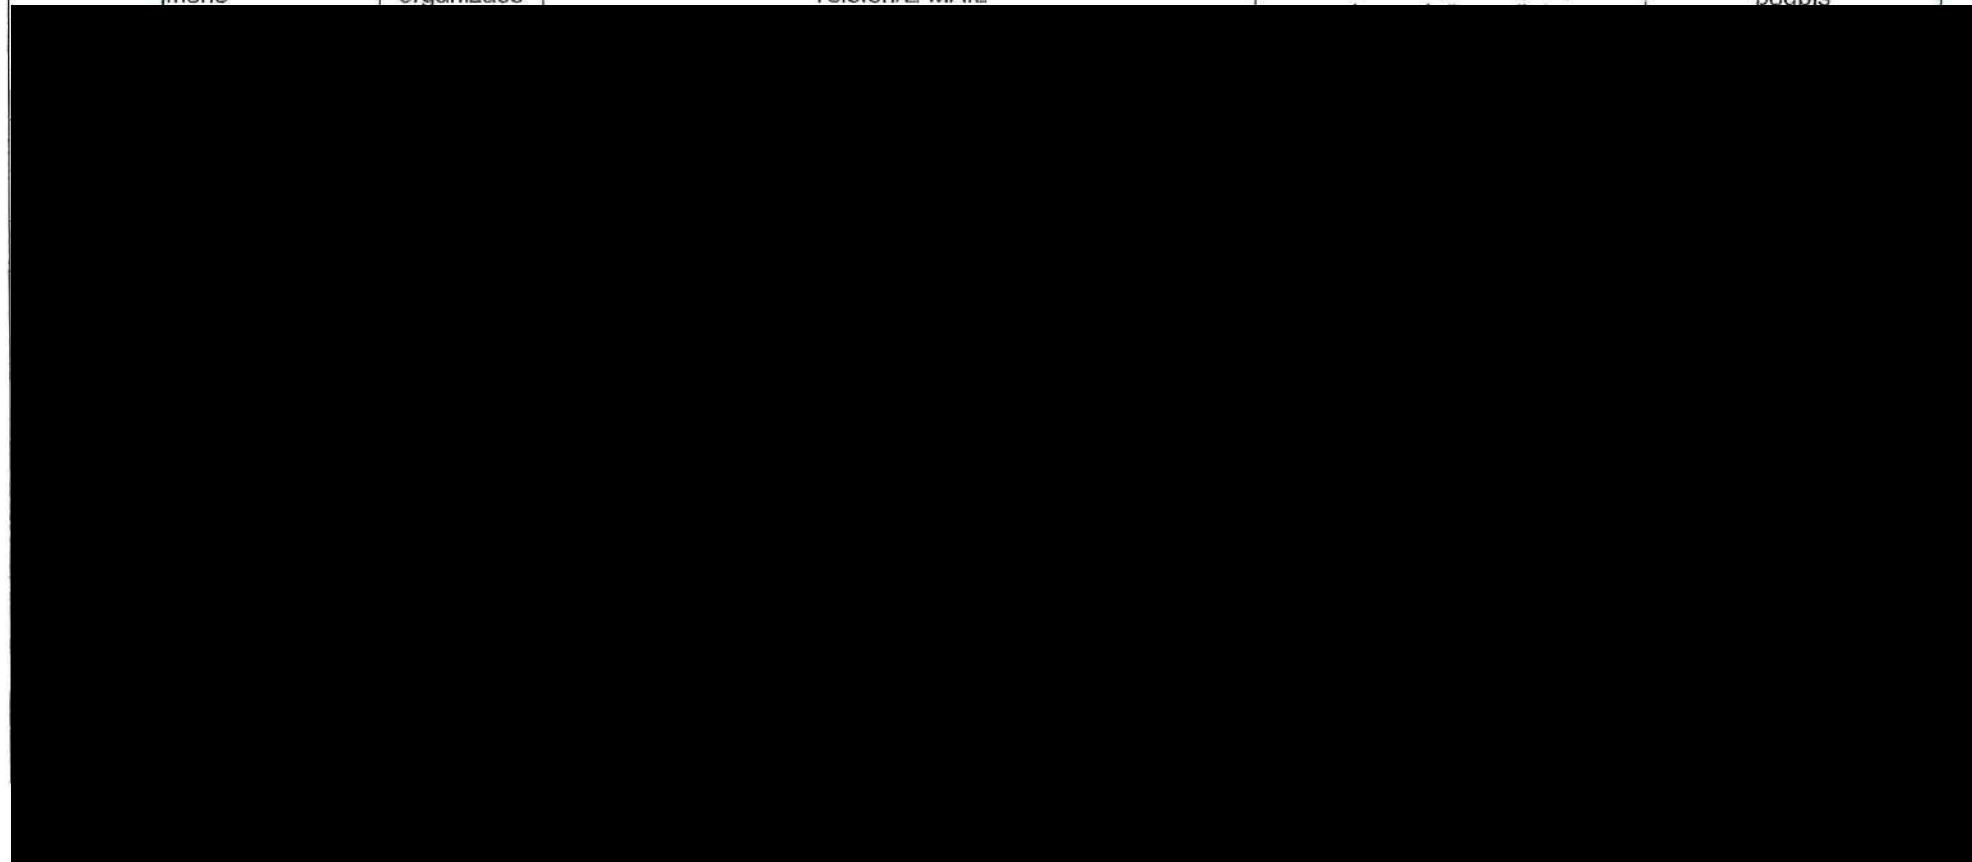

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 12. července 2024 9:24
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Florenc REKO - doplnění a aktualizace CN na prosklené stěny

Dobrý den,

dotčené útvary DPP souhlasí s aktuální verzí nepožární prosklené dělicí stěny do uzavřeného vestibulu.

Hezký den,

[REDACTED]
nost

From [REDACTED]
Sent: Tuesday, July 9, 2024 12:58 PM

[REDACTED]
Subject: Florenc REKO - doplnění a aktualizace CN na prosklené stěny

Dobrý den všem,
v příloze si dovoluji zaslat aktualizovaný návrh na dělicí prosklenou příčku do vestibulu.
Požádal bych Vás o prostudování a zaslání případných připomínek.

Po vašem odsouhlasení bude dopracována RDS a představena na zvv.


Děkuji a v případě dotazu mě prosím kontaktujte.

[REDACTED]

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 25021915, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177
Informace o zpracování osobních údajů: [Zásady ochrany soukromí](#)

Upozornění

Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace.
Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail





Zápis z kontrolního dne č.50

Konaný dne 5.3.2024

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce
viz příloha zápisu KD

Následující a očekávané práce
-viz příloha zápisu u KD

, Harmonogram stavby

-Stavba probíhá dle etapizace.

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. **trvá**
- 6.2. Výměna poškozených svítidel ve VZT bude provedena při zpětné montáži. Ostatní svítidla je nutno ochránit. Probíhá průběžně. Světla musí být vyvěšena.
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!

Sleduje se.

26.1 Zástupce investora opakovaně upozorňuje na rozesílání PD RDS také na technický úsek- Povrch, zejména službě 100 600 a 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams- týká se povrchů. **Trvalý úkol**

30.1 Zástupce investora a TDS požaduje každodenní kontrolu DIO vč. Zápisu do SD. Chybějící tabule neprodleně doplňovat. **Trvalý úkol**

34.5. Promptně provést opětovné proškolení/seznámení s TP, Souhlasy k činnosti cizích organizací v Metru, ROV apod. **Trvá**

37.2. DPP zjistil poškozené, nedostatečně ochráněné, prvky odbavovací čáry u PM ve vestibulu a požaduje opravu všech poškozených prvků. Zhotovitel opravy provede v návaznosti na postup výstavby. Trvá a bude provedeno na konci stavby.

39.2. Průsaky do MDT – zhotovitel sleduje – zatím bez průsaků.

39.3. Zhotovitel musí mít přehled o osobách na stavbě. Není možné, aby i pracovníci DPP se pohybovali na stavbě bez vědomí stavbyvedoucího. A neoprávněné osoby vůbec nepouštět na stavbu.

40.1. Reléová místnost je stavebně hotova, na sdělovací se pracuje. Doplnují se podhledy. Požadavek správců DPP – dokončit co nejdříve.

42.2. TDS upozornil zúčastněné o problematice již hotových (dokončených) částí díla. Zhotovitel připraví seznam SO a PS, kterých se to týká a TDS prověří u kolaudátora možnost částečné kolaudace (uvedení do zkušebního provozu). TDS zašle zhotoviteli vzor protokolu o převzetí a předání SO/PS a zhotovitel připraví příslušní SO nebo jejich části k předání. Do příštího KD zhotovitel připraví seznam SO nebo jejich částí, připravených k řízení s DESÚ. Proběhlo separátní porada a bylo rozhodnuto, že technické prohlídky budou 13. a 14.3.2024. program přejímek bude zaslán.

42.3. Zástupce DPP požaduje zprovoznění zdvihacího zařízení. Proběhla zkouška s vyhovujícím výsledkem, vč. Zaškolení obsluhy. Protokol bude předložen do konce tohoto týdne. Předloženo. Je nutné ještě vyměnit jistič. Trvá.

43.2. Průběžně kontrolovat zádržné nádrže na vodu v podchodu. Provádí se,

45.4. Zhotovitel požaduje místnost č. 427 naproti reléové místnosti vyklidit pro další postup prací. Provede příslušná jednotka DPP ve spolupráci se zhotovitelem. Zhotovitel požaduje specifikovat požadavky stavebních úprav od DPP. Probíhá. Zhotovitel v kontaktu s DPP p. Bezouškou. Zatím „status Quo“.

47.2. Cedula úniková cesta – staré sundat, opravit omítku a osadit nové. V řešení.

47.3. Způsob opravy opěrné zídky u FG, aby se mohli dokončit zásypy. Byly zvažovány 2 varianty – zbourat a postavit novou nebo opravit stávající. Názor TDS a zhotovitele je opravit. Pokud má někdo jiný názor, nechť ho neprodleně sdělí. Varianta nová znamená potřebu nakreslit a projednat s ČSAD . (demontáž zábradlí, zabezpečovačky, zásah do sadových úprav). Zástupce investora preferuje s ohledem na investiční náklady a časovou náročnost variantu oprava. Projektant souhlasí s názorem TDS a objednatele. Zídka bude sanována. Práce budou zahájeny tento týden.

49.1. Zhotovitel provede opatření proti zatékání do stanice (kolejiště) – nepřetržitá služba, ev. Úklid. Probíhá.

49.2. V případě většího průsaku musí zhotovitel neprodleně informovat dispečink DPP. Tel. Čísla jsou k dispozici v Souhlase k pracím. Systém funguje.

49.3. Zhotovitel neprodleně doplní osvětlení podchodu. Nutno vyklidit únikové cesty. Provedeno.

49.4. Zástupce DPP p. [REDACTED] požaduje v místnosti stávajících PT vyměnit stávající zdroje osvětlení za nové – 4 ks.

49.5. Bylo potvrzeno odkanalizování místnosti PM přes kolejiště. Projektant rozešle PD k připomínkám. PD zpracována.

Nové úkoly:

50.1. Byla zaslána specifikace úprav v místnosti stálé obsluhy v MDT. Zhotovitel předloží cenový návrh objednateli k posouzení.

Zintenzivnit práce na dokončení rekonstrukce VZT 1.etapa, aby bylo možné povolit do zk. provozu v rámci jednoho řízení.

K prohlídkám na dokončenou část (1.etapa) zpracovat dílčí mostní list.

Informace

2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

191.1. Likvidace materiálů je řešena v souladu s předpisy DPP. DPP zasílá pravidelně (měsíčně) instrukce.

24.1. Problematika prášení na nástupišti. V uplynulém období nebyla zaznamenána žádná stížnost. Nadále se sleduje.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD:

úterý 19.3.2024 od 9:00 hod.


Zapsal:

Přílohy : 1/ Prezenční listina
2/ Plán prací

Prezenční listina	KD č. 50	Datum:	05.03.2024
-------------------	----------	--------	------------



Stavba:	Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C			
Termin realizace:	03/2022 - 12/2025			
Jméno	Společnost	Tel.	email	podpis

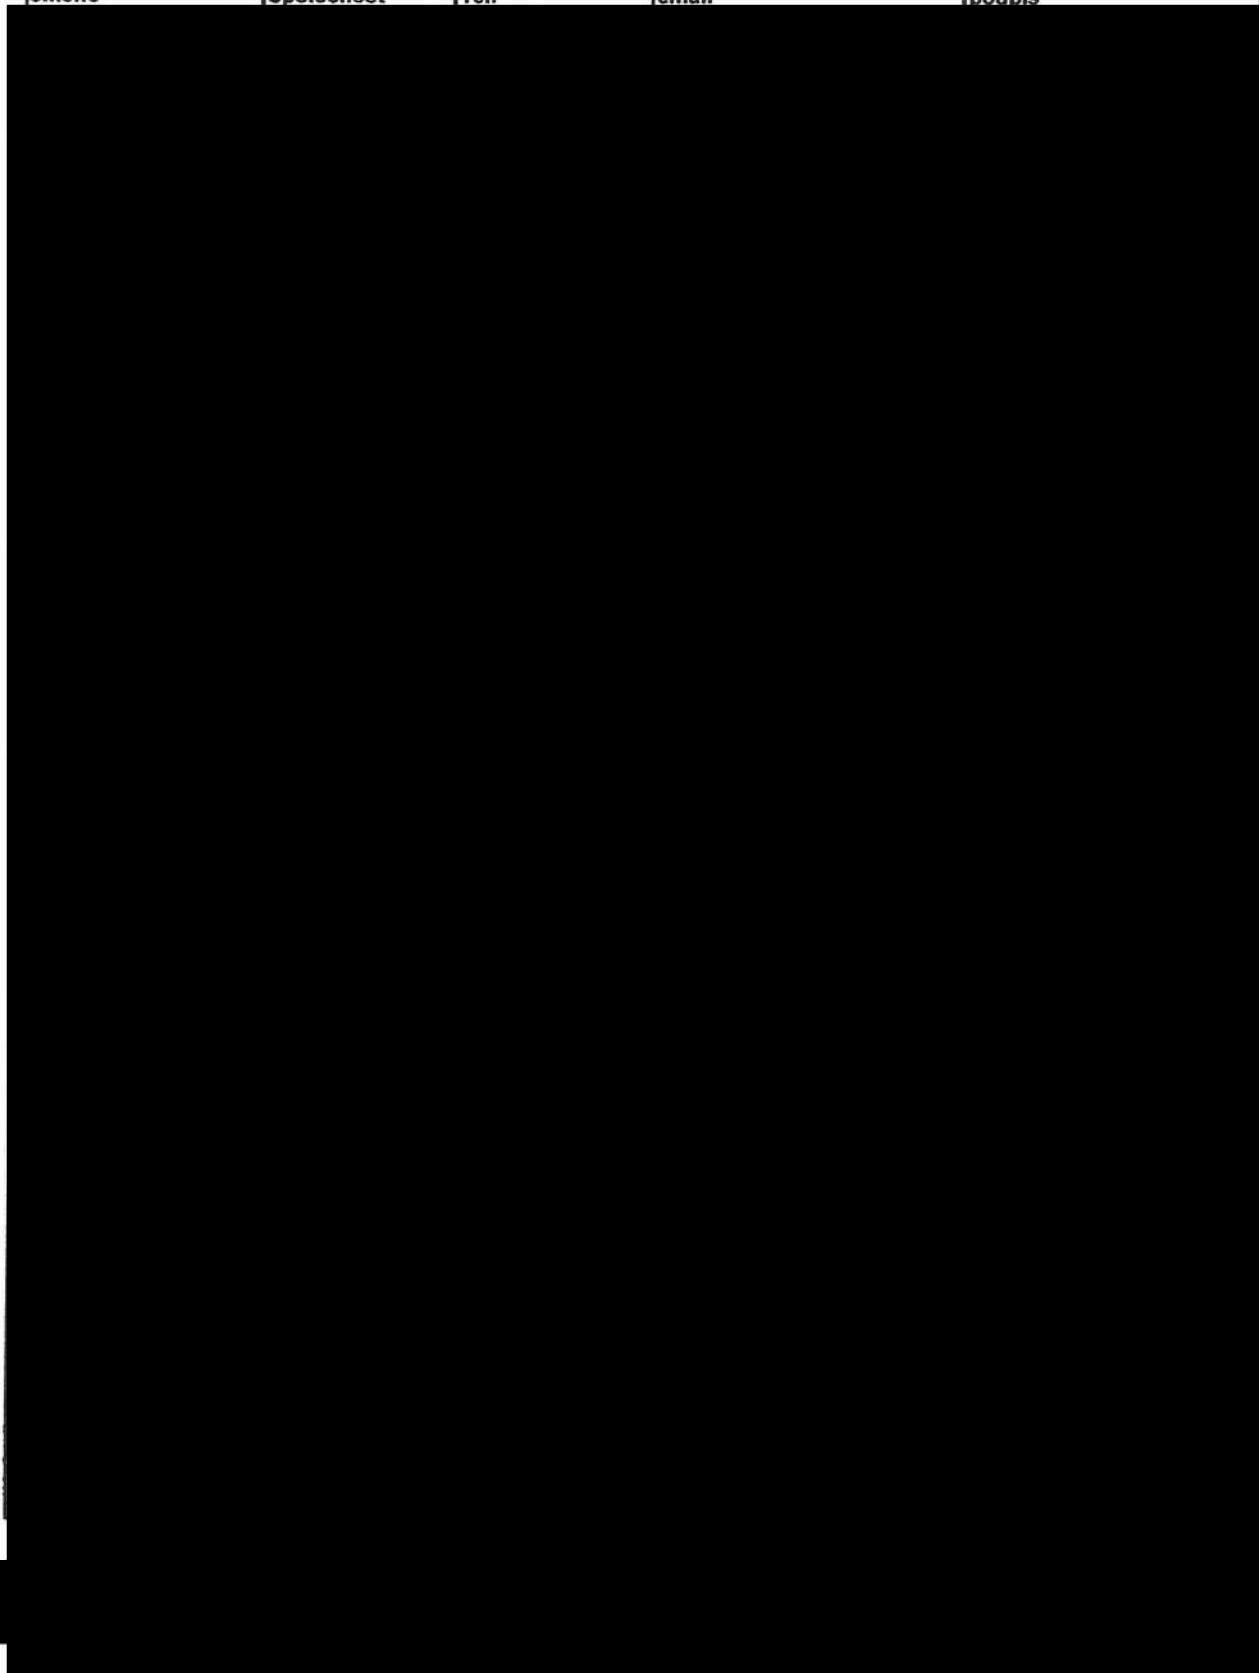

Zápis z kontrolního dne č.61

Konaný dne 6.8.2024

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“

Stavební povolení č.j. MHMP 342841/2021 ze dne 28.4.2021

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C“ bylo zhotovitelem převzato 1.3.2022.

Provedené práce
viz příloha zápisu KD

Následující a očekávané práce
-viz příloha zápisu u KD

, Harmonogram stavby

-Stavba probíhá dle etapizace.

Úkoly z minulých KD

- 1.1. TDS upozorňuje na proces schvalování subdodavatelů a materiálů. **trvá**
- 6.3. Protokoly materiálů – TDS upozorňuje, že veškeré zařízení a materiály musí mít v okamžiku uvedení do provozu platné certifikáty a schválení technického řed. DPP.
- 14.1 Zhotovitel musí postupovat dle souhlasu k pracím. **Trvalý úkol.**
- 14.2. Zhotovitel musí kontrolovat pohyb cizích subjektů na staveništi. **Trvalý úkol.**
- 14.4. Zástupce investora a TDS upozorňuje na technologickou kázeň – je nezbytné s postupem prací průběžně provádět taková opatření, která zamezí zatékání srážkových vod do stanice metra, zejména technologických prostor!
Sleduje se.
- 26.1 Zástupce investora opakovaně upozorňuje na rozesílání PD RDS také na technický úsek- Povrch, zejména službě 100 600 a 100 700 a zajištění možnosti účasti na VV přes Teams- týká se povrchů. **Trvalý úkol**
- 30.1 Zástupce investora a TDS požaduje každodenní kontrolu DIO vč. Zápisu do SD. Chybějící tabule neprodleně doplňovat. **Trvalý úkol**
- 34.5. Promptně provést opětovné proškolení/seznámení s TP, Souhlasy k činnosti cizích organizací v Metru, ROV apod. **Trvá**

37.2. DPP zjistil poškozené, nedostatečně ochráněné, prvky odbavovací čáry u PM ve vestibulu a požaduje opravu všech poškozených prvků. Zhotovitel opravy provede v návaznosti na postup výstavby. Trvá a bude provedeno na konci stavby.

39.3. Zhotovitel musí mít přehled o osobách na stavbě. Není možné, aby i pracovníci DPP se pohybovali na stavbě bez vědomí stavbyvedoucího. A neoprávněné osoby vůbec nepouštět na stavbu.

47.2. Cedula úniková cesta – staré sundat, opravit omítku a osadit nové. **Probíhá.**

49.1. Zhotovitel provede opatření proti zatékání do stanice (kolejiště) – nepřetržitá služba, ev. Úklid. Trvá.

49.2. V případě většího průsaku musí zhotovitel neprodleně informovat dispečink DPP. Tel. Čísla jsou k dispozici v Souhlase k pracím. Systém funguje. Stále se sleduje.

49.5. Bylo potvrzeno odkanalizování místnosti PM přes kolejiště. Bude provedeno v nočních výlukách. Provádí se, ale je problém s polohou potrubí. Trasa potrubí se musí změnit z důvodu kolize s výhybkami. V řešení AD se službou DPP [redacted], projekčně vyřešeno. Realizuje se. Nyní pozastaveno do vyjádření jednotky DPP.

50.1. Byla zaslána specifikace úprav v místnosti stálé obsluhy v MDT. Zhotovitel předloží cenový návrh objednateli k posouzení. Vydán pokyn k realizaci. Probíhá. Zbývá zednické zapravení a demontovat část sádkartonové stěny. Požadavek HZS. Termín: 31.8.2024

51.1 K prohlídkám na dokončenou část (1.etapa) zpracovat dílčí mostní list. Nutno do 06/24. Zhotovitel ML se sejde s [redacted] z DPP na upřesnění požadavků k vypracování ML. K jednání došlo, upřesnily se požadavky a ML budou zpracovány. Termín: 31.8.2024.

53.2. Zástupce DPP p. [redacted] navrhuje výměnu (opravu) hlavních vrat (místnost 408) do MDT. Zhotovitel a TDS prověří možnosti-do příštího KD. Po KD bude provedena pochůzka. Pochůzka provedena a zhotovitel předloží cenový návrh. Trvá. Dnes byla předložena cenová nabídka. Zástupce DPP p. [redacted] sdělí stanovisko. Do 31.8.2024.

54.2. Světla ve vestibulu – zhotovitel požaduje def. stanovisko o typu svítidel.

Dne 10.6.2024 proběhlo jednání na kterém byl dodavatelem svítidel prezentován vzorek svítidla s rozšířenou chromatičností, který byl účastníky (vč. MgA. Švarc) odsouhlasen. Bylo dohodnuto, že zhotovitel předloží cenový návrh zástupci investora k vyjádření – trvá.

54.3. Místnost 316 – p. [redacted] - odd. Elektrotechnika požaduje nové rozvaděče RS 02, RS 06 a RGB 220. 810110 zašle IS vedoucímu projektu (zástupci investora). Na RS 02, RS 06 vydán pokyn k realizaci. Realizuje se. TDS požaduje zrychlení prací (posílení kapacit) a koordinovat pracemi fy BREMA. Probíhá realizace.

55.2. Výrobce svítidel zpracovává prototyp svítidla s větší chromatičností. Po odzkoušení vzorku bude určen další postup. Viz. bod 54.2.

55.3. Problematika dveří do kolejiště z MDT – dveře nutno vyměnit za požární pro oddělení požárních úseků. Zástupce 830100 zašle písemný požadavek na výměnu. Vydán pokyn k realizaci. Probíhá. Termín 31.8.2024.

56.1. Zástupce investora požaduje neprodleně zahájit stavební práce na dokončení zásypů: zřízení podkladních vrstev parkoviště pro ČSAD. Probíhá realizace.

57.1. Nutno zlepšit informovanost mezi investorem, TDS a zhotovitelem ohledně mimořádných událostí – obzvláště krádeže materiálu a zařízení. Zhotovitel bude obratem informovat investora a TDS o oznámení PČR apod.

59.1. Zhotovitel žádá DPP 810 000 o součinnost při výměně rozvaděčů. Zhotovitel zašle žádost na p. [redacted] V procesu.

60.1. V trase kabelů ve stanici je jeden neidentifikovaný kabel. Zhotovitel kontaktuje ČD Telematiku a proběhne místní šetření. Majitel kabelu nezjištěn. Kabel byl přeložen a stavbě nepřekáží v dalším postupu. Bod se vypouští

60.2. Projektant požaduje vyjádření projektanta (fy AFRY) k demontáži potrubí v souvislosti s rušením plynové kotelny. Bude řešeno na KD stavby Změna vytápění dne 20.8.2024.

Nové úkoly:

61.1. Na základě požadavku HZS DPP bude odstraněna SDK předstěna v šatně u místnosti obsluhy MDT a stávající bude omítnuta. Tento bod souvisí s bodem 50.1.

Informace

2.7. Zástupce investora upozorňuje zhotovitele na ustanovení čl.6, bod č.6.7 SoD (veškeré vícepráce musejí být před realizací předem odsouhlaseny)

24.1. Problematika prášení na nástupišti. V uplynulém období nebyla zaznamenána žádná stížnost. Nadále se sleduje.

59.1. Zkušební provoz části I .etapa je do 30.11.2024.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD:


úterý 20.8.2024 od 9:00 hod.


Zapsal:

Přílohy :


- 1/ Prezenční listina
- 2/ Plán prací


Prezenční listina	KD č. 61	Datum:	06.08.2024
			
Stavba:	Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C		
Termín realizace:	03/2022 -12/2025		
Jméno	Společnost	Tel.	email

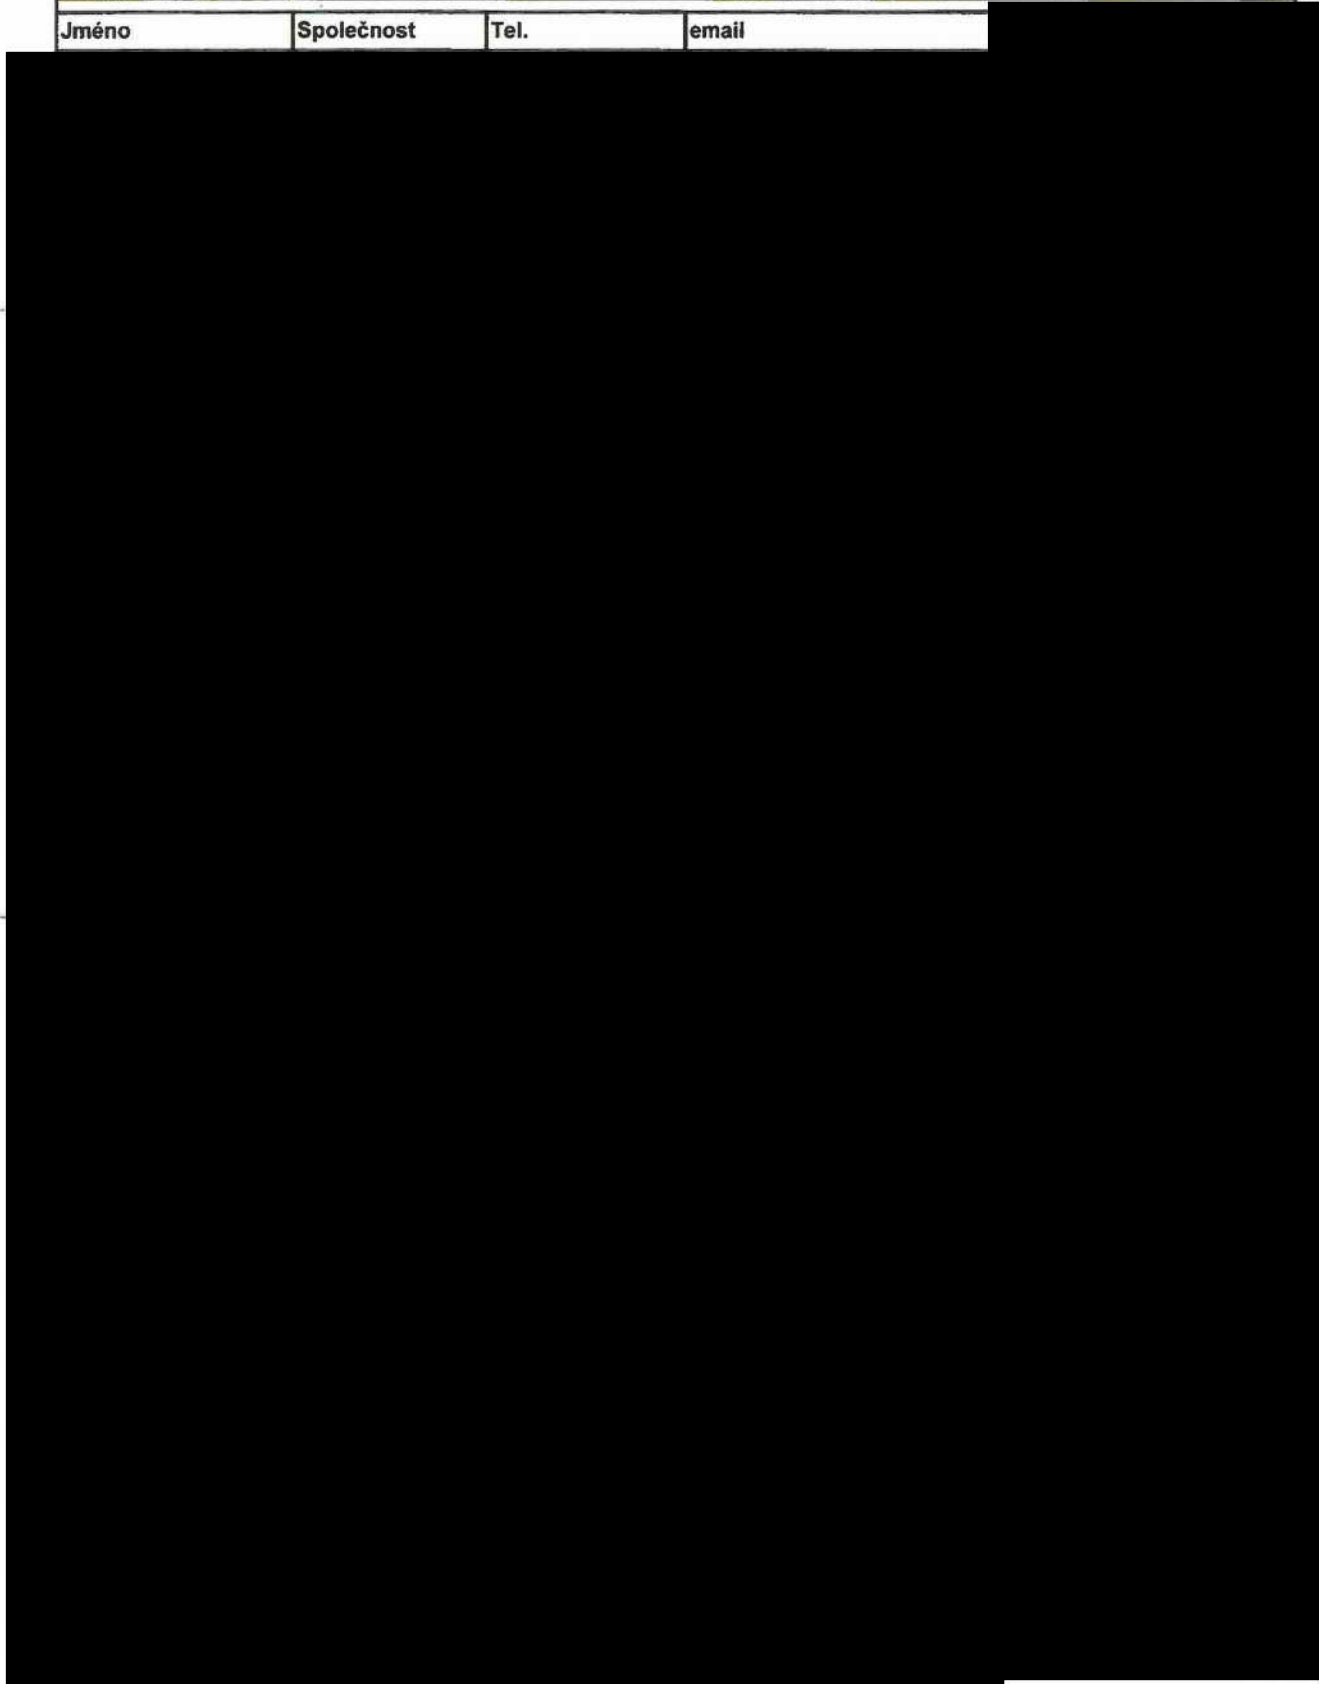




1000
1000
1000
1000
1000

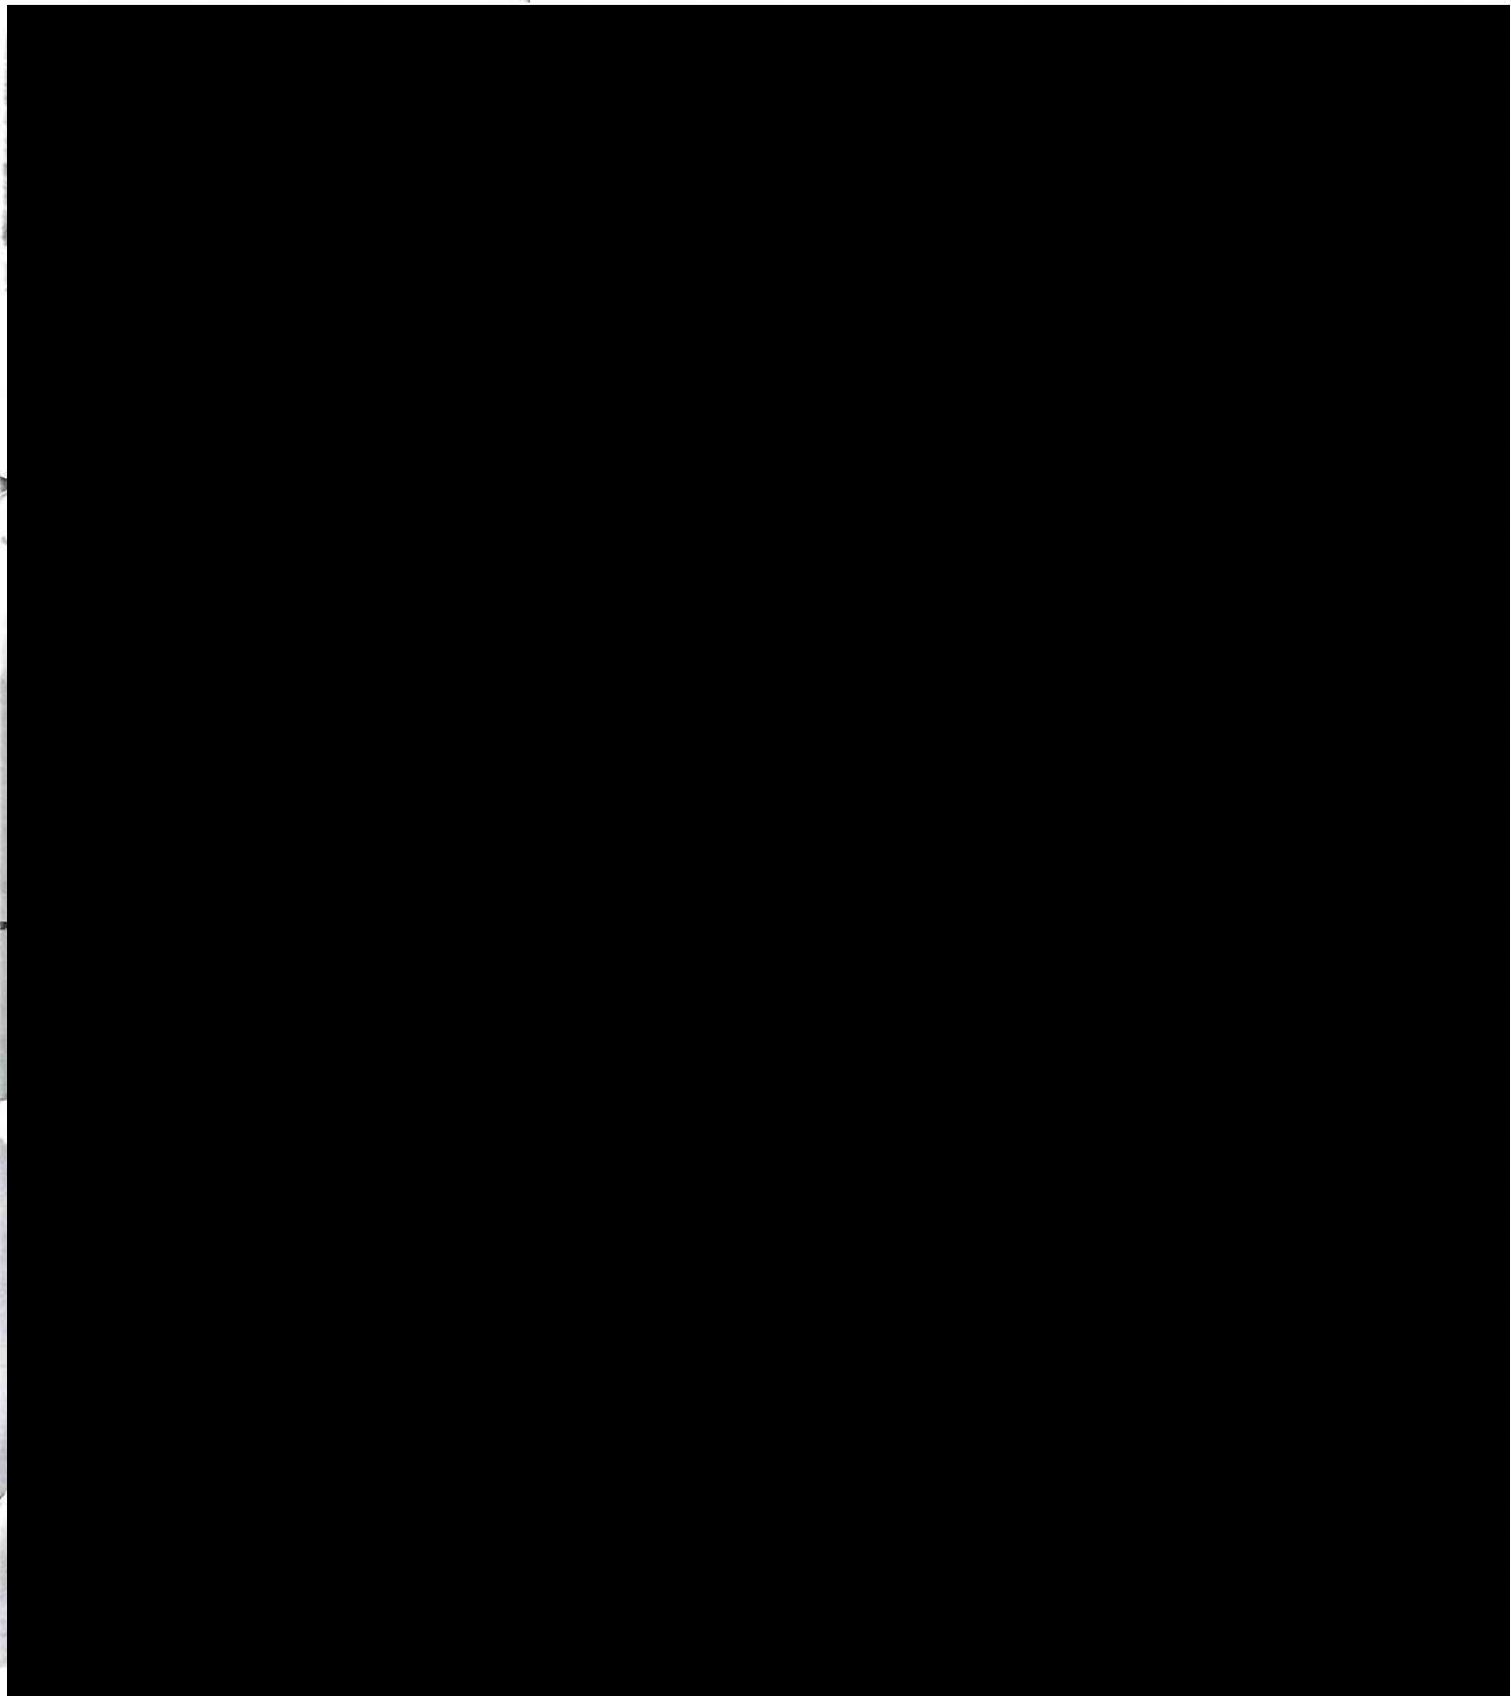





[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 4. března 2024 10:52
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: FRC - MDT - Výměna oken místnosti obsluhy
Přílohy: IMG_20240220_095730.jpg; IMG_20240220_095740.jpg; IMG_20240220_095753.jpg; IMG_20240220_095801.jpg; IMG_20240220_095812.jpg; RE: FRC - MDT - Výměna oken místnosti obsluhy; RE: FRC - MDT - Výměna oken místnosti obsluhy; IMG_20240220_101410.jpg

NEVEŘEJNÉ

Dobrý den,
na základě naší tel.dohody si Vás dovoluji požádat o předložení dopadů dle níže zasláného požadavku (před rozhodnutím o zahájení realizace-cena, termín).

Děkuji

[REDACTED]

Sent: Friday, March 1, 2024 2:43 PM

[REDACTED]

Subject: FRC - MDT - Výměna oken místnosti obsluhy

NEVEŘEJNÉ


Ahoj [REDACTED]

v návaznosti našeho hovoru zasílám záměr JE:

- v rámci realizace rekonstrukce stropní desky bychom:
 - snížením trvalé akustické zátěže rádi zlepšili pracovní podmínky. Žádáme proto výměnu stavebních výplní (oken a dveří) oddělující místnost obsluhy od prostor technologie MDT stanice metra Florenc C. Jedná se o náhradu celkem 3 ks kompletních rámu včetně skel a 1 ks vstupních dveří. Stávající rámy oken tvoří svařené kovové profily. Nové rámy předpokládáme rovněž kovové. Okna nebudou otevírací. Zasklení předpokládáme vakuovými skly v provedení s akustickým útlumem. Dveře předpokládáme kovové plné (bez zasklení) v provedení s akustickým útlumem. Fotodokumentace předmětných výplní a stanoviska dotčených útvarů tvoří přílohu tohoto vyjádření.
 - v místnosti MDT 66 potřebujeme přemístit stávající rozváděč RGB220, jehož umístění (viz přiložená fotografie) ve výšce cca 2,5 m nad podlahou neodpovídá požadavkům souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí. Zákon č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení uvádí: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány...a další. Musí být vždy zajištěna bezpečná obsluha a údržba

rozvaděče, vhodný manipulační prostor před rozvaděčem. Z uvedeného je patrné, že pro eliminaci rizik vyplývajících ze složitých pracovních podmínek při údržbě, je třeba střed předmětného rozvaděče přemístit do výšky 150 cm nad podlahou.

S přátelským pozdravem



Upozornění


Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstráňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.


Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.



)

)

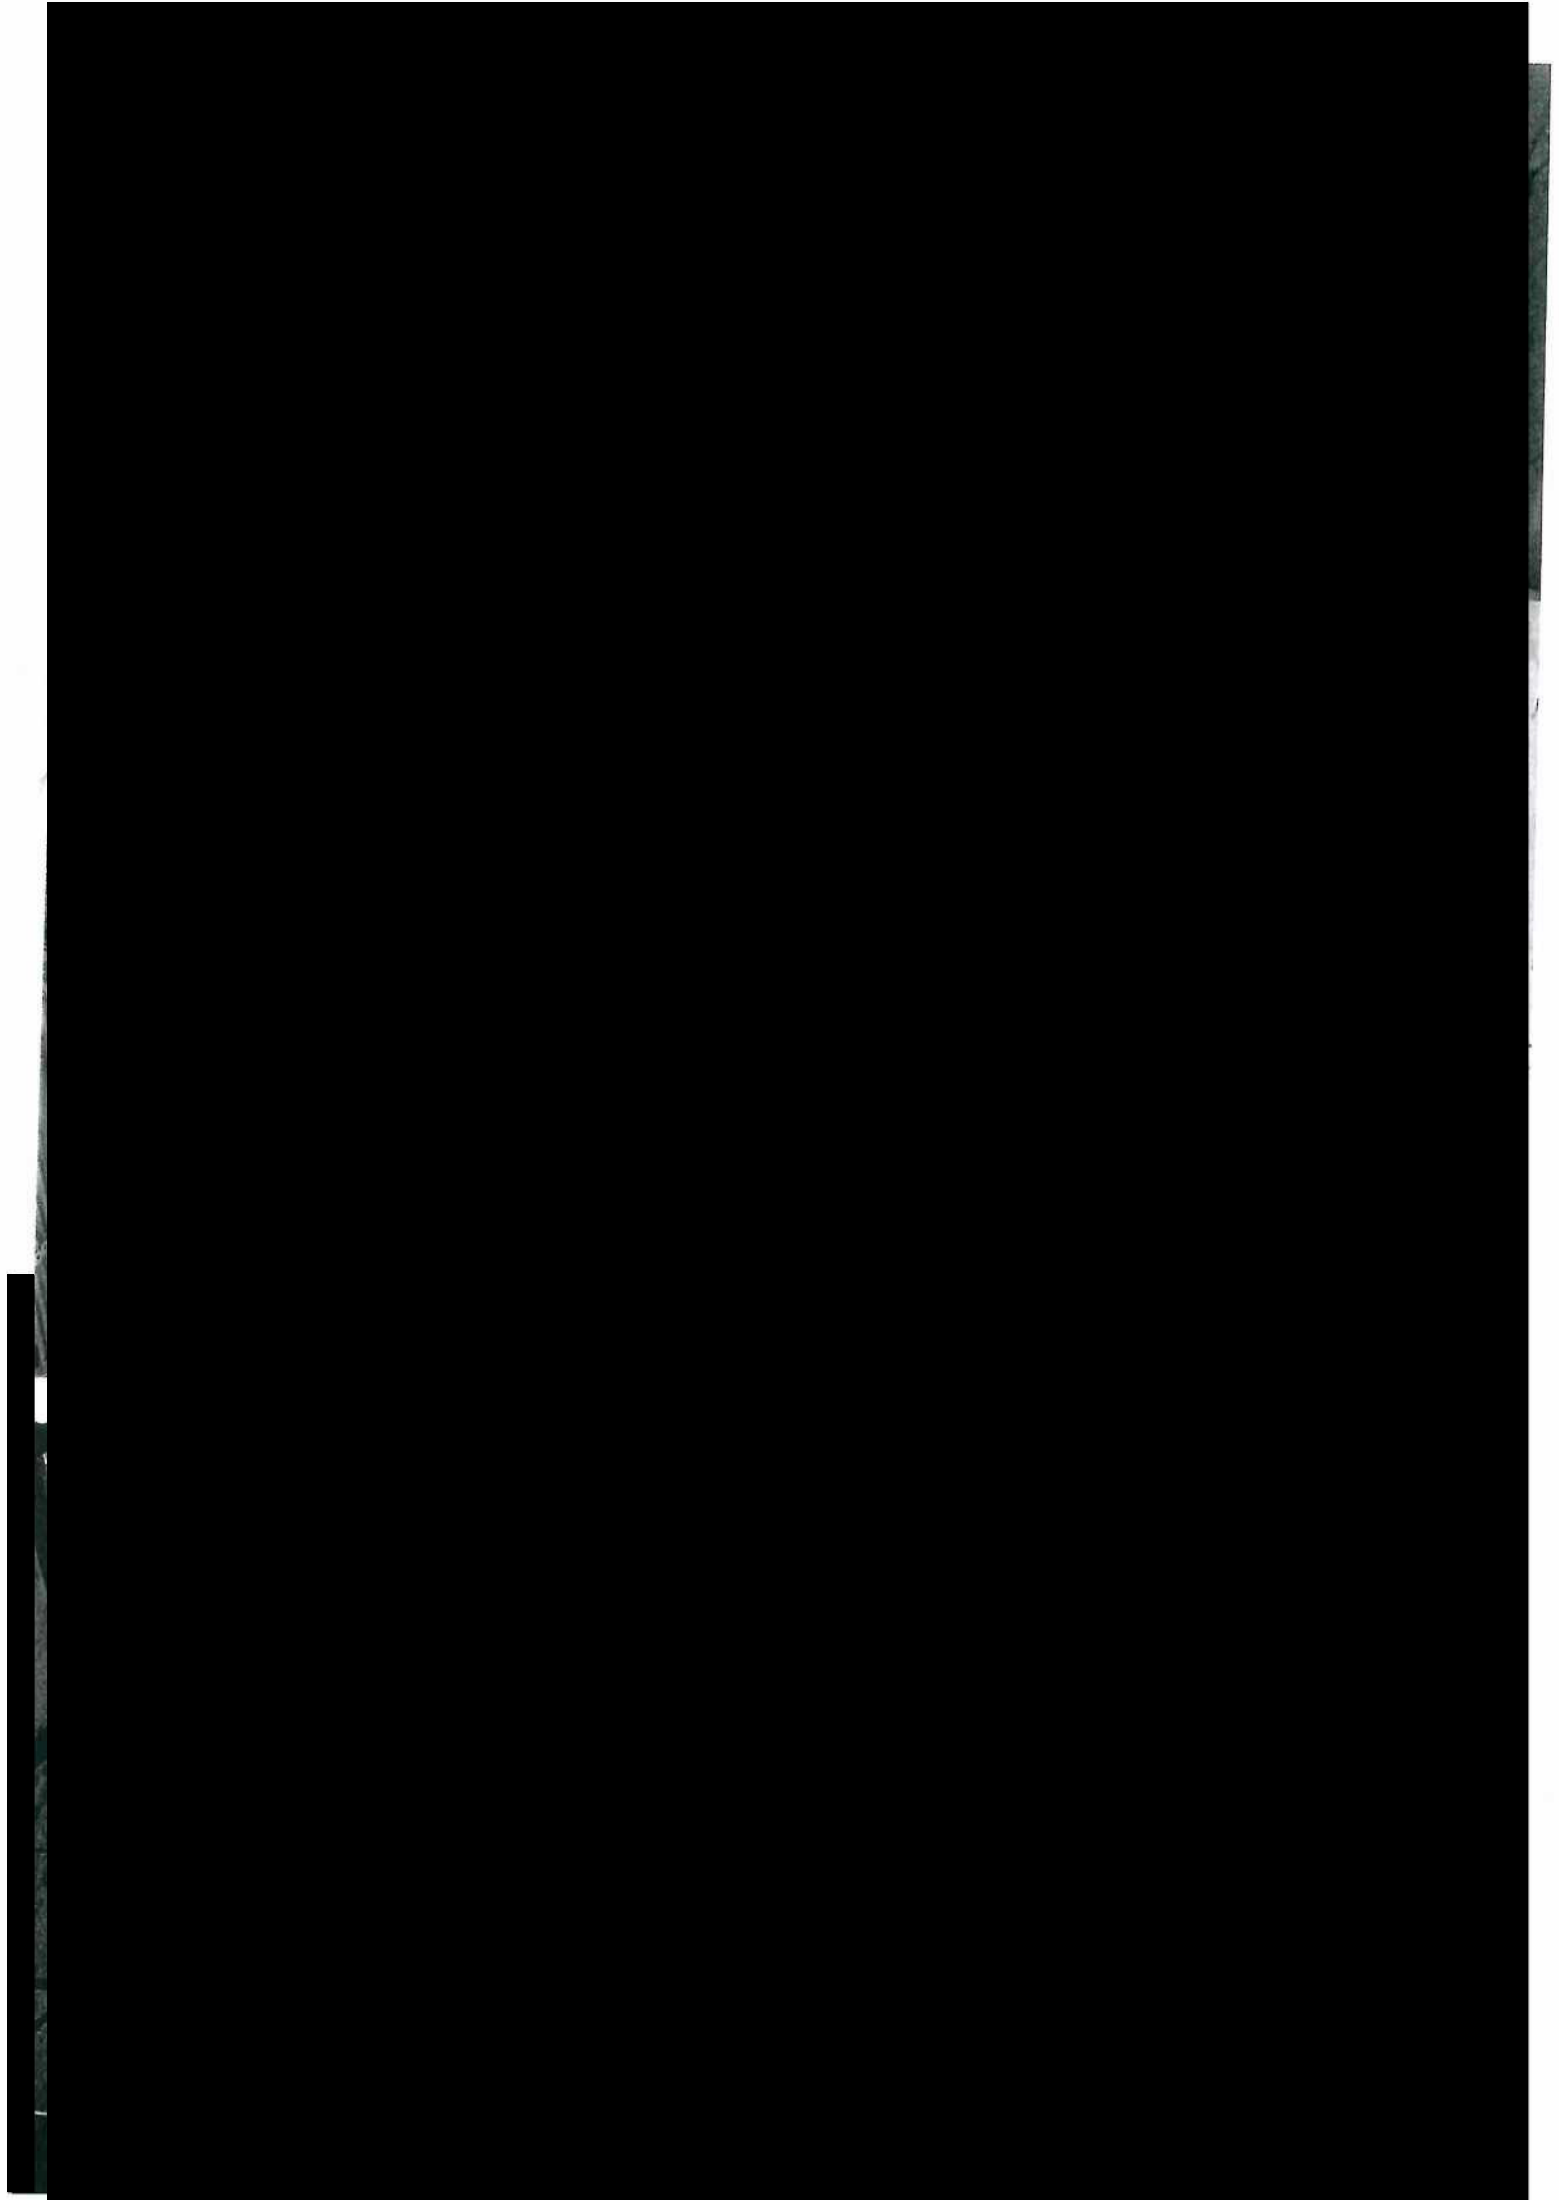



The first of these is the fact that the system is not a simple one. It is a complex system, and as such, it is not possible to understand it by looking at its parts in isolation. The system is a whole, and its behavior is determined by the interactions between its parts. This is a fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The second of these is the fact that the system is dynamic. It is not a static system, and its behavior changes over time. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The third of these is the fact that the system is open. It is not a closed system, and it interacts with its environment. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The fourth of these is the fact that the system is self-organizing. It is not a system that is controlled from the outside, and it is not a system that is designed from the top down. It is a system that organizes itself, and it is a system that evolves over time. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The fifth of these is the fact that the system is resilient. It is not a system that is fragile, and it is not a system that is easily disrupted. It is a system that is able to withstand change, and it is a system that is able to recover from disturbance. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.


The sixth of these is the fact that the system is sustainable. It is not a system that is unsustainable, and it is not a system that is doomed to failure. It is a system that is able to continue to exist, and it is a system that is able to thrive. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The seventh of these is the fact that the system is equitable. It is not a system that is unfair, and it is not a system that is biased. It is a system that is fair, and it is a system that is just. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The eighth of these is the fact that the system is inclusive. It is not a system that is exclusive, and it is not a system that is discriminatory. It is a system that is open to all, and it is a system that is welcoming. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The ninth of these is the fact that the system is transparent. It is not a system that is opaque, and it is not a system that is secretive. It is a system that is open, and it is a system that is honest. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.

The tenth of these is the fact that the system is accountable. It is not a system that is irresponsible, and it is not a system that is unaccountable. It is a system that is responsible, and it is a system that is answerable. This is another fundamental principle of systems thinking, and it is one that is often overlooked in traditional approaches to problem-solving.



Klient: Společnost Metrostav DIZ s.r.o. – Geosan pro rekonstrukci stropní desky metra Florenc
 Projekt: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C – dopracování PDPS



19.6.2023

Věc: Zápis z výrobního výboru :

Účastníci: Dle prezenční listiny
 Místo: budova Metroprojektu Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
 Svolavatel: Metroprojekt Praha a.s.


Projednávaný SO/PS (označení a název): SO 21/01-05 Modernizace podchodu a vestibulu - Stavební řešení – Etapa 2

Výrobní výbor (vstupní, průběžný č., závěrečný): 1vv

Změny oproti PDPS (popis, navrhovatel):

- 1) Byla předložena dokumentace zahrnující úpravy dispozice PR Florenc (změna oproti PDPS) a řešení nové dělicí stěny mezi V2T kamínem a st. OV v úvodu vestibulu, včetně úpravy u místě ocel. konstrukce zastropení.
- 2) Řešení bylo přijato bez připomínek.

Zapsal:



Neuplatní-li se požadavky na úpravu do 48 hodin (v pracovní dny), po obdržení, je zápis považován za odsouhlasený a závazný. Termíny dalších jednání, termíny dílčích plnění a úkolů uvedené v zápisu jsou závazné a nemají odkladný účinek při změně textu zápisu. Listinná podoba, podepsaná zapisovatelem, bude všem účastníkům předána na dalším jednání.

METROPROJEKT Praha a.s.

AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 296 154 226, Fax: +420 296 325 153

E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz


Záznam z jednání 1/1

PREZENČNÍ LISTINA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

KONANÉHO DNE: 5.6.2023 v budově METROPROJEKTU Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – dopracování PDPS – výrobní výbor


jméno	organizace	Telefon/E-MAIL	Odpovědný za objekty (nevyplněno=vše)	podpis
-------	------------	----------------	--	--------




Portrait of J

DPC

028





PDPS

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.

The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a major factor in the overall growth of the economy.



The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The second part of the paper describes the methodology used in the study, including the data collection and analysis techniques. The third part of the paper presents the results of the study, and the fourth part discusses the conclusions and implications of the findings.

The study was conducted using a quantitative research design. Data was collected from a sample of 100 participants using a survey questionnaire. The data was then analyzed using statistical software to identify patterns and trends. The results of the study show that there is a significant relationship between the variables being studied.

The findings of the study have several implications for practice and policy. First, the results suggest that there is a need for further research in this area. Second, the findings indicate that certain interventions may be effective in addressing the issues identified in the study. Finally, the results suggest that there are opportunities for future research to explore the underlying mechanisms of the observed relationships.

In conclusion, the study has provided valuable insights into the topic being investigated. The findings suggest that there is a need for further research and that certain interventions may be effective in addressing the issues identified. The results also suggest that there are opportunities for future research to explore the underlying mechanisms of the observed relationships.

Philomata 6. 3
PDPS

Polioha ē.4

RDS -



VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

							Vyhodnocení cenových nabídek					
SO/PS	SO 21	Modernizace vestibulu a podchodu					Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2		Cenová nabídka č. 3	
číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ. PDPS	množ. RDS	množ. rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem rozdíl	Cena Jedn.	Cena celkem rozdíl
		Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace										
		Příloha č. 1										
1		Dodávka a montáž dveřních křídel a zárubní povrchová úprava RAL,	ks					861 799,12		1 138 000,00		1 706 320,00
								861 799,12		1 138 000,00		1 706 320,00



Cenová nabídka č.: 091b/03/24

Poptávající: **Metrostav DIZ**

pan/í

tel:

fax:

e-mail:

Od:

tel:

e-mail:

V Praze dne 29.07.2024

zakázka

Akce: **Metro Florenc - prosklené stěny**

Vážený(á) pane(i),
předkládám Vám cenovou nabídku dle Vaší poptávky na výše uvedenou akci.

Podrobnosti viz. příloha - tabulka A4

Konečná cena bez DPH nepožární stěny

Cena obsahuje:	výrobu, montáž, dopravu, doplňky na dveře uvedené v tabulce
Cena neobsahuje:	stavební připravenost, zednické začištění, vložky FAB, nadpodhledové a podpodlahové výplně, SDK, grafické polepy skel, světelné reklamy, případné panikové zámky a elektrické vybavení dveří (např. el. zámky, magnety, atd.), žaluzie, finální úklid a čištění
Poznámka:	Oceněn hliníkový systém Aluprof, nepožární profily MB45 v barvě odstín dle RAL, viditelné panty WALA WX v barvě rámu, skla čirá jednoduchá 1B1.
Termín dodání:	cca 7 týdnů od potvrzení objednávky a odsouhlasení výrobní dokumentace

Případnou montáž naše firma provede za předpokladu, že bude na stavbě odběratelem zajištěn:

- * přívod elektrické energie (el. přípojka do vzdálenosti 50m od příslušných montážních míst)
- * volný přístup k jednotlivým montážním místům, volný prostor u stavebních otvorů, na kterých proběhne montáž
- * odběratel pověří na stavbě kontaktní osobu

Montážní práce provádíme v běžnou pracovní dobu, za práci o víkendu a mimo běžnou pracovní dobu budeme účtovat příplatek.

Montáž probíhá pouze do připraveného stavebního otvoru!!! Odběratel zajistí, aby příslušné stavební otvory měly předepsanou (předem odsouhlasenou) světlou - výška vztahená k čisté podlaze.

Případné rozdíly se skutečností, které budou znamenat více náklady pro zhotovitele, budou po vzájemném odsouhlasení přeučtovány objednateli jako více práce.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude pravidelně prováděna kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojistovnou. Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky. V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR.

Ceny obsahují pouze vyslovené uvedené příslušenství, rozměry jsou uváděny jako průchozí otvory, dveře jsou s polodrážkou, pokud není u položek uvedeno jinak. Nabídka může být přepočtena dle ČSN 730810 čl. 5.3.4, 5.3.5, 5.5.3 a dle ČSN 730802 čl. 8.5.3. Boční a horní světélky přiléhající ke dveřím do velikosti 1.5 násobku dveřního křídla budou ve stejné požární odolnosti jako dveře. Veškeré ceny jsou bez DPH.

Tato cenová nabídka nemusí být konečná, k případným úpravám může dojít po technickém upřesnění.

Do celkového uhrazení zakázky objednatelům je zboží majetkem zhotovitele. Zhotovitel nezodpovídá za škody způsobené na stavbě po podepsání předávacího protokolu.

Platební podmínky:

Splatnost faktur 45dní. Záruka 60 měsíců za podmínek provádění servisních prohlídek po předání díla kromě výrobků s vlastním záručním listem. V nabídce se nepočítá s odečtením X% na zařízení staveniště

Při komunikaci nebo případné objednávce uvádějte vždy číslo cenové nabídky

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vystavení.

Zdravíme a těšíme se na spolupráci

CENOVÁ NABÍDKA PRO:

Metrostav DIZ s.r.o – Geosan Group a.s.
Koželužská 2450/4
180 00, Praha 8

Vážení,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku pro stavbu:

“Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc – dělicí prosklené stěny

Cenová nabídka:

- D+M dělicí prosklené stěny do vestibulu dle zadání objednatele:
Cena za 1ks dělicí stěnu..... bez DPH
Celkem ks:

Poznámka:

- Uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH
- DPH bude účtováno dle zákonné výše
- Cenová nabídka není nezávazná
- Práce budou zahájeny až po potvrzení této cenové nabídky a uzavření smlouvy


Obsahem cenové nabídky je:

- Vypracování VTD dle schválené projektové dokumentace objednatele
- Kompletní provedení prací včetně materiálu
- Doprava materiálu a pracovníků
- Úklid pracoviště zhotovitele

Cenová nabídka neobsahuje

- Geodetické vytyčení (zajišťuje objednatel)
- Náklady na zařízení staveniště
- Náklady na elektrickou energii (zajistí objednatel)
- Bourání práce

V Praze dne: 15.7.2024





PPDS GROUP S.R.O.
Trabantská 290/31, 190 15, Praha 9 - Satalice
IČO 241 96 193, DIČ CZ24196193

CN 511a/2023		
Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C : prosklené stěny do vestibulu, které jsou v SO 21.		
Metrostav	Počet clk.:	2

požadavek na funkci : - Dveře musí být neustále otevřené (obě křídla) a opatřeny zástrčkami do dlažby - poudra pro obě polohy - otevřeno /zavřeno (obě křídla)

Popis	L	P	celový rozměr uzávěru	Výměr	Počet kř.	Barva	Typ křídla	Zámek	Zárubeň včetně barvy dle RAL	Kování	Typ kování	Požární odolnost	Kouřot ěsnost	Samoz avírač	Koordi nátor	Práh/p adecí lišta	Zástrč	Bezpečnostní pruh	Montáž	Jednotková cena /1ks	Celková cena /2ks
BV-024 sestava 4ks 2.kř.dveří o průchodu 1830/2150+ vrchní fixní světliky - zaskleno čirým bezpečnostním sklem		1															8x				
								16 000 Kč				#####					18 000 Kč	8 200 Kč	121 100 Kč		1 706 320 Kč

CN obsahuje D+M ocelových dveřních křidel a zárubní ze systému Jansen , vše v povrchové úpravě komaxit dle vzorníku RAL.

Odkaz Jansen <http://www.jansencz.cz/>

Madla by se použila ze stávajících dveří, NEJSOU OBSAHEM CN..... bude dořešeno později.

Součástí CN není dotěsnění mezi podhledem a stropní konstrukcí a ukončovací " zednické" práce po obvodu .

bezpečnostní pruh čtverečky 50/50mm



Součástí CN je přesun hmot. Stavba zajistí přístup k objednaným prvkům. Součástí CN je také doprava.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce.

zpracováno

Fez sy
