


ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 08/2025/59-25/1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Odry		
Název akce	PP Osoblahy v km 28,7		
Zhotovitel akce	VDP STAVBY a.s., IČO: 651 38 333		
Charakter akce (I/N)	investice	Účetní číslo akce	122338
Zdroj financování	PPO V		
Druh zakázky	PN, PBU, PSU, ZPŘ, OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00059-2025-951, 16.04.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 684 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		4 684 000,00	
Specifikace (popis) změny			
1) SO 01.1 - Úsek km 0,01032-0,073 47 - Oprava zdiva - spárování zdiva z lomového kamene na maltu cementovou a související práce s přesuny suti nebudou provedeny - MNP			
2) Posun termínu dokončení stavby na 12. 11. 2025 - termín dle SOD 31. 10. 2025			
Příčina - důvod vzniku změny			
ad 1) po provedení očištění konstrukcí od porostu dle PD bylo zjištěno, že v úseku opravy stávajícího opevnění se nachází oboustranné opevnění břehů opěrnými zdmi z lomového kamene na sucho (viz přiložené foto), z tohoto důvodu nebylo možno opravit zdivo spárováním.			
ad 2) Po předání staveniště dne 3. 6. 2025 uplatnili vlastníci sousední nemovitosti (na parc.č. 107/1 v k.ú. Janov u Krnova) námitku, odkazující na dříve uzavřenou dohodu s LČR o omezení stavebních prací v období 1. 6. – 30. 9. Takto vznesené omezení nebylo součástí zadávacích podmínek ani SOD a představuje objektivní překážku nezaviněnou zhotovitelem.			
Na základě navazujících jednání se podařilo rozsah přerušení prací zmírnit, kdy k jejich zastavení došlo pouze v období 1. 8. a 8. 8. – 18. 8. 2025.			
Přesto však vzniklé zdržení znemožňuje dokončení díla ve smluvním termínu. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla z původního data na nový termín 12. 11. 2025.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano/ ne	
Vliv na závazné parametry		ano/ ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ano/ ne	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		138 933,82	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		0,00	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		138 933,82	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		0	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		4 545 066,18	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
správce toku			
technik VH			
vedoucí ST			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
25.07.2025	SD 01: 845493 ad 1)		
30.07.2025	SD 01: 845495 ad 1) a ad 2)		
05.08.2025	SD 01: 845496 ad 2)		

Datum	Denní záznamy stavby
25.4.25	KONTROLNÍ DEN STAVBY ZA ÚČASTI AUTORSKÉHO DOZORU [REDACTED] Město Janov - [REDACTED] Zhotovitel - [REDACTED] investor - [REDACTED]
	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY. ZHOTOVITEL PROVEDL ODSTRANĚNÍ KŘOVIN A KÁČENÍ DLE PD. V SOUČASNOSTI PROVÁDÍ BOURÁNÍ LB 0.078 - 0.190; PB 0.080 - 0.100 a PB 0.170 - 0.190. V ÚSEKU OPRAVY STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ 0.010 - 0.073 BYLA NALEZENA OBOUSTRANNĚ OPEVNĚNÍ OPĚRNÝMI ZDI MI Z LK NA SULO. DLE PD BUDE PROVEDENO V ÚSEKU SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A SOUVISEJÍCÍ PRÁČE S PŘEMÍSTĚNÍM SUT Z PŮVODNÍCH SPÁR ZDIVA
	ZAHÁJENO ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.
	SPÁROVÁNÍ ZDIVA (OPRAVA SPÁR ZDIVA) NEBUDE PROVÁDĚNO - SOUČÁSTI MENĚPRACÍ. SOUVISEJÍCÍ POLOŽKY - SVISLÁ A VODROVNÁ DOPRAVA SUT NEBUDE PROVÁDĚNA - - SOUČÁSTI MENĚPRACÍ.
	[REDACTED]

Datum	Denní záznamy stavby
30.7.25	TDS: KONTROLA ÚSEKU 0.010-0.073 NALÉZEM: 3x MÍSTO KYPADNÉ ZDIVO, 4x STROM, 40x PŘEŽ. DOPLNĚNÍ ZDIVA A KÁČENÍ NEMISOUČASTI PD A SOD. V ÚSEKU JE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ STAVANILICH KONSTRUKCI OD POROSTU. SPÁROVÁNÍ NEBUDE PROVÁDĚNO VIZ KD dle 25.7.25. MAJITELÉ SOUSEDMNÍHO POZEMKU ST. 107/1 K.Ú. JAHOV UKLONOU POŽADUJÍ VE DNECH 31.7.25 A 1.8.25 PŘERUŠENÍ PRACÍ V KORYTĚ VT V ÚSEKU PODÉL JEJÍH POZEMKU 0.078-0.190. ZHOTOVITEL BUDE 31.7.25 PROVÁDĚT PRÁCE V PROSTORU MEZIDEPONIE. BT
31.7.25	POČASÍ: POLOJASNO 12-22°C; PD PRACOVNÍCI: [REDACTED] 2, [REDACTED] T815 ↗ MECHANIZACE: 1 THP, 2x STROJNÍK ↘ PRÁCE: ODVOZ SUTÍ Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU
1.8.25	PŘERUŠENO
4.8.25	POČASÍ: ZATAŽENO 11-19°C, PD 7⁰⁰-16⁰⁰, BP M⁰⁰-M³⁰ PRACOVNÍCI: 1 THP, 2x STROJNÍK, 1x HSV MECHANIZACE: [REDACTED] S2, [REDACTED] PRÁCE: PŘESUN KAMENE Z MEZIDEPONIE NA STAVBU
5.8.25	POČASÍ: POLOJASNO 12-20°C, PD 7⁰⁰-16⁰⁰; BP M⁰⁰-M³⁰ PRACOVNÍCI: 1 THP, 2x STROJNÍK; 1 HSV MECHANIZACE: [REDACTED] S2, [REDACTED] PRÁCE: VÝKOPKÉ PRÁCE PP 20-18 A ODVOZ NA MEZIDEPONII

Datum	Denní záznamy stavby
5.8.25	TDS. ZHOTUVTEL PROVÁDÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE V ÚSEKU 0,170 - 0,190. PRÁCE BUDOU PŘERUŠENY 8.8. - 18.8.25 DLE POŽADAVKU MAJITELE SOUV. POZEMKU. [REDACTED]
6.8.25	POČASÍ: JASNO 15-24°C; PD 7-16; BP 11 ⁰⁰ -11 ³⁰ PRACOVNÍCI: 1 THP, 2x STROJNÍK; 1 HSU MECHANIZACE: [REDACTED] S2; [REDACTED] PRÁCE: VÝKOPOVÉ PRÁCE PF 20-18 A ODVOZ NA MEZIDEPONII [REDACTED]
7.8.25	POČASÍ: JASNO 15-27°C; PD 7-16; BP 11 ⁰⁰ -11 ³⁰ PRACOVNÍCI: 1 THP, 2x STROJNÍK; 1 HSU MECHANIZACE: [REDACTED] S2; [REDACTED] 815 PRÁCE: ODVOZ MATERIÁLU NA MEZIDEPONII [REDACTED]
8.8.25	PRÁCE PŘERUŠENY [REDACTED]
10.8.25	SEUČASNĚ SE ZAKLÁDÁNÍM PRACÍ. [REDACTED]
19.8.25	POČASÍ: JASNO 16°C AŽ 26°C PD 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ , BP 11 ⁰⁰ -11 ³⁰ UT PRACOVNÍCI: 1 THP, 3 HSU MECHANIZACE: [REDACTED] S2; [REDACTED] 815 POPIS PRÁCE: DEMONTÁŽ PLOTY PB DŘEVENÝ + ZELČENÍ ODKOPÁVÁNÍ STARÉ OPER. ZDI PB+LB 19 PF AŽ 17 PF [REDACTED]
20.8.25	POČASÍ: APROXIMATIVNĚ 16°C AŽ 27°C PD 7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ BP 11 ⁰⁰ -11 ³⁰ ST PRACOVNÍCI: 1 THP, 3 HSU MECHANIZACE: [REDACTED] S2; [REDACTED] 815 POPIS PRÁCE: ODKOPÁVÁNÍ STARÉ OPER. ZDI LB+PB 17 PF AŽ 14 PF [REDACTED]

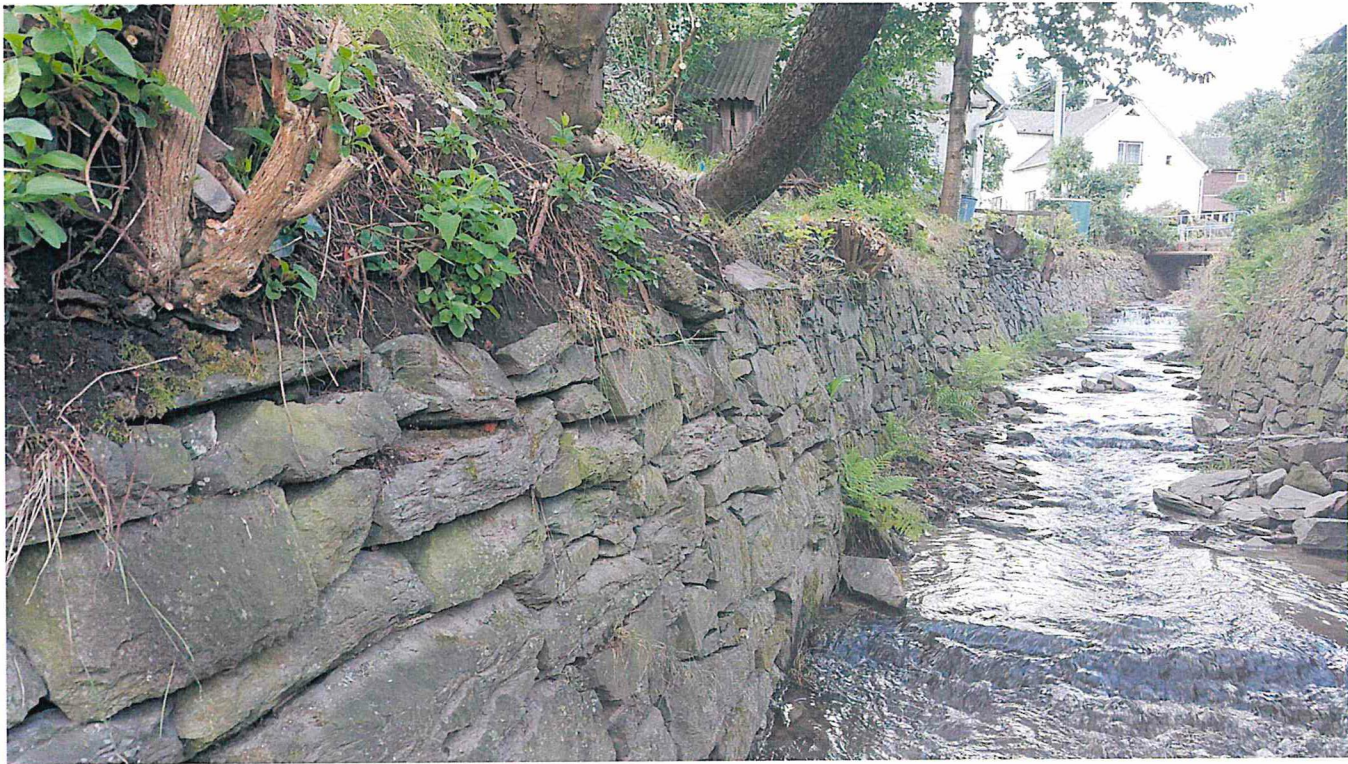


ad 1)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ K REKONSTRUKCI

PP OSOBLAHY V KOT 282

PŘÍTOMNI :



- [redacted] ST-OPD, LČR, a.p.
 [redacted] LČR, a.p.
 - [redacted] LČR, a.p.
 [redacted] č.p. 191
 [redacted] č.p. 191

LČR, a.p. jako investor akce žádá p. Věchabského
 o vyjádření zda a plánovanou stavbou tak
 jak je navržena dle proj. dokumentace souhlasí,
 případně na jakých podmínkách, do 30.6. 2023.

Vlastník domu č.p. 191 byli seznámeni s tím, že
 v rámci PD je třeba demontáž a výšková montáž
 oplocení v délce cca 70m (střešní i ocelový)
 v případě, že by vlastník chtěl osadit plynový oplocení,
 bude majitelem tento být dodán.
 Plot má být umístěn i na konstrukci nově
 přestavěného podlaží oplocení a majitel LČR.

Byla prezentována kresba, která má být nově přestavěna,
 na příkladu již stávající podlaží dokumentace.

Chce se po dokončení možné provést v období
 1.10. až 31.5. kalendářního roku.

Vlastník domu byli seznámeni s tím, že v rámci stavby
 budou obnovovány stávající sady do koryta.

Přeteno, odsouhlaseno, podepsáno: 16.6.2023

