

Změnový list č. 5

VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí (2. etapa)	
SoD (číslo ze dne): [REDACTED]	ze dne 31.10.2024
Popis a důvod víceprací/méněprací: Skalní podloží V průběhu pokládky inženýrských sítí v ulicích Revoluční a Na Hraně byl zastižen skalní masiv o takové mocnosti, rozsahu a struktuře, kterou projektová dokumentace nepředpokládala. Hornina odpovídající 7. třídě těžitelnosti způsobila zásadní zpomalení postupu provádění zemních prací a vyžadovala ruční a zejména mechanické rozpojování pomocí výkonných hydraulických kladiv.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za Zhotovitele: [REDACTED]	Dne 18.12.2025
za TDS: [REDACTED]	Dne 18.12.25
za AD: [REDACTED]	Dne 18.12.25
za Objednatele: [REDACTED]	Dne 19.12.2025

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne/stavebního deníku

Příloha č. 3 – vyjádření geologa

Příloha č. 4 – zakres tras bourání

Příloha č. 5 – fotodokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5024009
Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

KSO:
Místo: ZL5 - Skalní podloží

CC-CZ:
Datum: 19.11.2025

Zadavatel:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5024009

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Místo: ZL5 - Skalní podloží

Datum: 19.11.2025

Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Vícepráce

Méněpráce

SO 03.1	Splašková kanal...
ZL5a	Skalní podloží - méněpráce
ZL5a.	Skalní podloží - vícepráce
SO 03.2	Dešťová kanalizace
ZL5b	Skalní podloží - méněpráce
ZL5b.	Skalní podloží - vícepráce
SO 06.2	Vodovod – 2. etapa
ZL5c	Skalní podloží - méněpráce
ZL5c.	Skalní podloží - vícera

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

SO 03.1 - Splašková kanal...

Soupis:

ZL5a - Skalní podloží - méněpráce

Místo:

Datum: 19.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-442,500			
	W		"výlev A2"-((10*2,5*1,5)/2		-18,750			
	W		"výlev A"-((1,5*2,5*30)+(1,5*4,0*20)+(1,5*4*10)+(1,5*2,5*35))		-423,750			
	W		Součet		-442,500			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 03.1 - Splašková kanal...
Soupis: ZL5a. - Skalní podloží - vícepráce
Místo:
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Datum: 19.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1050	K	138611201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	442,500			CS ÚRS 2025 02*Kvak 1,15
	W		"větev A2"(10*2,5*1,5)/2		18,750			
	W		"větev A"(1,5*2,5*30)+(1,5*4*20)+(1,5*4*10)+(1,5*2,5*35)		423,750			
	W		Součet		442,500			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

SO 03.2 - Dešťová kanalizace

Soupis:

ZL5b - Skalní podloží - méněpráce

Místo:

Datum: 19.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132151255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	-204,750			
	W		~(1,5*3,5*39)		-204,750			
	W		Součet		-204,750			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh

Objekt:

SO 03.2 - Dešťová kanalizace

Soupis:

ZL5b. - Skalní podloží - vícepráce

Místo:

Datum: 19.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:


Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
105	K	138611201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	204,750			
vv			1,5*3,5*39		204,750			
								

CS ÚRS 2025 02*Kvak
1,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnických

Objekt:

SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa

Soupis:

ZL5c - Skalní podloží - méněpráce

Místo:

Datum: 19.11.2025

Zadavatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-176,000			
	W		-(1*1,6*95)-(1*1,6*15)		-176,000			
	W		Součet		-176,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnickéh
Objekt: SO 06.2 - Vodovod – 2. etapa
Soupis: ZL5c. - Skalní podloží - vícetáče
Místo:
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštepňý závod Plzeň

Datum: 19.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		1		Zemní práce				
105	K	138611201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m3	176,000			CS ÚRS 2025 02*Kvak 1,15
	W		"větev A"1*1,6*95		152,000			
	W		"větev A2"1*1,6*15		24,000			
	W		Součet		176,000			



Datum:

Denní záznamy stavby:

List č. [REDACTED]

30.10.2025	POČASÍ: POLOJASNOU +15°C
ČT.	PRACUJÍ: BAGR 9T, 8T, 22T + KLADIVO 4, 5T DEMPR. 3X MAKL. AUTO, VCC, ST, MAKLADAC SDEL, Fg POHL SDEL, Fg PAKUS SDEL, Fg HENSTAV
	- POSTUP PRACÍ: - HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU ROČR VODOVODU MEZI SL7 - POD. HYDRANT 3
4 HOD	- PIKOVÁNÍ SKALY MEZI SL7 - POD. HYDRANT 3 ŘAD A" - POKLÁDKA ROČR LT DN 200 DLE P.D. - HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU KANALIZACE A VODOVODU NASTOCE A1" ŘAD. A2" - POKLÁDKA ROČR LT DN 250 MEZI S1.4 - S1.5 - POKLÁDKA ROČR LT DN 100 ŘAD. A2" - ZASYP ZEMINOU PO VYSTAVĚNÍ SE ZHOTOVĚNÍM - HLOUBENÍ A MONTÁŽ PŘÍPOJEK PRO ČV. - UKLID STAVBY - ZAJIŠTĚNÍ STAVBY A VÝKON CENOVĚNÍ
31.10.2025	POČASÍ: POLOJASNOU +14°C
P.Ú.	PRACUJÍ: BAGR 9T, 8T, 22T + KLADIVO 4, 5T DEMPR. 3X MAKL. AUTO, VCC, ST, MAKLADAC SDEL, Fg POHL SDEL, Fg PAKUS SDEL, Fg HENSTAV
	POSTUP PRACÍ: - HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU ROČR VODOVODU MEZI SL7 - POD. HYDRANT 3
8 HOD	- PIKOVÁNÍ SKALY PRO POKLÁDKU ROČR VODOVODU MEZI SL7 - POD. HYDRANT 3. - HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU KANALIZACE A VODOVODU NASTOCE A1" ŘAD. A2" - POKLÁDKA ROČR LT DN 250 MEZI S1.4 - S1.5 - POKLÁDKA ROČR LT DN 100 ŘAD. A2" - ZASYP ZEMINOU PO VYSTAVĚNÍ SE ZHOTOVĚNÍM - HLOUBENÍ A MONTÁŽ PŘÍPOJEK PRO ČV. - MONITORING DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 174 - UKLID STAVBY - ZAJIŠTĚNÍ STAVBY A VÝKON CENOVĚNÍ - POKROČENÍ



Denní záznamy stavby:

Líst č. [redacted]

Datum:

17.10.2023	Práce: ZATVĚŘENÍ T+14°C	Práce: [redacted] BAGR 8T 9T 16T 2x AKK. AUTO PETA	Práce: SDEL. Fq POM. SDEL. Fq PAKUS.	Postup práce: HVOUBENÍ RÝH V MEZI S46 - S46B	- PLOVÁNÍ DVADÝŘ V MEZI S46 - S46B	- PÁZELI RÝHY	- POKLADKA DOUR. KT DR 300	- USAZENÍ A SESTAVENÍ SAGIT S46B DLE P.D.	- SVAROVÁNÍ ROVR PE Ø 90 PRO ZHOVOVÁNÍ	- SUCHOVODU POD ZUS Ø 150 SAGIT D4.	- ZAJISTĚNÍ STAVBY A VÝKONU OROCEK	18.10.2023	Práce: POKLADKA T+14°C	Práce: BAGR 16T 16T AKK. AUTO SDEL. Fq PAKUS	Práce: PPAE - ZASYP RÝHY S1 ASKOVÉ KAMENÍ	Práce: ZEMNÍ ROVR SAGIT S46B	Práce: ZEMNÍ ROVR SAGIT S46B	- PŘÍVOD ZEMNÍ VÝMĚNÍ	- ZAJISTĚNÍ VÝKONU A STAVBY OROCEK	20.10.2023	Práce: POKLADKA T+14°C	Práce: [redacted] BAGR 8T 9T 16T 2x AKK. AUTO PETA	Práce: SDEL. SDEL. Fq POM. SDEL. Fq PAKUS. OPTIKOVÝ	Práce: PPAE - KALIBROVÁNÍ ROVR VÝKON KAMENÍ	Práce: S1 ASKOVÉ KAMENÍ	- HLTA RÝHY V DOUR. KT DR 300 DLE P.D.	- POKLADKA ROVR KT DR 300 DLE P.D.	- KALIBROVÁNÍ ROVR VÝKON KAMENÍ	- PÁZELI RÝHY	- KALIBROVÁNÍ ROVR VÝKON KAMENÍ	- VÝKON POKLADKY A METALIZACE ROVR	PRO VY. DLE VÝKONU
------------	-------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	---------------	----------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------------------------	------------	------------------------	--	---	------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------	------------------------	--	---	---	-------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------



Datum:

Denní záznamy stavby:

List č. [REDACTED]

15.10.2025	POČASÍ: ZATAŽENO $T + 14^{\circ}\text{C}$
ST	PRACUJÍ: [REDACTED] BAGR 28T 16T 22T + KLADIVO 3x NAKL. AUTO 5 DĚL. FA POHL 5 DĚL. FA PALKUS
	POSTUP PRACÍ: - HLOUBENÍ RÝHY MEZI S16 - S16B - PAŽENÍ RÝHY 8 HOD - PÍKOVÁNÍ DLA RÝHY MEZI S16 - 16B - POKLÁDKA ROUL KT DN 100 DLE P.D. - VÝKOP + POKLÁDKA ROUL LT DN 80 VĚTEL "A" - ZAJISTĚNÍ VÝKOPU STAVBY OPLOCEMÍ - ZÁŠUP RÝHY ZEMINOU POUVRSTVÁCH SE ZAKR.
16.10.2025	ZÁDAK O KONTROLU POKLÁDKY POTRUBÍ KT DN 300 CT. LT DN 80. [REDACTED]
	POČASÍ: POLOJASNO $T + 15^{\circ}\text{C}$
	PRACUJÍ: [REDACTED] BAGR 28T 16T 22T + KLADIVO 3x NAKL. AUTO 5 DĚL. FA POHL 5 DĚL. FA PALKUS
	POSTUP PRACÍ: - HLOUBENÍ RÝHY MEZI S16 - S16B - PAŽENÍ RÝHY 8 HOD - PÍKOVÁNÍ DLA RÝHY MEZI S16 - 16B - POKLÁDKA ROUL KT DN 300 DLE P.D. - HLOUBENÍ + POKLÁDKA ROUL LT DN 200 OD SL 3 NA SL 4 - ZÁŠUP RÝHY ZEMINOU POUVRSTVÁCH SE ZAKR. - NAKLÁDÁNÍ A ODVOZ NASKLÁDKU PŘERÝTEČNÉ VYTĚŽENÉ ZEMINY - ÚKLID STAVBY - ZAJISTĚNÍ VÝKOPU A STAVBY OPLOCEMÍ.
	ZÁPIS ZHOTOVITELE [REDACTED]
	DNEŠNÍ DEN DOŠLO PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCECH K POŽ- KO ZEMÍ DVOU PODZEMNÍCH KABELŮ VE STANCIÍ T7800/10 SPĚŠKOVÉ KANALIZACE. PORUCHA BYLA NAMLÁŠENA NA SKUPINU ČEZ.



Denní záznamy stavby:

List č. [redacted]

Datum:

14.10.2025 8H00 - PÍKOVÁNÍ DLAŘŮ

PA - POKLADKA ROVR KT DÚ 300 D.E.P.D.

- PŘÍPRAVA ÚSEK VOD.ŘADU "A" KAT. AK. ŽEC. SK.

- ODVOZ PŘEBYTČEJŠÍHO VÝKOPU K A SKLADCE

- ZATISŤENÍ VÝKOPU A STAVBY OPLOCENÍ

14.10.2025 POČASÍ: POLOJASNO T +16°C

50 PRACOVNÍ BAGER ZET 16T + KLADIVO, NAKL. AUTO, SML. Fg. PAKUS.

8H00 PRŮBĚH PRACÍ: - PÍKOVÁNÍ DLAŘŮ MEZI S16 - S16B

- PAŽENÍ RŮHŮ

- ZASYPÁNÍ ZEMINOU - SEZNA MĚLÍTY PODSK.

- ZATISŤENÍ VÝKOPU A STAVBY OPLOCENÍ

14.10.2025 POČASÍ: POLOJASNO T +16°C

PO PRACOVNÍ: [redacted] BAGER ZET 16T + KLADIVO, NAKL. AUTO, SML. Fg. PAKUS, SML. Fg. PAKUS, SML. Fg. PAKUS

PRŮBĚH PRACÍ: - HOC BĚHÍ RŮHŮ MEZI S16 - S16B

- PAŽENÍ RŮHŮ

8H00 - PÍKOVÁNÍ DLAŘŮ MEZI S16 - S16B

- POKLADKA ROVR KT DÚ 300 D.E.P.D.

- NAKLADÁNÍ A ODVOZ PŘEBYTČEJŠÍHO VÝKOPU K A SKLADCE

- VYTÝČENÍ MŘ. SÍŤI A ŘADU "A" PRO ZAHÁJENÍ VÝKOPŮCH PRACÍ

- VÝKLIP STAVBY

- ZATISŤENÍ VÝKOPU A STAVBY OPLOCENÍ

14.10.2025 POČASÍ: POLOJASNO T +17°C

UT PRACOVNÍ: [redacted] BAGER ZET 16T + KLADIVO, NAKL. AUTO, SML. Fg. PAKUS, SML. Fg. PAKUS

PRŮBĚH PRACÍ: - HOC BĚHÍ RŮHŮ MEZI S16 - S16B

- PAŽENÍ RŮHŮ

8H00 - PÍKOVÁNÍ DLAŘŮ MEZI S16 - S16B

- POKLADKA ROVR KT DÚ 300 D.E.P.D.

- VÝKOP + POKLADKA ROVR KT DÚ 300 VĚTEV "A"

- ZATISŤENÍ VÝKOPU A STAVBY OPLOCENÍ



Datum:

Denní záznamy stavby:

List č. [REDACTED]

	PRÁCE - HLOUBENÍ RÝHY VÝKOPU PRO POKLÁDKU SPLEŠKOVÉ KANALIZACE MEZI S-15 S-16. - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 300 DLE PD - PAŽENÍ VÝKOPU PAŽÍČÍMI BOXY - SBIJENÍ DNA VÝKOPU CCA 2 m³ - ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A STAVBY OPLACENÍM
6 HOD	
8.10.	POČASÍ: ZATAŽENO DEŠT 10°C
STŘEDA	PRACOVNÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS
	PRÁCE - HLOUBENÍ RÝHY VODOVODU MEZI S-12-S-13 - POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ LT-DN200 DLE - ZAŠTĚP RÝHY VÝKOPU PO VRSTVÁCH + HUTNĚNÍ - HLOUBENÍ VÝKOPU PRO POKLÁDKU SPLEŠKOVÉ KANALIZACE MEZI S-15-S-16 - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 300 DLE PD - PAŽENÍ VÝKOPU PAŽÍČÍMI BOXY - SBIJENÍ DNA VÝKOPU CCA 0,5 m³ - ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A STAVBY OPLACENÍM
2 HOD	
9.10.	POČASÍ: POLOJASNO 14°C
ČTVRTEK	PRACOVNÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS
	PRÁCE - ODVOZ ZEMINÍ NA SKLÁDKU - HLOUBENÍ RÝHY VÝKOPU PRO SPLEŠKOVÉ KANALIZACE MEZI S-15-S-16 - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 300 DLE PD - PAŽENÍ VÝKOPU PAŽÍČÍMI BOXY - OSAZENÍ ŠACHTY S-16 - SBIJENÍ DNA VÝKOPU CCA 2 m³ - ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A STAVBY OPLACENÍM
6 HOD	
10.10.2025	POČASÍ: POLOJASNO T +15°C
PÁTEK	PRACOVNÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS, BAER 22T, 16T, 22T + KLON 3x NAKL. AUTO
	POSTUP PRÁCE: - HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU DOUR MEZI S-15-S-16 - PAŽENÍ RÝHY



Datum:

Denní záznamy stavby:

List č. [REDACTED]

4.10. SOBOTA	POČASÍ: POLNĚJŠÍ PRACUJÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS MECHANIZACE: BAGR 22T, 22T SBÍJECÍ KLADIVO 2x NÁKLADNÍ AUTO PRÁCE: - VYSKRUŽENÍ ŠACHTY DN4 - ZAŠTĚP VÝKOPU A HUTNĚNÍ VÝKOPU - ÚKLID STAVENISTE [REDACTED]
6.10. PONDĚLÍ	POČASÍ: POLNĚJŠÍ 10°C ZÁPIS ZHOTOVITELE BYLA PROVEDENA KONTROLA VÝKOPU PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE [REDACTED] PRACUJÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS MECHANIZACE: BAGR 22T, 16T, 22T SBÍJECÍ KLADIVO 3x NÁKLADNÍ AUTO PRÁCE: - HLOUBENÍ RÝHY VODOVODU MEZI SL2-SL3 - POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ LT-DN2 - ZAŠTĚP RÝHY VÝKOPU PO VRSTVÁCH + HUTNĚNÍ - HLOUBENÍ RÝHY VÝKOPU PRO POKLÁDKU ROUR SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE MEZI ŠACHTAMI S45-S46 - POKLÁDKA POTRUBÍ DLE PO PD - ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU PAZICÍMI BOXY 4HOD - SBÍJENÍ DŇA VÝKOPU CCA 1m ³ - ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU A STAVBY OPLOČENÍ [REDACTED]
7.10. ÚTERÝ	POČASÍ: ZATAŽENO DEŠT 10°C PRACUJÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS MECHANIZACE: BAGR 22T, 16T, 22T SBÍJECÍ KLADIVO 3x NÁKLADNÍ AUTO PRÁCE: - HLOUBENÍ RÝHY VODOVODU MEZI SL2-SL3 - POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ LT-DN2 - ZAŠTĚP RÝHY VÝKOPU PO VRSTVÁCH + HUTNĚNÍ - ODVOZ ŽIVICOVÝCH KER [REDACTED]



Denní záznamy stavby:

List č. [redacted]

1.10. 2HOD

STŘEDA

POSTUP PRACÍ - PÍKOVÁNÍ DNA VÝKOPU CCA 0,5m³

- POKLÁDKA ROUR DN 300 DLE PD

- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A STAVBY OPRACOVÁNÍ [redacted]

2.10.

ČTVRTEK

POČASÍ: POVOJASNO 13°

PRACUJÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS

MECHANIZACE: 3x BAGER 22T, 16T, 22T + SBJEČÍ VLADIV

3x NÁKLADNÍ AUTO, LOCUST, DEMPR

POSTUP PRACÍ - HLOUBENÍ RÝHY VODOVODU MEZI

SL2 - SL3

- POKLÁDKA ROUR LT DN 200 DLE PD

- ZAŠKŮP RÝHY PO VĚSTVÁCH + HUTNĚNÍ

- HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU

ROUR MEZI ŠACHTAMI D13-D14

- PAŽENÍ VÝKOPU PAŽÍCÍMI BOXY

- SBJEČENÍ DNA VÝKOPU CCA 1m³

- POKLÁDKA ROUR DN 300 DLE PD

- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A STAVBY OPRACOVÁNÍ

- NAVAŽENÍ VODOVODNÍCH ROUR DN 200 [redacted]

4HOD

3.10.

PÁTEK

POČASÍ: ZATAŽENO 10° DEŠT

PRACUJÍ: 5x FA POHL, 5x FA PALKUS

MECHANIZACE: 3x BAGER 22T, 16T, 22T + SBJEČÍ VLADIV

3x NÁKLADNÍ AUTO, LOCUST, DEMPR

PRÁCE - HLOUBENÍ RÝHY VODOVODU MEZI SL2-SL3

- POKLÁDKA ROUR LT DN 200 DLE PD

- ZAŠKŮP RÝHY PO VĚSTVÁCH + HUTNĚNÍ

- HLOUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU ROUR

MEZI ŠACHTAMI D13-D14

- POKLÁDKA ROUR DN 300 DLE PD

- POKLÁDKA DNA ŠACHTY D14

- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A STAVBY OPRACOVÁNÍ [redacted]

Datum:

$$\frac{0.1}{0.1}$$

29.9.2025

FOC491: P0203A5L0T + 1/2cc

Page 27

3x BAGR 221 161 221 + KLDP/VO & BAK, Porto

LOCAL DEHPH SPDL FAPOM SPDL FAPALUS

POSTUP PRAC: - Nováček, Petr a Vondrová, Jana, 9.

- Píková, KOSTAHO OBLUKU VTRÁŽE VO DOL

содерж. 1 м³ бетона.

- Pokladka nová LT DV200 DLE P.P.

- ZAGYPRZNY ZEMINOU POVESTVACH SEZNAMU

-Theodore L. Bryant Proctor, ME21193-44

PAZEL, RYAN

POKLEADK A BOUTKTD 300 DIE PD

Piková, I. Dvůr, 3. Mezi Mlýnskými - 18

2. Activity 1 - Introduction

30.9.2025 Počasí: ZATAŽENÍ + MŽ.

19

PROBLEM: [REDACTED]

LOCUST DEMPE SDEL, F. P. PARKS

POSTP. P. 101-102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918,

~~_____~~

1. The company's earnings are not stable and drop -

APPROVED FOR RELEASE

MOOREHEAD

24/2/2012

ROZKŁADKA POWR. KT DV 500 DLE P.D.

Plkovařka DVA P4H7 CCA 0,5 m³ ME2 D13-74

2A31STBN VYKOPU AGSTAVST OPROGAM

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

126

5 DELINIKO FA REL. SPEDNIVO FA PARKE

E. & BACD 90T KT 007 + KRAMU 3-6 PM

AND FACET DRPD

DATE: 11/15/2011

77C-17C-17E-17F-17G-17H-17I-17J-17K-17L-17M-17N-17O-17P-17Q-17R-17S-17T-17U-17V-17W-17X-17Y-17Z-17AA-17AB-17AC-17AD-17AE-17AF-17AG-17AH-17AI-17AJ-17AK-17AL-17AM-17AN-17AO-17AP-17AQ-17AR-17AS-17AT-17AU-17AV-17AW-17AX-17AY-17AZ-17BA-17BB-17BC-17BD-17BE-17BF-17BG-17BH-17BI-17BJ-17BK-17BL-17BM-17BN-17BO-17BP-17BQ-17BR-17BS-17BT-17BU-17BV-17BW-17BX-17BY-17BZ-17CA-17CB-17CC-17CD-17CE-17CF-17CG-17CH-17CI-17CJ-17CK-17CL-17CM-17CN-17CO-17CP-17CQ-17CR-17CS-17CT-17CU-17CV-17CW-17CX-17CY-17CZ-17DA-17DB-17DC-17DD-17DE-17DF-17DG-17DH-17DI-17DJ-17DK-17DL-17DM-17DN-17DO-17DP-17DQ-17DR-17DS-17DT-17DU-17DV-17DW-17DX-17DY-17DZ-17EA-17EB-17EC-17ED-17EE-17EF-17EG-17EH-17EI-17EJ-17EK-17EL-17EM-17EN-17EO-17EP-17EQ-17ER-17ES-17ET-17EU-17EV-17EW-17EX-17EY-17EZ-17FA-17FB-17FC-17FD-17FE-17FF-17FG-17FH-17FI-17FJ-17FK-17FL-17FM-17FN-17FO-17FP-17FQ-17FR-17FS-17FT-17FU-17FV-17FW-17FX-17FY-17FZ-17GA-17GB-17GC-17GD-17GE-17GF-17GG-17GH-17GI-17GJ-17GK-17GL-17GM-17GN-17GO-17GP-17GQ-17GR-17GS-17GT-17GU-17GV-17GW-17GX-17GY-17GZ-17HA-17HB-17HC-17HD-17HE-17HF-17HG-17HH-17HI-17HJ-17HK-17HL-17HM-17HN-17HO-17HP-17HQ-17HR-17HS-17HT-17HU-17HV-17HW-17HX-17HY-17HZ-17IA-17IB-17IC-17ID-17IE-17IF-17IG-17IH-17II-17IJ-17IK-17IL-17IM-17IN-17IO-17IP-17IQ-17IR-17IS-17IT-17IU-17IV-17IW-17IX-17IY-17IZ-17JA-17JB-17JC-17JD-17JE-17JF-17JG-17JH-17JI-17JJ-17JK-17JL-17JM-17JN-17JO-17JP-17JQ-17JR-17JS-17JT-17JU-17JV-17JW-17JX-17JY-17JZ-17KA-17KB-17KC-17KD-17KE-17KF-17KG-17KH-17KI-17KJ-17KK-17KL-17KM-17KN-17KO-17KP-17KQ-17KR-17KS-17KT-17KU-17KV-17KW-17KX-17KY-17KZ-17LA-17LB-17LC-17LD-17LE-17LF-17LG-17LH-17LI-17LJ-17LK-17LL-17LM-17LN-17LO-17LP-17LQ-17LR-17LS-17LT-17LU-17LV-17LW-17LX-17LY-17LZ-17MA-17MB-17MC-17MD-17ME-17MF-17MG-17MH-17MI-17MJ-17MK-17ML-17MM-17MN-17MO-17MP-17MQ-17MR-17MS-17MT-17MU-17MV-17MW-17MX-17MY-17MZ-17NA-17NB-17NC-17ND-17NE-17NF-17NG-17NH-17NI-17NJ-17NK-17NL-17NM-17NO-17NP-17NQ-17NR-17NS-17NT-17NU-17NV-17NW-17NX-17NY-17NZ-17OA-17OB-17OC-17OD-17OE-17OF-17OG-17OH-17OI-17OJ-17OK-17OL-17OM-17ON-17OO-17OP-17OQ-17OR-17OS-17OT-17OU-17OV-17OW-17OX-17OY-17OZ-17PA-17PB-17PC-17PD-17PE-17PF-17PG-17PH-17PI-17PJ-17PK-17PL-17PM-17PN-17PO-17PP-17PQ-17PR-17PS-17PT-17PU-17PV-17PW-17PX-17PY-17PZ-17QA-17QB-17QC-17QD-17QE-17QF-17QG-17QH-17QI-17QJ-17QK-17QL-17QM-17QN-17QO-17QP-17QQ-17QR-17QS-17QT-17QU-17QV-17QW-17QX-17QY-17QZ-17RA-17RB-17RC-17RD-17RE-17RF-17RG-17RH-17RI-17RJ-17RK-17RL-17RM-17RN-17RO-17RP-17RQ-17RR-17RS-17RT-17RU-17RV-17RW-17RX-17RY-17RZ-17SA-17SB-17SC-17SD-17SE-17SF-17SG-17SH-17SI-17SJ-17SK-17SL-17SM-17SN-17SO-17SP-17SQ-17SR-17SS-17ST-17SU-17SV-17SW-17SX-17SY-17SZ-17TA-17TB-17TC-17TD-17TE-17TF-17TG-17TH-17TI-17TJ-17TK-17TL-17TM-17TN-17TO-17TP-17TQ-17TR-17TS-17TT-17TU-17TV-17TW-17TX-17TY-17TZ-17UA-17UB-17UC-17UD-17UE-17UF-17UG-17UH-17UI-17UJ-17UK-17UL-17UM-17UN-17UO-17UP-17UQ-17UR-17US-17UT-17UU-17UV-17UW-17UX-17UY-17UZ-17VA-17VB-17VC-17VD-17VE-17VF-17VG-17VH-17VI-17VJ-17VK-17VL-17VM-17VN-17VO-17VP-17VQ-17VR-17VS-17VT-17VU-17VV-17VW-17VX-17VY-17VZ-17WA-17WB-17WC-17WD-17WE-17WF-17WG-17WH-17WI-17WJ-17WK-17WL-17WM-17WN-17WO-17WP-17WQ-17WR-17WS-17WT-17WU-17WV-17WW-17WX-17WY-17WZ-17XA-17XB-17XC-17XD-17XE-17XF-17XG-17XH-17XI-17XJ-17XK-17XL-17XM-17XN-17XO-17XP-17XQ-17XR-17XS-17XT-17XU-17XV-17XW-17XX-17XY-17XZ-17YA-17YB-17YC-17YD-17YE-17YF-17YG-17YH-17YI-17YJ-17YK-17YL-17YM-17YN-17YO-17YP-17YQ-17YR-17YS-17YT-17YU-17YV-17YW-17YX-17YY-17YZ-17ZA-17ZB-17ZC-17ZD-17ZE-17ZF-17ZG-17ZH-17ZI-17ZJ-17ZK-17ZL-17ZM-17ZN-17ZO-17ZP-17ZQ-17ZR-17ZS-17ZT-17ZU-17ZV-17ZW-17ZX-17ZY-17ZZ-17AA-17AB-17AC-17AD-17AE-17AF-17AG-17AH-17AI-17AJ-17AK-17AL-17AM-17AN-17AO-17AP-17AQ-17AR-17AS-17AT-17AU-17AV-17AW-17AX-17AY-17AZ-17BA-17BB-17BC-17BD-17BE-17BF-17BG-17BH-17BI-17BJ-17BK-17BL-17BM-17BN-17BO-17BP-17BQ-17BR-17BS-17BT-17BU-17BV-17BW-17BX-17BY-17BZ-17CA-17CB-17CC-17CD-17CE-17CF-17CG-17CH-17CI-17CJ-17CK-17CL-17CM-17CN-17CO-17CP-17CQ-17CR-17CS-17CT-17CU-17CV-17CW-17CX-17CY-17CZ-17DA-17DB-17DC-17DD-17DE-17DF-17DG-17DH-17DI-17DJ-17DK-17DL-17DM-17DN-17DO-17DP-17DQ-17DR-17DS-17DT-17DU-17DV-17DW-17DX-17DY-17DZ-17EA-17EB-17EC-17ED-17EE-17EF-17EG-17EH-17EI-17EJ-17EK-17EL-17EM-17EN-17EO-17EP-17EQ-17ER-17ES-17ET-17EU-17EV-17EW-17EX-17EY-17EZ-17FA-17FB-17FC-17FD-17FE-17FF-17FG-17FH-17FI-17FJ-17FK-17FL-17FM-17FN-17FO-17FP-17FQ-17FR-17FS-17FT-17FU-17FV-17FW-17FX-17FY-17FZ-17GA-17GB-17GC-17GD-17GE-17GF-17GG-17GH-17GI-17GJ-17GK-17GL-17GM-17GN-17GO-17GP-17GQ-17GR-17GS-17GT-17GU-17GV-17GW-17GX-17GY-17GZ-17HA-17HB-17HC-17HD-17HE-17HF-17HG-17HH-17HI-17HJ-17HK-17HL-17HM-17HN-17HO-17HP-17HQ-17HR-17HS-17HT-17HU-17HV-17HW-17HX-17HY-17HZ-17IA-17IB-17IC-17ID-17IE-17IF-17IG-17IH-17II-17IJ-17IK-17IL-17IM-17IN-17IO-17IP-17IQ-17IR-17IS-17IT-17IU-17IV-17IW-17IX-17IY-17IZ-17JA-17JB-17JC-17JD-17JE-17JF-17JG-17JH-17JI-17JJ-17JK-17JL-17JM-17JN-17JO-17JP-17JQ-17JR-17JS-17JT-17JU-17JV-17JW-17JX-17JY-17JZ-17KA-17KB-17KC-17KD-17KE-17KF-17KG-17KH-17KI-17KJ-17KK-17KL-17KM-17KN-17KO-17KP-17KQ-17KR-17KS-17KT-17KU-17KV-17KW-17KX-17KY-17KZ-17LA-17LB

-1804 DRA PCOL LA JN 268 BLE P-1)

24.5.19 D'HT 150 VISIVACH + HOTTENDI

HEUBER, RYH PRO BROADCO RGR.

MEZI SAGHARI D-13-14

- PASEMI RCHY



Datum:

Denní záznamy stavby:

List č. [REDACTED]

16.9.2025	POČASÍ: ZATAŽENOST +16°C
ÚT	PRÁCE: [REDACTED] 3x BAGER 22T 16T 22T + KLADIVO 3x NÁKL. AUTO 4 DEL. F4 POHL 5 DEL. F4 POKUS
	POSTUP PRÁČE: - VÝKOP + ČISTĚNÍ DOUŘ V MÍSTECH PROPOSENÝ PROVIZORNÍHO VPRÁVĚ PEDVOVASTICE A" - TERENÍ ÚPRAVY - NAKLADÁNÍ + ODVOZ ZEMNÝ NA SKLADU 8 HOD. - PLOVÁNÍ SKLADY V RÝŽE KANALIZACE MEZI SA-15 - POKLÁDKA DOUŘ KT DN 300 VASTICE A" DLE P.D. - MONTÁŽ + SESTAVENÍ ŠACHTY S 15 DLE P.D. - ZASYP RÝHY ZEMNÍ V POKRÝVACÍCH ŠACHTY - ZATISŤENÍ VÝKOPU CEMENTEM
17.9.2025	POČASÍ: ZATAŽENOST +15°C
ST	PRÁCE: [REDACTED] 3x BAGER 22T 16T 22T + KLADIVO 3x NÁKL. AUTO 4 DEL. F4 POHL 5 DEL. F4 POKUS
	POSTUP PRÁČE: MONTÁŽ TVAROVEK DN 200 (PŘÍPRAVA NA PRÁCE) - SVAŘOVÁNÍ POLYETYLENU DE 80 - PŘÍPRAVA MATERIÁLU NA PRÁCE PROPOJENÍ VODY - HLOUBENÍ RÝHY PROPEŠTOVACÍ KANALIZACE DN-12 - POKLÁDKA RÝHY - POKLÁDKA DOUŘ KT DN 300 DLE P.D. - VYSAZENÍ CIBULEK 4KS KT DN 300 DLE P.D. - ZATISŤENÍ VÝKOPU CEMENTEM
18.9.2025	ZÁPIS ZHOTOVITEL
ČT	ŽÁDÁM O KONTROLU POKLÁDKY DOUŘ NA KANALIZACI
	PRÁCE: [REDACTED] 3x BAGER 22T 16T 22T + KLADIVO 3x NÁKL. AUTO 4 DEL. F4 POHL 5 DEL. F4 POKUS
	POSTUP PRÁČE: UZAVŘENÍ STANATICKÉHO MĚŘENÍHO ROKU DN 200 - PŘEHLÍŽENÍ, PROVIZORNÍHO ROKU TE 80 CIBULEK VPRÁVĚ PO MÍSTNÍ KANALIZACI V RÝŽI A - PŘEHLÍŽENÍ VPRÁVĚ MĚŘENÍHO ROKU 4KS - HLOUBENÍ RÝHY PROPEŠTOVACÍ KANALIZACE DN-12 - VYSAZENÍ ŠACHTY V HLOUBCE DLE P.D. - ZATISŤENÍ VÝKOPU CEMENTEM



Datum:

Denní záznamy stavby:

List č

12.9.2025	POČASÍ: POLOJASNO + 19°C
PA	PRACOVNÍ: [REDACTED] x BAGER 22T 16T 22T KLAMNO, 2x NÁKL. AUTO 4DEČ. Fg POHL 5DEČ. Fg PALKUS
	POSTUP PRACÍ: - OPRAVA PORUCHY NA PŘÍPOJCE LT 100 PRO STŘELNÍCI.
	- POKLÁDKA PROVIZORNÍHO VOD. POTRUBÍ PRO PŘÍJEZD LT V MÍSTĚ STOKY A1.
	- OBKOPÁNÍ PŘE VOD. POTRUBÍ V MÍSTĚ BUDOVYHO PŘE JENÍ NA ROZLIČKELNÁH. PŘED KAVÁRNOU.
8HOD	- PIKOVÁNÍ SKÁLY V RÝŽE SÁDROVÉ KAN. MEZI S14-1
	- PÁŽENÍ RÝHY
	- NAKLÁDKA A ODVOZ VTBOROVÉHO KAMNĚ ZE - ZATISŤENÍ VÝKOPU OPLECENÍM.
13.9.2025	POČASÍ: POLOJASNO + 18°C
SO	PRACOVNÍ: [REDACTED] BAGER 16T 22T KLAMNO, 1x NÁKL. AUTO 5DEČ. Fg PALKUS
8HOD	POSTUP PRACÍ: - PIKOVÁNÍ SKÁLY V RÝŽE KANALIZACE MEZI
	- HLUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU ROUR
	- POKLÁDKA ROUR KT DN 300 DLE P.D.
	- PŘEVOS MATERIÁLU V MÍSTĚ
	- ZASYP RÝHY ZEMINOU POUŠTĚNÍ SE ZH
	- ZATISŤENÍ RÝHY OPLECENÍM.
15.9.2025	POČASÍ: ZATAŽENÍ + 17°C
PO	PRACOVNÍ: [REDACTED] x BAGER 16T 22T 22T KLAMNO, 2x NÁKL. AUTO 4DEČ. Fg POHL 5DEČ. Fg PALKUS
	POSTUP PRACÍ: - PŘEPOJENÍ PROVIZORNÍHO VODOVODU PŘEČ K KANALIZAČNÍ STOLE A1"
	- PŘEPOJENÍ DEMOVNÍH PŘÍPOJEK 2KS
8HOD	- PIKOVÁNÍ SKÁLY V RÝŽE KANALIZACE MEZI S14-
	- HLUBENÍ RÝHY PRO POKLÁDKU ROUR
	- PÁŽENÍ RÝHY
	- PŘEVOS MATERIÁLU V MÍSTĚ
	- NAKLÁDKA VÝKOPU A ODVOZ NA SKLÁDKU.
	- ZATISŤENÍ VÝKOPU OPLECENÍM

Datum:

999075

10

POCAST, POLYESTER + 20°C

PREVIOUS [REDACTED] PALPKS.

2. BACR 29T KT Chalks, AJO GDBL, Fg POW, SDE Fa

- KAVETAR I POTRAVI V MÍSTNÍ KAPOTAŘI
- PŘEMĚŤE PRÁVIZOBRAH OBČAN PEŠŮ

— UPRAVA OROČENÍ
— VÝKOP SOD

- V'kop' noy, prirodek na dnu A2.1

063 NA DAV A2.1

10.9.2025	РосАсп: ЗАПЯЗКА Т + 190с
-----------	--------------------------

57.

PRACTICE: [REDACTED] 3x8/AGP 271 kT 22T+Kt AND 0xmkk. AND GHE ROM
SDEI. TAPALUS.
POSTUP PRACTICE:- PROPLACH PROUZOPAM HO EADV PE 90

- Odstřepávání křespek pomocí speciálního nástroje
- Pokládka provizorního vop. před p.p. 6.5

ORANJA BOLD PE@65GEOTEXTIL

1048

- Hledám byty pro poplatky Bore
- Poplady křídla 300 Kč 544-45
- Zajištění výkopu oplocení.

9. 2. 25 Pict. 1076801 + 1076802

77

4 DEL FAYTH SDEL FAYTHS, L'ASSURANCE L'ASSURANCE
POSTER REPEL - POSTER REPEL - POSTER REPEL

- (Křídla) vlny z proužek, které
- (Křídla) vlny z proužek, které

340

- Píková i skřivý vyzývají spáskové kam m. 21. 4. 1
- Píková i Píh
- Píková i A. 21. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828.



List č.

Рассчитайте: $60^\circ + 10^\circ$ Полюсание $11^\circ + 12^\circ$

Proc. 1000 6⁰⁰ 02 12⁰⁰

Procedencia: Pa. PdD (2: 12/11/5000) Pa. PdD (2: 5000)

Des a mechi: Bagis 200, RABR 169, DEMPL, TRAILER RABR skandin

Posled. Prac. Fa. Pohl ce: TRAKTORBAH PIVOVARSKÝ SKUPY PIVO
Č.P. 73. VÝKUP STAVBY A ČIDEL NA SUCOVU.

Pa. Tołkacz: Wykop KTI 360 NAWIĄZANO NA SKALY
WYBUDOWAŁ WYBUDOWAŁ SKŁAD WOSPŁAMIAŁI PAŁ. POLU.

Temperatura: $7^{\circ}\text{C} + 12^{\circ}\text{C}$ PULCRO 1200 + 1100°C

Price of 1000 6" or 17"

Prescription: Ca. Pol (1200) 5x100, Ca. Pol (1200) 5x100

РМ в мачи и ваке-луре, императорски/католически, децата и ж. бива

Postup Práci: Po Pohlaz. Píknodul skaly od c. 7. z hrano domu

Fa Polkovič: Polkovička L7. DU 300, 9 VÝKOP LESKALÉ VE SVRCHU
Fa Polkovič: Polkovička L7. DU 300, 9 VÝKOP LESKALÉ VE SVRCHU

2018 Zhurnalov Poise Meniung z driten. skhizichesk
Podomne (dite)

POČASÍ: POLOJASNĚ T + 21°C

PRACUJ! [REDACTED] 3x BAGR 22T 16T TRAKTOR HLADIVO 2x NAKLAD
LOOSE VALER 4 DEL. FARM 5 DEL. FOPALUS!

- POKRYTÍ PRACÍ - PÍKOVÁNÍ SKALY V RÝZÍ KANALIZACE MEZI 514-15
- HLoubení RÝHY SPL. KANALIZACE MEZI 514-15
- PAŽEBNÍ RÝHY
- KAKLADÁNÍ A ODVOZ VÝKOPU NA SKLÁDKU
- HLoubení RÝHY PRO PŘÍVOD PRŮTOKU PROPOJ VODOVODU NAD KAVARNOU S DVOU BUCHET.
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU OPLOCENÍM
- ZHOTOVENÍ KORIDORU PRO CHODCE V HORNÍM ÚSEKU STAVBY

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

POHL cz, a.s.

██████████
Domažlická 168
318 00 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne

██████████
26.11. 2025

naše značka

vyřizuje / telefon

dne:

28.11.2025

Věc: Vyjádření geotechnika – posouzení výskytu 7. třídy těžitelnosti horniny

Zakázka: POHL 2025

Číslo : 2025 – 329


Stavba: Plzeň – rekonstrukce Revoluční ulice včetně Rolnického náměstí

Na základě předané fotodokumentace, zápisů ve stavebním deníku a návštěvy geotechnika na stavbě potvrzujeme výskyt 7. třídy těžitelnosti (ve smyslu ČSN 73 3055) v rýze kanalizace v prostoru mezi Š14 a S16 na ulici Revoluční. Výskyt horniny 7. třídy těžitelnosti byl registrován v rýze u domu č.p. 73 a pokračoval podél domu č.p. 71 dále vzhůru proti svahu směrem k šachtě Š16. Horninu odpovídající 7. třídy těžitelnosti představuje navětralý až zdravý metabazalt s nepravidelnou odlučností s plochami odlučnosti vzdálenými od sebe více než 250 mm. Tato hornina je rozpojována výkonnými hydraulickými kladivy. Metabazalty tvoří nepravidelná tělesa v proterozoických břidlicích. Břidlice v nezvětralé formě jsou také velmi pevné horniny, které však lze díky pravidelnému systému ploch nespojitosti (břidličnatost) rozpojovat snadněji než metabazalty.

Následující strany vyjádření obsahují fotodokumentaci z provádění zemních prací.

Fotodokumentace

Těleso metabazaltu v rýze u domů čp. 73 a čp. 71 Revoluční ulice

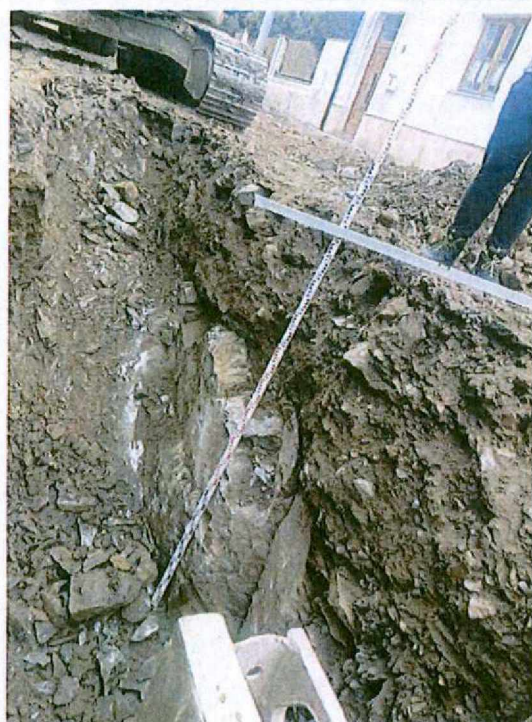



Zpracoval:

geotechnik

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.11.28
15:13:21 +01'00'

Schválil:


vedoucí pracoviště České Budějovice

Digitálně podepsal


Datum: 2025.11.28
15:16:32 +01'00'

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE v dl. 95m - 423.75 m³

VODOVOD v dl. 95m - 152.00 m³

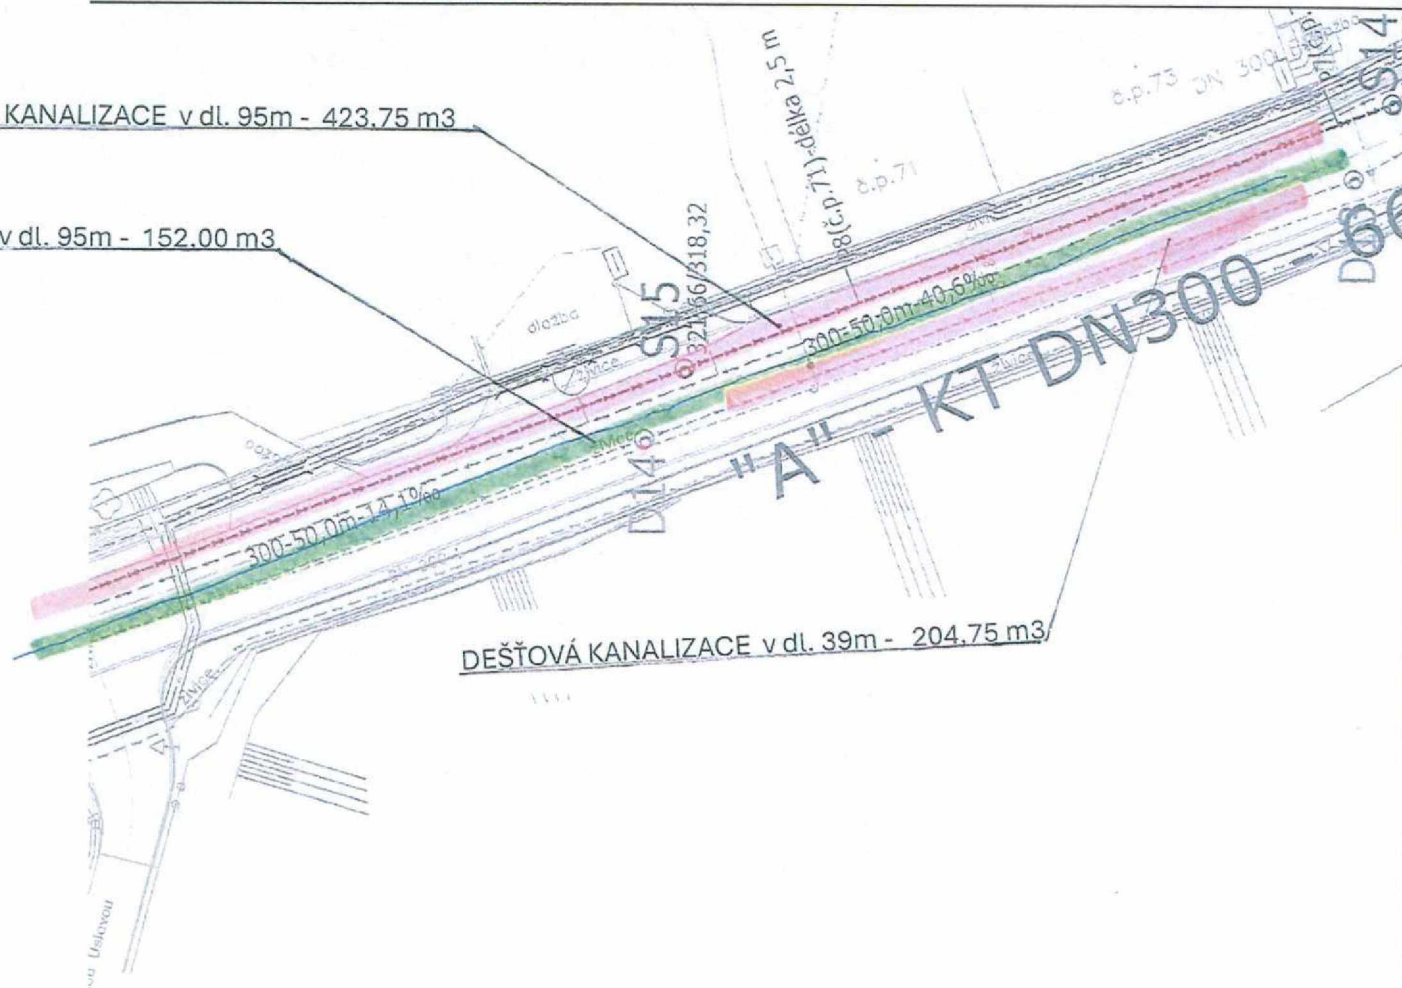

DEŠŤOVÁ KANALIZACE v dl. 39m - 204.75 m³

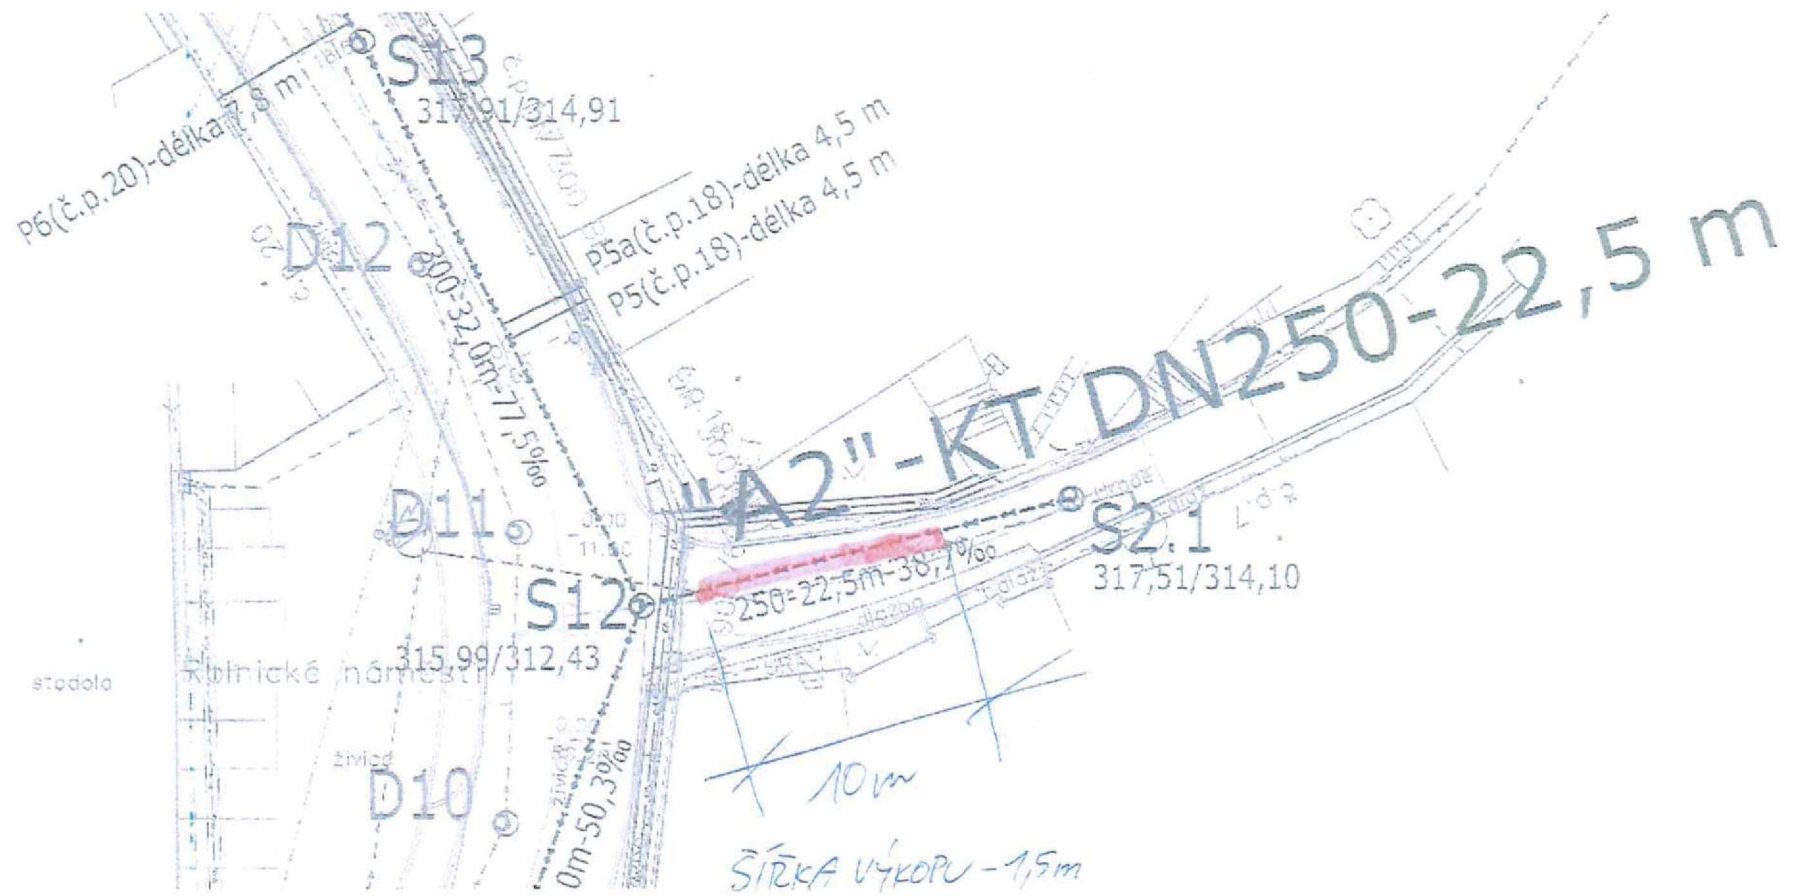


512

ZL5

L
T- E I TE - HT

==

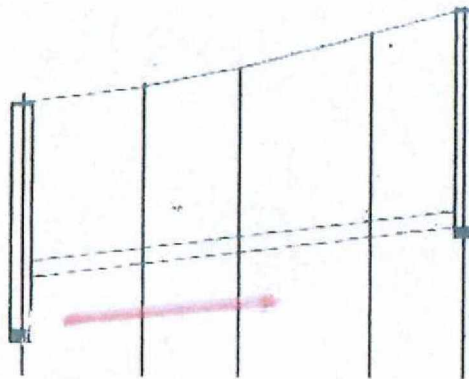

- I - E I - -
-
ET E E L
-



