



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 043

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	--

<b>Dotčená část stavby:</b>	SO104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část		
<b>Název / označení změny:</b>	změna úpravy chodníku Osek		
<b>Podklad pro změnu:</b>	Skutečný stav na stavbě		
<b>Návrh pro změnu podal:</b>	Zhotovitel	<b>Dne:</b>	01.11.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b>	Původní PDPS uvažovala, že stávající chodník v obci Osek bude v rámci úpravy komunikace předlážděn a zachován. V rámci RDS došlo ke změně nivelety a polohy komunikace. Z tohoto důvodu nebylo možné stávající chodník zachovat, ale musel být odstraněn. Nový chodník bylo nutné rozšířit a polohově a výškově přizpůsobit komunikaci.		
<b>Změna se týká položek:</b>	viz příložený rozpočet		
<b>Způsob ocenění změny:</b>	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>		<b>NE</b>	
<b>Vliv změny na cenu díla:</b>		<b>ANO</b>	
<b>Náklady na změnu celkem:</b>			107 820,80 Kč
<b>přípočty celkem:</b>			206 702,80 Kč
<b>odpočty celkem:</b>		-	98 882,00 Kč
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace stavební deník obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
<b>firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

# REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z\_241016  
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:  
Místo: Rokycansko

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119  
DIČ:

Zhotovitel:  
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427  
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>107 820,80</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>107 820,80</b>	<b>22 642,37</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>130 463,17</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z\_241016

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: **Rokycansko**

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>107 820,80</b>	<b>130 463,17</b>	
<b>ZL43</b>	<b>Chodník Osek SO 104.2</b>	107 820,80	130 463,17	<b>STA</b>
<b>SO 104.2</b>	<b>Přeložka silnice III/2322 - východní část</b>	107 820,80	130 463,17	Soupis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL43 - Chodník Osek SO 104.2

Soupis: **SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část**

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**107 820,80**

VCP - VÍCEPRÁCE

206 702,80

MPR - MĚNĚPRÁCE

-98 882,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL43 - Chodník Osek SO 104.2

Soupis: **SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část**

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**107 820,80**

### D VCP VÍCEPRÁCE


**206 702,80**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	140,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123</a>					
VV			Nová položka dle ÚRS 2024 01					
			množství = viz původní rozpočet SOD					
VV			140					
			140,000					
VV			Součet					
			140,000					
2	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	49,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112</a>					
VV			Nová položka dle ÚRS 2024 01					
			množství = viz původní rozpočet SOD					
VV			49					
			49,000					
VV			Součet					
			49,000					
3	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	80,000			
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
P			Poznámka k položce: ŠDB ; 150mm					
VV			Položka z SOD z objektu SO 104.2, pol. 24					
			množství = zaměření skutečnost - původní rozpočet SOD					
VV			220-140					
			80,000					
VV			Součet					
			80,000					
4	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	210,000			
PP			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM					
P			Poznámka k položce: Dl 60mm, Lože 30mm					
VV			množství = zaměření skutečnost - odečet reliéfní dlažba					
VV			Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol. 30					
			220-10					
			210,000					
VV			Součet					
			210,000					
5	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,000			
PP			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> reliéfní dlažba 60 mm, ložná 30 mm					
VV			Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol. 31					
VV			množství = zaměření skutečnost					
VV			10			10,000		
VV			Součet			10,000		
6	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	83,600			
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
P			<i>Poznámka k položce:</i> betonový silniční obrubník					
VV			Položka z SOD z objektu SO 107.1 pol. 34					
VV			množství = zaměření skutečnost					
VV			79,6+4			83,600		
VV			Součet			83,600		
7	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	2,700			
PP			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM					
VV			Položka z SOD z objektu SO 107.1, pol. 33					
VV			množství = zaměření skutečnost					
VV			2,7			2,700		
VV			Součet			2,700		
8	K	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	21,088			
PP			PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II					
VV			Položka z SOD z objektu SO 104.1, pol. 10					
VV			množství = dlažba vč. lože + obrubníky vč. Lože = množství v tunách (přepočet viz KROS) / objemová hmotnost = m3					
VV			(36,4+14,21)/2,4			21,088		
VV			Součet			21,088		
9	K	12573 b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	21,088			
PP			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I					
P			<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.					
VV			Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4					
VV			množství = viz položka č. 8					
VV			21,088			21,088		
VV			Součet			21,088		
D	MPR		MÉNĚPRÁCE				-98 882,00	
10	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-140,000			
PP			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dl 60mm, Lože 30mm					
VV			Položka z SOD z objektu SO 104.2, pol. 31					
VV			množství = viz původní rozpočet SOD					
VV			původní PDPS = přeskládání stávající dlažby					
VV			-140			-140,000		
VV			Součet			-140,000		
11	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-49,000			
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
P			<i>Poznámka k položce:</i> betonový silniční obrubník					
VV			Položka z SOD z objektu SO 104.2, pol. 33					
VV			množství = viz původní rozpočet SOD					
VV			původní PDPS = přeskládání stávajících obrubníků					
VV			-49			-49,000		
VV			Součet			-49,000		

# S0104 - Přeložka silnice III/2322

délky obrub a plocha dlažby u napojení na Osek

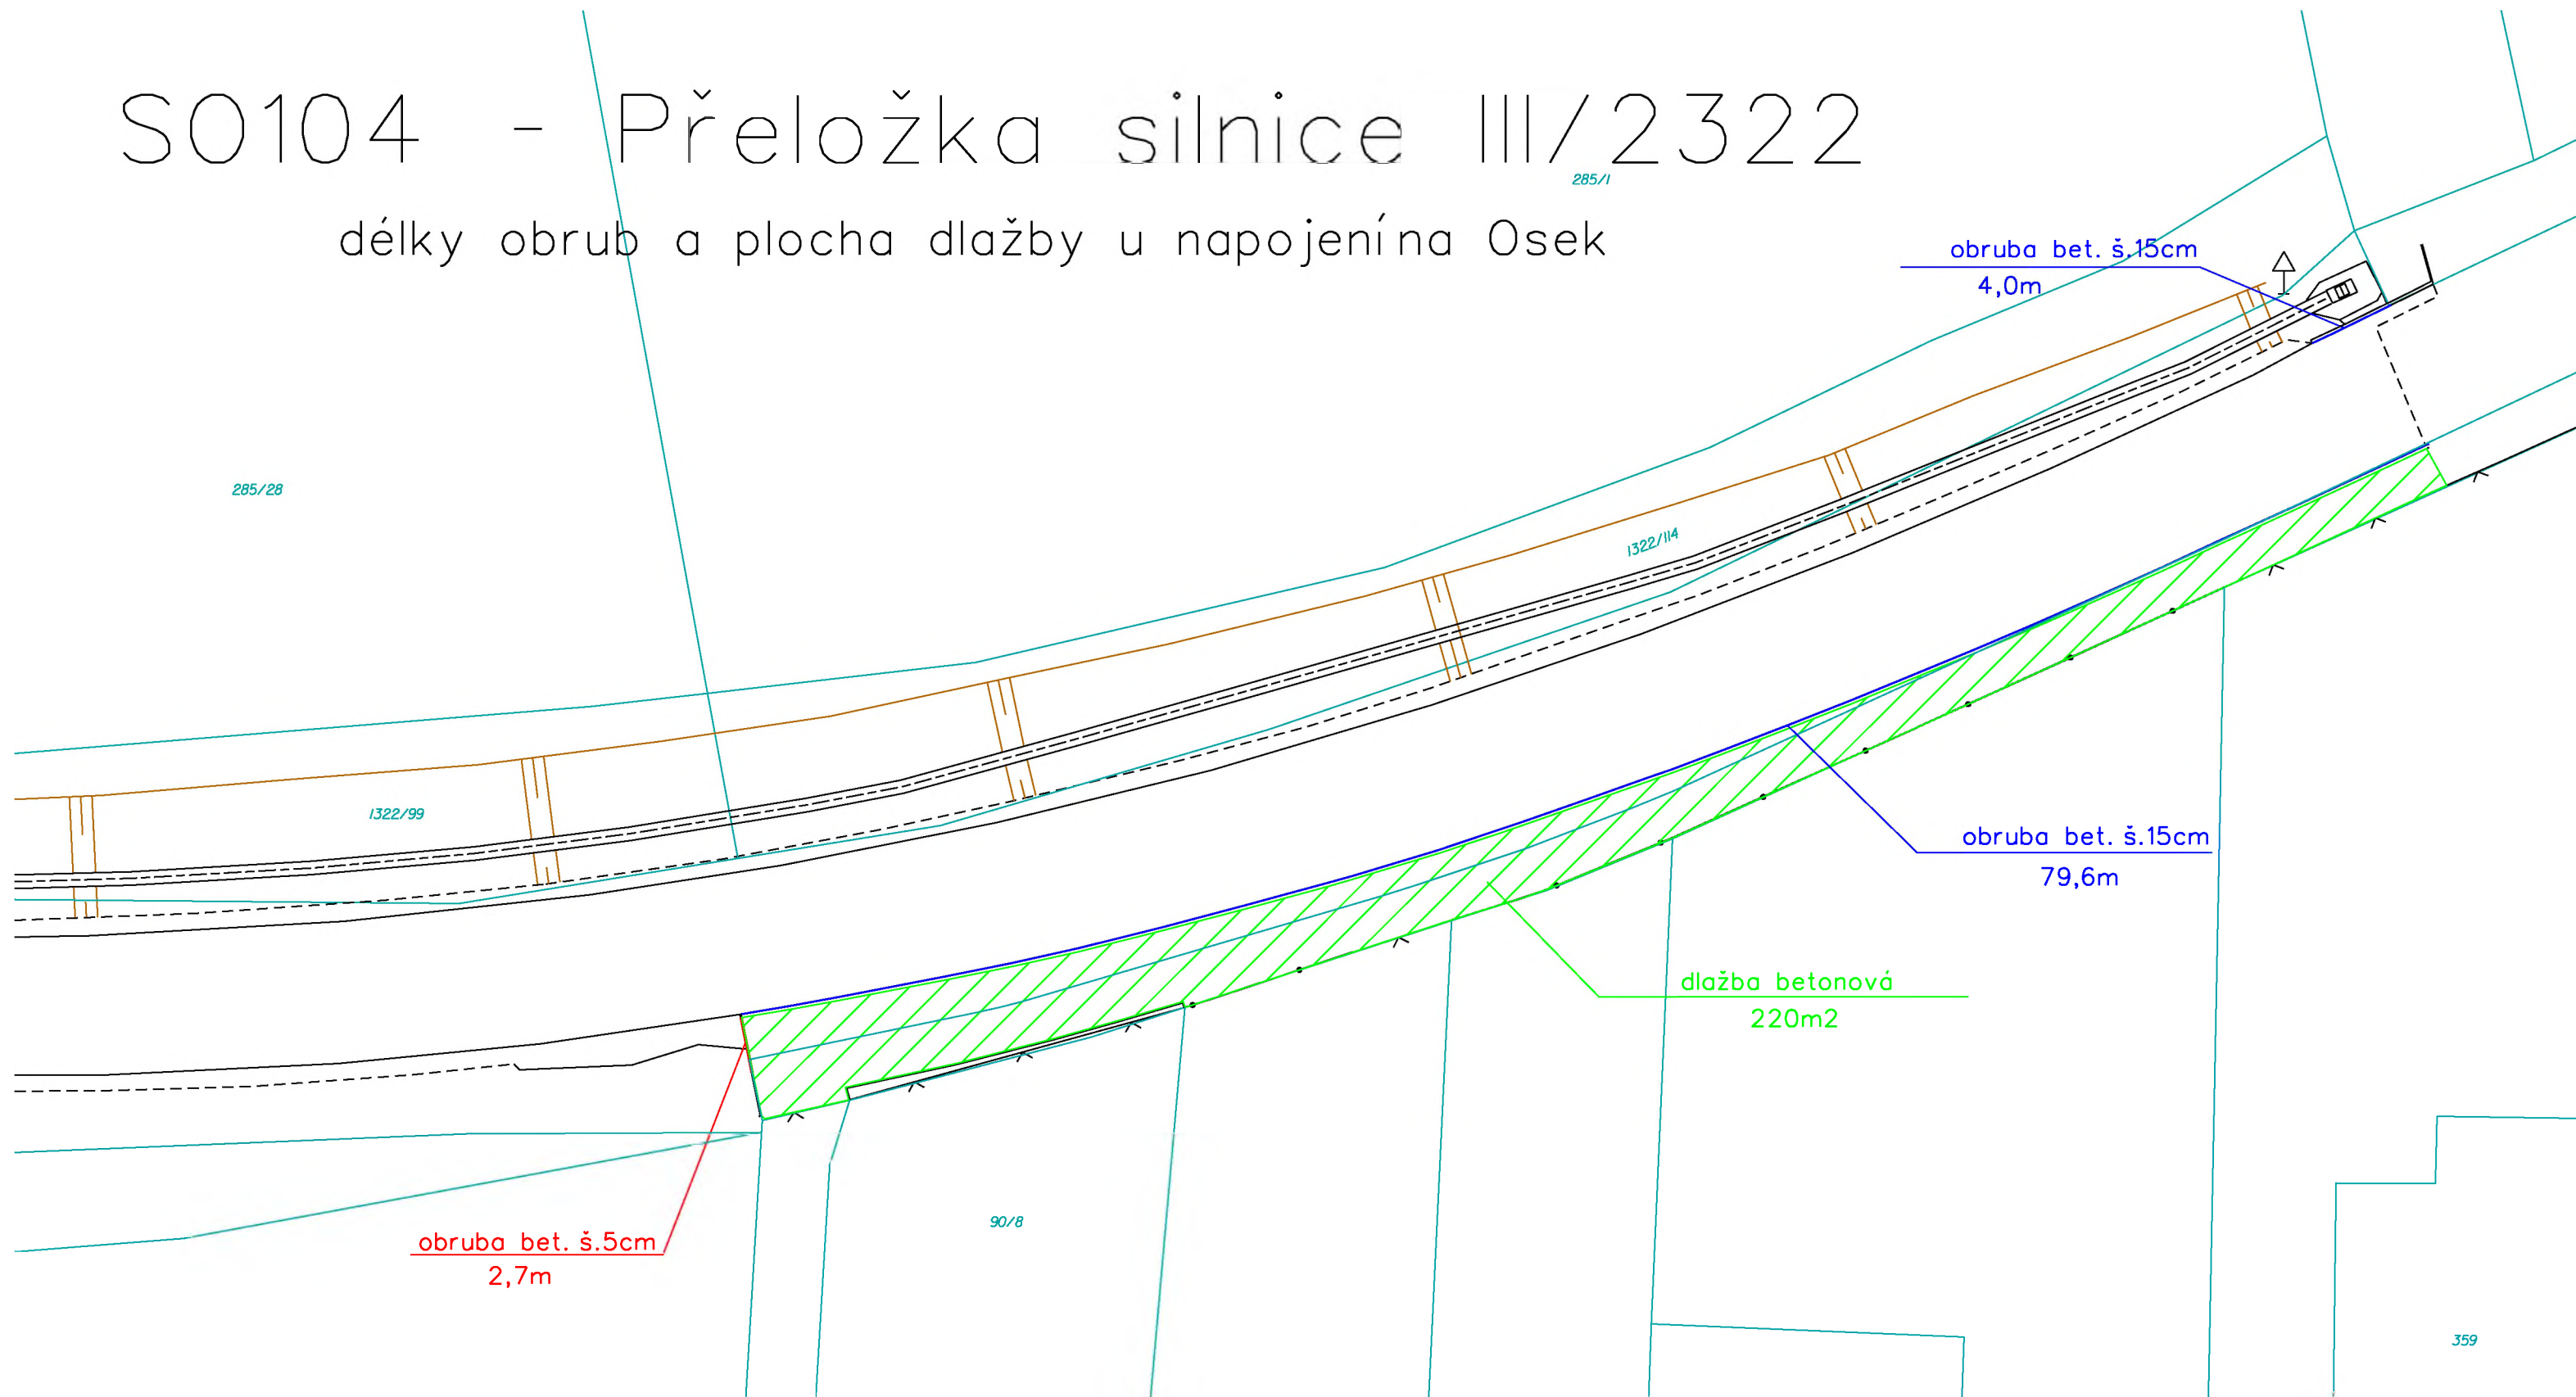



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	2,5°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	227°	83%
12:00	Déšť	6,0°C	0,5 mm/h	5,0 m/s	218°	72%
18:00	Déšť	5,8°C	0,1 mm/h	2,6 m/s	257°	69%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
STRABAG a.s.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8				

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásová CAT 330	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní válec Hamm	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Autojeřáb Tatra	STRABAG a.s.		1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 104 - přeložka silnice III/2322 propustek km 0,538 - zemní práce, příprava základové spáry - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	DEKAKOM plus s.r.o.		
SO 104 - přeložka silnice III/2322 propustek km 0,605 - proveden podsyp ze štěrkopísku - zřízeno betonové lože vč. kari sítí - pokládka železobetonových trub - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	STRABAG a.s.		
chodník km 0,880 - KÚ - odstranění stávající dlažby a obrubníků			

Podpisy:





DENÍK: SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI  
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasnó	6,4°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	177°	94%
12:00	Polojasno	18,2°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	34°	45%
18:00	Polojasno	19,8°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	71°	33%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
[REDACTED]	Dělník	1	8	[REDACTED]	Vedoucí Pokládky	1	8
[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8	[REDACTED]	Mistr Stavby	1	8
[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8				
STRABAG a.s.							
[REDACTED]	Dělník	1	8	[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8
[REDACTED]	Dělník	1	8	[REDACTED]	Dělník	1	8
[REDACTED]	Dělník	1	8				

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8
Finišer Voge 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.	[REDACTED]	1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.	[REDACTED]	1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.	[REDACTED]	1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
6x nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 104 - přeložka silnice III/2322 km 0,300 - KÚ - prováděna pokládka vrstvy stabilizace cementem - statické hutnění válcem - proveden infiltrační postřik - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
SO 104 - přeložka silnice III/2322 chodník km 0,880 - KÚ - pokládka dlažby do lože z ŠD	STRABAG a.s.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR [REDACTED] (TDS)

NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:



DENÍK: SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI  
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	4,8°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	292°	96%
12:00	Polojasno	17,0°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	59°	42%
18:00	Polojasno	18,0°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	19°	39%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
[REDACTED]	Dělník	1	8	[REDACTED]	Vedoucí Pokládky	1	8
[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8	[REDACTED]	Mistr Stavby	1	8
[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8				
STRABAG a.s.							
[REDACTED]	Dělník	1	8	[REDACTED]	Stavbyvedoucí	1	8
[REDACTED]	Dělník	1	8	[REDACTED]	Dělník	1	8
[REDACTED]	Dělník	1	8				

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8
Finišer Voge 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.	[REDACTED]	1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.	[REDACTED]	1	8
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.	[REDACTED]	1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
6x nákladní vozidlo	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 104 - přeložka silnice III/2322 km 0,300 - KÚ - prováděna pokládka vrstvy stabilizace cementem - statické hutnění válcem - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		
SO 104 - přeložka silnice III/2322 chodník km 0,880 - KÚ - pokládka dlažby do lože z ŠD	STRABAG a.s.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR [REDACTED] (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis [REDACTED] (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:  
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole provedené pláňe povolují pokládku konstrukční vrstvy ŠD.

AUTOR [REDACTED] (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis [REDACTED] (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 6.5.2024:

Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole provedené konstrukční vrstvy ŠD povolují pokládku konstrukční vrstvy SC.

Podpisy:

█

█

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	7,5°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	104°	98%
12:00	Polojasno	15,4°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	96°	77%
18:00	Polojasno	19,4°C	0,0 mm/h	2,3 m/s	326°	56%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
STRABAG a.s.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8				

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové CAT 330	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní válec Hamm	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8
4x nákladní vozidlo	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 104 - přeložka silnice III/2322 chodník km 0,880 - KÚ - osazení betonových obrubníků	STRABAG a.s.		
SO 104 - přeložka silnice III/2322 km ZÚ - KÚ - prováděna pokládka vrstvy ŠD, hutnění válcem - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	DEKAKOM plus s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Žádám TDS o kontrolu vrstvy ŠD a povolení povolení pokládky vrstvy SC.

PŘÍLOHY

OSEK - SO 104 - Os...05-  
06.pdf

Podpisy:





113106123



## Kompletní zobrazení

- 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
- 012 - Budovy a haly – montované
- 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
- 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
- 015 - Objekty pozemní zvláštní
- 211 - Mosty
- 221 - Komunikace pozemní a letišť
  - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
  - A99 - Přesun hmot
  - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí
    - 11 - Přípravné a přidružené práce

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113106492	cementovou maltou	m2		287,00
			1131061**	<b>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší</b>			
				<b>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</b>			
				<b>s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár</b>			
				<b>ručně</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113106111	z mozaiky	m2		111,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113106121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2		77,20
<input type="checkbox"/>	221	B01	113106122	z kamenných dlaždic nebo desek	m2		80,90
<input type="checkbox"/>	221	B01	113106123	ze zámkové dlažby	m2		101,00




113201112



**Kompletní zobrazení**

- ▶ A99 - Přesun hmot
- ▶ B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí
  - ▶ 11 - Přípravné a přidružené práce
    - 1131051\*\* - Rozebrání dlažeb z lomového kamene

O	Ceník	Část	Kód položky
			1132011**
<input type="checkbox"/>	221	B01	113201111
<input type="checkbox"/>	221	B01	113201112

Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<b>Vytrhání obrub</b>			
<b>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</b>			
chodníkových ležatých	m		122,00
silničních ležatých 	m		147,00

**Ragemia, s.r.o.**

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

## **Vyjádření autorského dozoru**

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

**Objekt:** SO104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část

**ZL č.:** 043

**Název změny:** Změna úpravy chodníku Osek

Původní PDPS uvažovala, že stávající chodník v obci Osek bude v rámci úpravy komunikace pouze předlážděn. V rámci RDS došlo ke změně nivelety a polohy komunikace. Z tohoto důvodu nebylo možné stávající chodník zachovat, ale musel být odstraněn. Nový chodník bylo nutné rozšířit a polohově a výškově přizpůsobit komunikaci.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem  
**Ing. Jan Rambousek**  
Ragemia, s.r.o.

## STANOVISKO TDS K ZL č. 43

**Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa**

Číslo ZL: 043

Název ZL: SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 – východní část – Změna úpravy chodníku Osek

### Zdůvodnění:

Původní PDPS uvažovala, že stávající chodník v obci Osek bude v rámci úpravy komunikace předlážděn a zachován. V rámci RDS došlo ke změně nivelety a polohy komunikace. Z tohoto důvodu nebylo možné stávající chodník zachovat, ale musel být odstraněn. Nový chodník bylo nutné rozšířit a polohově a výškově přizpůsobit komunikaci.

**Stanovisko TDS:** TDS souhlasí se změnou.

### Technické posouzení:

V důsledku změny nivelety a polohy komunikace byl stávající chodník odstraněn a nový chodník byl rozšířen a přizpůsoben komunikaci.

### Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.

Odpočítané položky: - 98 882,00Kč

Připočítané položky: 206 702,80 Kč

**Celkem ZL: 107 820,80 Kč**

**Závěr:** Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS: [redacted]

**DOZOR**  
DO  
Koterov  
www.
