



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 051

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090		
Název / označení změny:	Zřízení vtokových objektů propustku v km 3,530		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	01.11.2024
Zdůvodnění a popis změny:	S ohledem na výškové uspořádání příkopů a napojení melioračních objektů na propustek v km 3,530 byly nutné zrealizovat monolitické vtokové objekty, tak aby bylo možné jednotlivé přítoky propojit.		
Změna se týká položek :	viz příložený rozpočet		
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			434 503,99 Kč
přípočty celkem:			434 503,99 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC RDS SD obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	tum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			434 503,99
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	434 503,99	91 245,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	525 749,83
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: **Rokycansko**

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		434 503,99	525 749,83	
ZL51	Vtokové objekty k propustku km 3,534	434 503,99	525 749,83	STA
SO 101.3	Vtokové objekty k propustku km 3,534	434 503,99	525 749,83	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt:

ZL51 - Vtokové objekty k propustku km 3,534

Soupis:

SO 101.3 - Vtokové objekty k propustku km 3,534

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

434 503,99

VCP - VÍCEPRÁCE

434 503,99

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt:

ZL51 - Vtokové objekty k propustku km 3,534

Soupis:

SO 101.3 - Vtokové objekty k propustku km 3,534

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovo

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem



434 503,99

D	VCP	VÍCEPRÁCE					434 503,99	
1	K	115001105R	Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování a likvidace	kpl	2,000			
	PP		Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování a likvidace					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 301-5, pol. 1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	336,000			
	PP		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 5					
	VV		14*24		336,000			
	VV		Součet		336,000			
3	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	76,205			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zemina					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 1					
	VV		" pro vtokový objekt" ((2,8*2,8*2,7)*2)*1,8		76,205			
	VV		Součet		76,205			
4	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	42,336			
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 9					
	VV		" pro vtokový objekt" (2,8*2,8*2,7)*2		42,336			
	VV		Součet		42,336			
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15,680			
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 14					
	VV		"pro vtokový objekt" (2,8*2,8)*2		15,680			
	VV		Součet		15,680			
6	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	0,648			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315115					
			Nová položka dle ÚRS 2024 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		" pro vtokový objekt" (1,8*1,8*0,1)*2		0,648			
	VV		Součet		0,648			
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,648			
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 304, pol. 11					
	VV		" pro vtokový objekt" (1,8*1,8*0,1)*2		0,648			
	VV		Součet		0,648			
8	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	16,584			
	PP		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betón C30/37-XF4, XD3, vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 26					
	VV		Betón C30/37 pro nové vtokové objekty					
	VV		"ŽB desky" (1,2*1,2*0,3)*2		0,864			
	VV		"ŽB stěny" ((2,5*1,8*0,3*2)+(2,5*1,2*2))*2		17,400			
	VV		"odečteny otvory" -(4*0,42)		-1,680			
	VV		Součet		16,584			
9	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,624			
	PP		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betónářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 27					
	VV		" pro vtokový objekt"					
	VV		(42,462+32,376+79,226+63,312+89,957+71,960+244,968)/1000		0,624			
	VV		Součet		0,624			
10	K	465512.R	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ	M3	0,864			
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V kubatuře i opěrné prahy v patě dlažby pod mostem; uvažována kamenná dlažba do betonového lože C25/30n-XF3 a podsyp v celkové průměrné tloušťce 400 mm					
	VV		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 40					
	VV		" pro vtokový objekt" (1,2*1,2*0,3)*2		0,864			
	VV		Součet		0,864			
11	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
	VV		nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	M	59224450	mříž dvojitá B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		mříž dvojitá B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm					
	VV		nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501221					
	VV		Nová položka dle ÚRS 2024 02					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			



PROPUSTEK DN 1000 PODÉLNÝ REZ OSOU
km 3,534

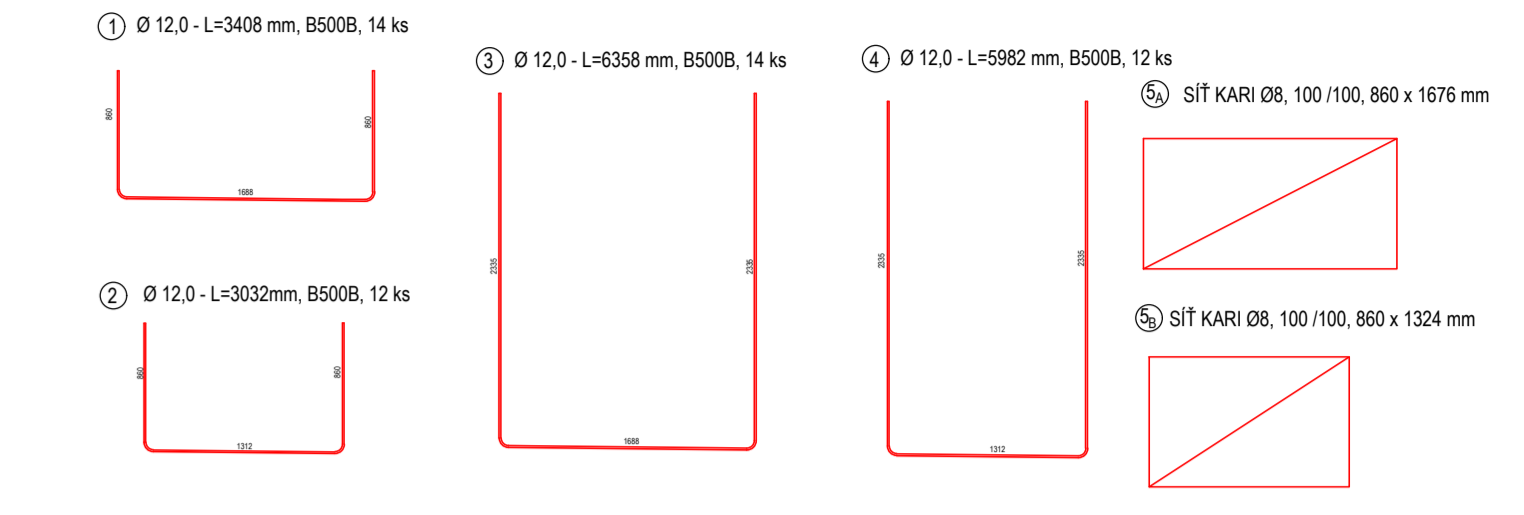

POPIS VÝZTUŽOVÝCH VLOŽEK

UDAJ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PIŠEZNÉ OZNAČENÍ VLOŽKY	14	12	14	12	8	8
POČET VLOŽEK	14	12	14	12	8	8
PROJEKČNÍ VÝŠKY V MILIMETRECH	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 8	Ø 8
ROZTĚČ V MILIMETRECH	250	250	250	250	100 X 100	100 X 100
DĚLKA	3408	3052	6368	6028	880 X 1676	880 X 1324
VÁHA kg/m	0,89	0,89	0,89	0,89	7,9 kg/m ²	7,9 kg/m ²
VÁHA PRVKU kg	3,033	2,688	5,689	5,276	11,387	6,966
VÁHA CELKEM kg	42,462	32,376	79,226	63,312	89,957	71,960

BETONOVÝ
POKRYVNÝ BETON
28 DESKY
BETONOVÉ PRAHY
DLAŽBA DO BETONU

C16/20
C20/25 XF4
C20/25 XF4
C20/25 XF3

POZN: KRYTÍ VŠECH PRVKŮ VÝZTUŽE BUDE MINIMÁLNĚ 20 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM
BpV

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Název stavby NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYČANSKA NA DALNICI D5, 1. ETAPA				
Číslo objektu SO 101.4				
Investor Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		Riziko a podpis		
Tisk DOZOR inženýring s. r. o. Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň		Datum		
Zdrojové stavby ROADFIN STAVBY s. r. o. Plzeňská 1147, 330 27 Vejmice		Riziko a podpis		
Autorský dozor Ragemia, s. r. o. Plzeňská 27, 266 01 Beroun		Datum		
Projektant [Logo]	Projekt NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYČANSKA NA DALNICI D5, 1. ETAPA	Investor SÚS PK, s. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň	C. číslo dok. 200.2023	Stavba dok. RIS
Vypracoval Schválil [Logo]	Druh dok. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Název dok. SO 101.4 PROPUSTEK V KM 3,534 1:50	Ref. ozn. D	Č. základu 06	Ref. list 06 1/1

DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	☁ Déšť	15,8°C	0,1 mm/h	1,8 m/s	252°	94%
12:00	☁ Polojasno	20,3°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	256°	64%
18:00	☁ Déšť	16,4°C	1,3 mm/h	4,6 m/s	299°	83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
██████████	Stavbyvedoucí	1	8	██████████	Dělník	1	8
██████████	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
██████████	Dělník	1	8	██████████	Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
██████████	Dělník	1	8	██████████	Vedoucí Party	1	8
██████████	Dělník	1	8	██████████	Dělník	1	8
██████████	Stavbyvedoucí	1	8	██████████	Mistr Stavby	1	8
██████████	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Kolový bagr CAT 14 t	ROADFIN STAVBY s.r.o.	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO101 hlavní trasa km ZÚ - 0,500 LS	DEKAKOM plus s.r.o.		

- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 0,200 - 0,780

- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 1,500 SO201

- prováděn zásyp přechodových oblastí mostu SO201
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa

ROADFIN STAVBY s.r.o.

- propustek v km 3,534 vtokové objekty
- zemní práce, příprava základové spáry
- čerpání vody 24 hodin denně

SO 101 hlavní trasa

BIGGEST s.r.o.

- km 3,340 - 3,800
- pokládka stabilizační geomříže v požadovaném rozsahu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500

- pokládka stabilizační geomříže v požadovaném rozsahu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 5,170 hospodářský sjezd

- zemní práce, příprava základové spáry
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

██████████ (Stavbyvedoucí - manažer projektu)

NÁZEV DODAVATELE

ROADFIN STAVBY s.r.o.

S ohledem na výškové a polohové uspořádání příkopů a napojení melioračních objektů v km přibližně 3,530 vznikl z RDS nový požadavek na vyhotovení vtokových objektů na propustku v km 3,534 po obou stranách. Práce budou provedeny nad rámec SOD a bude vypracován změnový rozpočet.

Podpisy:



DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	17,7°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	25°	94%
12:00	Polojasno	27,1°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	123°	59%
18:00	Déšť	22,8°C	0,1 mm/h	0,9 m/s	314°	90%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Party	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Kolový bagr CAT 14 t	ROADFIN STAVBY s.r.o.	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO101 hlavní trasa km ZÚ - 0,500 LS - prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů	DEKAKOM plus s.r.o.		

-
- odvoz vytěženého materiálu
 - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa

BIGGEST s.r.o.

km 3,340 - 3,800

- prováděna pokládka stabilizační geomříže
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa

ROADFIN STAVBY s.r.o.

propustek v km 3,534 vtokové objekty

- provedeno odstranění bednění monolitických stěn

Podpisy:

█

|

DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	18,9°C	0,0 mm/h	0,4 m/s	7°	94%
12:00	Polojasno	27,3°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	261°	64%
18:00	Déšť	23,3°C	0,1 mm/h	3,1 m/s	300°	73%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Party	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Kolový bagr CAT 14 t	ROADFIN STAVBY s.r.o.	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO101 hlavní trasa km ZÚ - 0,500 LS - prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů	DEKAKOM plus s.r.o.		

-
- odvoz vytěženého materiálu
 - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa

BIGGEST s.r.o.

km 3,340 - 3,800

- prováděna pokládka stabilizační geomříže
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa

ROADFIN STAVBY s.r.o.

propustek v km 3,534 vtokové objekty

- prováděna betonáž monolitických stěn vtokových objektů
- čerpání vody 24 hodin denně

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR [REDAKCE] (TDS)

NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:

DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	12,8°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	178°	95%
12:00	Polojasno	21,0°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	150°	60%
18:00	Polojasno	24,7°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	130°	47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Party	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Kolový bagr CAT 14 t	ROADFIN STAVBY s.r.o.	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO101 hlavní trasa km ZÚ - 0,500 LS - prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů	DEKAKOM plus s.r.o.		

-
- odvoz vytěženého materiálu
 - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa

BIGGEST s.r.o.

km 3,340 - 3,800

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa

ROADFIN STAVBY s.r.o.

propustek v km 3,534 vtokové objekty

- provedena betonáž desky
- čerpání vody 24 hodin denně

Podpisy:

|

█

DENÍK: SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,9°C	0,0 mm/h	0,6 m/s	327°	98%
12:00	Polojasno	19,4°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	250°	50%
18:00	Polojasno	21,8°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	260°	49%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Party	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Kolový bagr CAT 14 t	ROADFIN STAVBY s.r.o.	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO101 hlavní trasa km ZÚ - 0,500 LS - prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů	DEKAKOM plus s.r.o.		

-
- odvoz vytěženého materiálu
 - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa

BIGGEST s.r.o.

km 3,340 - 3,800

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500

- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa

ROADFIN STAVBY s.r.o.

propustek v km 3,534 vtokové objekty




- armování betonářské výztuže
- čerpání vody 24 hodin denně

Podpisy:

█

█

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	12,7°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	223°	93%
12:00	 Zamračeno	15,8°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	295°	71%
18:00	 Polojasno	19,2°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	336°	48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Party	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
STRABAG a.s.							
	Dělník	1	8		Stavbyvedoucí	1	8
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Dělník	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	HOD.
Dávkovač pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní fréza Wirtgen	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dávkovač pojiva MAN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní fréza WIRTGEN	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
nákladní vozidlo TATRA 8x8	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper BELL	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.	1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.	1	8
Pásové rypadlo HITACHI 30t	BIGGEST s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dumper CAT	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Rypadlo pásové CAT 30t	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Dozér CAT D6	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.	1	8
Kolový bagr CAT 14 t	ROADFIN STAVBY s.r.o.	1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN MJ
<p>SO101 hlavní trasa km ZÚ - 0,500 LS</p> <ul style="list-style-type: none">- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů- odvoz vytěženého materiálu- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP <p>km 0,200 - 0,780</p> <ul style="list-style-type: none">- prováděno odtěžení materiálu v zářezu- odvoz vytěženého materiálu- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP <p>km 0,780 - 1,450</p> <ul style="list-style-type: none">- prováděna pokládka stabilizační geomříže v požadovaném rozsahu- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	DEKAKOM plus s.r.o.	
<p>SO 101 hlavní trasa km 3,340 - 3,800</p> <ul style="list-style-type: none">- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojiv- hutnění po vrstvách- použit materiál ze stavby- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP <p>km 4,090 - 4,500</p> <ul style="list-style-type: none">- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojiv- hutnění po vrstvách- použit materiál ze stavby- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	BIGGEST s.r.o.	
<p>SO101 hlavní trasa propustek v km 3,534 vtokové objekty</p> <ul style="list-style-type: none">- zemní práce, příprava základové spáry- čerpání vody 24 hodin denně	ROADFIN STAVBY s.r.o.	
<p>SO101 hlavní trasa km 5,170 hospodářský sjezd</p> <ul style="list-style-type: none">- proveden podsyp ze štěrkopísku- prováděno betonové lože včetně kari sítí- osazení železobetonových trub- obetonování tub- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř a KZP	STRABAG a.s.	

Podpisy:

|



59224450








Kompletní zobrazení	O	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Porizovací cena
potrubí drenážní	<input type="checkbox"/>	59224450	mříž dvojitá B 125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm	kus		19 500,00

451315115



Kompletní zobrazení

-  014 - Budovy a haly – opravy a údržba 
-  015 - Objekty pozemní zvláštní
-  211 - Mosty
-  A01 - Silniční mosty






O	Ceník	Část	Kód položky
			4513151..
<input type="checkbox"/>	211	A01	451315114
<input type="checkbox"/>	211	A01	451315115


Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého			
tloušťky do 100 mm, z betonu			
C 12/15	m2		434,00
C 16/20	m2		459,00

899204112



Kompletní zobrazení





-  89203100 - Proplach a dezinfekce
-  89410000 - Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné
-  89420000 - Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu
-  89430200 - Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu
-  89441000 - Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	271	A01	899401113	hydrantových	kus		1 980,00
			89920100	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení			
<input type="checkbox"/>	271	A01	899202112	A15	kus		1 360,00
<input type="checkbox"/>	271	A01	899203112	B125, C250	kus		1 440,00
<input type="checkbox"/>	271	A01	899204112	D400, E600	 kus		1 520,00


899501221



Kompletní zobrazení

-  89410..... - Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné
-  89420..... - Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu
-  894302... - Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu
-  89441..... - Osazení betonových



	Ceník	Část	Kód položky
<input type="checkbox"/>	271	A01	899204112
<input type="checkbox"/>			89950.....
<input type="checkbox"/>	271	A01	899501221

Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
D400, E600	kus		1 520,00
Stupadla do šachet a drobných objektů			
ocelová s PE povlakem			
vidlicová			
pro přímé zabudování do hmoždinek	kus		174,00

Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

ZL č.: 051

Název změny: Zřízení vtokových objektů na propustek v km 3,530

S ohledem na výškové uspořádání příkopů a napojení melioračních objektů na propustek v km 3,530 bylo nutné zrealizovat monolitické vtokové objekty tak, aby bylo možné jednotlivé přítoky propojit.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem
Ing. Jan Rambousek
Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 51

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 051

Název ZL: SO 101.4 Hlavní trasa – km 2,900-4,090 – Zřízení vtokových objektů propustku v km 3,530

Zdůvodnění:

S ohledem na výškové uspořádání příkopů a napojení melioračních objektů na propustek v km 3,530 bylo nutné zrealizovat monolitické vtokové objekty, tak aby bylo možné jednotlivé přítoky propojit.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Nutná realizace monolitických vtokových objektů z důvodu připojení na propustek.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 434 503,99 Kč

Celkem ZL: 434 503,99 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS: 


Z
Kot
w
