


f)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 12	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.		Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018	
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 23 ze dne 27.2.2019 2/11	
	Kategorizace položek		
ZMĚNA:			
Kontrola obvodu staveniště na popud investora z důvodu stížnosti majitele sousedního pozemku. (Bez zjištění odchylek)			
Počet připojených listů specifikací: 5		Počet výkresů: 0	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.			
ZPRACOVAL:			
Jaroslav Horák GEOSAN GR			
(za)			
Datum: 29.7.2019			
Toto Oznámení Není tedy Potv			

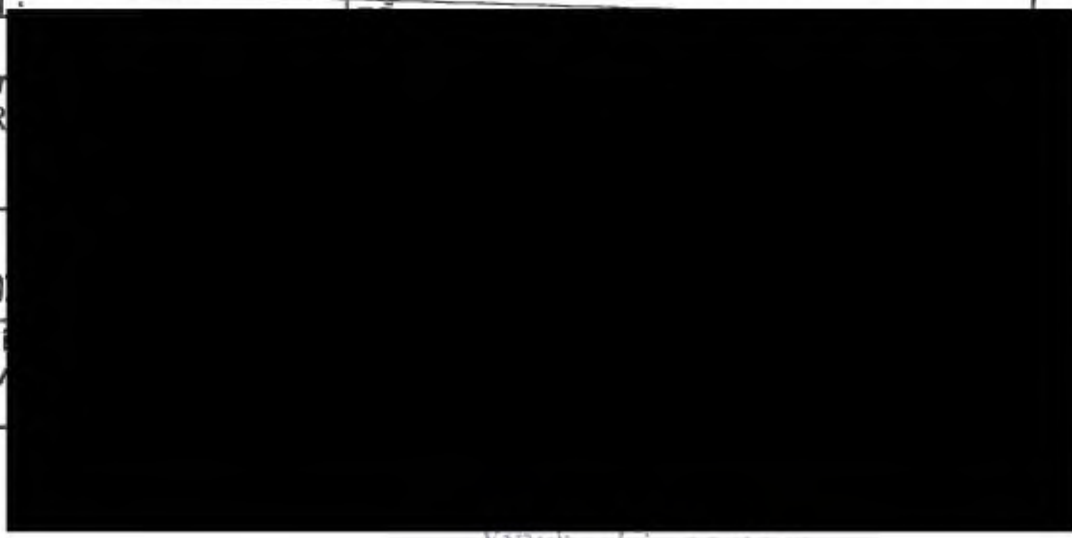

2/9 Projektant vypracuje nabídku na PD inventáře – vybavení školy. V návaznosti na bod 1/9 bude mezi MČ, investorem a projektantem jednáno o dalším postupu.

- Trvá – nabídku vypracuje p. arch. Lang. Tato dodávka není součástí stavby, zajišťuje následný uživatel – MČ Zličín. Termín do 31.1.2019 – Trvá
- Realizace je plánována po ukončení stavby veškerým MČ bude vypracována objednávka.

3/9 Zástupci zhotovitele upozornili na nutnost řešení výběru zhotovitelů vybavení laboratoří učeben IT s dostatečným předstihem pro zajištění potřebné stavební připravenosti – napojovací body medií apod.

- Dne 17.1.2019 proběhlo jednání mezi projektantem, arch. Langem a ředitelkou ZŠ, při kterém byly specifikovány požadavky ředitelky ZŠ (jako budoucího uživatele) na úpravy projektu. Z jednání byl pořízen zápis, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
- Při dnešním jednání KD bylo investorem oznámeno, že souhlasí s požadavky tohoto zápisu s výjimkou bodu 11) – zde bude provedena pouze příprava pro napojení spotřebičů, dodávka spotřebičů nebude investorem hrazena. Totéž platí pro bod č. 5) – bude provedena příprava pro instalaci interaktivních tabulí a otázka dodávky těchto tabulí bude předmětem samostatného jednání mezi vedením MČ Praha – Zličín a investorem stavby INV MHMP.
- INV sepsal požadavek na dodávku interaktivních tabulí s odhadem nákladu a ten předal na odbor školství MHMP, který rozhodne. Informace na příštím KD.
- Odbor školství doporučil MČ jednat v této věci s ručním p.Šimralem a ředitelem INV MHMP Ing Prajerem.
- Klientské úpravy v definitivní podobě projedná pí ředitelka ZŠ s arch Langem do týdne a předá projektantovi, který je zahrne do úprav PD, které budou předány stavbě do 15.3.2019.

2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku

- PVK nepožaduje, smlouva bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP.
- Protože končí platnost stávající smlouvy s CENTRAL GROUP, uzavře MHMP novou smlouvu.
- Po převzetí pozemku trvá platnost smlouvy dalších 5 měsíců, není tedy nutná nová smlouva.
- Realizace přípojky bude v dubnu 2019, věcné břemeno bude řešeno až po ukončení stavby.

2/11 Přehled změnových listů :

Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

- Zakrytí oken pro následující práce
- Polystyren do aletážních spár
- Dodávka Al záruční pro Al dveře místo ocelových

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

č. NOZ 12

NOZ zpracoval: Jaroslav Hort

Datum: 29-07-2019

NOZ navazuje na:

OZ č. 12

PZ č.

PL č.:

Odesláno/předáno:

Projektant

TDS

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3
Podrobný výpočet viz rozpočet

Cena celkem bez DPH	6.944 Kč
DPH 21%	1.458,24 Kč
Cena celkem s DPH	8.402,24 Kč

Počet listů příloh: Cenová nabídka	8 listů
Výkresová část	0 listů
Technický popis	0 listy

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

6.944 Kč


šest tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

0 kalendářních dnů

Zpracováno

Datum:

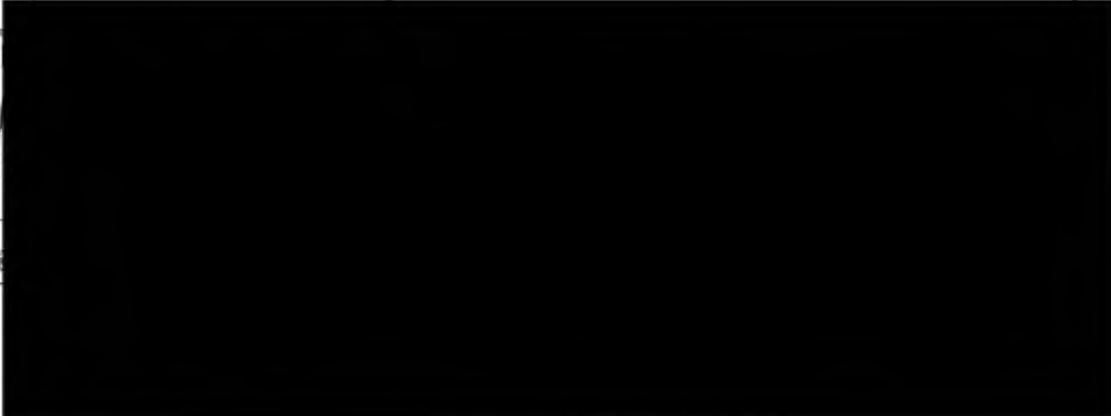

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:	18_01_KR_A1			
Stavba:	Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště			
JKSO:		CC-CZ:		
Místo:		Datum:		
Objednatel:		IČ:		
		DIČ:		
Zhotovitel:		IČ:	28169522	
Geosan Group a.s.		DIČ:	CZ28169522	
Projektant:		IČ:		
		DIČ:		
Zpracovatel:		IČ:		
		DIČ:		
Poznámka:				

Náklady z rozpočtů	6 944,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	6 944,00
<hr/>	
DPH základní 21,00% ze	6 944,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
zákl. přenesená 21,00% ze	0,00
sníž. přenesená 15,00% ze	0,00
nulová 0,00% ze	0,00
	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 402,24
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
 Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Geosan Group a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 944,00	6 944,00
SO 01	Základní škola	0,00	0,00
01.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00

4.



SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00
SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	6 944,00	6 944,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 944,00	6 944,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: Vytyčení geodet

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 21. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

6 944,00

1	HZS	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	16,000	434,00	6 944,00
---	-----	---------	---------------------------------	-----	--------	--------	----------

"opětovné přeměření oplocení stavby"

"zaměření a zpracování zprávy"

16

16,000

Celkem

6 944,00

8)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba

FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

č. OZ 13

Komu: Ing. Pavel Příkryl, ZAVOS s.r.o.

Datum: 29.7.2019

Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
-----------------------	------------	-----	--------

Týká se: SoD č. DIL/22/03/000379/2018

Odkazy: na specifikaci: Čl. 6.1. vícepráce

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy: Zápis z kontrolního dne č. 20 ze dne 06.2.2019
2/11

Kategorizace položek

ZMĚNA:

Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro spádové klíny pro dodávku materiálu v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci, proto dochází k navýšení, viz. výkaz výměr GP

Počet připojených listů specifikací: 7

Počet výkresů:

Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:

Jarosl
GEOS



Datum:

Toto Oz
Není te

u.

1/8 Ve výkazu výměr nejsou uvedeny výkopy pro ležatou kanalizaci pod základovou deskou. Stavba připraví ZL.

- Stavba připravuje příslušný ZL.
- Splněno , ZL byl schválen , bude obsaženo v dodatku k SOD č.2.

Zajistí : p.Hort , Ing Bryndová

2/9 Projektant vypracuje nabídku na PD inventáře – vybavení školy. V návaznosti na bod 1/9 bude mezi MČ , investorem a projektantem jednáno o dalším postupu.

- Trvá – nabídku vypracuje p. arch. Lang. Tato dodávka není součástí stavby , zajišťuje následný uživatel – MČ Zličín. Termín do 31.1.2019 – Trvá

3/9 Zástupci zhotovitele upozornili na nutnost řešení výběru zhotovitelů vybavení laboratoří učeben IT s dostatečným předstihem pro zajištění potřebné stavební připravenosti – napojovací body medií apod.

- Dne 17.1.2019 proběhlo jednání mezi projektantem, arch.Langem a ředitelkou ZŠ , při kterém byly specifikovány požadavky ředitelky ZŠ (jako budoucího uživatele) na úpravy projektu. Z jednání byl pořízen zápis , který tvoří přílohu tohoto zápisu.
- Při dnešním jednání KD bylo investorem oznámeno , že souhlasí s požadavky tohoto zápisu s výjimkou bodu 11) – zde bude provedena pouze příprava pro napojení spotřebičů , dodávka spotřebičů nebude investorem hrazena. Totéž platí i pro bod č. 5) – bude provedena příprava pro instalaci interaktivních tabulí a otázka dodávky těchto tabulí bude předmětem samostatného jednání mezi vedením MČ Praha –Zličín a investorem stavby INV MHMP.
- INV sepsal požadavek na dodávku interaktivních tabulí s odhadem nákladu a ten předal na odbor školství MHMP , který rozhodne. Informace na příštím KD.
- Odbor školství se zatím nevyjádřil , bude provedena urgence ze strany INV

2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku

- PVK nepožaduje , smlouva bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP.
- Protože končí platnost stávající smlouvy s CENTRAL GROUP , uzavře MHMP novou smlouvu.
- Po převzetí pozemku trvá platnost smlouvy dalších 5 měsíců , není tedy nutná nová smlouva. Věcné břemeno bude řešeno až po ukončení stavby.

2/11 Přehled změnových listů :

Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

- Omítky vnitřní
- SDK podhledy
- SDK předstěny
- PVC podlahy
- Obklady
- Dlažby
- KZS

- **Střecha – spádové klíny**
- **Komunikace**

Nově budou připraveny ZL na tyto práce a dodávky :

- Asfaltové pásy pro zdění AKU zdiva
- Kotvy pro napojení zdiva a ŽB konstrukcí
- Dodávka a montáž izolační vrstvy jako ukončení AKU zdiva u stropu
- Vylamovací výztuž ve sloupech
- Zimní opatření – zateplení a vytápění stavby

Nové ZL stavba zatím nepřipravuje.

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- *Ing Milota předložil dvě varianty řešení. Obratem je přeposle p. Kovářikovi a ten s nimi seznámí radu MČ a požádá o stanovisko. Informace na příštím KD.*
- *Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.*
- *Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.*
- *Nabídka na projekt byla předána , INV MHMP vystavil objednávku na realizaci.*
- *Po předání projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení*

**Zajistí : Ing Bryndová ,Ing Milota
Pí Mejvaldová**

2/13 Stavba upozornila na nesoulad horních úrovní stávajících kanalizačních šachet (4 ks) s předpokládanou výškou dle PD. Na tyto šachty se napojují vnitroareálové rozvody splaškové i dešťové kanalizace. Požadavek na investora , aby zajistil nápravu.


- *Ing Bryndová zajistila kontakt na zhotovitele CETUS PLUS , který je připraven provést úpravu (p.Janoušek , tel. 602 342 234). Stavba s CETUS PLUS jedná.*
- *Došlo k dohodě o realizaci úpravy, která bude zahájena po dokončení vsakovacího objektu. Informace na příštím KD.*

6/13 Pí Mejvaldová oznámí OŽPD MČ Praha 17 skutečnost , že k dnešnímu dni je na stavbě dokončen LAPOL tuků včetně revizní šachty.

- *Po jednání na stavebním úřadě bylo zjištěno , že v červnu 2019 bude nutné požádat o prodloužení stavebního povolení na vodní dílo*
- *Žádost o prodloužení stavebního povolení byla podána dne 30.1.2019.*

2/14 Na dnešní KD se dostavil p.arch. Lang a pí. ředitelka ZŠ a byl dohodnut postup při schvalování a vzorkování materiálů pro stavbu. Bylo dohodnuto :

- Pro výběr dlažeb a obkladů vypracují p.arch.Lang a pí.ředitelka ZŠ do 9.1.2019 tabulku místností s požadavkem na barvu dle vzorníku RAKO , který dnes stavba předala
- Podlahy : p.arch.Lang navrhne materiály pro jednotlivé prostory ze vzorníku TARKET a na KD dne 9.1.2019 předá stavbě
- Fasády : stavba předá do 20.12.2019 p.arch.Langovi vzorník a na KD 9.1.2019 bude určeno barevné řešení

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 13
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort		Datum: 29-07-2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 13	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet			
Cena celkem bez DPH		511.830,25 Kč	
DPH 21%		107.484,35 Kč	
Cena celkem s DPH		619.314,60 Kč	
Počet listů příloh: Cenová nabídka		5 listů	
Výkresová část		0 listů	
Technický popis		0 listy	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 511.830,25 Kč pět set jedenáct tisíc osm set třicet korun českých dvacet pět haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval: Jaroslav Hort (za ZŠ Zličín)			
Datum: 29-07-2019			

h.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
 IČO: CC-CZ:
 Město: Datum: 21.02.2018
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 28169522
 Geosan Group a.s. DIČ: CZ28169522
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů 511 830,25
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH **511 830,25**

DPH základní	21,00%	ze	511 830,25	107 484,35
zařízené	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesené	21,00%	ze	0,00	0,00
sněž. přenesené	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **619 314,60**
 v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Z
Vin
 Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

u.

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	511 830,25	511 830,25
SO 01	Základní škola	458 793,06	458 793,06
01.1	Architektonicko-stavební řešení	458 793,06	458 793,06
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace sílnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	53 037,19	53 037,19
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - sílnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasná komunikace	0,00	0,00

b.



SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		511 830,25	511 830,25



6.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: ZŠ Zličín
Část: Spádové klíny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zličín

Zpracoval:
Datum: 11. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	198,397	2 312,50	458 793,06

"dopočítání materiálu spádových klínů"

"oděřeno digitálně a dopočítáno v programu"304,01

304,010

"odečet dle původního VV"-109,503

-109,503

"koeficient množství 1,02"

Součet

194,507

Celkem

458 793,06

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: Trafostanice, Letní šatny
Část: Spádové klíny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zličín

Zpracoval:
Datum: 20. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	22,935	2 312,50	53 037,19

"dopočítání materiálu spádových klínů"

"oděřeno digitálně a dopočítáno v programu" 42,22

42,220

"odečet dle původního VV" -19,735

-19,735

"koeficient množství 1,02"

Součet

22,485


Celkem

53 037,19

u.

h)

1.1.1.1.1.29.7.2019

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 14	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.		Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018	
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce	
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 30 ze dne 17.4.2019 2/11	
	Kategorizace položek		
ZMĚNA:			
Po dokončení realizační projektové dokumentace a následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedený počet hliníkových výplní - dveří v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídá počtu hliníkových výplní- dveří v projektové dokumentaci, doplnění viz výkaz výměr GP.			
Počet připojených listů specifikací: 6		Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdilem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci			
ZPRAVIL			
Jaroslav GEOS			
			
Datum: 29.7.2019		Datum: 29.7.2019	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			

ZAVOS® s.r.o.
Vinebná 111 100 516
120 00 Praha 2

h.

3) KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO KD

- 2/1 Dne 11.9.2018 proběhlo jednání na odboru územního plánu ÚMČ P 17, na kterém ze strany ÚP vznikly požadavky na úpravu PD (hřiště). Pí Bryndová a pí Mejvaldová budou o těchto požadavcích informovat GP.
- *K dispozici je většina vyjádření orgánů k návrhu projektu. Projektant závěry vyjádření zpracuje do čistopisu PD – termín do 31.3.2019. Pí Mejvaldová následně předá na stavební úřad.*
 - *Projektant předá čistopis PD, pí Mejvaldová předá na stavební úřad.*
- 1/2 , 3/9 , 2/14 , 2/22 , 5/22 : Otázka vzorkování materiálů , barevného řešení a požadavků budoucího uživatele stavby na změny a úpravy projektu byly řešeny v materiálu , který vypracoval Ing.arch.Lang ve spolupráci s ředitelkou ZŠ Mgr Šimáčkovou. Tento materiál byl předán generálnímu projektantovi stavby a ten technické věci zpracovává do PD , další podklady jako barevné řešení , spárořezy a podobně předá stavbě. Další vzorkování a výběr materiálů bude probíhat průběžně s postupem stavby – vždy v potřebném předstihu a bude předmětem jednání dalších KD stavby. V otázce interaktivních tabulí bude provedena potřebná stavební příprava , o dodávce tabulí bude dál probíhat jednání mezi MHMP a MČ Praha – Zličín. O jednání budou na dalších KD podávány průběžné informace.
- *Stavba požaduje definitivní rozhodnutí do 31.5.2019 – to je nejzazší termín pro objednání tabulí dle PD a SOD.*
 - *Byla podána žádost na MHMP o povolení záměny keramických tabulí za dodání interaktivních tabulí v ceně keramických , zbývající tabule by uhradila MČ ze svých prostředků. Zatím bez odpovědi.*
 - *Pí Mejvaldová zjistí na stavebním úřadu , zda je ke kolaudaci požadována dodávka a osazení tabulí*
 - *Hygienu dodávku tabulí ke kolaudaci nepožaduje*
 -
- 1/6 OSI prověří s PPD postup pro uzavření Dohody o provozování plynovodu a zajistí uzavření této dohody. ZAVOS zruší smlouvu o přípojce a následně uzavře Dohodu o provozování a budoucí Smlouvu kupní.
- *Nájemní smlouva mezi CENTRAL GROUP a MHMP na vybudování přípojky je uzavřena*
 - *Smlouva s PP a.s. o připojení je připravena a bude uzavřena po vybudování přípojky*
- 2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku
- *PVK nepožaduje , smlouva o věcném břemenu bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP – a bude uzavřena po vybudování přípojky*
 -
- 2/11 Přehled změnových listů :
- Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

Nově se připravuje ZI na víceúčelové na VZT.

Stavba upravená, je nejistou v rozpočtu protipožární úpravy ÚT a VZT – projektant do 9.3.2019 předá stavbě výměry pro ocenění.

Dále stavba připraví ZI na 5 ks hliníkových dveří v DC 2, které nejsou v rozpočtu

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- *Ing Milota předložil dvě varianty řešení.*
 - *Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.*
 - *Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.*
 - *Projektant vypracuje projekt ve dvou částech :*
 - 1.část - bude sloužit pro projednání – termín do 31.3.2019
 - 2.část - bude projekt pro realizaci stavby - termín : po základním projednání
- Po předání 1.části projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení*
- *1.část projektu byla předána , projekt byl rozaslán k připomínkovému řízení a čeká se na vyřízení*

2/17 Vzhledem k pozdnímu předání stavebního povolení v právní moci na změnu stavby před jejím dokončením dojde ke změně SOD – dojde ke změně termínů milníků č. 1 a č.2 a konečného termínu. Zhotovitel připraví návrh dodatku č.2 , který bude obsahovat změnu termínu a ZL .

- *Splněno , návrh dodatku k SOD předán na ZAVOS , Ing Píkrýl projedná s MGMP a zhotovitelem.*
- *Návrh dodatku byl projednán , zhotovitel vypracuje čistopis dodatku a předá ke schválení.*

Dodatek k SOD byl podepsán zástupci GG a ZAVOS a předán na MHMP. Nyní projde schvalovacím procesem – schvalovací proces probíhá.

Schvalovací proces je před koncem , k podpisu dojde do 20.4.2019.

SOD je před podpisem , případné zdržení bude z důvodu procesu MHMP.

1/19 Stavba vznesla připomínku k projektu elektro, projektant řeší. Informace na dalších KD.

- *Projektant připomínku uznal a předá stavbě řešení – urychleně.*
- *Projektant elektro zpracovává změnu PD, kterou předá stavbě.*
Termín : 31.3.2019.
- *Zatím nepředána , projektant je v kontaktu s dodavatelem elektro a vzájemně řeší detaily.*
- *Tento stav trvá i nadále , zatím není na překážku postupu stavby.*

2/21 Byla řešena otázka servisních smluv . Stavba vyžádá návrhy servisních smluv od svých subdodavatelů a předá je k posouzení následnému uživateli stavby.

Zhotovitel zadal požadavek na své subdodavatele , návrhy smluv bude postupně předávat uživateli.

- *Jako první byl předán návrh servisní smlouvy na výtah , ostatní budou předávány postupně dle průběhu stavby.*

Trvá

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba	FO 2
-------------------------------	------

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY	č. NOZ 14
-------------------------------	------------------

NOZ zpracoval: Jaroslav Hort	Datum: 29-07-2019
------------------------------	-------------------

NOZ navazuje na:	OZ č. 14	PZ č.	PL č.:
------------------	----------	-------	--------

Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně
-------------------	------------	-----	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3
Podrobný výpočet viz rozpočet

Cena celkem bez DPH	310.975,10 Kč
DPH 21%	65.304,77 Kč
Cena celkem s DPH	376.279,87 Kč

Počet listů příloh: Cenová nabídka	4 listů
Výkresová část	0 listů
Technický popis	0 listy

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):
310.975,10 Kč
tři sta deset tisíc devět set sedmdesát pět korun českých deset haléřů
(bez DPH)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:
0 kalendářních dnů

Zpra
Dat



u.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Průběh: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
Objednatel: CC-CZ:
Datum: 21.02.2018
Zhotovitel: IC:
DIČ: 28169522
Geosan Group a.s. DIČ: CZ28169522
Projektant: IC:
DIČ:
Zpracovatel: IC:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	310 975,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	310 975,10
DPH základní 21,00% ze 310 975,10	65 304,77
snížení 15,00% ze 0,00	0,00
základ, přenesení 21,00% ze 0,00	0,00
snížení, přenesení 15,00% ze 0,00	0,00
celkem 0,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	376 279,87

Projektant

Datum a podpis

Objednavatel

**ZŠ
Vino
12**

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

u.

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Geosan Group a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	310 975,10	376 279,87
SO 01	Základní škola	310 975,10	376 279,87
01.1	Architektonicko-stavební řešení	310 975,10	376 279,87
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00

6.

SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		310 975,10	376 279,87



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: Hliníkové dveře

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				310 975,10
		767	Konstrukce zámečnické				310 975,10
436	R	76771119R	Montáž hliníkových prosklených stěn	m2	4,453	4 056,39	18 063,10
			"doplnění dveří H16 dle výkresu a tabulky specifikací"				
			2,15*2,071		4,453		
442		553417H16	<i>hliníková prosklená stěna s dveřmi 2084x2530 mm, více vrstevnaté bezpečnostní sklo z PO EI30 DP1-C, Sm, otevíravé, rámová hliníková zárubeň, nátěr bílý - H16</i>	KUS	1,000	292 912,00	292 912,00
			1		1,000		
Celkem							310 975,10

4)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 15	
Komu: Ing. Pavel Příklad, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 34 ze dne 22.5.2019 2/11		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
Na základě návrhu změny vyvolané provozovatelem, dochází v učebnách první a druhé třídy k záměně podlahové krytiny v zadní části místnosti. Jedná se o náhradu povlakových krytin Forbo za Flotex (sametový vinyl textilní), viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 5			Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOV				
Jaroslav GEOSAN				
Datum:				
Toto Oznámení Není tedy				

6.

- 2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku
- PVK nepožaduje, smlouva o věcném břemenu bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP – a bude uzavřena po vybudování přípojky
 - Stavba objemně vodovodních štolami, po jejím dokončení budou zahájeny práce na přípojce
 - Šedota bude sříznuta včetně přípojky na přípojku

2/11 Přehled změnových listů :

Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

Stavba připravuje změnové listy na :

- Přípravu pro instalaci 3 ks myček nádobí- dle bodu 1/31
- Změny v projektu slaboproudu – dle bodu 1/19

A nově na :


- Betonáž prostupů po instalacích v podlažích
- Podlahy ve 4 učelnách z FLOTEXU.

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- Ing Milota předložil dvě varianty řešení.
- Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.
- Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.
- Projektant vypracuje projekt ve dvou částech :
 - 1.část - bude sloužit pro projednání – termín do 31.3.2019
 - 2.část - bude projekt pro realizaci stavby - termín : po základním projednání
- Po předání 1.části projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení
- 1.část projektu byla předána, projekt byl rozeslán k připomínkovému řízení a čeká se na vyjádření
- Stanoviska orgánů průběžně přicházejí, chybí HZS, HS, PVS a odbor krizového řízení MHIAP. Pí Mejvaldová provede urgenci. Až po získání těchto vyjádření lze zahájit práce na 2.části projektu
- Bylo rozhodnuto, že stavba provede přípravu pro parkování dle upravené PD, tedy i s novými parkovacími místy

1/19 Stavba vznesla připomínku k projektu elektro, projektant řeší. Informace na dalších KD.

- Projektant připomínku uznal a předá stavbě řešení – urychleně.
- Projektant elektro zpracovává změnu PD, kterou předá stavbě. Termín : 31.3.2019.
- Byla předána část slaboproudu, za provozu se řeší poslední problémy silnoproudé části (rozvaděče, osvětlení schodišť). Nebrání pokračování prací.
- Část silnoproudu je zpracovaná a bude předána stavbě nejpozději do KD č.33 – zatím nesplněno, projektant dál řeší některé sporné body
- Zatím nepředáno, řeší se ještě otázka osvětlení schodišť, stavbu však tato záležitost nebrzdí

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 15
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort		Datum: 29 -07- 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 15	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet			
Cena celkem bez DPH		84.304,89 Kč	
DPH 21%		17.704,03 Kč	
Cena celkem s DPH		102.008,92 Kč	
Počet listů příloh: Cenová nabídka		4 listů	
Výkresová část		0 listů	
Technický popis		0 listy	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 84.304,89 Kč osmdesát čtyři tisíc tři sta čtyři korun českých osmdesát devět haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval:			
Datum: 29-07-2019			

u.

List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č. 41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
JKSO: CC-CZ:
Město: Datum: 21.02.2018
Objednavatel: IČ:
D.Č.:
Zhotovitel: Geosan Group a.s. IČ: 28169522
D.Č.: CZ28169522
Projektant: IČ:
D.Č.:
Zpracovatel: IČ:
D.Č.:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů 84 304,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 84 304,89

DPH základní	21,00%	ze	84 304,89	17 704,03
snižené	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
na jiné	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 102 008,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Objednavatel

Z
V
Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41 170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	84 304,89	102 008,92
SO 01	Základní škola	84 304,89	102 008,92
01.1	Architektonicko-stavební řešení	84 304,89	102 008,92
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapoj	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: FLOTEX

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 5. 2019


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				84 304,89
776			Podlahy povlakové				84 304,89
2	776	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem "Odečet dle původního VV" 20,34+20,34+20,34+20,19	m2	81,210	-165,20	-13 415,89
					81,210		
3		28411052R	díl. vinylové tl.3,0 mm,nášlep.vrstva 0,70 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bř S1,bez řtalátů	m2	93,392	-435,42	-40 664,74
			81,21 * 1,15		93,392		
4	776	776241121	Lepení pásů ze sametového vinylu (20,34+20,34+20,34+20,19)	m2	81,210	138,00	11 206,98
					81,210		
1	284	28411064.BSE	Flotex Linear sametový vinyl textilní vyrobený systémem vložkování, tloušťka 5,30mm, vlákno 100% Nylon 6.6, hustota min. 70mil./m2, útlum 19dB, protiskuz > R10, Bř-s1, zátěž 33, antibakteriální úprava	m2	93,392	1 360,00	127 013,12
5	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,392	422,00	165,42

Celkem

84 304,89



j)

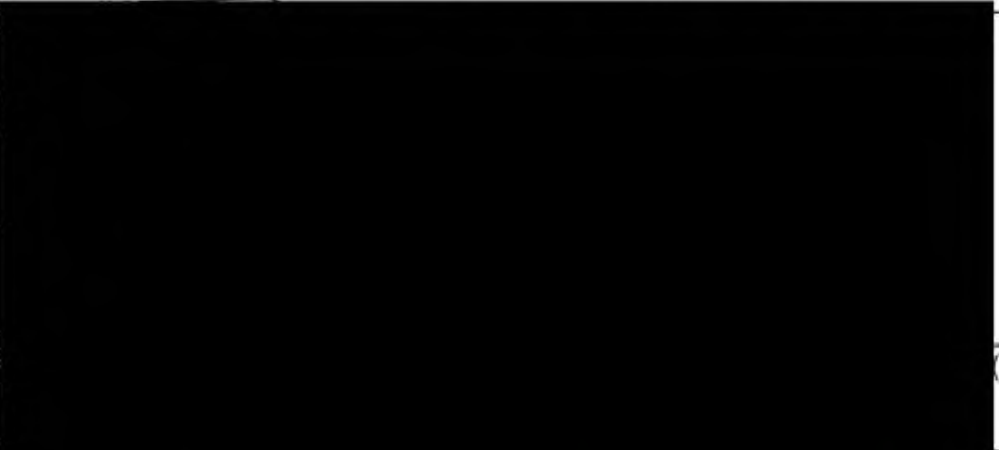Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 16	
Komu: Ing. Pavel Přikryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Dohoda z kontrolního dne č. 27 ze dne 27.3.2019		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
Na základě požadavku budoucího uživatele, byla vyměněna prosklená stěna do místnosti číslo 212 - sborovny za zděnou příčku, viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 4			Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVANÉ				
Jaroslav GEOSAN				
Datum:				
Toto Oznámení změny Není tedy	(NOZ).			

Vin... 2016
130 Da Pr... 2016

6.

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 16	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 29-07-2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 16	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		-140.019,88 Kč		
DPH 21%		-29.404,17 Kč		
Cena celkem s DPH		-169.424,05 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 4 listů Výkresová část 0 listů Technický popis 0 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): -140.019,88 Kč jedno sto čtyřicet tisíc devatenáct korun českých osmdesát osm haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: 				

h.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
 ÚSO: CC-02:
 Město: Datum: 21.02.2018
 CC-02:
 CC-02:
 Zhotovitel: IČ: 28169522
Geosan Group a.s. DIČ: CZ28169522
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-140 019,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-140 019,88
DPH základní 21,00%	-140 019,88
DPH snížená 15,00%	0,00
DPH zvl. převedená 21,00%	0,00
DPH sč. převedená 15,00%	0,00
DPH nulové 0,00%	0,00
Cena s DPH	-169 424,05

Projektant

Datum a

Objednatel

ZA
 Výstavba
 120

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

u.

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:


Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-140 019,88	-169 424,05
SO 01	Základní škola	-140 019,88	-169 424,05
01.1	Architektonicko-stavební řešení	-140 019,88	-169 424,05
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasná komunikace	0,00	0,00

6.

SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-140 019,88	-169 424,05

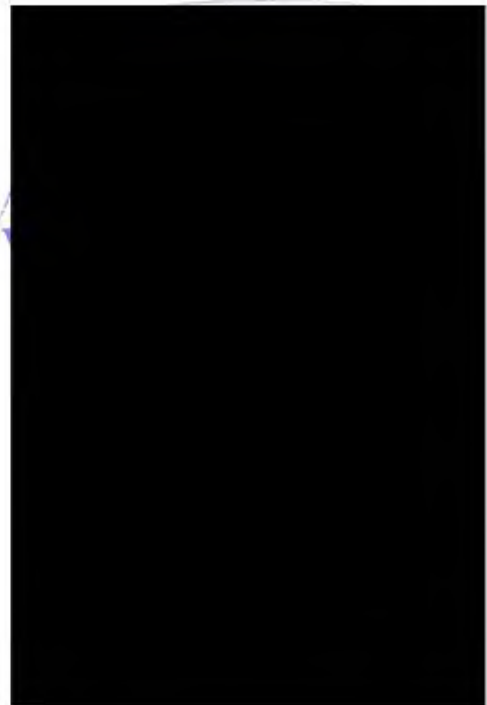

6.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Stěna do sborovny

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
449	R	76771119R	Montáž hliníkových prosklených stěn (0,5+2,524+0,5)*3,58	m2	12,616	-4 056,39	-51 175,42
					12,616		
448		553417H24	hliníková prosklená stěna 500+2524+500x3580 mm, více vrstevnaté bezpečnostní sklo tvrzené, pevné zasklení, rámová hliníková zárubeň, nátěr bílý - H24	KUS	1,000	-96 148,70	-96 148,70
450	R	7866271R1	D+M vnitřní vertikální žaluzie (sborovna, okno na chodbu) 2500x3150 mm - V36 *dle PD*1	KUS	1,000	-2 302,30	-2 302,30
					1,000		

HSV Práce a dodávky HSV 9 606,54

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 660,23

451	011	11238131	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC 3,195*3,7+0,35*3,7*2	m2	14,412	574,60	8 281,14
					14,412		
452	011	346961111	Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží 3,195+0,35*2	m	3,895	30,00	116,85
					3,895		
453	011	346971111	Izolace mezi příčky proti šíření zvuku lepenkou nepřiskovanou (3,195+0,35*2)*0,25	m2	0,974	40,50	39,45
					0,974		
454	011	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z lepenky š přes 250 mm 3,195+0,35*2	m	3,895	57,20	222,79
					3,895		

998 Přesun hmot 946,31

455	011	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	3,953	239,39	946,31
-----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem -140 019,88

k)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 17	
Komu: Ing. Pavel Přikryl, ZAVOS s.r.o.		Datum: 29.7.2019		
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 30 ze dne 17.4.2019 2/11		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
V rámci realizační projektové dokumentace byly doplněny technologie VZT -tlumiče hluku a chlazení servoven, typ po dohodě s projektantem, viz výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 6			Počet výkresů:	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVANÉ				
Jaroslav H GEOSAN				
Datum: 29.7.2019				
Toto Oznámení změny Není tedy P				

u.

3) KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO KD

- 2/1 Dne 11.9.2018 proběhlo jednání na odboru územního plánu ÚMČ P 17, na kterém ze strany ÚP vznikly požadavky na úpravu PD (hřiště). Pí Bryndová a pí Mejvaldová budou o těchto požadavcích informovat GP.
- *K dispozici je většina vyjádření orgánů k návrhu projektu. Projektant závěry vyjádření zpracuje do čistopisu PD – termín do 31.3.2019. Pí Mejvaldová následně předá na stavební úřad.*
 - *Projektant předal čistopis PD, pí Mejvaldová předá na stavební úřad.*
- 1/2, 3/9, 2/14, 2/22, 5/22 : Otázka vzorkování materiálů, barevného řešení a požadavků budoucího uživatele stavby na změny a úpravy projektu byly řešeny v materiálu, který vypracoval Ing.arch.Lang ve spolupráci s ředitelkou ZŠ Mgr Šimáčkovou. Tento materiál byl předán generálnímu projektantovi stavby a ten technické věci zpracovává do PD, další podklady jako barevné řešení, spárořezy a podobně předá stavbě. Další vzorkování a výběr materiálů bude probíhat průběžně s postupem stavby – vždy v potřebném předstihu a bude předmětem jednání dalších KD stavby. V otázce interaktivních tabulí bude provedena potřebná stavební příprava, o dodávce tabulí bude dále probíhat jednání mezi MHMP a MČ Praha – Zličín. O jednání budou na dalších KD podávány průběžné informace.
- *Stavba požaduje definitivní rozhodnutí do 31.5.2019 – to je nejzazší termín pro objednání tabulí dle PD a SOD.*
 - *Byla podána žádost na MHMP o povolení záměny keramických tabulí za dodání interaktivních tabulí v ceně keramických, zbývající tabule by uhradila MČ ze svých prostředků. Zatím bez odpovědi.*
 - *Pí Mejvaldová zjistí na stavebním úřadu, zda je ke kolaudaci požadována dodávka a osazení tabulí*
 - *Hygienu dodávky tabulí ke kolaudaci nepožaduje*
 -
- 1/6 OSI prověří s PPD postup pro uzavření Dohody o provozování plynovodu a zajistí uzavření této dohody. ZAVOS zruší smlouvu o přípojce a následně uzavře Dohodu o provozování a budoucí Smlouvu kupní.
- *Nájemní smlouva mezi CENTRAL GROUP a MHMP na vybudování přípojky je uzavřena*
 - *Smlouva s PP a.s. o připojení je připravena a bude uzavřena po vybudování přípojky*
- 2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku
- *PVK nepožaduje, smlouva o věcném břemenu bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP – a bude uzavřena po vybudování přípojky*
 -
- 2/11 Přehled změnových listů :
- Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

Nově se připravuje ZL na vícepráce na VZT.

Stavba upozornila , že nejsou v rozpočtu protipožární ucpávky ÚT a VZT – projektant do 9.5.2019 předá stavbě výměry pro ocenění.

Dále stavba připraví ZL na 1 ks hliníkových dveří v DC 2 , které nejsou v rozpočtu

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- Ing Milota předložil dvě varianty řešení.
- Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.
- Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.
- Projektant vypracuje projekt ve dvou částech :
1.část - bude sloužit pro projednání – termín do 31.3.2019
2.část - bude projekt pro realizaci stavby - termín : po základním projednání
Po předání 1.části projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení
- 1.část projektu byla předána , projekt byl rozeslán k připomínkovému řízení a čeká se na vyjádření

2/17 Vzhledem k pozdnímu předání stavebního povolení v právní moci na změnu stavby před jejím dokončením dojde ke změně SOD – dojde ke změně termínů milníků č. 1 a č.2 a konečného termínu. Zhotovitel připraví návrh dodatku č.2 , který bude obsahovat změnu termínu a ZL .

- Splněno , návrh dodatku k SOD předán na ZAVOS , Ing Příklad projedná s MGMP a zhotovitelem.
- Návrh dodatku byl projednán , zhotovitel vypracuje čistopis dodatku a předá ke schválení.

Dodatek k SOD byl podepsán zástupci GG a ZAVOS a předán na MHMP. Nyní projde schvalovacím procesem – schvalovací proces probíhá.

Schvalovací proces je před koncem , k podpisu dojde do 20.4.2019.

SOD je před podpisem , případné zdržení bude z důvodu procesu INV MHMP.

1/19 Stavba vnesla připomínku k projektu elektro, projektant řeší. Informace na dalších KD.

- Projektant připomínku uznal a předá stavbě řešení – urychleně.
- Projektant elektro zpracovává změnu PD, kterou předá stavbě.
Termín : 31.3.2019.
- Zatím nepředáno , projektant je v kontaktu s dodavatelem elektro a vzájemně řeší detaily.
- Tento stav trvá i nadále , zatím není na překážku postupu stavby.

2/21 Byla řešena otázka servisních smluv . Stavba vyžádá návrhy servisních smluv od svých subdodavatelů a předá je k posouzení následnému uživateli stavby.

Zhotovitel zadal požadavek na své subdodavatele , návrhy smluv bude postupně předávat uživateli.

- Jako první byl předán návrh servisní smlouvy na výtah , ostatní budou předávány postupně dle průběhu stavby.

Trvá

Kj

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 17	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 29-07-2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 17	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p>(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		794.701,57 Kč		
DPH 21%		166.887,33 Kč		
Cena celkem s DPH		961.588,90 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 4 listů Výkresová část 0 listů Technický popis 0 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 794.701,57 Kč sedm set devadesát čtyři tisíc sedm set jedna korun českých padesát sedm haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracováno				
Datum:				

6.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.02.2018
Objednatel: IČ:
DiČ:
Zhotovitel: IČ: 28169522
Geosan Group a.s. DiČ: CZ28169522
Projektant: IČ:
DiČ:
Zpracovatel: IČ:
DiČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	794 701,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	794 701,57
DPH základní 21,00% ze 794 701,57	166 887,33
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
zákl. přenesená 21,00% ze 0,00	0,00
sníž. přenesená 15,00% ze 0,00	0,00
rotová 0,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	961 588,90

Projektant

Zpracovatel


PROJEKT
SOKO
184

Datum a podpis

Objednavatel

Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	794 701,57	794 701,57
SO 01	Základní škola	794 701,57	794 701,57
01.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	794 701,57	794 701,57
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasná komunikace	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: ZŠ Zličín
Část: VZT

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zličín

Zpracoval:
Datum: 11. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Tlumiče a chlazení				794 701,57
1	R	751122	D+M chlazení do rozvodoven a serveroven	kpl	1,000	353 528,00	353 528,00
2	R	751123	D+M Buňkový tlumič 400x100/1500	ks	59,000	3 995,03	235 706,77
			"Die PD"				
			59		59,000		
3	R	751124	D+M Buňkový tlumič 300x100/1500	ks	8,000	5 295,50	42 364,00
			"Die PD"				
			8		8,000		
4	R	751125	D+M Protihluková izolace tl. 20mm	m2	280,000	582,51	163 102,80
			"Die PD"				
			280		280,000		
Celkem							794 701,57



Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 18	
Komu: Ing. Pavel Příkryl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 34 ze dne 22.5.2019 2/11		
	Kategorizace položek			
ZMĚNA:				
Jedná se o doplnění realizační projektové dokumentace o zabetonování prostupů pro instalace mezi patry 1.NP- 4.NP, jež oddělují požární úseky od sebe, které nebylo v PD ani ve VV řešeno.				
Počet připojených listů specifikací: 5			Počet výkresů: 0	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVAL:		PŘEVZAL:		
Jaroslav H GEOSAN G				
Datum: 29				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

ZAVOS® s.r.o.
Vineňská 100 2516
120 00 Praha 2 ©

u

- 2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku
- PVK nepožaduje, smlouva o věcném břemenu bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP – a bude uzavřena po vybudování přípojky
 - Stavba objednala vodoměrnou šachtu, po jejím dodání budou zahájeny práce na přípojce
 - Šachta bude dodána do týdne, zahajují se přípravné práce

2/11 Přehled změnových listů :

Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

Stavba připravuje změnové listy na :

- Přípravu pro instalaci 3 ks myček nádobí- dle bodu 1/31
- Změny v projektu slaboproudu – dle bodu 1/19

A nově na :

- Betonáž prístupů po instalacích v podlažích
- Podlahy ve 4 učebnách z FLOTEKU.

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- Ing Milota předložil dvě varianty řešení.
- Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.
- Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.
- Projektant vypracuje projekt ve dvou částech :
 - 1.část - bude sloužit pro projednání – termín do 31.3.2019
 - 2.část - bude projekt pro realizaci stavby - termín : po základním projednání
- Po předání 1.části projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení
- **1.část projektu byla předána, projekt byl rozeslán k připomínkovému řízení a čeká se na vyjádření**
- Stanoviska orgánů průběžně přicházejí, chybí HZS, HS, PVS a odbor krizového řízení MHMP. Pí Mejvaldová provede urgenci. Až po získání těchto vyjádření lze zahájit práce na 2.části projektu
- Bylo rozhodnuto, že stavba provede přípravu pro parkování dle upravené PD, tedy i s novými parkovacími místy

1/19 Stavba vznesla připomínku k projektu elektro, projektant řeší. Informace na dalších KD.

- Projektant připomínku uznal a předá stavbě řešení – urychleně.
- Projektant elektro zpracovává změnu PD, kterou předá stavbě.
Termín : 31.3.2019.
- Byla předána část slaboproudu, za provozu se řeší poslední problémy silnoproudé části (rozvaděče, osvětlení schodišť). Nebrání pokračování prací.
- Část silnoproudu je zpracovaná a bude předána stavbě nejpozději do KD č.33 – zatím nesplněno, projektant dál řeší některé sporné body
- Zatím nepředáno, řeší se ještě otázka osvětlení schodišť, stavbu však tato záležitost nebrzdí

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 18	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 29-07-2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 18	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		168.435,00 Kč		
DPH 21%		35.371,35 Kč		
Cena celkem s DPH		203.806,35 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 4 listů Výkresová část 0 listů Technický popis 0 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 168.435,00 Kč jedno sto šedesát osm tisíc čtyři sta třicet		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval:				
Datum:				

h.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
JKSC: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.02.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 28169522
Geosan Group a.s. DIČ: CZ28169522
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	168 435,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	168 435,00
DPH: základní 21,00%	ze 168 435,00 35 371,35
snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
zákl. přenesená 21,00%	ze 0,00 0,00
sníž. přenesená 15,00%	ze 0,00 0,00
celková 0,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 203 806,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a p

Objednav

V
Datum a p

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Uc

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:


Projektant:

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	168 435,00	0,00
SO 01	Základní škola	168 435,00	0,00
01.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapoi	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasná komunikace	0,00	0,00

u.



SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenni a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		168 435,00	0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín

Objekt: ZŠ Zličín

Část: Zabetonování prostupů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				168 435,00
4			Vodorovné konstrukce				168 435,00
8	R	41132141R	Zabetonování prostupů "zabetonování prostupů včetně izolace"	Kpl	57,000	2 955,00	168 435,00
			57		57,000		
			Celkem				168 435,00

m)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 19	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.		Datum: 29.7.2019		
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 27 ze dne 27.3.2019 2/11		
	Kategorizace položek			
ZMĚNA: Na základě požadavku budoucího provozovatele byly rozšířeny čistící zóny a to u hlavního vstupu do budovy, dále do prostor školní kuchyně a jídelny a letních šaten, viz. výkaz výměr GP.				
Počet připojených listů specifikací: 5		Počet výkresů:		
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVÁ				
Jaroslav Ho				
GEOSAN G				
(z				
Datum: 29.7.2019		Datum: 29.7.2019		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

6.

2/11 Přehled změnových listů :

Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

Nově se připravuje ZL na vícepráce na VZT.

5/11 Na základě požadavku MČ a Investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- Ing Milota předložil dvě varianty řešení.
 - Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.
 - Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.
 - Projektant vypracuje projekt ve dvou částech :
 - 1.část - bude sloužit pro projednání – termín do 31.3.2019
 - 2.část - bude projekt pro realizaci stavby - termín : po základním projednání
- Po předání 1.části projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení
- Zhotovitel zpracuje do příštího týdne cenovou rozvahu – odhad nákladů podle podkladů, které mu předal projektant.
 - Splněno , cenový odhad nákladů byl stavbou předložen a předán investorovi

2/17 Vzhledem k pozdnímu předání stavebního povolení v právní moci na změnu stavby před jejím dokončením dojde ke změně SOD – dojde ke změně termínů milníků č. 1 a č.2 a konečného termínu. Zhotovitel připraví návrh dodatku č.2 , který bude obsahovat změnu termínu a ZL .

- Upřesnění konečného termínu a posun termínů milníků bude součástí Dodatku k SOD . Stavba s investorem doladí text dodatku do 31.1.2019.
- Splněno , návrh dodatku k SOD předán na ZAVOS , Ing Pířkryl projedná s MGMP a zhotovitelem.
- Návrh dodatku byl projednán , zhotovitel vypracuje čistopis dodatku a předá ke schválení.

Dodatek k SOD byl podepsán zástupci GG a ZAVOS a předán na MHMP. Nyní projde schvalovacím procesem – schvalovací proces probíhá.

Zástupce INV MHMP provede urgenci na urychlené uzavření schvalovacího procesu a podpisu dodatku k SOD

2/18 Zhotovitel vznesl požadavek na projektanta na upřesnění některých technických věcí.

Splněno , vyjádření projektanta bylo předáno.

Bylo dohodnuto , že k bodu 8) – hmoždinky do fasádního zateplovacího systému , zajistí zhotovitel u svého subdodavatele vyčíslení nákladu na případné použití zápuštěných hmoždinek.

Zápuštěné hmoždinky představují navýšení ceny o cca 200 tis. Kč. Stavba zajistí odborné stanovisko, které doporučí tyto hmoždinky s ohledem na barevnost fasády. Stanovisko firmy BAUMIT bylo dnes předáno včetně fotodokumentace. Materiál bude obratem předán investorovi s žádostí o závěrečné stanovisko.

Zástupce INV MHMP do příštího KD předá definitivní stanovisko vedení IVN k této záležitosti.

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 19
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort		Datum: 29 -07- 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 19	PZ č.	PL č.:
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p style="text-align: center;">(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet			
Cena celkem bez DPH		236.205,54 Kč	
DPH 21%		49.603,16 Kč	
Cena celkem s DPH		285.808,70 Kč	
Počet listů příloh:			
Cenová nabídka		4 listů	
Výkresová část		0 listů	
Technický popis		0 listy	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 236.205,54 Kč dvě stě třicet šest tisíc dvě stě pět korun českých padesát čtyři haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracov	[REDACTED]		
Datum:			

6.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
JKSP: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.02.2018
Objednatel: IČ:
 DiČ:
Zhotovitel: IČ: 28169522
Geosan Group a.s. DiČ: CZ28169522
Projektant: IČ:
 DiČ:
Zpracovatel: IČ:
 DiČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů 236 205,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 236 205,54

DPH základní	21,00%	ze	236 205,54	49 603,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
si.ř. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
základní	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 285 808,70

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis

Objednavatel

ZŠ
Vin
Datum a podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

h.

Kód: 18_01_KR_A1

Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Geosan Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		236 205,54	285 808,70
SO 01	Základní škola	236 205,54	285 808,70
01.1	Architektonicko-stavební řešení	236 205,54	285 808,70
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00
SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00

SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		236 205,54	285 808,70



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Čistící zóny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 6. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 236 205,54

767 Konstrukce zámečnické 236 205,54

1	767	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	24,271	295,20	7 164,80
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"doplnění rohoží u vstupu"

1,8*5,75+5,75*1,295

17,796

1,5*1,85+2*1,85

6,475

Součet

24,271

2	69752001R	69752001R	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	14,050	8 568,00	120 380,40
---	-----------	-----------	---	----	--------	----------	------------

"navýšení VV klientská změna"

2*1,85

3,700

1,8*5,75

10,350

Součet

14,050

3	69752002R	69752002R	rohož dočistřovací provedení hliník standard 27 mm	m2	10,221	8 568,00	87 573,53
---	-----------	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"navýšení VV klientská změna"

1,5*1,85

2,775

5,75*1,295

7,446

Součet

10,221

4	767	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	49,780	57,60	2 867,33
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

"doplnění rohoží u vstupu"

2+2*1,85+1,85+1,85+1,85+1,5+1,5

14,400

1,8+1,8+1,8+1,8+5,75+5,75

18,700

1,295+1,295+1,295+1,295+5,75+5,75

16,680


Součet

49,780

5	697521600	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30 - Al	m	49,780	366,00	18 219,48
---	-----------	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem 236 205,54

n)

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ 20	
Komu: Ing. Pavel Píkrýl, ZAVOS s.r.o.			Datum: 29.7.2019	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS		osobně
Týká se:		SoD č. DIL/22/03/000379/2018		
Odkazy:	na specifikaci:	Čl. 6.1. vícepráce		
	na výkresy:			
	na rozp. podklady:			
	na jinou část smlouvy:	Zápis z kontrolního dne č. 20 ze dne 6.2.2019, a č. 22 ze dne 20.2.2019 2/11		
Kategorizace položek				
ZMĚNA:				
<p>Na základě armovacích výkresů a statických výpočtů, došlo k upřesnění projektové dokumentace. Při následné kontrole se zadávací dokumentací a smluvním výkazem výměr, došlo ke zjištění, že uvedené výměry pro monolit v zasmluvněném výkazu výměr neodpovídají projektové dokumentaci, proto dochází k navýšení výměr. Tato skutečnost se promítla i u zvětšení objemu betonových konstrukcí viz výkaz výměr generálního projektanta.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 12			Počet výkresů: 0	
Oznámení změny je vyvoláno: Rozdílem mezi zadávací dokumentací a dokumentací pro realizaci.				
ZPRACOVAN				
Jaroslav Píkrýl GEOSAN				
Datum: 29.7.2019				
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

h.

- Střecha – spádové klíny
- Komunikace

Nově budou připraveny ZL na tyto práce a dodávky :

- Asfaltové pásy pro zdění AKU zdiva
- Kotvy pro napojení zdiva a ŽB konstrukcí
- Dodávka a montáž izolační vrstvy jako ukončení AKU zdiva u stropu
- Vylamovací výztuž ve sloupech
- Zimní opatření – zateplení a vytápění stavby

Nové ZL stavba zatím nepřipravuje.

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- *Ing Milota předložil dvě varianty řešení. Obratem je přepošle p. Kováříkovi a ten s nimi seznámí radu MČ a požádá o stanovisko. Informace na příštím KD.*
- *Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.*
- *Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.*
- *Nabídka na projekt byla předána , INV MHMP vystavil objednávku na realizaci.*
- *Po předání projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení*

**Zajistí : Ing Bryndová ,Ing Milota
Pí Mejvaldová**

2/13 Stavba upozornila na nesoulad horních úrovní stávajících kanalizačních šachet (4 ks) s předpokládanou výškou dle PD. Na tyto šachty se napojují vnitroareálové rozvody splaškové i dešťové kanalizace. Požadavek na investora , aby zajistil nápravu.

- *Ing Bryndová zajistila kontakt na zhotovitele CETUS PLUS , který je připraven provést úpravu (p.Janoušek , tel. 602 342 234). Stavba s CETUS PLUS jedná.*
- *Došlo k dohodě o realizaci úpravy, která bude zahájena po dokončení vsakovacího objektu. Informace na příštím KD.*

6/13 Pí Mejvaldová oznámí OŽPD MČ Praha 17 skutečnost , že k dnešnímu dni je na stavbě dokončen LAPOL tuků včetně revizní šachty.

- *Po jednání na stavebním úřadě bylo zjištěno , že v červnu 2019 bude nutné požádat o prodloužení stavebního povolení na vodní dílo*
- *Žádost o prodloužení stavebního povolení byla podána dne 30.1.2019.*

2/14 Na dnešní KD se dostavil p.arch. Lang a pí. ředitelka ZŠ a byl dohodnut postup při schvalování a vzorkování materiálů pro stavbu. Bylo dohodnuto :

- Pro výběr dlažeb a obkladů vypracují p.arch.Lang a pí.ředitelka ZŠ do 9.1.2019 tabulku místností s požadavkem na barvu dle vzorníku RAKO , který dnes stavba předala
- Podlahy : p.arch.Lang navrhne materiály pro jednotlivé prostory ze vzorníku TARKET a na KD dne 9.1.2019 předá stavbě
- Fasády : stavba předá do 20.12.2019 p.arch.Langovi vzorník a na KD 9.1.2019 bude určeno barevné řešení

3/9 Zástupci zhotovitele upozornili na nutnost řešení výběru zhotovitelů vybavení laboratoří učeben IT s dostatečným předstihem pro zajištění potřebné stavební připravenosti – napojovací body medií apod.

- Dne 17.1.2019 proběhlo jednání mezi projektantem, arch.Langem a ředitelkou ZŠ, při kterém byly specifikovány požadavky ředitelky ZŠ (jako budoucího uživatele) na úpravy projektu. Z jednání byl pořízen zápis, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
- Při dnešním jednání KD bylo investorem oznámeno, že souhlasí s požadavky tohoto zápisu s výjimkou bodu 11) – zde bude provedena pouze příprava pro napojení spotřebičů, dodávka spotřebičů nebude investorem hrazena. Totéž platí i pro bod č. 5) – bude provedena příprava pro instalaci interaktivních tabulí a otázka dodávky těchto tabulí bude předmětem samostatného jednání mezi vedením MČ Praha –Zličín a investorem stavby INV MHMP.
- INV sepsal požadavek na dodávku interaktivních tabulí s odhadem nákladu a ten předal na odbor školství MHMP, který rozhodne. Informace na příštím KD.
- Odbor školství se zatím nevyjádřil, bude provedena urgency ze strany INV -Trvá

2/10 Pí Mejvaldová uzavře smlouvu o věcném břemenu na vodovodní přípojku

- PVK nepožaduje, smlouva bude uzavřena jen s CENTRAL GROUP.
- Protože končí platnost stávající smlouvy s CENTRAL GROUP, uzavře MHMP novou smlouvu.
- Po převzetí pozemku trvá platnost smlouvy dalších 5 měsíců, není tedy nutná nová smlouva. Věcné břemeno bude řešeno až po ukončení stavby. Trvá

2/11 Přehled změnových listů :

Zhotovitel upozornil na rozpor mezi PD a VV a na tyto skutečnosti vypracuje změnové listy. Zhotovitel vypracuje změnové listy – jedné se o následující profese :

- Srovnávací stěrka pod obklady
- Zvětšený rozsah bednění a železobetonových konstrukcí
- Svislá hydroizolace základů a ochranná geotextilie

5/11 Na základě požadavku MČ a investora prověří projektant možnosti příjezdu a parkování aut rodičů u školy a navrhne úpravu komunikací.

- Ing Milota předložil dvě varianty řešení. Obratem je přepošle p. Kováříkovi a ten s nimi seznámí radu MČ a požádá o stanovisko. Informace na příštím KD.
- Rada MČ vybrala variantu s 9 ks nových stání. Projektant předá projektové podklady do konce ledna 2019.
- Pí Mejvaldová prověřila postup na stavebním úřadu – je možné podat společnou žádost o změnu ÚR a stavebního povolení.
- Nabídka na projekt byla předána, INV MHMP vystavil objednávku na realizaci.
- Projektant vypracuje projekt ve dvou částech :
1.část - bude sloužit pro projednání – termín do 31.3.2019
2.část - bude projekt pro realizaci stavby
- Po předání 1.části projektu vyřídí pí Mejvaldová změnu ÚR a stavebního povolení

Zajistí : Ing Bryndová ,Ing Milota
pí Mejvaldová

Č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ 20	
NOZ zpracoval: Jaroslav Hort			Datum: 29 -07- 2019	
NOZ navazuje na:	OZ č. 20	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	Projektant	TDS	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <p style="text-align: center;">(a) dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/></p> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: Ad a) Příloha číslo 1 – rozpočet ocenění změny č. 3 Podrobný výpočet viz rozpočet				
Cena celkem bez DPH		4.907.313,63 Kč		
DPH 21%		1.030.535, 86 Kč		
Cena celkem s DPH		5.937.849,49 Kč		
Počet listů příloh: Cenová nabídka 10 listů Výkresová část 0 listů Technický popis 0 listy				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 4.907.313,63 Kč čtyři miliony devět set sedm tisíc tři sta třináct korun českých šedesát tři haléřů		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: do 20.1.2020		
Zpracováno				
Datum				

6.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.02.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: Geosan Group a.s. IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů 4 907 313,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 907 313,63

DPH základní	21,00%	ze	4 907 313,63	1 030 535,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
celková	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 937 849,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a pod

Objednavat

Vin

Datum a pod

6.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18_01_KR_A1
Stavba: Stavba č.41170 ZŠ Zličín - Výstavba základní školy u sportovního hřiště
Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Geosan Group a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 907 313,63	5 937 849,49
SO 01	Základní škola	4 907 313,63	5 937 849,49
01.1	Architektonicko-stavební řešení	4 907 313,63	5 937 849,49
1.4.1	Vytápění	0,00	0,00
1.4.10	Gastrotechnologie	0,00	0,00
1.4.3	VZT, chlazení	0,00	0,00
1.4.4	MaR	0,00	0,00
1.4.5	ZTI - vodovod, kanalizace	0,00	0,00
1.4.5.1	ZTI - vnitřní instalace	0,00	0,00
1.4.5.2	ZTI - venkovní vodovod	0,00	0,00
1.4.6	ZTI - Plyn	0,00	0,00
1.4.6.1	ZTI - vnitřní plynovod	0,00	0,00
1.4.6.2	ZTI - venkovní plynovod	0,00	0,00
1.4.7	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
1.4.8	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
1.4.9	Požární větrání	0,00	0,00
SO 02	Příprava území	0,00	0,00
SO 03	Vodovod	0,00	0,00
3.1	Vodovodní přípojka	0,00	0,00
SO 04	Kanalizace splašková	0,00	0,00
04.2	Vnitroareálová splašková kanalizace	0,00	0,00
SO 05	Kanalizace dešťová	0,00	0,00
05.2	Vnitroareálová dešťová přípojka	0,00	0,00
SO 06	Retenční nádrž	0,00	0,00
SO 07	Lapol	0,00	0,00
SO 08	Plynovodní přípojka	0,00	0,00
SO 10	Trafostanice, letní šatny	0,00	0,00
10.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
10.4.1	Vytápění	0,00	0,00
10.4.2	VZT	0,00	0,00
10.4.4	MaR	0,00	0,00
10.4.5	ZTI	0,00	0,00
10.4.7	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	0,00
10.4.8	Elektroinstalace - slaboproud	0,00	0,00
10.4.9	Trafostanice	0,00	0,00

SO 101	Dočasná komunikace	0,00	0,00
SO 102	Oplocení dočasné komunikace	0,00	0,00
SO 11	Přípojka NN	0,00	0,00
SO 12	Přípojka slaboproudu	0,00	0,00
SO 13	Venkovní osvětlení	0,00	0,00
SO 14	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
SO 15	Terenní a sadové úpravy	0,00	0,00
SO 16	Hřiště	0,00	0,00
SO 17	Oplocení	0,00	0,00
VON	VRN+ON	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 907 313,63	5 937 849,49



IČO: 00111111 /
 DIČ: CZ28169522
 54

u.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Monolit

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 907 313,63

2 Zakládání 162 574,24

27	011	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	32,301	3 402,59	109 907,06
"deska"(1543,562511*0,3)					463,069		
"kalich"(((6,1*2,53+3,13*6,7)/2*0,3*1)+((3,1*6,7+2,5*6,1)/2*0,3)*9+((2,5*2,5+3,1*3,1)/2*0,3)*6					68,362		
"ZTI knál + výtahová šachta"1*(6,1705+1,739)					7,910		
"šachty"1,15*1,7*2					3,910		
Mezisoučet					543,251		
"odečet původní VV"					-510,95		-510,950
Součet					32,301		
1	011	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	120,824	341,00	41 200,98
bedneni_deska 225,4*0,3+7*1,3+22,849*1,3+3,6*2*2					120,824		
2	011	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	120,824	94,90	11 466,20
bedneni_deska					120,824		

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102 015,13

36	011	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	179,252	3 532,46	633 200,52
"1NP							
stěny(3,73*(32,5+25,6+12,12985+9,375+2,033+1,025+4,875+10,724+3,2)					378,453		
"otvory vnější 1NP"							
(5,85*2,37+5,85*2,37+3*2,37+2,2*2,37+2,2*3,4+2,2*3,4+2,1*1,87+2,2*1,87+2,2*1,87+2,2*1,87+2,2*1,87+5,2*1,87)*0,25					-21,327		
(3,055*2,37+3,05*2,37+1,45*2,3+4,6*1,25+2,8*1,25+1,6*1,25+2,2*1,25+2,2*1,25+1,3*2,35+5,2*1,87+5,2*1,87+5,2*1,87)*0,25					-16,695		
(1,6*1,87+1,55*2,15+2,1*3,4+2,9*1,2+1,9*1,25+1,3*1,25+1,3*1,25+3,1*2,37+1,3*3,4+1,6*1,25+2,8*1,25+3,4*1,257)*0,25					-11,028		
(2,2*2,37+3,35*2,37+5,2*2,37+1,95*2,37+2,2*3,4+1,95*2,37+5,2*2,37+3*2,37)*0,25					-15,409		
"otvory vnitřní 1NP" -							
(1*2,22*4+0,9*2,22*2+1*2,22*5+1,22*0,51+1,01*0,36+0,9*0,51+0,1*0,51+1,1*2,31+2,1*2,35)*0,25					-8,237		
"2NP							
stěny(28,3+16,5+1,8125+9,375+2,033+1,025+4,875+10,724+3,2)*3,7					288,025		
"otvory vnější 2NP"							
(5,2*2,37+1,45*2,37+0,75*2,77+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37)*0,25					-24,605		
(2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+3,6*2,37+6,49*2,37+3,055*2,37+4,6*2,37+3,05*2,37+1,45*2,3+2,98*1,25+1,1*1,7+4,6*2,37)*0,25					-22,967		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Monolit

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,6*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+1,6*1,25+1,6*1,25+1,1*2,95+3,18*2,95+1,12*1,77+1,55*2,95+3*2,37+1,45*2,37+0,75*2,77+5,2*2,37)*0,25				-22,223
			-3,35*2,37*0,25				-1,985
			"otvory vnitřní 2NP"				
			(1*2,15+1,6*2,15+0,9*2,15+0,9*2,15+0,9*2,15+1*2,15+2,3*3,32+1*2,15+0,9*2,15+0,9*2,15+1,1*2,31+1*2,15+1*2,15)*0,25				-8,511
			"3NP stěny"(26,3+16,5+1,8125+9,375+2,033+1,025+4,875+10,724+3,2)*3,7				288,025
			"otvory vnější 3NP"				
			(5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37)*0,25				-28,440
			(2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+3,6*2,37+6,49*2,37+3,05*2,37+1,45*4+2,98*2,95+1,5*2,95+4,6*2,37+2,8*2,37+1,6*2,37)*0,25				-21,782
			-5,2*2,37*0,25				-3,081
			(2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+1,6*1,25+1,6*1,25+1,1*2,95+1,12*1,77+1,55*2,95+3,18*2,95)*0,25				-14,090
			"otvory vnitřní 3NP"(1*2,15+1*2,15+0,9*2,15+0,9*2,15+1*2,15+1*2,15+1*2,15+1*2,15+0,9*2,15+0,9*2,15+1,1*2,31+1*2,15+1*2,15+1*2,15)*0,25				7,945
			"4NP stěny"(27,22+13,805+1,8125+1,025+2,033+9,375202+14,821+3,2+0,6625+2,9375)*3,7				284,499
			"otvory vnější 4NP"				
			(5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37)*0,25				-29,388
			(5,2*2,37+2,5*2,37+1,1*3,37+3,715*2,37+3,05*2,37+1,45*2,3+2,9*2,3+1,5*2,3+4,6*2,37+2,8*2,37+1,6*2,37)*0,25				-18,194
			(2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+1,6*1,25+1,6*1,25+1,1*1,25+3,18*1,25+1,55*1,18+2,825*2,37+2,725*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37)*0,25				-14,378
			-(5,2*2,37+3,35*2,37)*0,25				-5,066
			"otvory vnitřní 4NP"				
			(0,9*2,15+0,9*2,15+0,9*2,15+1*2,15+1*2,15+1*2,15+0,9*2,15+0,9*2,15+1*2,15+1,1*2,31)*0,25				-5,742
			"Atika 4 NP"(186,5+23,703+10,557+13,73+3,01+10,01+18,007+10,44+31,149+20,82+2,85+10,124+11,2213+18,007+32,446+8+9,1875+18,948)*0,25+4,58*0,77*2				114,731
			"Atika 3 NP-odměřeno digitálně"8,187				8,187
			"Atika 1NP-odměřeno digitálně"4,04				4,040
			"sloupy obdel"0,25*0,8*4*3,73+0,25*0,7*3*3,73+7*0,25*0,8*3,7+0,2*0,45*3,7+7*0,25*0,8*3,7+0,4*0,45*3,7				16,301
			Mezisoučet				1 097,058
			"odečet dle původního VV"				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Monolit

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Zličín

Zpracoval:

Datum: 22. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-917,806				-917,806
			Součet				179,252
37	011	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2 730,951	467,53	1 276 801,52
			"1NP stěny"3,73*(225,4+280,568+7+85,9+26,099)		2 331,127		
			"2NP stěny"(213,1+258,5+26,099+61,999+38+17,2+7)*3,7		2 301,023		
			"3NP stěny"(213,1+258,5+26,099+61,999+38+17,2+7)*3,7		2 301,023		
			"4NP stěny"(208,1+262,404+26,1+61,999+17,2+7)*3,7		2 156,371		
			"otvory vnější 1NP"				
			(5,85*2,37+5,85*2,37+3*2,37+2,2*2,37+2,2*3,4+2,2*3,4+2,2*1,87+2,2*1,87+2,2*1,87+2,2*1,87+2,2*1,87+5,2*1,87+5,2*1,87)				-95,031
			(9,955*3,4+3,055*2,37+3,05*2,37+1,45*2,3+4,6*1,25+2,8*1,25+2,2*1,25+2,2*1,25+1,3*2,35+5,2*1,87+5,2*1,87+5,2*1,87+2,8*1,87+1,6*1,87)				-106,856
			(1,55*2,15+2,1*3,4+2,9*1,2+3,1*2,37+1,3*3,4+2,8*1,25+3,4*1,25+3,4*1,25+6,7*1,87+2,2*2,37+2,2*2,37+3,35*2,37+5,2*2,37+1,95*2,37+2,2*3,4)				-93,042
			-(5,2*2,37+3*2,37)				-19,434
			"otvory vnější 2NP"				
			(5,2*2,37+1,45*2,37+0,75*2,77+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37)				-98,418
			(2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+3,6*2,37+6,49*2,37+3,055*2,37+4,6*2,37+3,05*2,37+1,45*2,3+2,98*1,25+4,6*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+1,6*2,37+1,6*2,37)				-122,230
			(5,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+1,1*2,95+3,18*2,95+1,55*2,95+3*2,37+1,45*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+3,35*2,37)				-97,305
			"otvory vnější 3NP"				
			(5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37)				-89,112
			(5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+3,6*2,37+6,49*2,37+3,055*2,37+1,45*2,3+2,98*1,25+4,6*2,37+2,8*2,37)				-95,662
			(2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+1,1*2,95+1,55*2,95+3,18*2,95+5,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+3,35*2,37)				-95,290
			"otvory vnější 4NP"				
			(5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37)				-127,980
			(5,2*2,37+2,5*2,37+1,1*3,37+3,715*2,37+3,05*2,37+1,45*2,3+2,9*2,3+1,5*2,3+4,6*2,37+2,8*2,37+1,6*2,37+5,2*2,37+5,2*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37)				-107,850
			(5,2*2,37+3,18*1,25+2,825*2,37+2,725*2,37+2,2*2,37+2,2*2,37+2,725*2,37+1,6*2,37+3,8*2,37+5,2*2,37+3,35*2,37)				-79,400
			"ostění vnější 1NP"				
			(5,85*2+2,37*2+5,85*2+2*2,37+3*2+2*2,37+2,2*2+2*2,37+2,2*2+2*3,4+2,2*2+3,4*2+2,2*2+2*1,87+2,2*2+1,87*2+2,2*2+2*1,87+2,2*2+1,87*2)*0,25				26,930

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Monolit

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			$(2,2 \cdot 2 + 1,87 \cdot 2 + 5,2 \cdot 2 + 1,87 \cdot 2 + 5,2 \cdot 2 + 1,87 \cdot 2 + 5,2 \cdot 2 + 1,87 \cdot 2 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87 + 9,955 \cdot 2 + 3,4 \cdot 2 + 3,055 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,05 \cdot 2 + 2,37 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 + 2 \cdot 2,3 + 4,6 \cdot 2 + 2 \cdot 1,25) \cdot 0,25$		33,075		
			$(2,8 \cdot 2 + 2 \cdot 1,25 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,25 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,25 + 1,3 \cdot 2 + 2 \cdot 2,35 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87 + 2,8 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87 + 1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87 + 1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87) \cdot 0,25$		23,710		
			$(1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87 + 1,55 \cdot 2 + 2 \cdot 2,15 + 2,1 \cdot 2 + 3,4 \cdot 2 + 2,9 \cdot 2 + 2 \cdot 1,2 + 3,1 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,3 \cdot 2 + 2 \cdot 3,4 + 2,8 \cdot 2 + 2 \cdot 1,25 + 3,4 \cdot 2 + 2 \cdot 1,25 + 3,4 \cdot 2 + 2 \cdot 1,25 + 6,7 \cdot 2 + 2 \cdot 1,87) \cdot 0,25$		24,430		
			$(2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,35 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,95 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 3,4 + 1,95 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		24,805		
			"Ostění 2.NP"				
			$(5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,45 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		28,475		
			$(5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 6,49 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,055 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		30,623		
			$(4,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,05 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,45 \cdot 2 + 2 \cdot 2,3 + 2,98 \cdot 2 + 2 \cdot 1,25 + 4,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		28,995		
			$(5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,1 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 3,18 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 1,55 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,45 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,35 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		29,935		
			"ostění 3.NP"				
			$(5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		27,350		
			$(2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 6,49 \cdot 2) \cdot 0,25$		31,295		
			$(2 \cdot 2,37 + 3,05 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,45 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 2,98 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 1,5 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 4,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,8 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,58 \cdot 2 + 2 \cdot 1,6 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		28,710		
			$(2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,1 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 1,55 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 3,18 \cdot 2 + 2 \cdot 2,95 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,35 \cdot 2) \cdot 0,25$		31,010		
			"ostění 4.NP"				
			$(5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		32,635		
			$(5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,5 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,1 \cdot 2 + 2 \cdot 3,37 + 3,715 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,05 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,45 \cdot 2 + 2 \cdot 2,3 + 2,9 \cdot 2 + 2 \cdot 2,3 + 1,5 \cdot 2) \cdot 0,25$		27,788		
			$(2 \cdot 2,3 + 4,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,8 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,18 \cdot 2 + 2 \cdot 1,25 + 2,825 \cdot 2) \cdot 0,25$		28,758		
			$(2 \cdot 2,37 + 2,725 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 2,725 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 1,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,8 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 5,2 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37 + 3,35 \cdot 2 + 2 \cdot 2,37) \cdot 0,25$		22,565		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Monolit

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"atiky 4NP"(186,5+28,46+10,55+15,525+3,01+10,83+18,007+10,83+31,149+20,82+3,61+10,12+12,62+18,007+40,94+9,1875+19,275)*2+4,58*0,77*4		912,987		
			"atika 3NP"2,4*2+2,65*2+10,85+11,35		32,300		
			"atika 1NP"(10,5+12,25+10,5)+(10,25+11,75+10,25)		65,500		
			"sloupy obdel" (0,25*2+0,7*2)*4*3,73+(0,25*2+0,7*2)*3*3,73+7*(0,25*2+0,8*2)*3,7+0,2*2*3,7+7*3,7*(0,25*2+0,8*2)+0,2*2*3,7+7*(0,25*2+0,8*2)*3,7+(0,4+0,45)*3,7		218,884		
			Mezisoučet		9 572,694		
			"odečet dle původního VV" -6841,743		-6 841,743		
		bednění_nosna_zed'	Součet		2 730,951		
38	011	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2 730,951	207,79	567 464,31
			bednění_nosna_zed'		2 730,951		
73	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	8,759	32 727,20	286 657,54
			"hmotnost výztuže dle prováděcí PD" 8,759		8,759		
74	R	31136210R	Vylamovací výztuž do kruhových sloupů	m	6,320	4 473,26	28 271,00
			"dle VV od subdodavatele" 6,32		6,320		
75	R	31136220R	Navrtání trnování pilot	kpl	16,000	4 837,00	77 392,00
			"Dle PD subdodavatele" 16		16,000		
51	231	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,634	3 532,46	19 901,88
			"zed"4*1,85+0,08875*4,1		7,764		
			"zaklady"0,3125*4		1,250		
			Mezisoučet		9,014		
			"odečet dle původního VV" -3,38		-3,380		
			Součet		5,634		
52	231	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	0,085	467,79	39,76
			"zed"(4*2+0,25)*1,85		15,263		
			"spodní část"0,1*2*4,1+0,1*0,25		0,845		
			"boky"9,1*0,2		1,820		
			Mezisoučet		17,928		
			"Odečet dle původního VV" -17,843		-17,843		
		bednění_opěrky	Součet		0,085		
53	231	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	0,085	207,79	17,66
			bednění_opěrky		0,085		
55	011	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,594	3 584,41	2 129,14
			0,15904*11*3,73+2*0,15904*3,7+0,07952*3,7+2*0,15904*3,7+0,07952*3,7+3*0,15904*3,7		11,233		
			"odečet dle původního VV" -10,639		-10,639		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
 Objekt: ZŠ Zličín
 Část: Monolit

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Zličín

Zpracoval:
 Datum: 22. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						0,594	
71	011	332361821	Výztuž sloupů obých betonářskou oceli 10 505	t	5,574	37 700,00	210 139,80
"hmotnost výztuže dle prováděcí PD"							
7,0634						7,063	
"odečet dle původního VV"							
-1,489						-1,489	
Součet						5,574	
4 Vodorovné konstrukce							1 642 724,26
63	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	63,645	3 454,54	219 864,20
"strop nad 1NP"1628,68755*0,3						488,606	
"strop nad 2NP"1462,562*0,3+22,79748*0,15						442,188	
"strop nad 3NP"1462,562*0,3+22,79748*0,15						442,188	
"strop nad 4NP"1432,248*0,3						429,674	
"otvory 1NP"- (29,756247*0,3+0,8295*0,3+2,3318*0,3+3,06*0,3+17,7047*0,3)						-16,135	
"otvory 2NP"- (6,2474*0,3+28,89375*0,3+2,3318*0,3+2,3318*0,15+3,06*0,3+17,704*0,3)						-17,821	
"otvory 3NP"- (6,24749*0,3+28,89375*0,3+2,3318*0,3+2,3318*0,15+3,06*0,3+17,704*0,3)						-17,821	
"otvory 4NP"- (6,142*0,3+10,63*0,3+0,3654*0,3+1,8*0,3+2,33*0,3+2,12*0,3)						-7,016	
Mezisoučet						1 743,863	
"odečet dle původního VV"							
-10,080-1670,138						-1 680,218	
Součet						63,645	
65	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	556,502	324,68	180 685,07
"1NP deska"1568,827						1 568,827	
"1NP boky"0,3*(9,8+21,55+4,48+7,02+7+16,959+240,4)						92,163	
"2NP deska"1408,19						1 408,190	
"2NP boky"0,3*(213,4+21,85+13,99+4,48+4,1+4,9+17,269+7)+0,5*7,02+0,2*21,85						93,977	
"3NP deska"1408,19						1 408,190	
"3NP boky"0,3*(213,4+21,85+13,99+4,48+4,1+4,9+17,269+7)+0,5*7,02+0,2*21,85						93,977	
"4NP deska"1380,7						1 380,700	
"4NP boky"0,3*(208,1+13,799+15,2+4,53+4,13+7,02+5,9)						77,604	
Mezisoučet						6 123,628	
"odečet dle původního VV"							
-5567,126						-5 567,126	
bednění_stropu Součet						556,502	
66	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	556,502	142,86	79 501,88

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Zličín
Objekt: ZŠ Zličín
Část: Monolit

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Zličín

Zpracoval:
Datum: 22. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
bednění stropu						556,502	
69	011	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	556,502	129,87	72 272,91
bednění stropu						556,502	
70	011	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	556,502	90,91	50 591,60
bednění stropu						556,502	
72	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	31,772	32 727,20	1 039 808,60
"hmotnost výztuže dle prováděcí PD"							
					267,0021		267,002
"odečet dle původního VV"							
					-235,230		-235,230
Součet							31,772
Celkem							4 907 313,63
