

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR HAVÍŘOV CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008965		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 11 Přeložka Horkovodu		

Číslo smlouvy o dílo: 980/OUR/19 ze dne 6. 1. 2020
 Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**
 Zhotovitel: **OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří**
 Projektant/ autorský dozor: **DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
 Technický dozor objednatele/investora: **ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava**

Přílohy: PZ-2.1 Změnový rozpočet dle § 222 odst. 6 PZ-2.2 Situační výkres bourané sekundární trasy horkovodu PZ-2.3 Tabulka evidence změn	Počet paré: 5	Rozdělovník: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora
---	-----------------------------	--

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, je potřeba realizovat uvedené stavební práce a dodávky:
 V rámci projektová dokumentace stavby je navržena přeložka horkovodu pro primární úsek (od silničního podjezdu pod železniční tratí do budovy nádraží). Na primárním úseku stávajícího ŽB dvojitého kanálu o vnitřních rozměrech 800x450mm a 500x450mm budou demontovány zakrytové ŽB desky, stěny a dno kanálu budou ponechány.
 Projektová dokumentace navrhovala stávající nevyužívaný sekundární rozvod horkovodu - trasa odbočky horkovodu pro bytový dům (Zlatý dešť) - ponechat bez zásahu.
 Dvojitý ŽB kanál sekundárního úseku horkovodu ve skutečnosti neodpovídá předpokládané poloze dané vytýčením a svou výškovou polohou zasahuje do konstrukčních vrstev vozovky. Současně jsou v kolektoru celkem 4 ks potrubí. Z tohoto důvodu je nutné vybourání sekundárního ŽB kanálu úseku v délce 146,7 m.

SO 11 Přeložka Horkovodu

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
2 934 670,96	0,00	835 080,26	3 769 751,22

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**


Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH (21%)
2 934 670,96 Kč	0,00 Kč	835 080,26 Kč	28,46%	3 769 751,22 Kč
				Cena ZL celkem s DPH (21%)
				4 561 398,98 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová Ing. Lenka Krejčová	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno Ing. Ladislav Čech st.	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Radim Žvak	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. Miroslav Janíček	datum	podpis

PZ-2.1 (RP-rekapitulace)

Stavba:	18007	Přednádražní prostor Havířov
Objednatel:	Město Havířov, Svornosti 2, 736 01 Havířov	IČO: 00 29 74 88 DIČ: CZ 00 29 74 88
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Vypracoval:		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 0
Snížená DPH	15 %	0,00 0
Základ pro základní DPH	21 %	175 366,85 0
Základní DPH	21 %	1 010 447,11 0
Cena celkem bez DPH		835 080,26 0
Cena celkem s DPH		1 010 447,11 CZK
v _____ dne _____		
		
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
13	SO 11 Příprava území	835 080,26	835 080,26	175 366,85	1 010 447,11	100,00
Celkem za stavbu			835 080,26	175 366,85	1 010 447,11	100,00

Položkový rozpočet

S:	18007	Přednádražní prostor Havířov
O:	13	SO 11 Přeložka horkovodu
R:	13	SO 11 Přeložka horkovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	771 841,06
---------------	---	-------------------

37	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	108,88000	5 495,24	598 321,73
		Profil horkovodu č. 1 (bez zákrytových desek), 0,722 m2, délka 122 m		88,08000		
		Profil horkovodu č.2 (bez zákrytových desek), 0,842 m2, délka 24.7m Celková délka 146,7 m		20,80000		

41	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	272,20000	159,36	43 377,79
42	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 449,80000	14,29	35 007,64
43	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	272,20000	184,64	50 259,01
44	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	272,20000	164,86	44 874,89

Díl: 713	Izolace tepelné	36 137,86
-----------------	------------------------	------------------

47	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm kanal 800/400 - 137,0 m 137,00*2 (sekundární okruh celkem 4xDN)	m	274,00000	131,89	36 137,86
				274,00000		

Díl: 23-M	Montáže potrubí	27 101,34
------------------	------------------------	------------------


75	230081056	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 mm 137,00*2 (sekundární okruh celkem 4xDN)	kus	274,00000	98,91	27 101,34
				274,00000		

Celkem	835 080,26
---------------	-------------------

Technický výkres bourané sekundární trasy horkovodu

Přednádražní prostor Havířov
Délky bouraného betonu horkovodu


Vyhotovil: ing. Roman Piják
Datum: 27.4.2020



Celková délka bouraného betonu 146,7 m

délka bouraného horkovodu 122 m

délka bouraného horkovodu 24,70 m

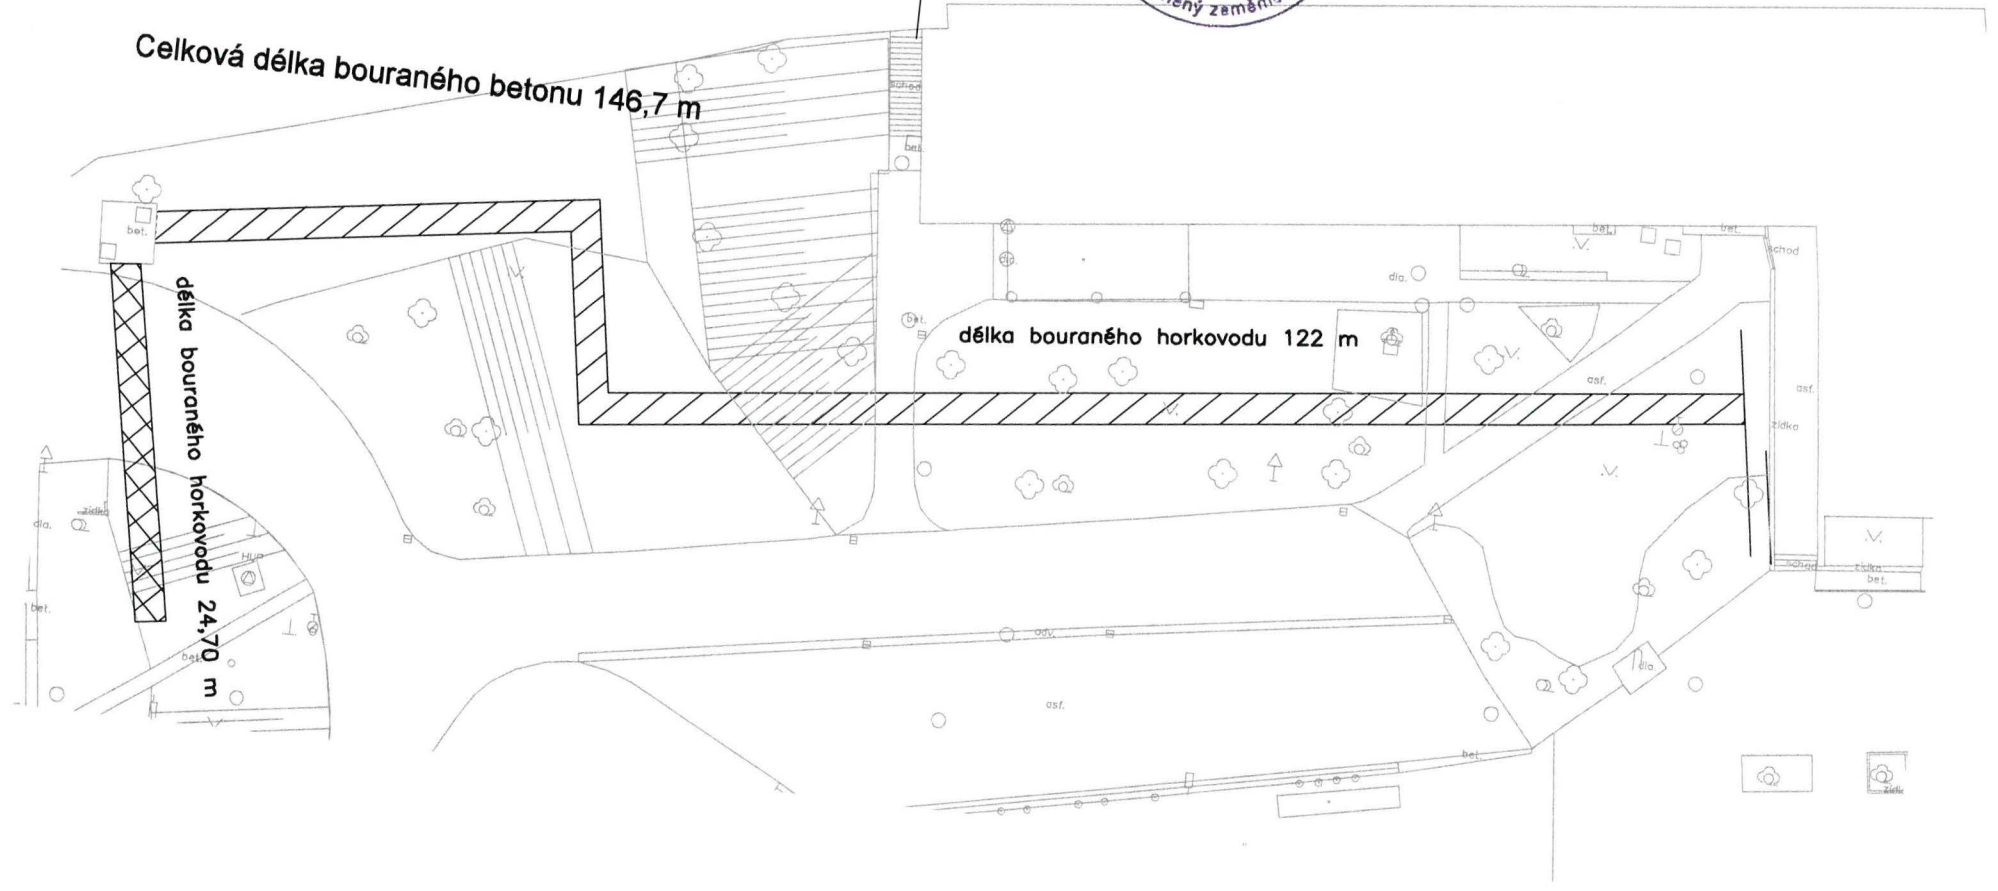

PZ-2.3 TABULKA EVIDENCE ZMĚN

Stavba: Přednádražní prostor Havířov

AKTUALIZACE K: 30. 04. 2020

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)	
			Odpočet	Přípočet	Rozdíl							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SO 01 Příprava území	Změna způsobu sanace zemních plání ve SO komunikací a zpevněných ploch	0,00	1 937 542,50	1 937 542,50	1 937 542,50			1 937 542,50		1 937 542,50	
	SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy		996 060,33	4 566 455,28	3 570 394,95	5 562 515,61			5 562 515,61		3 570 394,95	
	ZL-1 Celkem		996 060,33	6 503 997,78	5 507 937,45	7 500 058,11						
2	SO 11 Přeložka Horkovodu	Vybourání sekundárního ŽB kanálu		835 080,26	835 080,26	835 080,26			835 080,26		835 080,26	
					0,00	0,00			0,00		0,00	
CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn			v Kč	996 060,33	7 339 078,04	6 343 017,71	8 335 138,37	0,00	0,00	8 335 138,37	0,00	6 343 017,71
			v % z původní hodnoty závazku	1,08%	7,98%	6,89%						
			LIMITY podle § 222 ZVZ	Kč	původní hodnota závazku	91 995 275,52	13 799 291,33	45 997 637,76	45 997 637,76		27 598 582,66	
			REZERVA (zbývající do vyčerpání LIMITU dle ZVZ)	Kč			13 799 291,33	45 997 637,76	37 662 499,39		21 255 564,95	
						% čerpání	0,00%	0,00%	18,12%		22,98%	
			NOVÁ CENA vč. změn	Kč		98 338 293,23						
