

Protokol o změně díla

změnový list číslo 075

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: NN vnitroareálové – přeložky, NN vnitroareálové Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195														
Změna: Dopřesnění přeložek a přípojek NN kabelů - výkopy														
P O P I S	Změnu vyvolal: GZ Popis změny: Optimalizace provádění prací na přípojkách a přeložkách NN, sloučení výkopů a zrušení kabelové šachty, která z technického hlediska nebyla nutná realizovat. D.1.402_SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky, D.1.402.003_NN vnitroareálové - přeložky													
	Způsob projekčního zpracování: bez vliv změny na náklady stavby: ANO													
C E N A	ocenění změny předložil: GZ <span style="float: right;">ve formě</span>													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>vícepráce</th> <th>méněpráce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objekt SO 402 NN vnitroareálové přeložky rozpočet D.1.402.003 NN vnitroareálové přeložky</td> <td></td> <td>209.380,50</td> </tr> <tr> <td>Objekt SO 403 NN vnitroareálové rozpočet D.1.403.003 NN vnitroareálové</td> <td>508.139,54 Kč</td> <td>439.763,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </tbody> </table>		vícepráce	méněpráce	Objekt SO 402 NN vnitroareálové přeložky rozpočet D.1.402.003 NN vnitroareálové přeložky		209.380,50	Objekt SO 403 NN vnitroareálové rozpočet D.1.403.003 NN vnitroareálové	508.139,54 Kč	439.763,90 Kč	projekční náklady	0,-	0,-
		vícepráce	méněpráce											
	Objekt SO 402 NN vnitroareálové přeložky rozpočet D.1.402.003 NN vnitroareálové přeložky		209.380,50											
	Objekt SO 403 NN vnitroareálové rozpočet D.1.403.003 NN vnitroareálové	508.139,54 Kč	439.763,90 Kč											
	projekční náklady	0,-	0,-											
	úprava smluvní ceny:													
	zvýšení:													
	snížení: 141 004,86 Kč													
	nová cena:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>odsouhlasení nákladů na změnu:</th> <th>Datum</th> <th>Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zhotovitel:</td> <td>5.1. 2021</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>objednatel (investor, uživatel)</td> <td>5.2. 2021</td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td>16.3. 21</td> </tr> <tr> <td>GP:</td> <td>3.9. 2020</td> </tr> </tbody> </table>		odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	zhotovitel:	5.1. 2021		objednatel (investor, uživatel)	5.2. 2021	TDI:	16.3. 21	GP:	3.9. 2020	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis												
zhotovitel:	5.1. 2021													
objednatel (investor, uživatel)	5.2. 2021													
TDI:	16.3. 21													
GP:	3.9. 2020													
Termín předání PD změny: bez PD														
Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby														
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby														
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: <span style="margin-left: 100px;">stavební práce</span> <span style="margin-left: 100px;">projekční práce</span> SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb													
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 fotodokumentace, výřez trasy z PD													
	Datum 19. 5. 2020													

## Příloha č. 1 pro ZL 075 - Dopřesnění přeložky NN kabelů - výkopy

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.402 SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky  
 D.1.403 SO 403 - NN vnitroareálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP	MNP	Cena vá úrove
<b>Díl: _1</b>		<b>D.1.402_SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky, D.1.402.003_NN vnitroareálové - přeložky</b>						
		<b>D.1.402_SO 402 - Zemní, stavební a montážní práce</b>						
7	4.03	Výkop kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř. 3	m	-155,00000	640,60		-99 293,00	SoD
8	4.04	Zához kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř.3	m	-155,00000	192,10		-29 775,50	SoD
9	4.05	Pískové lože š. 45cm	m	-155,00000	70,20		-10 881,00	SoD
10	4.06	Písek do výkopu	t	-11,00000	874,00		-9 614,00	SoD
11	4.07	Výstražná fólie š. 33cm	m	-155,00000	15,00		-2 325,00	SoD
12	4.08	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	-91,00000	400,20		-36 418,20	SoD
13	4.09	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	-23,00000	545,10		-12 537,30	SoD
14	4.10	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	-70,00000	104,70		-7 329,00	SoD
15	4.11	Odvoz suti	t	-3,00000	402,50		-1 207,50	SoD
<b>celkem VCP/MNP SO 402</b>							<b>-209 380,50</b>	
<b>Díl: _2</b>		<b>D.1.403_SO 403 - NN vnitroareálové, D.1.403.003_NN vnitroareálové</b>						
		<b>3. Materiál</b>						
1	33	Kabelová šachta, pojezdové víko, zatížení D400, rozměry cca 1,3m x 1,3m, kompletní, včetně montáže	ks	-1,00000	67 636,10		-67 636,10	SoD
6	410	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	86,50000	104,70	9 056,55		SoD
7	411	Beton do výkopu	m3	-6,40000	4 220,50		-27 011,20	SoD
8	412	Odvoz suti	t	-3,00000	400,20		-1 200,60	SoD
10	43	Výkop kabelové rýhy 100x90cm v zemině tř. 3	m	-150,00000	1 437,50		-215 625,00	SoD
11	44	Zához kabelové rýhy 100x90cm v zemině tř.3	m	-150,00000	433,60		-65 040,00	SoD
12	45	Pískové lože š. 100cm	m	-150,00000	141,50		-21 225,00	SoD
13	47	Výstražná fólie š. 33cm	m	95,00000	15,00	1 425,00		SoD
14	48	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	-105,01249	400,20		-42 026,00	SoD
15	49	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	31,80000	545,10	17 334,18		SoD
16	46	Písek do výkopu	t	78,30000	1 070,70	83 835,81		SoD
	Nová položka	Výkop kabelové rýhy 150x90cm v zemině tř. 3	m	135,00000	1 600,00	216 000,00		R-pol.
	Nová položka	Ztížená montáž v místě stávajících kabelů pod napětím	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		R-pol.
	Nová položka	Likvidace pařezů pro potřeby stavby, bez likvidace pařezů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		R-pol.
	Nová položka	Zához kabelové rýhy 150x90cm v zemině tř.3	m	115,00000	545,00	62 675,00		R-pol.
	Nová položka	Pískové lože š. 150 cm a zásyp pískem, celkově do 30 cm	m	135,00000	233,80	31 563,00		R-pol.
	Nová položka	Pronájem, dovoz a odvoz pažení na stavbu, předpoklad týden pronájmu do 30.6.2019	kpl	1,00000	71 250,00	71 250,00		R-pol.
<b>celkem VCP/MNP SO 403</b>							<b>508 139,54</b>	<b>-439 763,90</b>

<b>Celkem VCP / MNP za ZL</b>	<b>508 139,54</b>	<b>-649 144,40</b>
<b>Celkem ZL bilance</b>	<b>-141 004,86</b>	




PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 75






PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 75

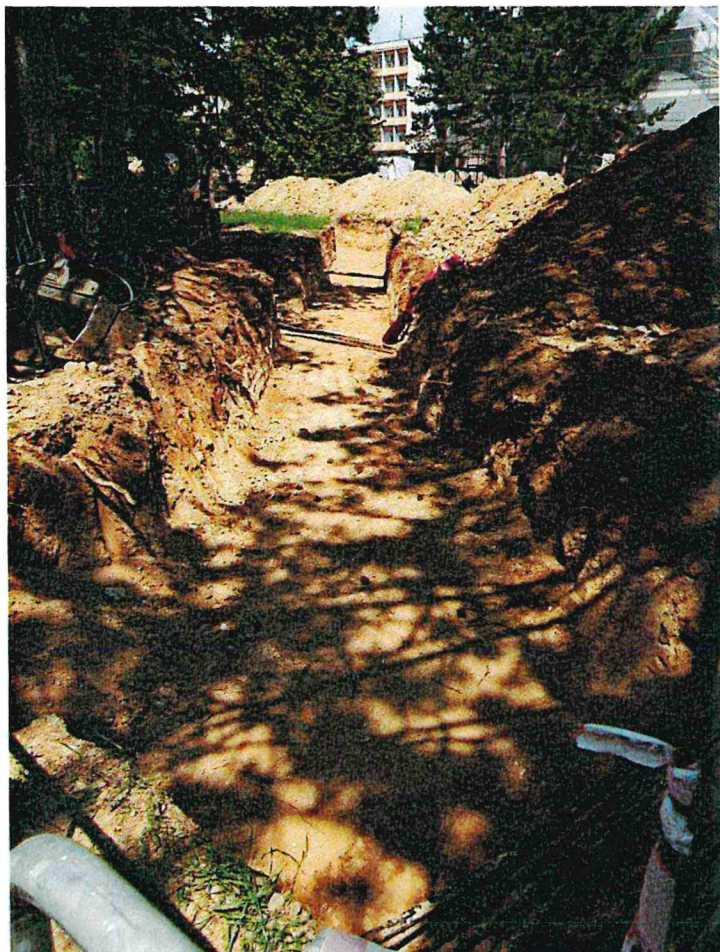



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 75

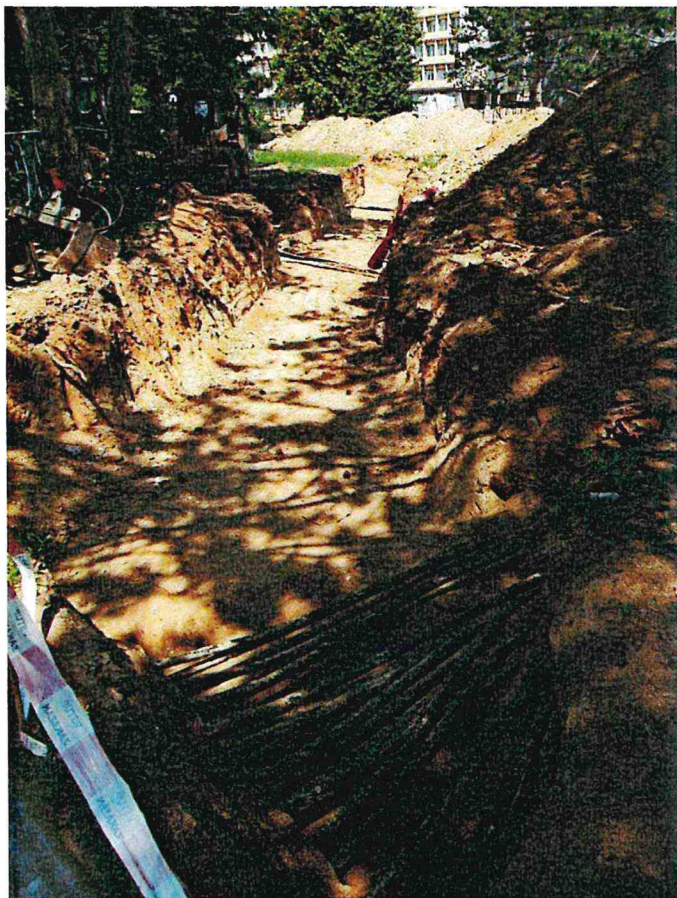



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 75






PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 75





PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 75

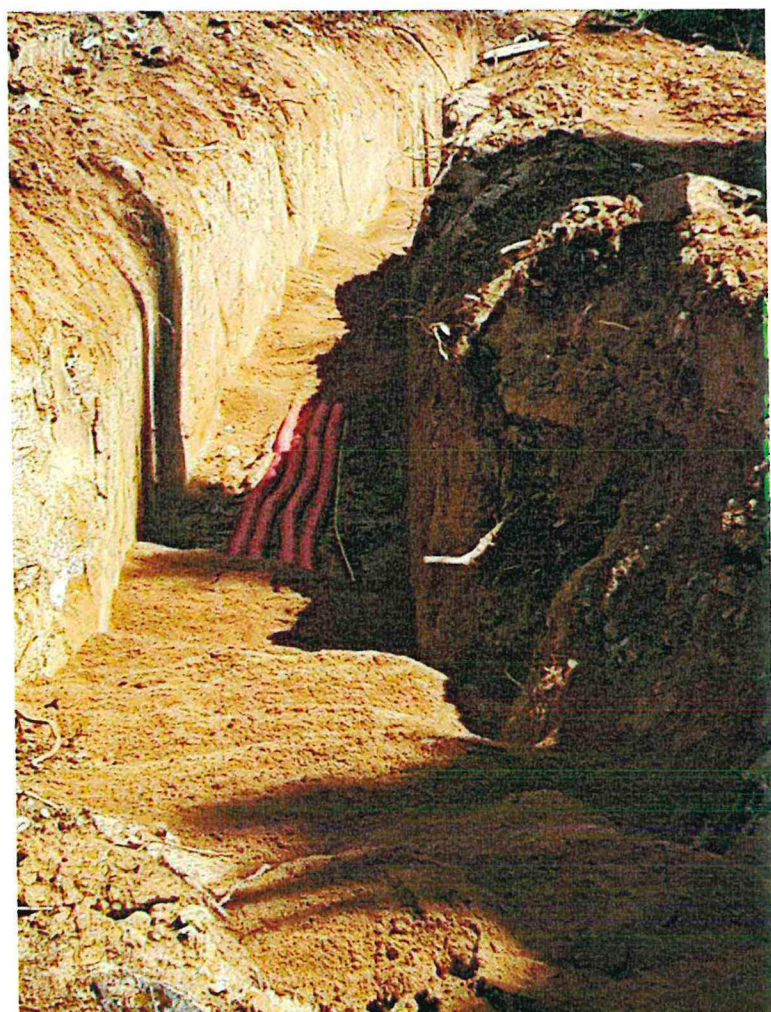



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 75





