

Změnový list č. 5/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou S/RVC/078/R/SoD/2019 Číslo projektu 562 553 0005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO05 - Sjezd Název ZBV: Variace č.5 - Sanace podloží sjezdu, Úprava betonového povrchu - striáž, Oděrné trámce svodidla	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO05	Pořadové číslo ZBV: 5
--	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, IČO: 45538093)

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek Návrh na Variace č.5 - Sanace podloží sjezdu, Úprava betonového povrchu - striáž, Oděrné trámce svodidla Pokyn Správce stavby č. 9 Protokol o zkoušce zhuštění Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po provedení zkoušek zhuštění pod plánovanou ŽB deskou Sjezdu, byly zjištěny nevyhovující hodnoty. Pokud by byl zachován stávající (původní) materiál, mohlo by v budoucnu hrozit riziko sedání ŽB desky a následně velmi nákladné a komplikované opravy. V rámci úpravy bylo provedeno odebrání původního, nevhodného materiálu a zásyp štěrkomíti frakce 0/125mm, hutněného po 0,3m. Rozsah byl dohodnut a následně kontrolován TDI.
 Na pochozích a jezdových plochách objektu SO 05 - Sjezd byla dodatečně provedena, na základě požadavku zástupce objednatele, úprava ploch protiskluzovou úpravou - striáž.
 Byla provedena dodávka a montáž oděrných trámů do svodidla SO 05. Osazení trámů do UPE profilů. Provedeno dle PD, položka není obsažena ve výkazu výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn kladných celkem
0,00 Kč	236 185,78 Kč	236 185,78 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu zachování kontinuity prací v prostoru Sjezdu, zejména návaznosti technologických postupů prováděných prací při betonážích, dále prováděných montáží trvalých konstrukcí.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Časový nárok by přečerpal časové rezervy dílčích činností. Realizace sanace dna musela být zajištěna v krátkém čase, aby bylo možné neprodleně zahájit práce na provádění ŽB desek sjezdu. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajících s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum Podpis
Supervize	jméno	██████████	datum Podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum Podpis
Vyjádření:			
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	17.12.2020
týká se bodu :	285 784,79 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum Podpis
příkazce operace:	jméno	██████████	datum Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum Podpis
			Číslo paré:

ZBV 05

STAVBA: REKREAČNÍ PŘÍSTAV VESELÍ NAD MORAVOU

SO 05 - SJEZD

Náklady soupisu celkem

236 185,78

D		1	Zemní práce			
N001		464541112	Zpevněné plochy ze štěrkodrti 0 - 125 mm	M3	74,880	
			Sanace podloží sjezdu kamenivem drceným 0/125mm, se zhuštěním zásyp ŠD - sanace sjezdu 6 x 0,6 x 20,8= 74,88 m3		74,880	
D		1_A3	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
N003	K	98511313R	Úpravy povrchů - striáž	M2	268,840	
	PP		Úpravy povrchů - striáž			
	VV	A10	ŽB desky sjezdu (30,89m x 6m) chodník (2,5m x 20,8 m) + (3m x 10,5m)		185,340 83,500	
D		2_A3	Svislé a kompletní konstrukce			
N008	K	34695112.R01	Dubové oděrné trámce 180 x 180 mm, dl. 8700 mm, montáž a dodávka	M	34,800	
	PP		Dubové oděrné trámce tdl. 8700mm (180 x 180 mm) 4 ks			
	VV		SO 05 - svodidlo			
	VV	A6	34,8 m		34,800	



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

Věc: Návrh na Variaci

Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 5 dle Pod-čl. 13.3
SO/PS – SO 05 – Sjezd

Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1,

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **GARNETS – BETING – Správce stavby, ■■■**

Datum: 30.11.2020

NÁVRH NA VARIACI: Č.5 – SANACE PODLOŽÍ SJEZDU, ÚPRAVA BETONOVÉHO POVRCHU - STRIÁŽ, ODĚRNÉ TRÁMCE SVODIDLA

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

na základě Vámi zaslání Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na ocenění Variace č. 5:

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

- Odebrání původního nevhodného materiálu v tl. 0,6 m, šířky 6 m a v délce 20 m
- Pokládka geotextilie 400 g/m²
- Zásyp ŠD 0/125 mm, hutněno po minimálně 0,3 m
- Provedení protiskluzové úpravy na pochozích a pojížděných plochách
- Dodávka a montáž dubových trámů do profilů UPE v rámci svodidla Sjezdu

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- bez časového nároku

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace

- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 236 185,78 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění variace

Příloha č. 2 – Protokol o provedených zkouškách původního materiálu

S pozdravem

.....
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

.....
Správce stavby „Rekreační přístav Veselí
nad Moravou“

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“)

adresát

Správce stavby
Sdružení „Garnets – Beting“
(vedoucí sdružení):
 Garnets Consulting a.s.
 Čs. legií 445/4
 415 01 Teplice - Trnovany

Objednatel:
 Ředitelství vodních cest ČR
 Nábřeží L. Svobody 1222/12
 110 15 Praha 1



IDS – inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

██████████ – manažer projektu
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc – Nová Ulice

<i>váš dopis značky / ze dne</i>	<i>naše značka</i>	<i>vyřizuje</i>	<i>místo odeslání / dne</i>
- / -	SpS/VU/P009/2020	██████████ ██████████ ██████████	Praha / 10. 3. 2020

Smlouva: Smlouva o dílo – „**Rekreační přístav Veselí nad Moravou**“ – mezi Objednatelem (ŘVC ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019.

Dílo: **Rekreační přístav Veselí nad Moravou**

Věc: **Pokyn Správce stavby č. 9 k provedení Variace podle Pod-čí. 13.3 Smluvních podmínek SoD**

Vážený pane inženýre,

Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn:

- a) Popis navrhované práce
 Provedení sanace podloží sjezdu SO 05, úpravy betonového povrchu – striáž a doplnění oděrných trámů svodidla.
- b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu
 Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby.
- c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace
 Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci stavby k odsouhlasení.

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby.

S pozdravem

██████████
 vedoucí týmu Správce stavby
 za Sdružení „Garnets – Beting“

Na vědomí: ██████████ manažer projektu Objednatele, ŘVC ČR

Z P R Á V A č. : 3716 / 01 / KZ / 2020

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Stavba : Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Objekt : SO 05
Konstrukční vrstva : pláň
Materiál : stávající
Staničení : D1
Klimatické podmínky : polojasno, 8°C
Průměr zatěžovací desky : 300 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.


Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : **ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A**

Výsledek zkoušky :

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,07	4,70
0,14	14,92
0,21	24,70
0,29	-
0,36	-
0,43	-
0,50	-
0,25	-
0,12	-
0,00	-
0,07	-
0,14	-
0,21	-
0,29	-
0,36	-
0,43	-

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	-	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	-	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	

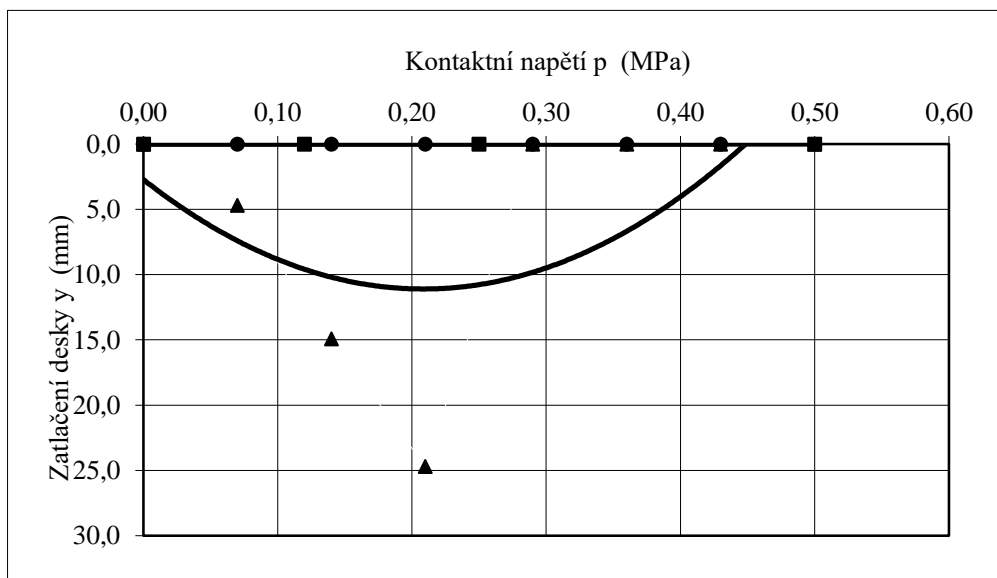


Poznámka : **Neměřitelné - mimo rozsah měřidla.**

Vlhkost : -
Datum a čas zkoušky : 14.4.2020, 9:20
Zkoušku provedl : XXXXXXXXXX

V Brně dne : 14.4.2020

Rozdělovník : 2 x IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

1 x AZL QUALIFORM, a.s.
SD/09-Zpráva-Verze 01-14



technicky vedoucí pracoviště

Z P R Á V A č. : 3717 / 01 / KZ / 2020

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
 Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
 Stavba : Rekreační přístav Veselí nad Moravou
 Objekt : SO 05
 Konstrukční vrstva : pláň
 Materiál : stávající
 Staničení : D2
 Klimatické podmínky : polojasno, 18°C
 Průměr zatěžovací desky : 300 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.


Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : **ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A**

Výsledek zkoušky :

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,07	1,36
0,14	3,04
0,21	4,66
0,29	6,50
0,36	7,92
0,43	9,56
0,50	11,18
0,25	10,30
0,12	9,12
0,00	5,94
0,07	6,76
0,14	7,66
0,21	8,46
0,29	9,40
0,36	10,26
0,43	11,10

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	9,9	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	18,8	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	1,90	

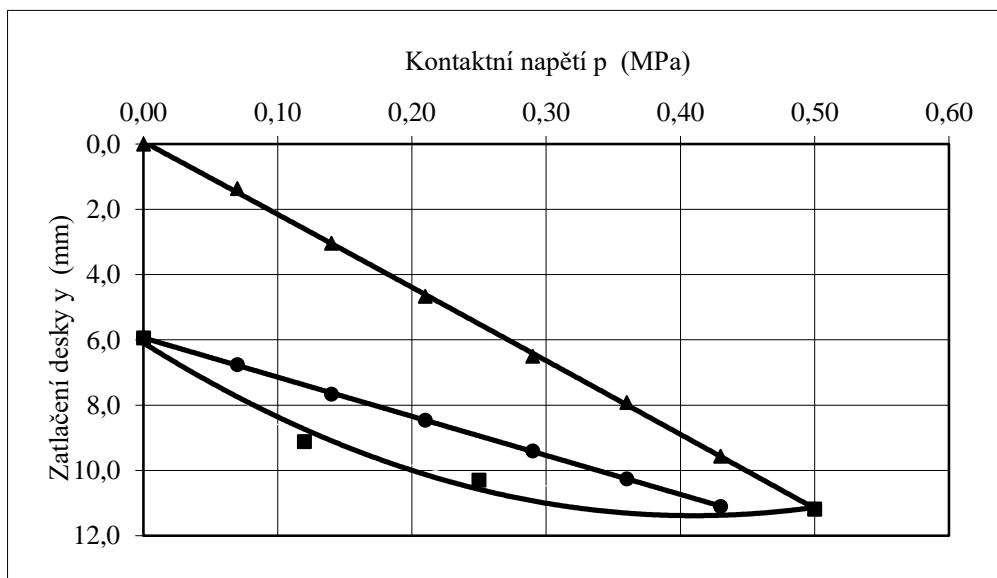


1. větev: $y = -1,384 p^2 + 23,441 p - 0,238$ 2. větev: $y = -0,14 p^2 + 12,05 p + 5,939$

Poznámka :

Vlhkost : -
 Datum a čas zkoušky : 14.4.2020, 9:35
 Zkoušku provedl : ██████████

V Brně dne : 14.4.2020

Rozdělovník : 2 x IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.



technický vedoucí pracoviště

Z P R Á V A č. : 3718 / 01 / KZ / 2020

o kontrole zhutnění zemin a sypanin statickou zatěžovací zkouškou

Identifikační údaje :

Objednatel zkoušky : **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
 Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
 Stavba : Rekreační přístav Veselí nad Moravou
 Objekt : SO 05
 Konstrukční vrstva : pláň
 Materiál : stávající
 Staničení : D3
 Klimatické podmínky : polojasno, 8°C
 Průměr zatěžovací desky : 300 mm

Poznámky: Výše uvedené údaje sdělil objednatel zkoušky. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zpráva reprodukovat jinak než celá.


Charakteristika zkoušky :

Zkouška byla provedena dle : **ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Příloha A**

Výsledek zkoušky :

Napětí p MPa	Zatlačení y mm
0,00	0,00
0,07	4,54
0,14	13,34
0,21	25,62
0,29	-
0,36	-
0,43	-
0,50	-
0,25	-
0,12	-
0,00	-
0,07	-
0,14	-
0,21	-
0,29	-
0,36	-
0,43	-

První zatěžovací cyklus $E_{def,1}$	-	MPa
Druhý zatěžovací cyklus $E_{def,2}$	-	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	

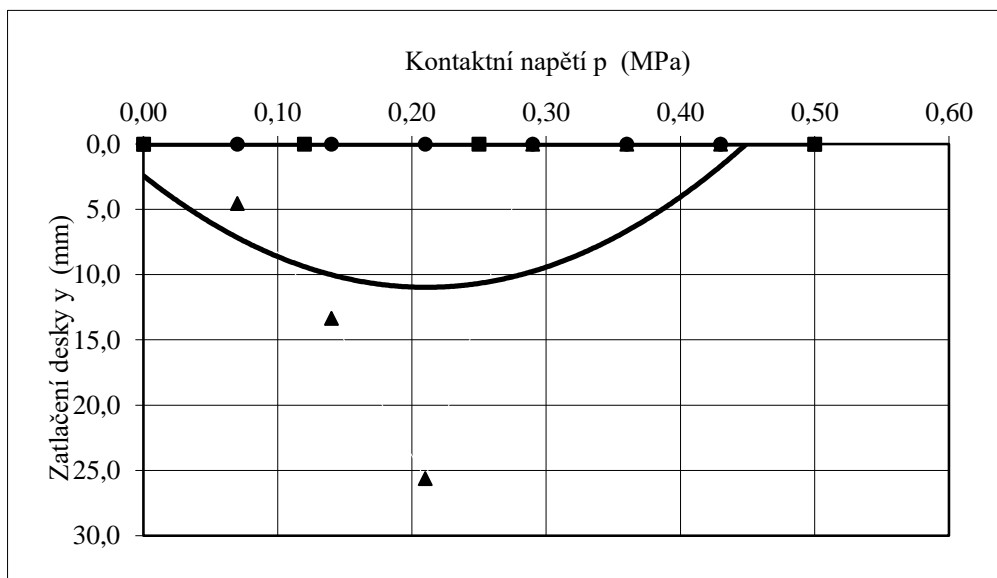


Poznámka : **Neměřitelné - mimo rozsah měřidla.**

Vlhkost : -
 Datum a čas zkoušky : 14.4.2020, 10:00
 Zkoušku provedl : XXXXXXXXXX

V Brně dne : 14.4.2020

Rozdělovník : 2 x IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

1 x AZL QUALIFORM, a.s.
 SD/09-Zpráva-Verze 01-14



technický vedoucí pracoviště
