

Dodavatel: IČO: 26026279 DIČ: CZ26026279 ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská tř. 597 37001 České Budějovice Banka: Komerční banka a.s. Účet: 86-8606050287/0100 Telefon: 387 221 549 Fax: E-mail: info@zvanovec.cz www: www.zvanovec.cz		Faktura číslo: 0022/76 Variabilní symbol: 002276 Odběratel: Obec Čičenice Čičenice 79 38771 Čičenice CZ IČO: 00251097 DIČ: NEPLÁTCE DPH	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109.			
Příjemce: IČO: DIČ:		Konstantní symbol: 0308 Způsob úhrady: převodním příkazem HS-č.objednávky: Akce: 222092 Způsob dopravy: Číslo vozu/SPZ: Odebral/Dodací list:	
Středisko: 003 Zpracoval: Ilona Němcová Telefon: 387 221 549 E-mail: nemcova@zvanovec.cz		Datum vystavení: 18.11.2022 Datum splatnosti: 18.12.2022 Datum uskutečnění zdanit. plnění: 18.11.2022	

KONEČNÁ FAKTURA.



Vážení zákazníci, dle smlouvy o dílo Vám fakturujeme za provedené práce:

"Odvodnění Čičenice u č.p. 51 "

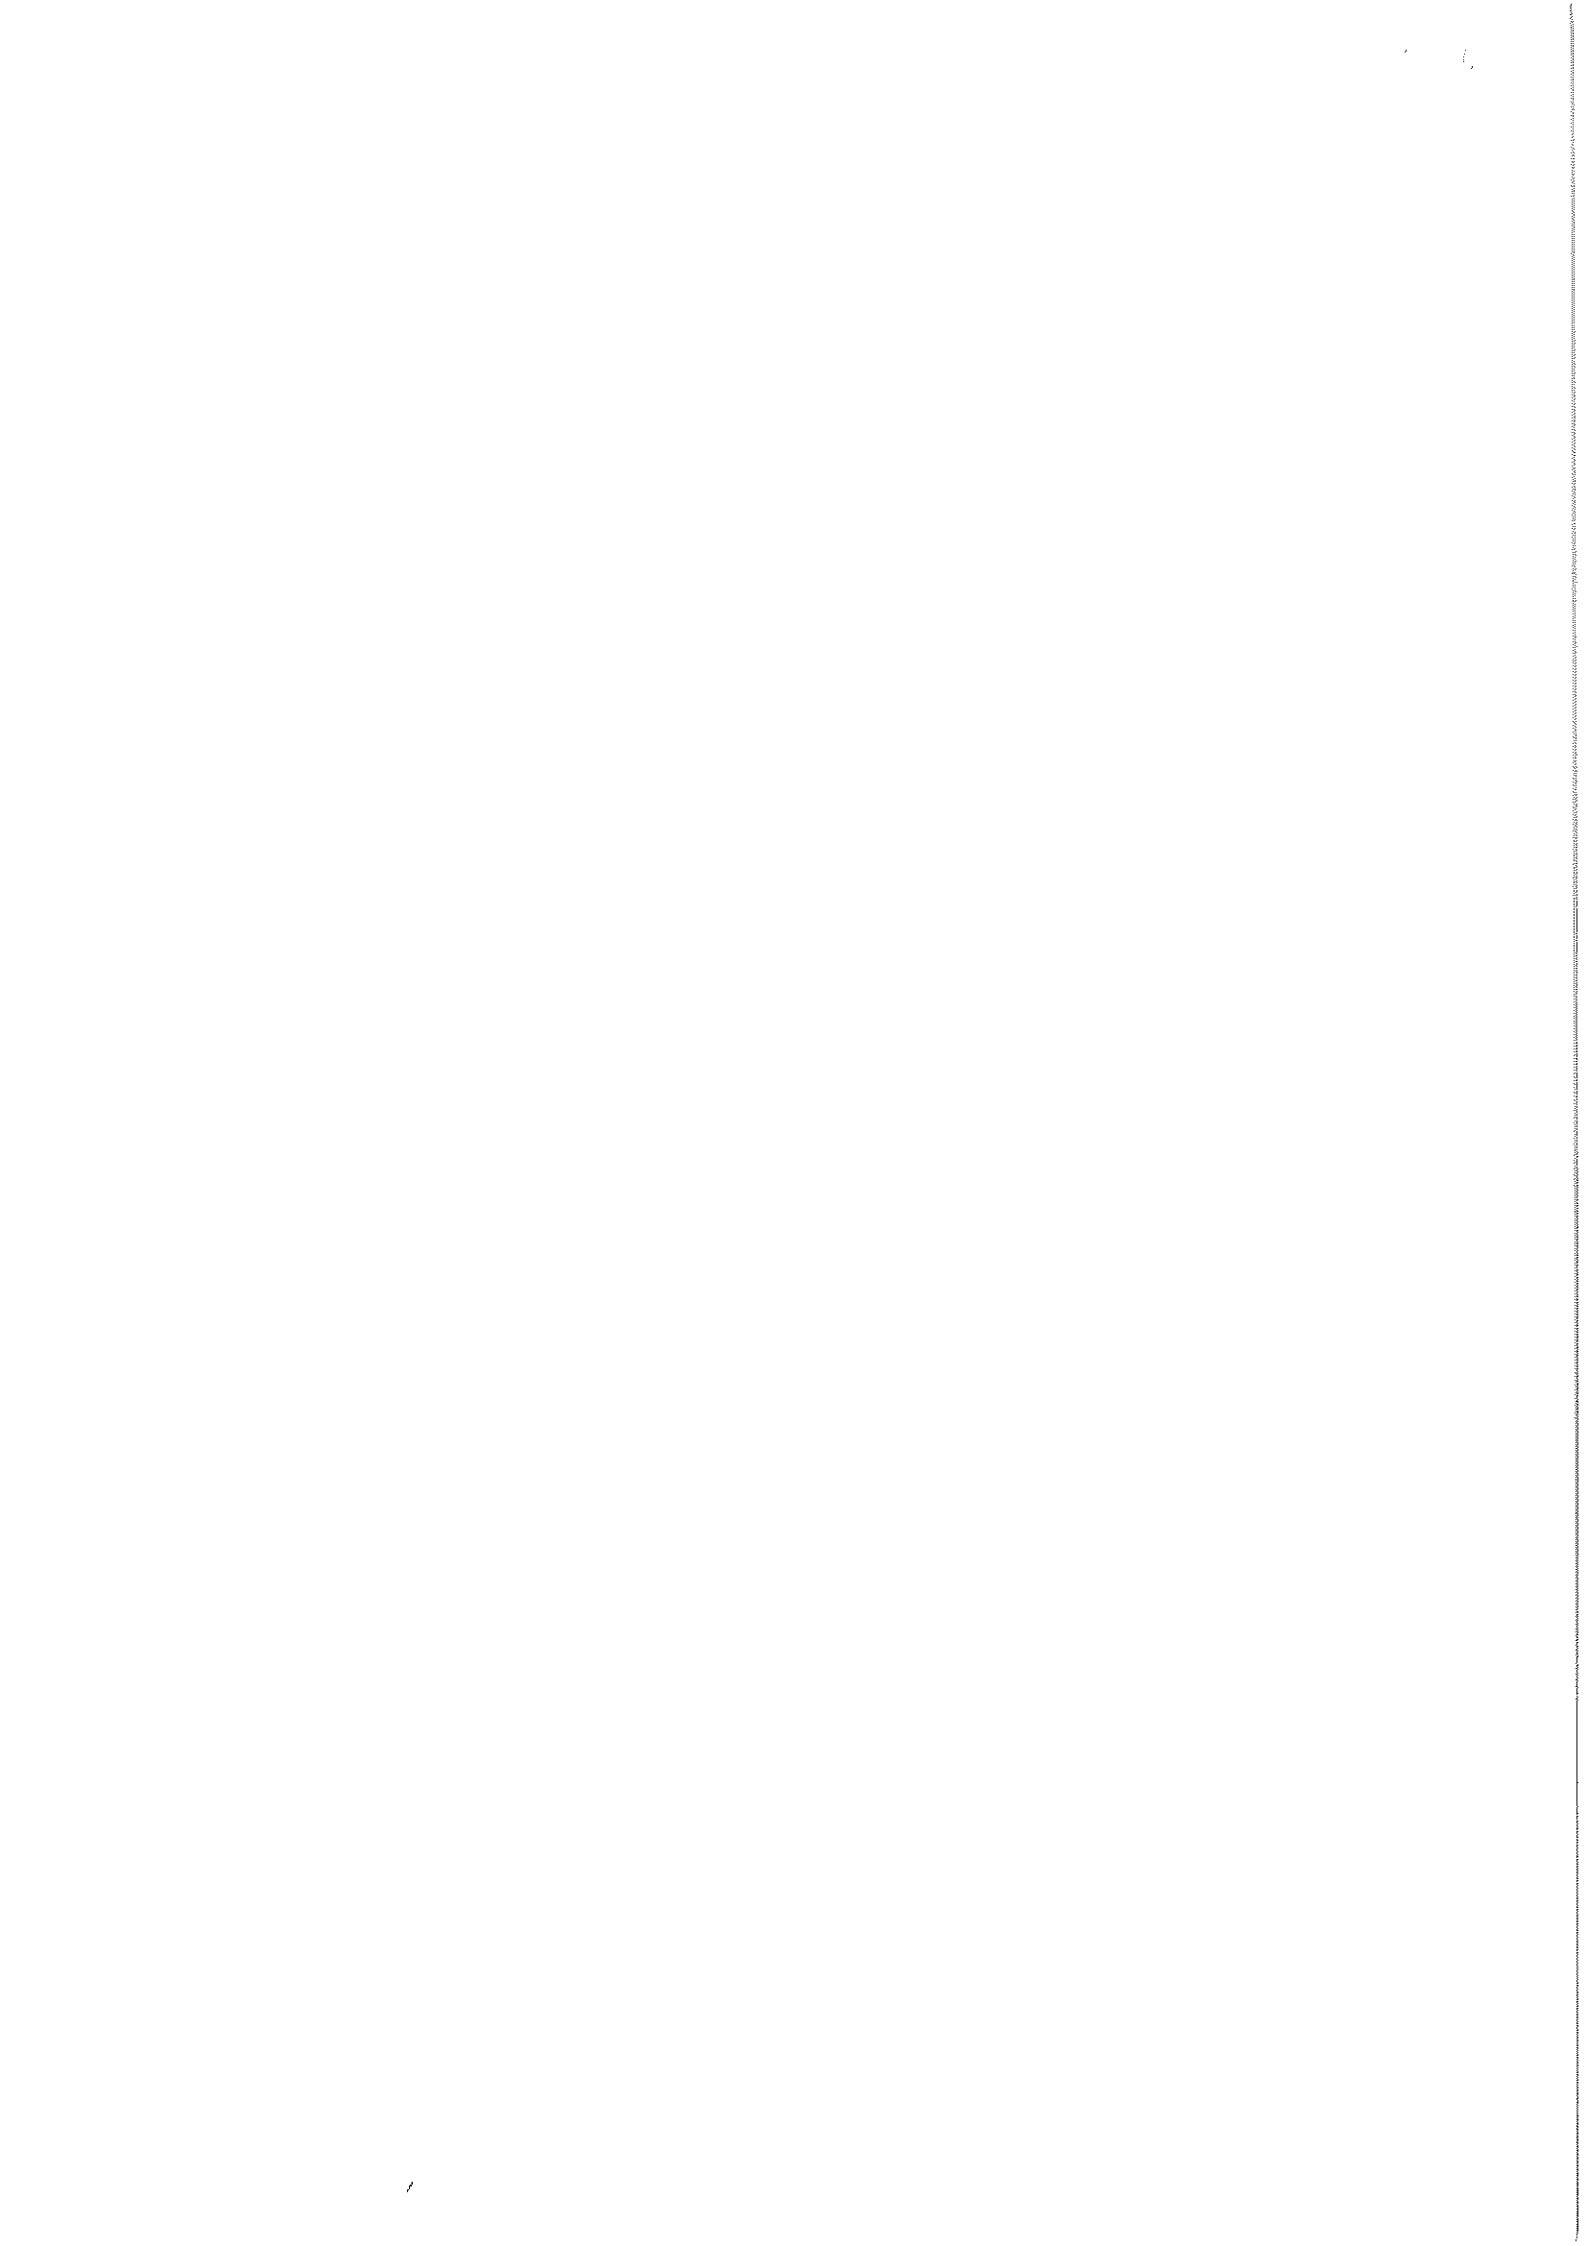
Název	Nomenklatura	Cena/jednotku	Množství	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH	Sleva
> Odvodnění Čičenice u č.p. 51				1 482 305,30	21%	1 793 589,41	0%
DPH	Základní sazba 21%:	311 284,11 Kč ze základu	1 482 305,30 Kč	Celkem bez DPH:		1 482 305,30 Kč	
	Snížená sazba 15%:	0,00 Kč ze základu	0,00 Kč	Celkem s DPH:		1 793 589,41 Kč	
	Snížená sazba 10%:	0,00 Kč ze základu	0,00 Kč				
	Osvobozeno 0%	0,00 Kč		Haléřové vyrovnání:		0,00 Kč	
	Mimo režim DPH:	0,00 Kč					

CELKEM K ÚHRADĚ:**1 793 589,41 Kč**

Příloha - ZP č.1.

Razítko a podpis: 	Fakturu převzal: 
--	--

Guthrie s provedením faktur
 dne 9/12/2022.



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Číslo zakázky : 039/22

Stavba : A 222 092

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Zhotovitel : Zvánovec a.s.
Rudolfovská tř. 597
37001 České Budějovice

IČO : 26026279
DIČ : CZ26026279

Objednatel : Obec Čičenice
Čičenice 79
38771 Čičenice

IČO : 00251097
DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	1 482 305,30	0,00	1 482 305,30	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 18.11.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

ZVÁNOVEC
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279 (P)

Za zhotovitele

Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel.: 385 381 101
IČ: 00251097

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01 Odvodnění Čičenice u č.p.51	1 313 055,30	0,00	1 313 055,30	0,00
VON Vedlejší a ostatní náklady	169 250,00	0,00	169 250,00	0,00
Cena celkem za stavbu	1 482 305,30	0,00	1 482 305,30	0,00

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Číslo zakázky : 039/22

Stavba : A 222 092

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Objekt : SO 01

Odvodnění Čičenice u č.p.51

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	1 313 055,30	0,00	1 313 055,00	0,00

ZVINOVER
a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ02626279

Za zhotovitele

Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 881 101
IČ: 0051097

Za objednatele

Soupis provedených prací

za období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Stavba : A 222 092

Odvodnění Číčenice u č.p.51

Objekt : SO 01

Odvodnění Číčenice u č.p.51

Rozpočet : 1

úpravy v záchytném prostoru a místě stavby zemního

Základ pro DPH

21 %

278 812,09 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	278 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	278 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
1 Zemní práce											
1	121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14,07	24 692,85		0,00		24 692,85		0,00	
				1 755,00		0,00		1 755,00		0,00	
2	122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do	m3	113,78	71 977,23		0,00		71 977,23		0,00	
				632,60		0,00		632,60		0,00	
3	162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	44,59	28 207,63		0,00		28 207,63		0,00	
				632,60		0,00		632,60		0,00	
4	182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při sva	m2	70,37	153 934,38		0,00		153 934,38		0,00	
				2 187,50		0,00		2 187,50		0,00	
Celkem za : 1 Zemní práce				278 812,09		0,00		278 812,09		0,00	

Soupis provedených prací

za období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Stavba : A 222 092 Odvodnění Čičenice u č.p.51
Objekt : SO 01 Odvodnění Čičenice u č.p.51
Rozpočet : 2 zemní val

Základ pro DPH 21 % 202 599,45 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	202 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	202 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství	
1 Zemní práce								
1	111103212 Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	22 373,77	7 830,82	0,00	7 830,82	0,00	0,00
				0,35	0,00	0,35	0,00	0,00
2	171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 p	m3	93,87	59 870,29	0,00	59 870,29	0,00	0,00
				637,80	0,00	637,80	0,00	0,00
3	181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše pře	m2	14,42	23 949,82	0,00	23 949,82	0,00	0,00
				1 660,87	0,00	1 660,87	0,00	0,00
4	181451121 výsevem včetně utažení lučního v r	m2	4,07	6 759,76	0,00	6 759,76	0,00	0,00
				1 660,87	0,00	1 660,87	0,00	0,00
5	00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	118,00	3 919,72	0,00	3 919,72	0,00	0,00
				33,22	0,00	33,22	0,00	0,00
6	182211121 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahu	m2	105,25	100 269,04	0,00	100 269,04	0,00	0,00
				952,68	0,00	952,68	0,00	0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				202 599,45	0,00	202 599,45	0,00	0,00

Soupis provedených prací

za období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Stavba : A 222 092

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Objekt : SO 01

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Rozpočet : 3

horská vpust

Základ pro DPH

21 %

250 033,77 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	215 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	229 283,77	20 750,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
1 Zemní práce											
1	122251101	m3	209,33	3 296,95		0,00		3 296,95		0,00	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			15,75		0,00		15,75		0,00	
2	162251101	m3	39,27	1 237,01		0,00		1 237,01		0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože			31,50		0,00		31,50		0,00	
3	171103201	m3	93,87	1 478,45		0,00		1 478,45		0,00	
	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 p			15,75		0,00		15,75		0,00	
Celkem za : 1 Zemní práce				6 012,41		0,00		6 012,41		0,00	
3 Svislé a kompletní konstrukce											
4	321321116	m3	6 151,15	58 964,92		0,00		58 964,92		0,00	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektrár			9,59		0,00		9,59		0,00	
5	321351010	m2	1 226,11	59 440,59		0,00		59 440,59		0,00	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavební			48,48		0,00		48,48		0,00	
6	321352010	m2	401,37	19 458,02		0,00		19 458,02		0,00	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavební			48,48		0,00		48,48		0,00	
7	321366112	t	53 731,71	77 266,20		0,00		77 266,20		0,00	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby v			1,44		0,00		1,44		0,00	
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				215 129,73		0,00		215 129,73		0,00	
4 Vodorovné konstrukce											
8	451541111	m3	1 170,31	565,26		0,00		565,26		0,00	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm			0,48		0,00		0,48		0,00	
Celkem za : 4 Vodorovné konstrukce				565,26		0,00		565,26		0,00	
8 Trubní vedení											
9	899501221	kus	145,34	1 453,40		0,00		1 453,40		0,00	
	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmož			10,00		0,00		10,00		0,00	
Celkem za : 8 Trubní vedení				1 453,40		0,00		1 453,40		0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
10	953334423	m	409,31	5 321,03		0,00		5 321,03		0,00	
	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha			13,00		0,00		13,00		0,00	
Celkem za : 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 321,03		0,00		5 321,03		0,00	
998 Přesun hmot											
11	998322011	t	410,20	801,94		0,00		801,94		0,00	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 50			1,96		0,00		1,96		0,00	
Celkem za : 998 Přesun hmot				801,94		0,00		801,94		0,00	
767 Konstrukce zámečnické											
12	767101501	kus	20 750,00	20 750,00		0,00		20 750,00		0,00	
	Dodávka a osazení ocelových česlí s rámem, rozměr 370 x 160cm, povrchová úprava žárovým zinkováním			1,00		0,00		1,00		0,00	
Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické				20 750,00		0,00		20 750,00		0,00	

Soupis provedených prací

za období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Stavba : A 222 092

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Objekt : SO 01

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Rozpočet : 4

zatrubněný odtok

Základ pro DPH

21 %

581 609,99 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	300 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	5 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	256 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	20 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	581 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
1 Zemní práce											
1	121151103	m2	56,00	2 721,60		0,00		2 721,60		0,00	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm			48,60		0,00		48,60		0,00	
2	132254102	m3	861,76	33 091,58		0,00		33 091,58		0,00	
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v h			38,40		0,00		38,40		0,00	
3	133254101	m3	963,06	31 203,14		0,00		31 203,14		0,00	
	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			32,40		0,00		32,40		0,00	
4	139001101	m3	545,62	7 365,87		0,00		7 365,87		0,00	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbu			13,50		0,00		13,50		0,00	
5	141721216	m	2 520,00	168 840,00		0,00		168 840,00		0,00	
	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4			67,00		0,00		67,00		0,00	
6	151101201	m2	110,91	2 129,47		0,00		2 129,47		0,00	
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m			19,20		0,00		19,20		0,00	
7	151101211	m2	32,78	629,38		0,00		629,38		0,00	
	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od			19,20		0,00		19,20		0,00	
8	151101301	m3	59,62	858,53		0,00		858,53		0,00	
	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů sápotřebným přepažováním při pažení příloženém, hlo			14,40		0,00		14,40		0,00	
9	151101311	m3	13,11	188,78		0,00		188,78		0,00	
	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pa			14,40		0,00		14,40		0,00	
10	151811131	m2	110,00	11 264,00		0,00		11 264,00		0,00	
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířk			102,40		0,00		102,40		0,00	
11	151811132	m2	145,00	2 784,00		0,00		2 784,00		0,00	
	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířk			19,20		0,00		19,20		0,00	
12	151811231	m2	72,00	7 372,80		0,00		7 372,80		0,00	
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,			102,40		0,00		102,40		0,00	
13	151811232	m2	88,00	1 689,60		0,00		1 689,60		0,00	
	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,			19,20		0,00		19,20		0,00	
14	162251102	m3	44,59	937,42		0,00		937,42		0,00	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože			21,02		0,00		21,02		0,00	
15	167151101	m3	154,04	3 238,38		0,00		3 238,38		0,00	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství			21,02		0,00		21,02		0,00	
16	171103201	m3	93,87	1 973,42		0,00		1 973,42		0,00	
	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 p			21,02		0,00		21,02		0,00	
17	174151101	m3	143,35	7 607,01		0,00		7 607,01		0,00	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šac			53,07		0,00		53,07		0,00	
18	175151101	m3	212,73	2 722,94		0,00		2 722,94		0,00	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo mat			12,80		0,00		12,80		0,00	
19	58337310	t	373,00	9 548,80		0,00		9 548,80		0,00	
	štěrkopisek frakce 0/4			25,60		0,00		25,60		0,00	
20	181351003	m2	74,47	3 619,24		0,00		3 619,24		0,00	
	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do			48,60		0,00		48,60		0,00	
21	181411121	m2	6,58	319,79		0,00		319,79		0,00	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rov			48,60		0,00		48,60		0,00	

Stavba : A 222 092	Odvodnění Čičenice u č.p.51	Zjišťovací protokol č. 1
Objekt : SO 01	Odvodnění Čičenice u č.p.51	Datum tisku : 18.11.2022
Rožpočet : 4		

Por.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá	
				cena množství		cena množství		cena množství		cena množství	
22	00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	118,00	114,70 0,97		0,00 0,00		114,70 0,97		0,00 0,00	
Celkem za : 1 Zemní práce				300 220,46		0,00		300 220,46		0,00	
4 Vodorovné konstrukce											
23	451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1 170,31	263,32 0,23		0,00 0,00		263,32 0,23		0,00 0,00	
24	451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až	m3	1 429,23	3 658,83 2,56		0,00 0,00		3 658,83 2,56		0,00 0,00	
25	452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce zábetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, sto	m3	3 226,75	1 090,64 0,34		0,00 0,00		1 090,64 0,34		0,00 0,00	
Celkem za : 4 Vodorovné konstrukce				5 012,79		0,00		5 012,79		0,00	
8 Trubní vedení											
26	871364201 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném	m	241,82	16 201,94 67,00		0,00 0,00		16 201,94 67,00		0,00 0,00	
27	28613700 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 250x22.7mm dl 12m	m	2 575,00	181 151,25 70,35		0,00 0,00		181 151,25 70,35		0,00 0,00	
28	877365201 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16	kus	662,08	4 634,56 7,00		0,00 0,00		4 634,56 7,00		0,00 0,00	
29	28615982 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 250mm	kus	3 140,00	21 980,00 7,00		0,00 0,00		21 980,00 7,00		0,00 0,00	
30	894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř.	kus	10 821,75	10 821,75 1,00		0,00 0,00		10 821,75 1,00		0,00 0,00	
31	59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	8 310,00	8 310,00 1,00		0,00 0,00		8 310,00 1,00		0,00 0,00	
32	59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	2 569,00	2 569,00 1,00		0,00 0,00		2 569,00 1,00		0,00 0,00	
33	59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	346,00	346,00 1,00		0,00 0,00		346,00 1,00		0,00 0,00	
34	59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	224,00	224,00 1,00		0,00 0,00		224,00 1,00		0,00 0,00	
35	899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zařízení D400, E600	kus	1 180,38	1 180,38 1,00		0,00 0,00		1 180,38 1,00		0,00 0,00	
36	55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace s pantem	kus	3 460,00	3 460,00 1,00		0,00 0,00		3 460,00 1,00		0,00 0,00	
37	899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	13,85	443,20 32,00		0,00 0,00		443,20 32,00		0,00 0,00	
38	899801501 Příplatek za uřízení kanalizační šachty na stávajícím kanalizačním potrubí, napojení potrubí	kus	5 000,00	5 000,00 1,00		0,00 0,00		5 000,00 1,00		0,00 0,00	
Celkem za : 8 Trubní vedení				256 322,08		0,00		256 322,08		0,00	
998 Přesun hmot											
39	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zátrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod	t	628,87	20 054,66 31,89		0,00 0,00		20 054,66 31,89		0,00 0,00	
Celkem za : 998 Přesun hmot				20 054,66		0,00		20 054,66		0,00	

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Číslo zakázky : 039/22

Stavba : A 222 092

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Objekt : VON

Vedlejší a ostatní náklady

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	169 250,00	0,00	169 250,00	0,00

ZVANOVEC

a.s.
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 (2)
DIČ: CZ026026279

Za zhotovitele

Odvodnění Čičenice
Odvodnění č.p. 79, 387 71
181 385 181 101
DIČ: 00261097

Za objednatele

Soupis provedených prací

za období od 19.9.2022 do 18.11.2022

Stavba : A 222 092

Odvodnění Čičenice u č.p.51

Objekt : VON

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet : VON

Vedlejší a ostatní náklady

Základ pro DPH

21 %

169 250,00 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3 Zařízení staveniště	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
1	011114000 Inženýrsko-geologický průzkum	---	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00
2	011114001 Statické zkoušky hutnění	kus	2 750,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
				3,00	0,00	3,00	0,00
3	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	---	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00
4	012303001 Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	---	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00
5	013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tiště	---	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00
6	013254002 Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení příslušnými správci	---	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za : VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				114 250,00	0,00	114 250,00	0,00
VRN3 Zařízení staveniště							
7	030001000 Zařízení staveniště	---	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
				1,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za : VRN3 Zařízení staveniště				55 000,00	0,00	55 000,00	0,00

