



1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŘÍŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

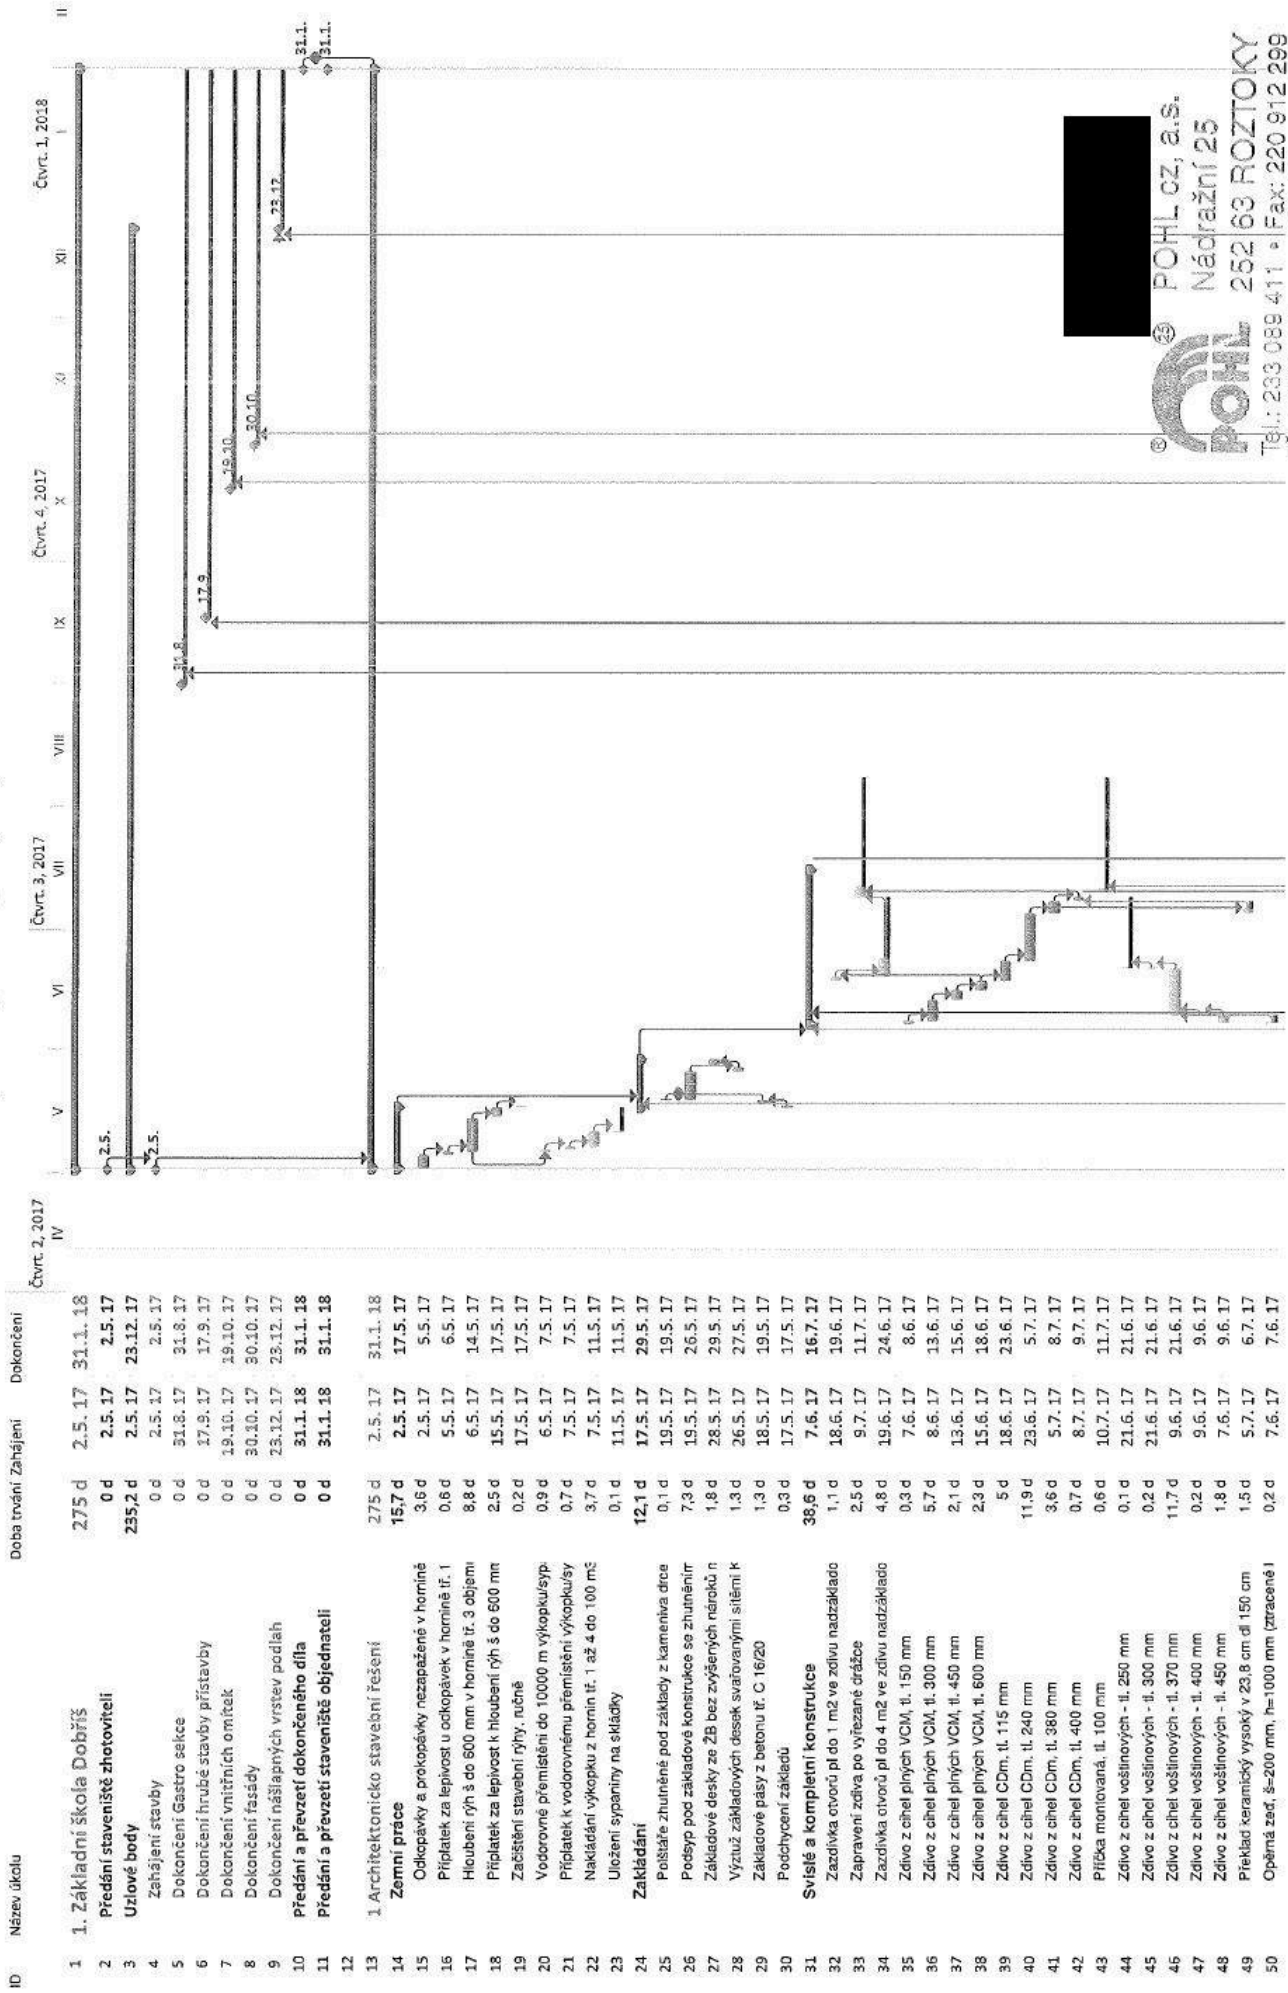


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	1. Základní škola Dobříš	275 d	2.5.17	31.1.18
2	Předání staveniště zhotoviteli	0 d	2.5.17	2.5.17
3	Uzlové body	235,2 d	2.5.17	23.12.17
4	Zahájení stavby	0 d	2.5.17	2.5.17
5	Dokončení Gastro sěky	0 d	31.8.17	31.8.17
6	Dokončení hrubé stavby přístavby	0 d	17.9.17	17.9.17
7	Dokončení vnitřních omítek	0 d	19.10.17	19.10.17
8	Dokončení fasády	0 d	30.10.17	30.10.17
9	Dokončení nášlapných vrstev podlah	0 d	23.12.17	23.12.17
10	Předání a převzetí dokončeného díla	0 d	31.1.18	31.1.18
11	Předání a převzetí staveniště objednateli	0 d	31.1.18	31.1.18
12				
13	1. Architektonicko stavební řešení	275 d	2.5.17	31.1.18
14	Zemní práce	15,7 d	2.5.17	17.5.17
15	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině	3,6 d	2.5.17	5.5.17
16	Příplatek za lepkovost v otkopávek v hornině tř. 1	0,8 d	5.5.17	6.5.17
17	Houbení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemi	8,8 d	6.5.17	14.5.17
18	Příplatek za lepkovost k houbení rýh š do 600 mm	2,5 d	15.5.17	17.5.17
19	Začistění stavební rýhy, ručně	0,2 d	17.5.17	17.5.17
20	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/šyp	0,9 d	6.5.17	7.5.17
21	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/šyp	0,7 d	7.5.17	7.5.17
22	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 mš	3,7 d	7.5.17	11.5.17
23	Uložení sypáníny na skládky	0,1 d	11.5.17	11.5.17
24	Zakládání	12,1 d	17.5.17	29.5.17
25	Posištění zhuňené pod základy z kameniva drce	0,1 d	19.5.17	19.5.17
26	Podšyp pod základové konstrukce se zhuňením	7,3 d	19.5.17	26.5.17
27	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků n	1,8 d	28.5.17	29.5.17
28	Výztuž základových desek svařovanými síťmi k	1,3 d	26.5.17	27.5.17
29	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	1,3 d	18.5.17	19.5.17
30	Podchycení základů	0,3 d	17.5.17	17.5.17
31	Svislé a kompletní konstrukce	38,6 d	7.6.17	16.7.17
32	Zadávka otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> ve zdvi nadzáklado	1,1 d	18.6.17	19.6.17
33	Zapravení zdvo po vyřezané drážce	2,5 d	9.7.17	11.7.17
34	Zadávka otvorů pl do 4 m <sup>2</sup> ve zdvi nadzáklado	4,8 d	19.6.17	24.6.17
35	Zdivo z cihel plných VCM, tl. 150 mm	0,3 d	7.6.17	8.6.17
36	Zdivo z cihel plných VCM, tl. 300 mm	5,7 d	8.6.17	13.6.17
37	Zdivo z cihel plných VCM, tl. 450 mm	2,1 d	13.6.17	15.6.17
38	Zdivo z cihel plných VCM, tl. 600 mm	2,3 d	15.6.17	18.6.17
39	Zdivo z cihel CDm, tl. 115 mm	5 d	18.6.17	23.6.17
40	Zdivo z cihel CDm, tl. 240 mm	11,9 d	23.6.17	5.7.17
41	Zdivo z cihel CDm, tl. 380 mm	3,6 d	5.7.17	8.7.17
42	Zdivo z cihel CDm, tl. 400 mm	0,7 d	8.7.17	9.7.17
43	Příbka montovaná, tl. 100 mm	0,6 d	10.7.17	11.7.17
44	Zdivo z cihel voštinových - tl. 250 mm	0,1 d	21.6.17	21.6.17
45	Zdivo z cihel voštinových - tl. 300 mm	0,2 d	21.6.17	21.6.17
46	Zdivo z cihel voštinových - tl. 370 mm	11,7 d	9.6.17	21.6.17
47	Zdivo z cihel voštinových - tl. 400 mm	0,2 d	9.6.17	9.6.17
48	Zdivo z cihel voštinových - tl. 450 mm	1,8 d	7.6.17	9.6.17
49	Příklad keramický vysoký v 23,8 cm d 150 cm	1,5 d	5.7.17	6.7.17
50	Opěrná zeď, š=200 mm, h=1000 mm (ztraceně I	0,2 d	7.6.17	7.6.17

**POHL** cz, a.s.  
Nádražní 25  
252 63 ROZTOKY  
Těl.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299  
IČ: 25660466 • DIČ: CZ25660466


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

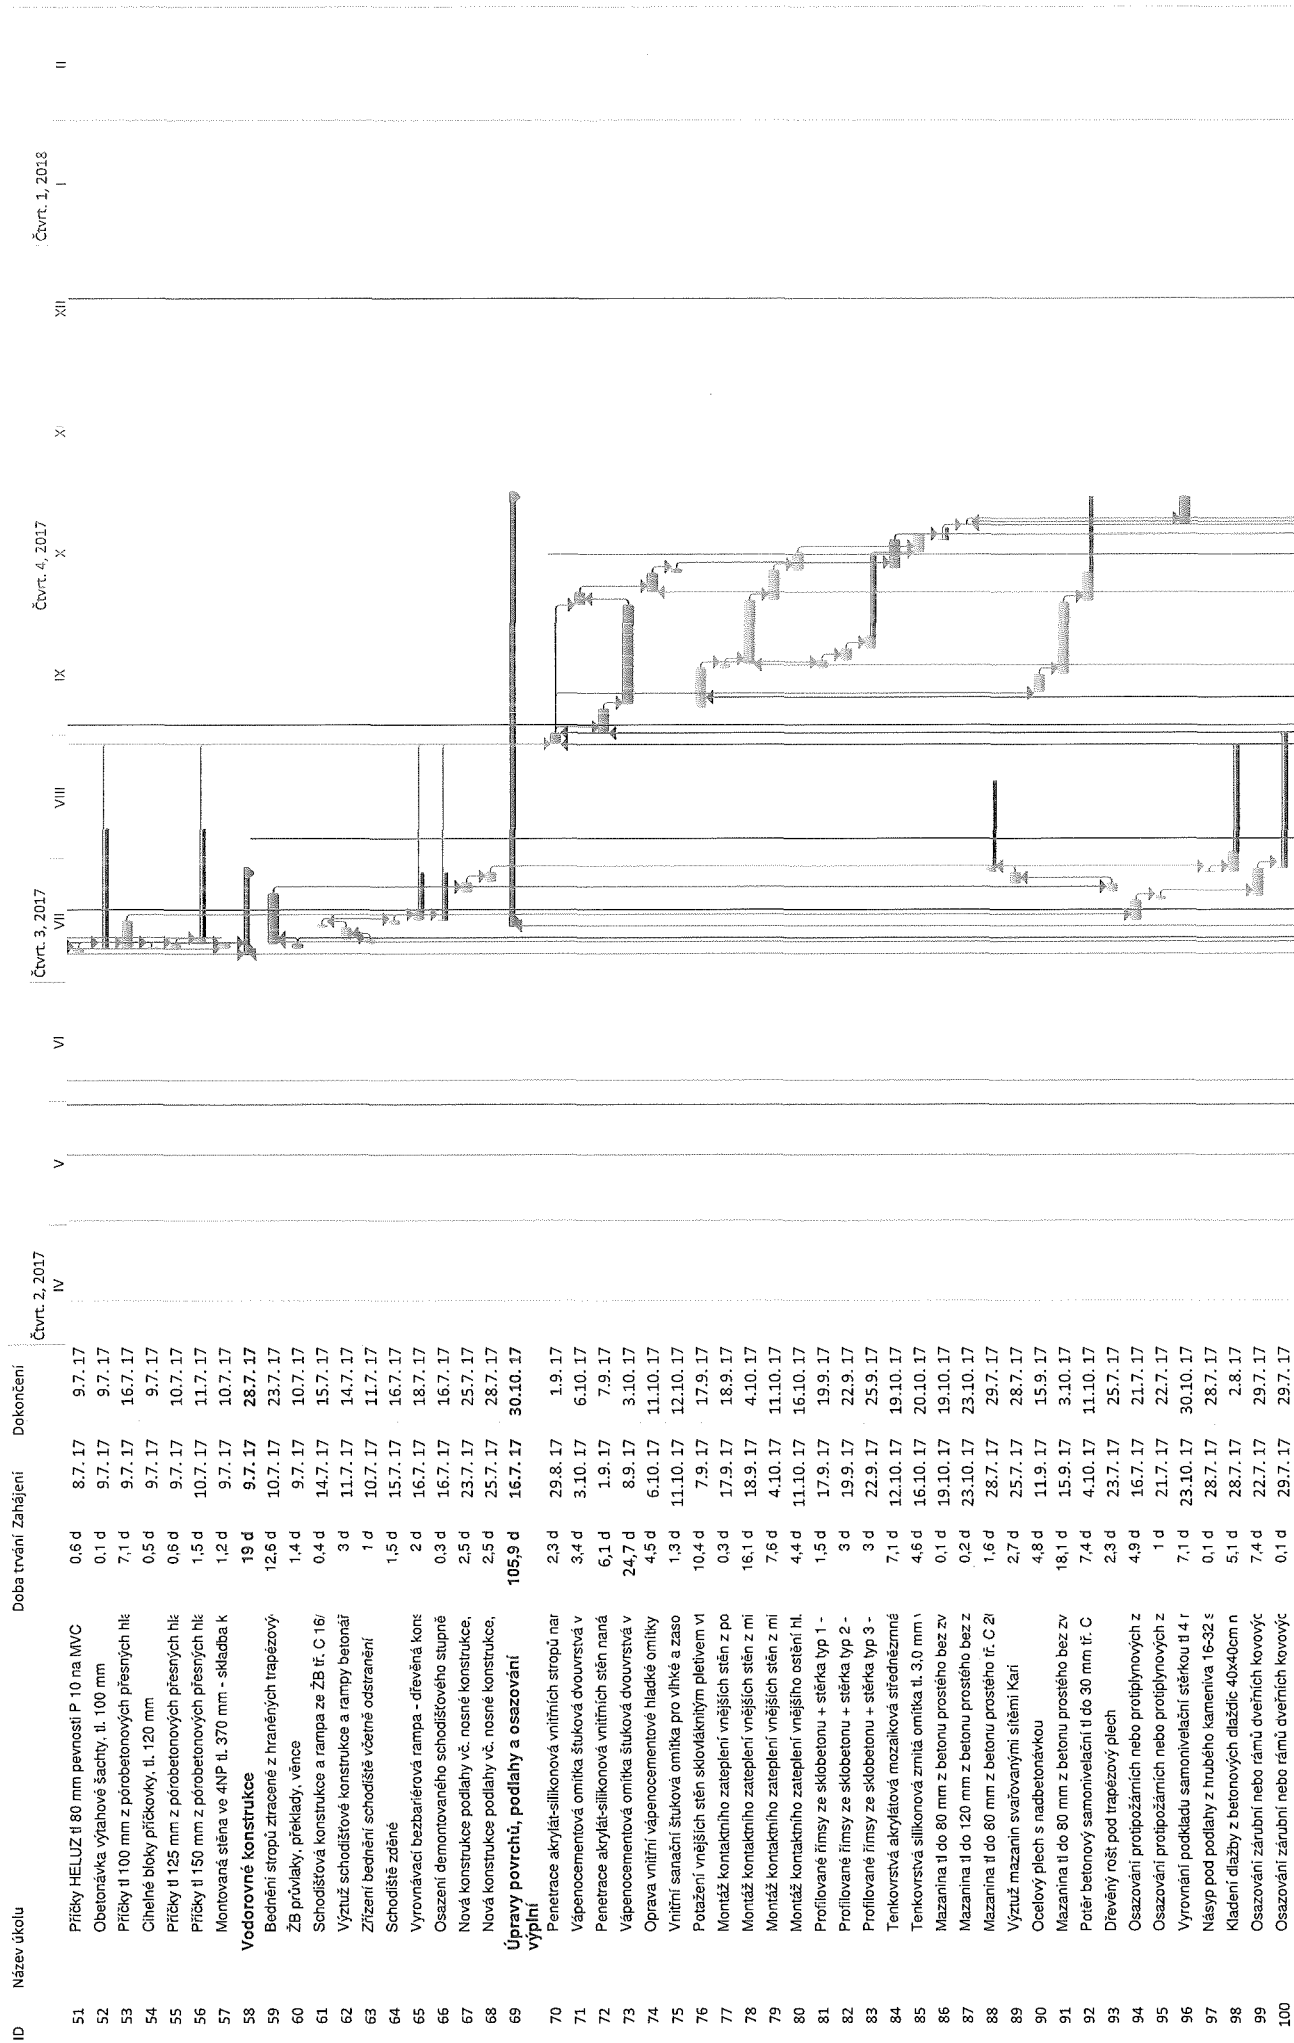


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, vana, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

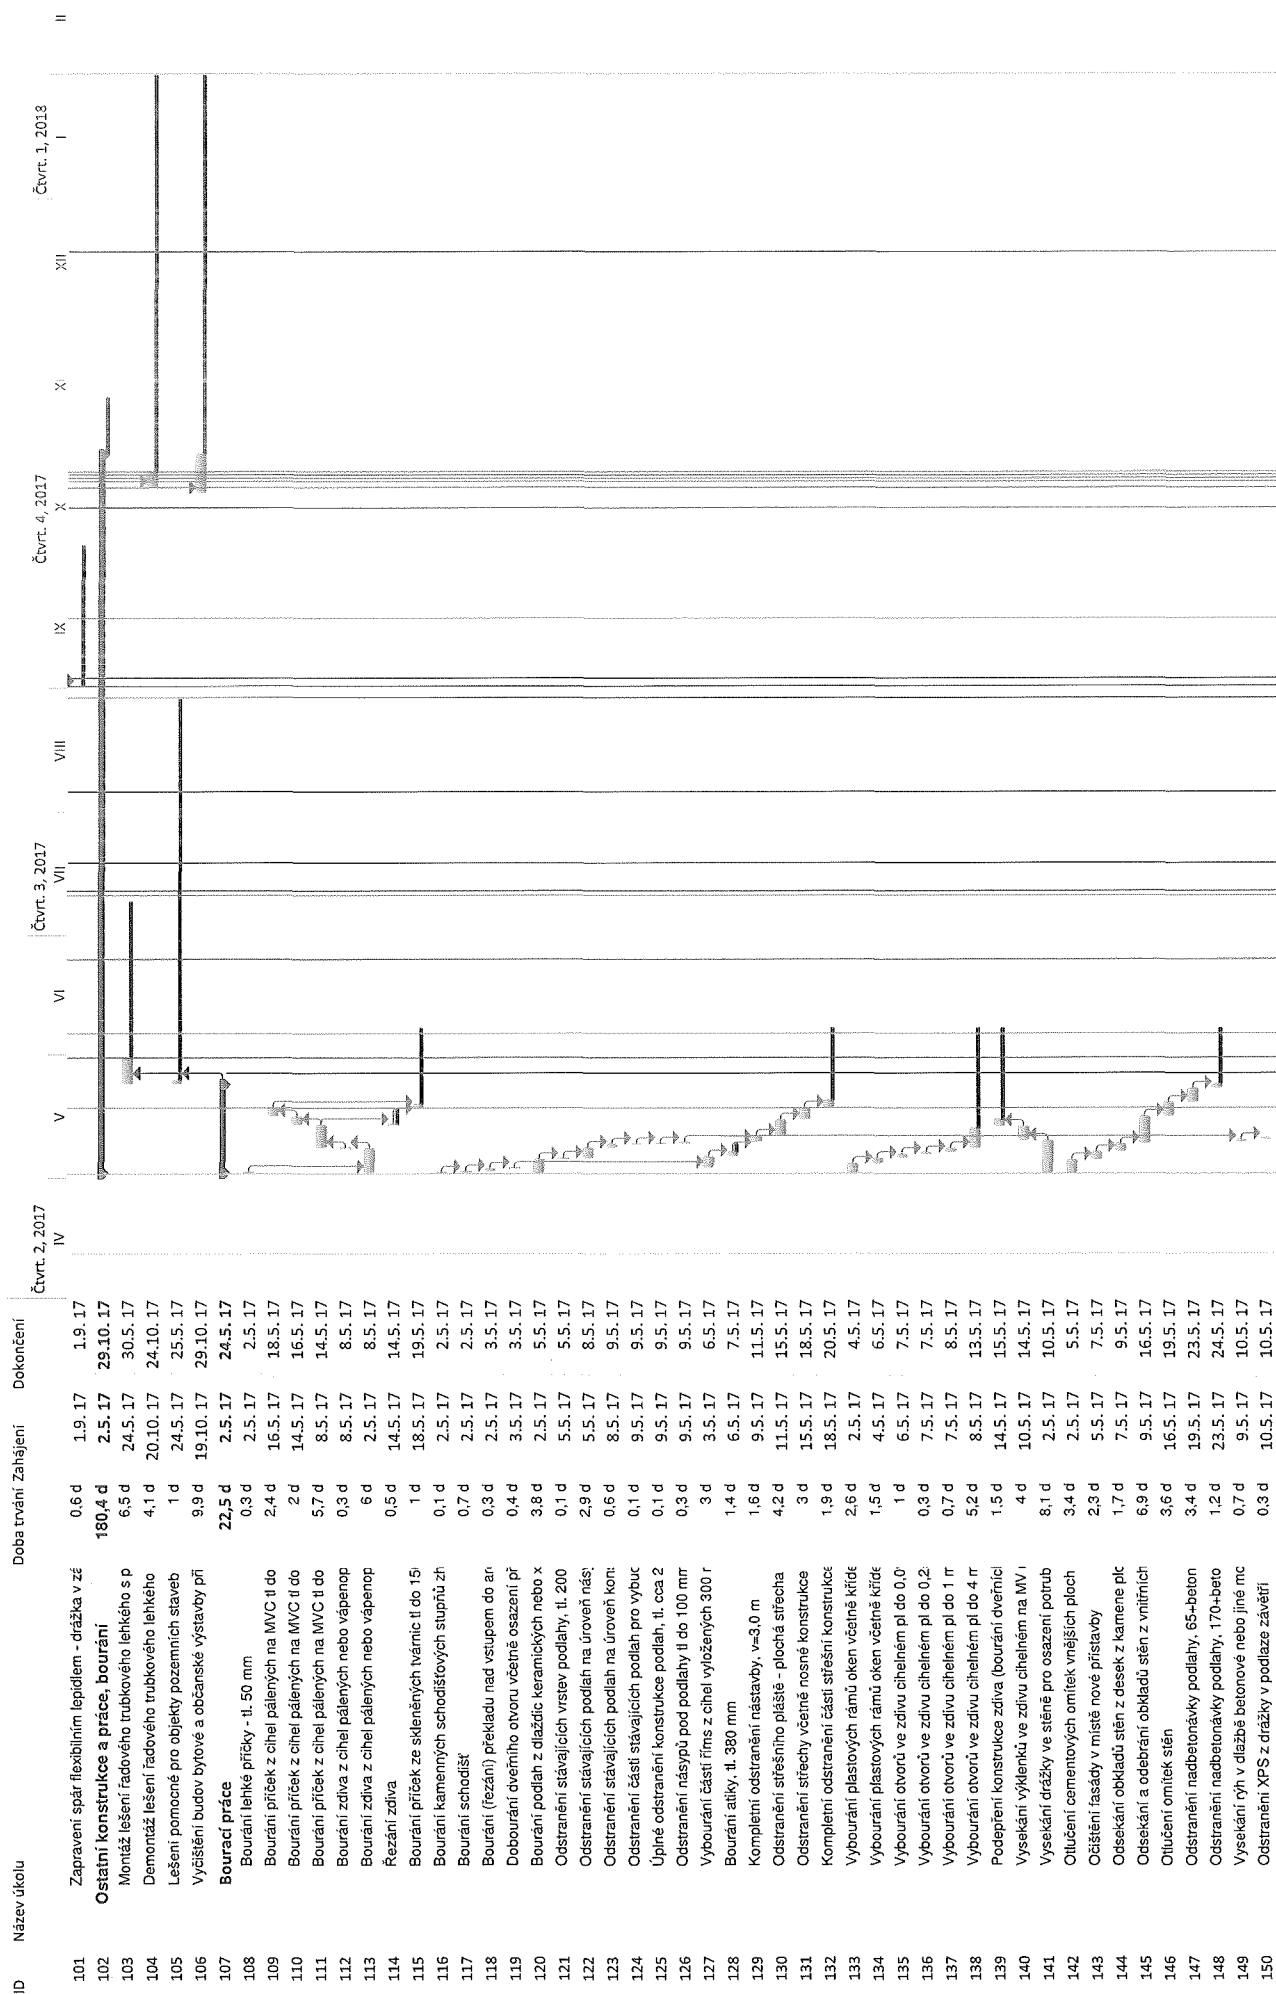


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŮŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

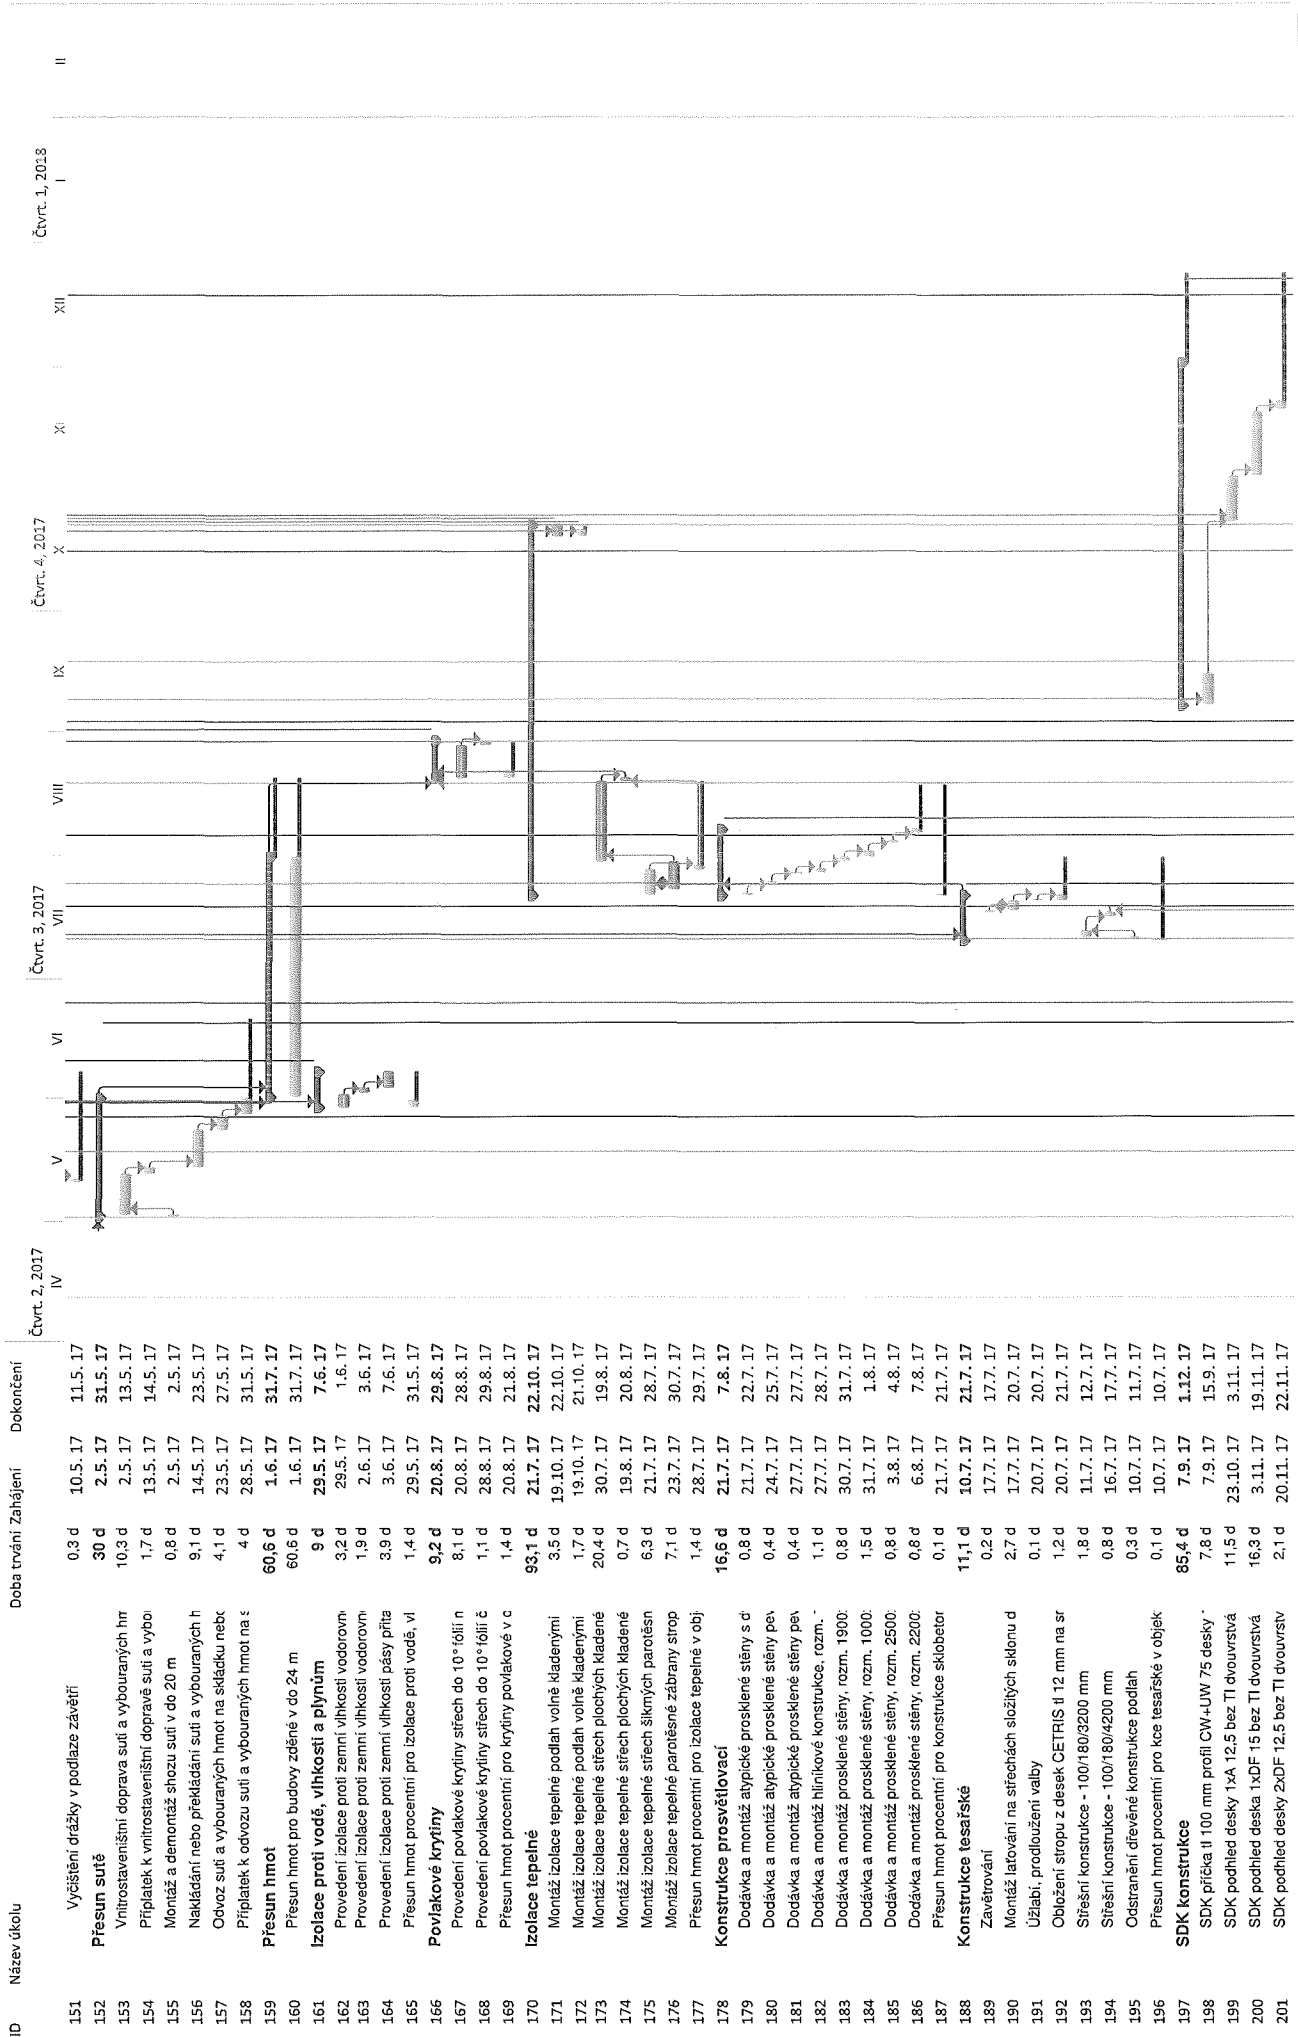


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, útebný  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

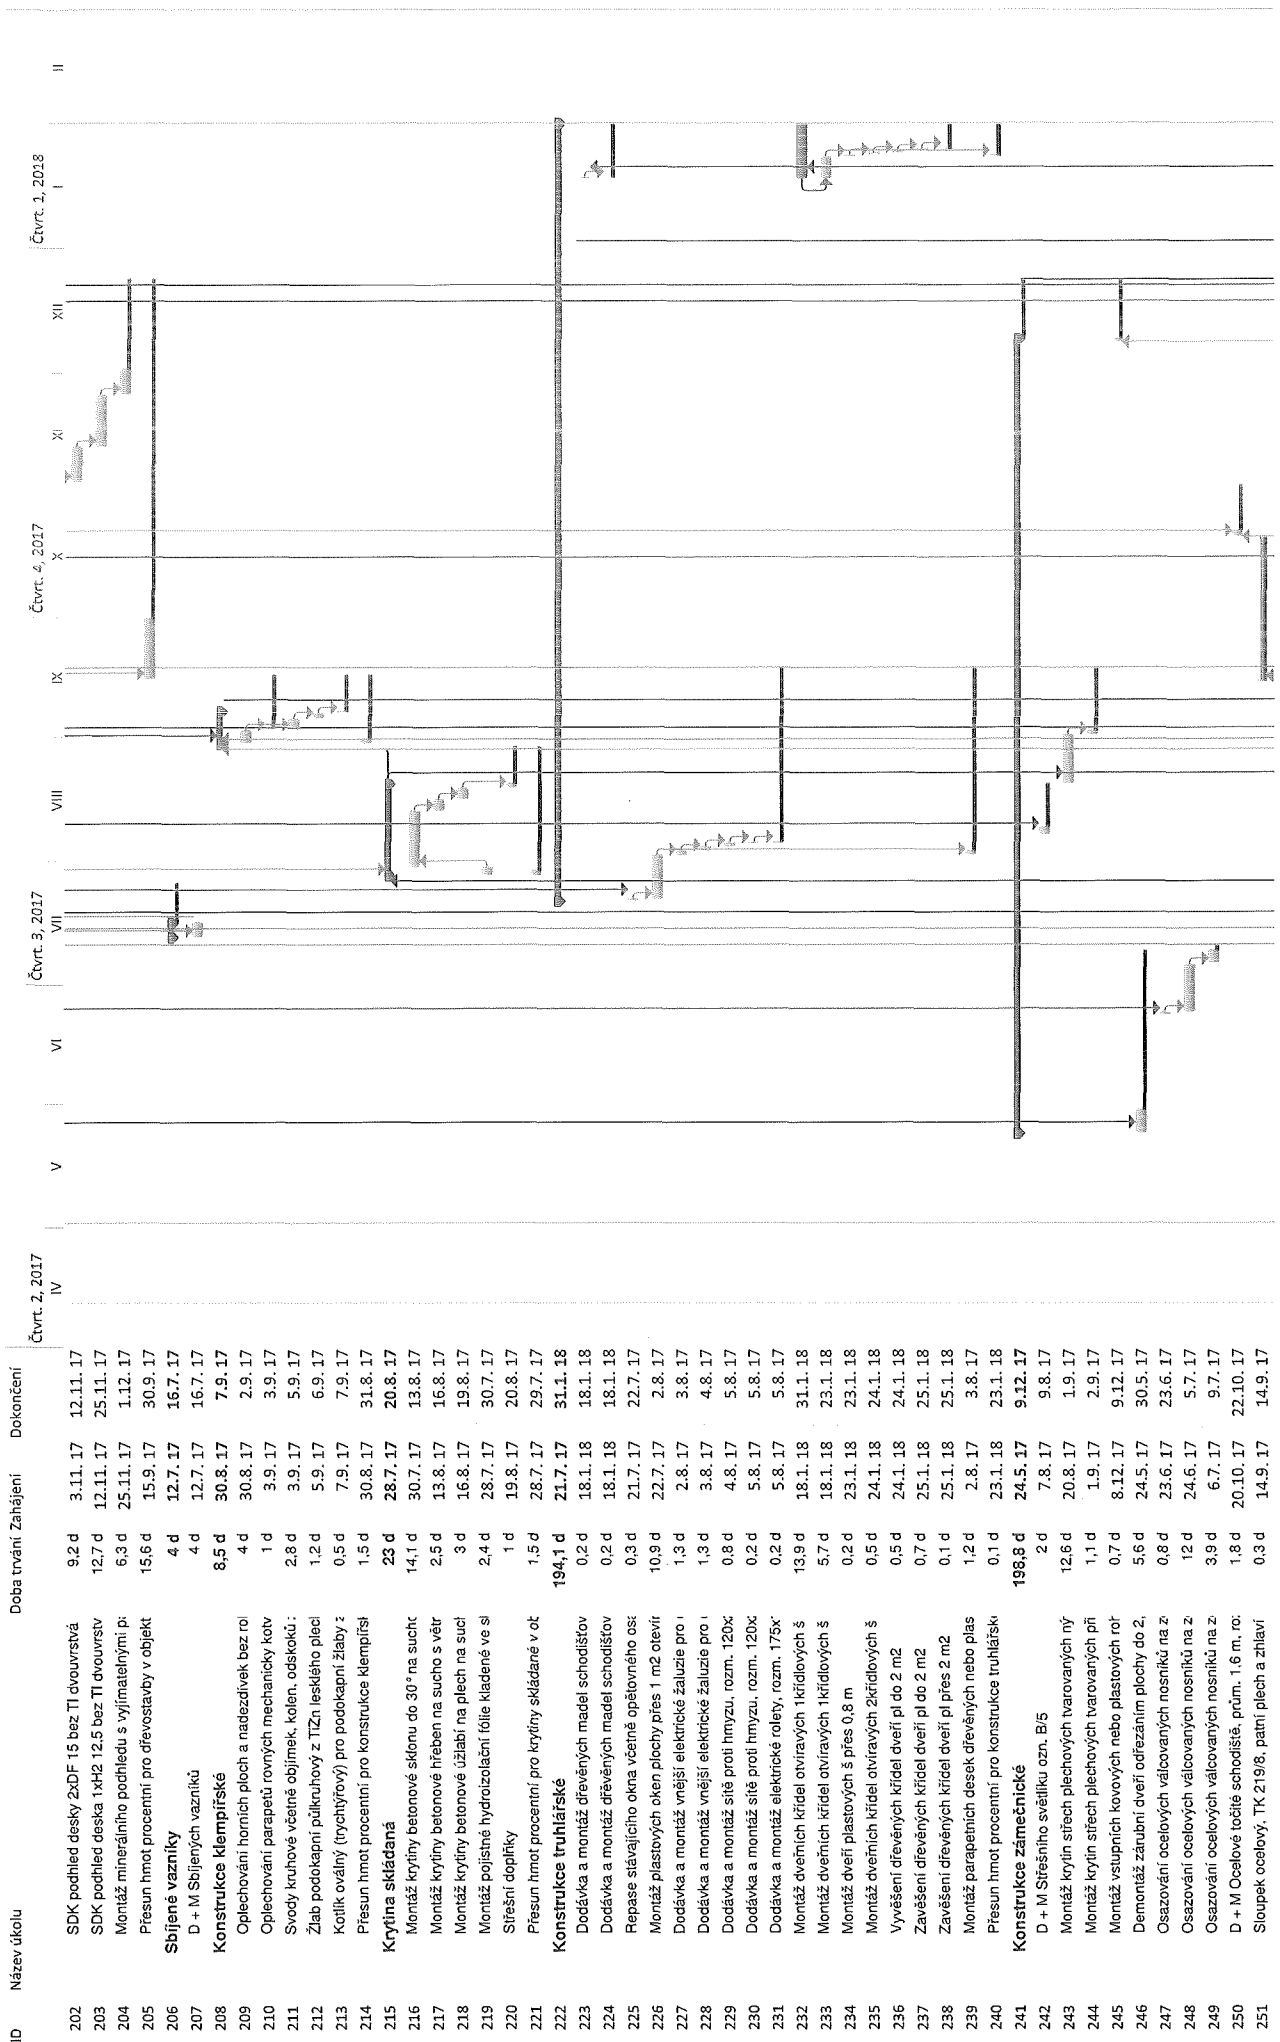


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - žitny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

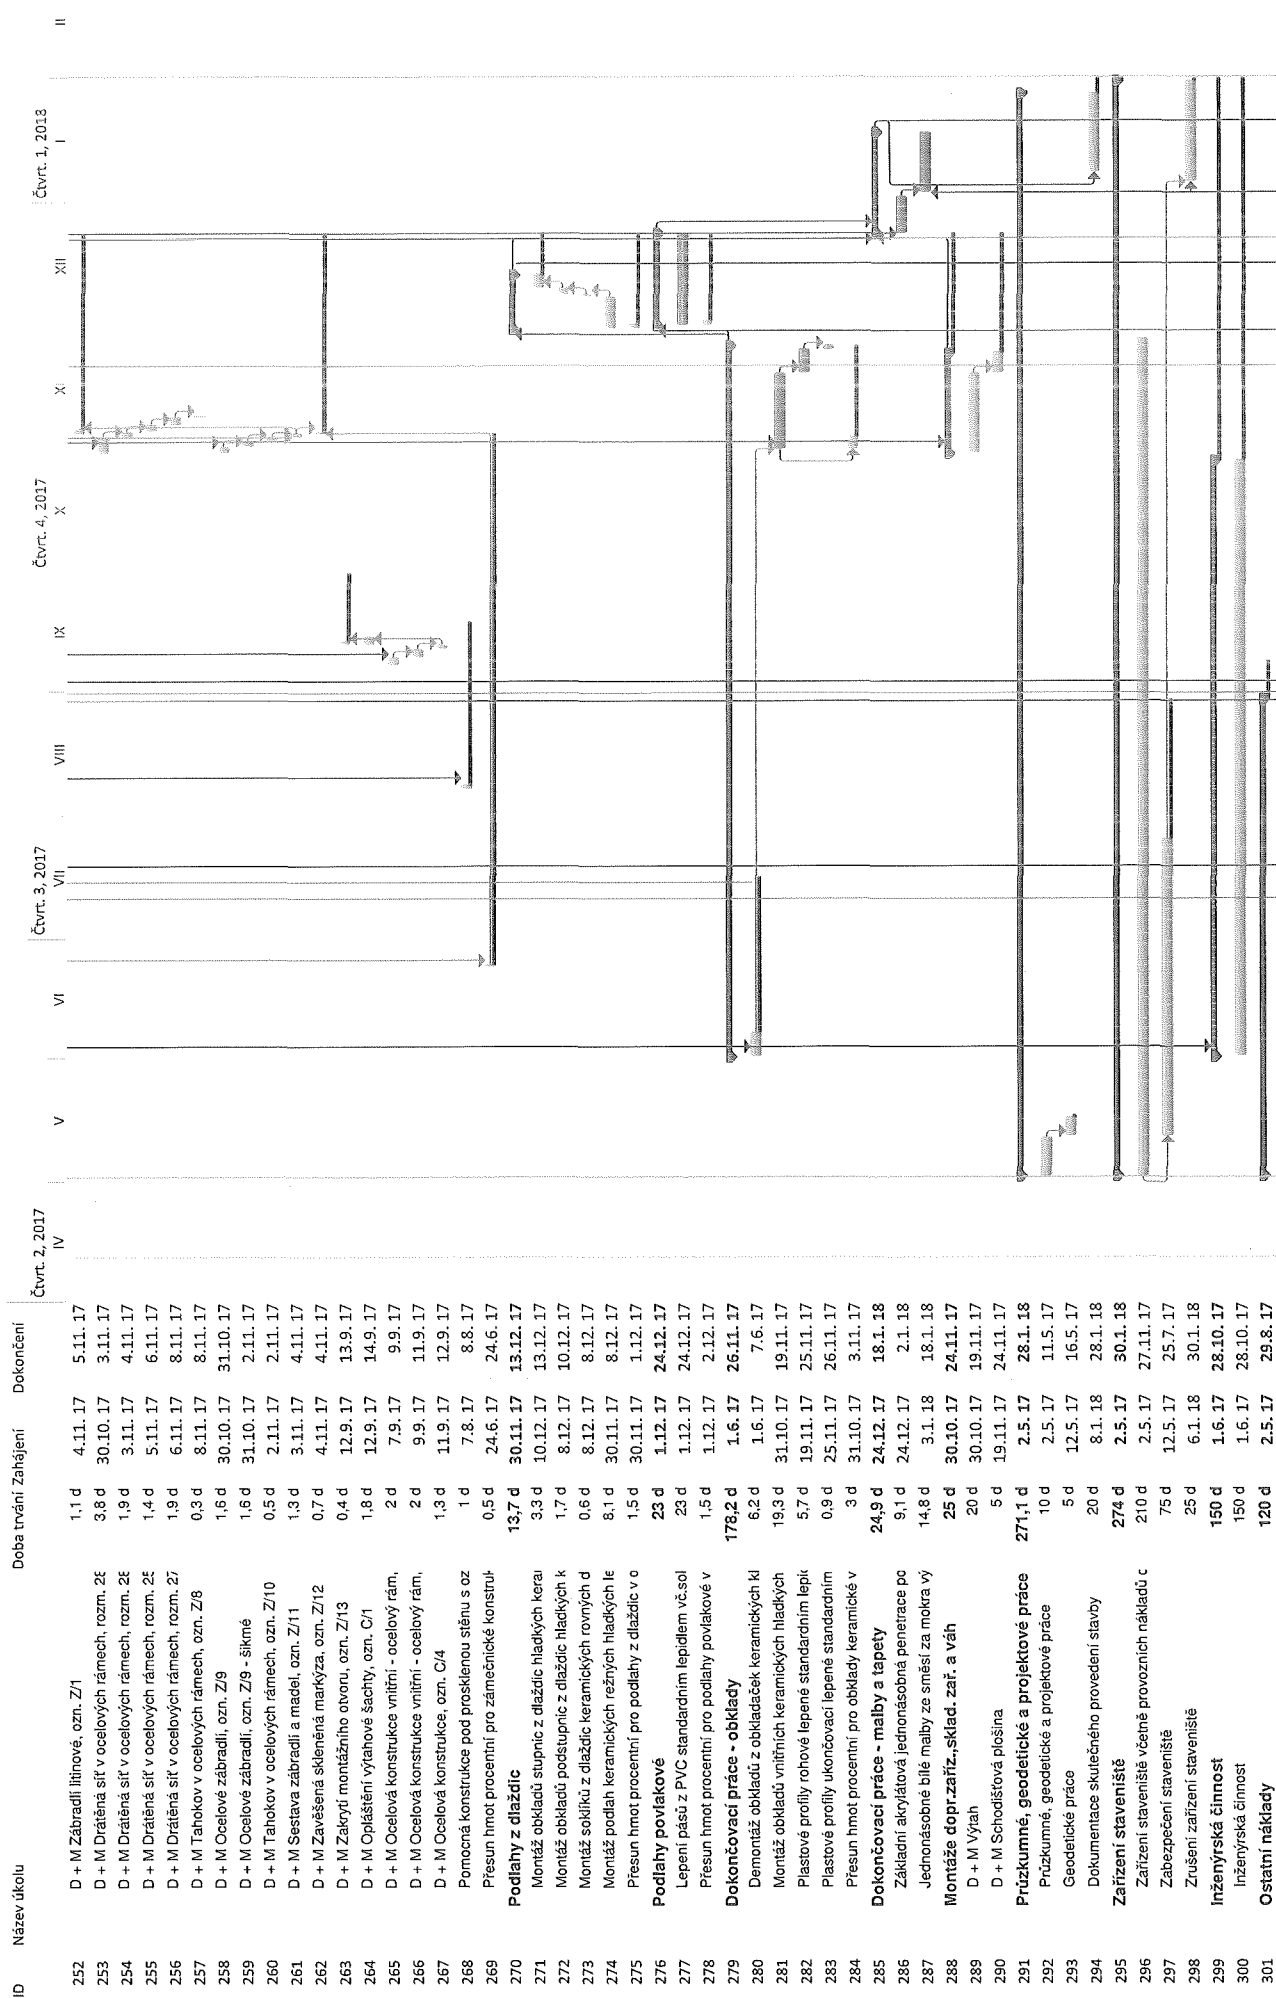

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

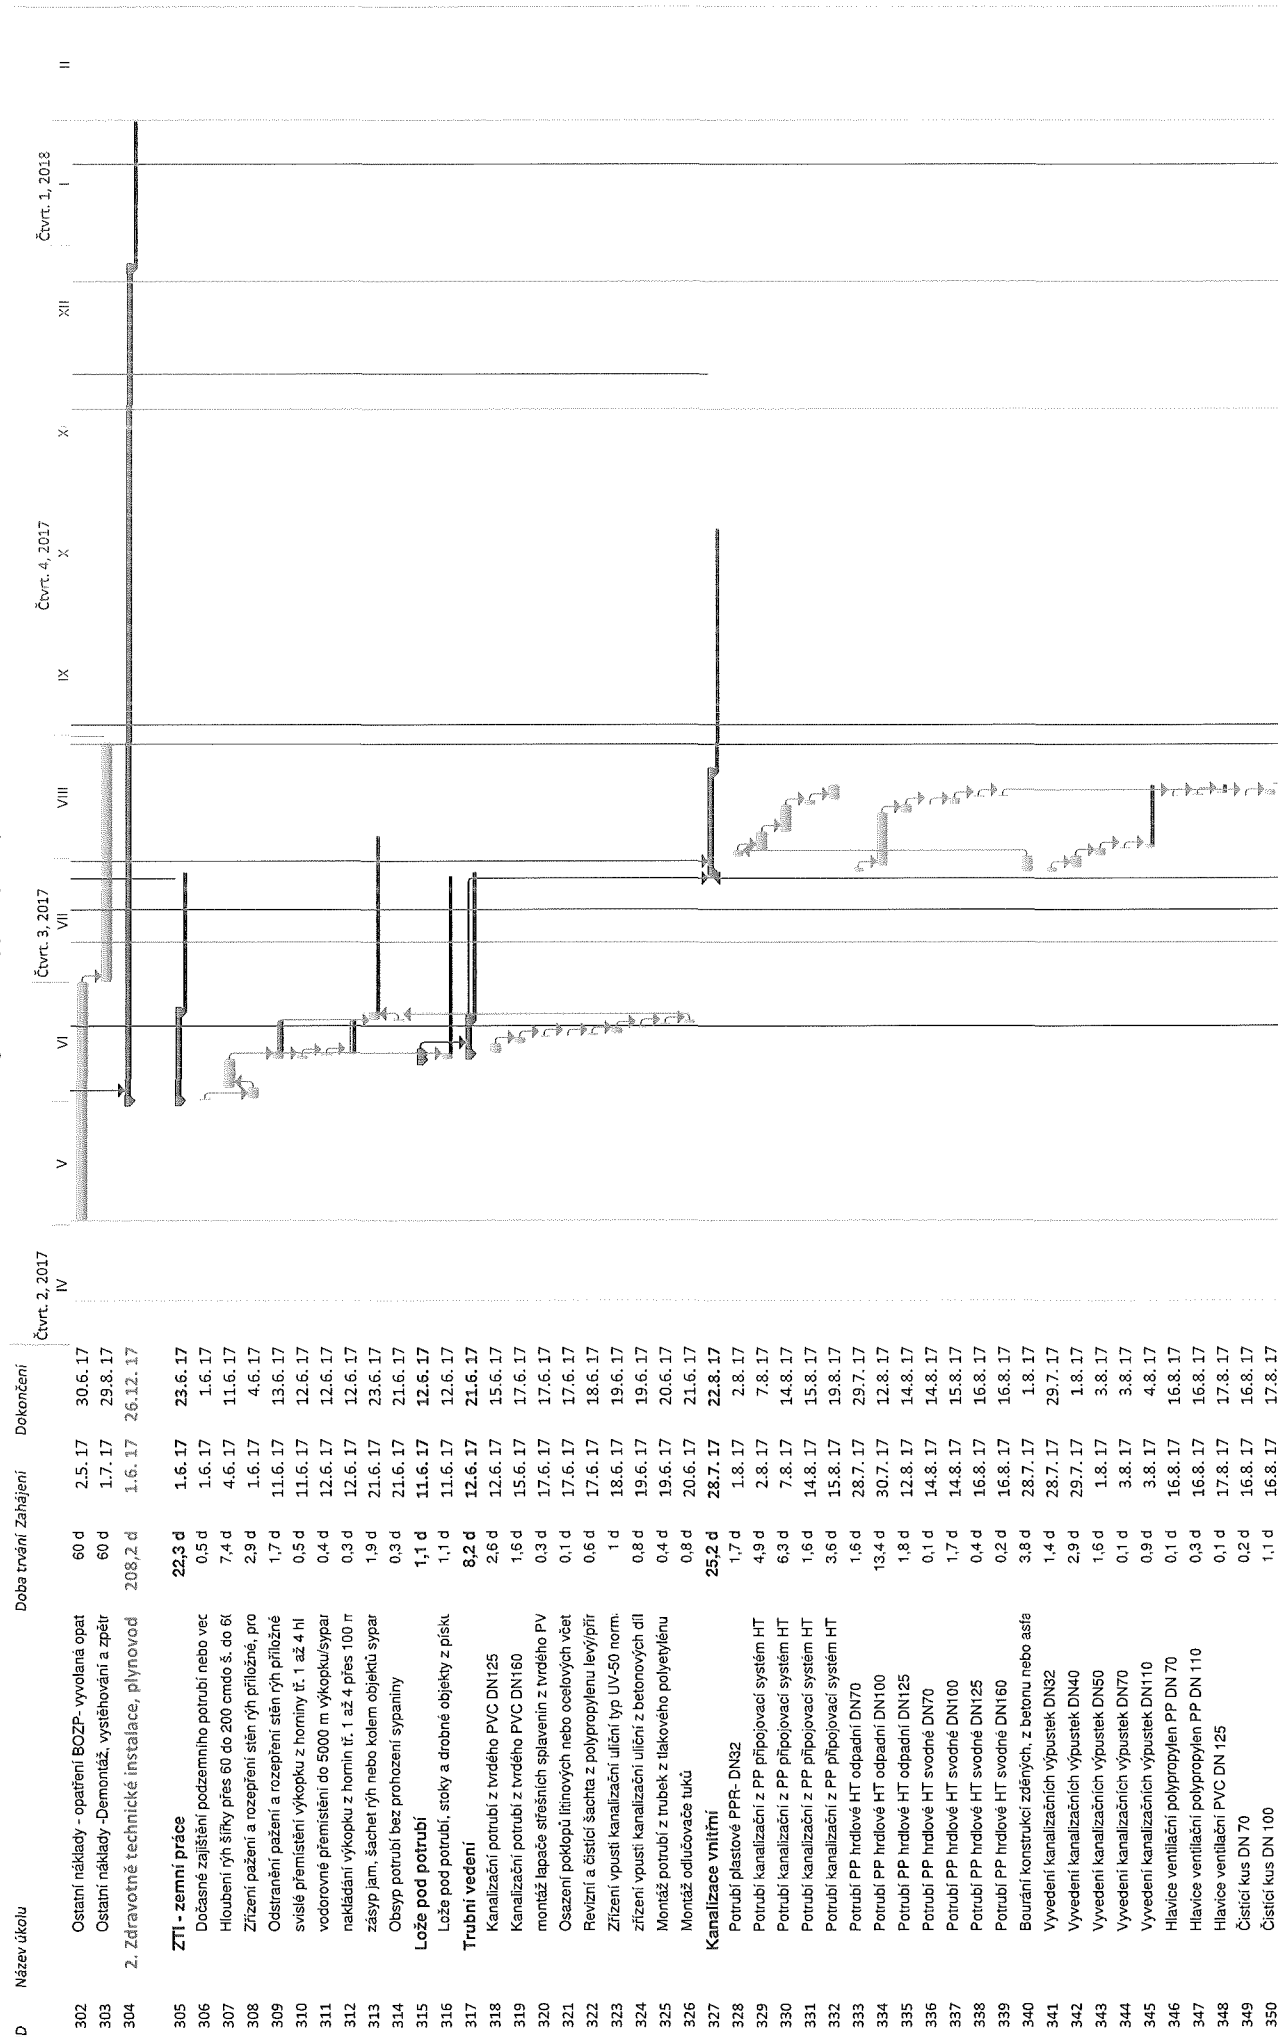


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šetny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

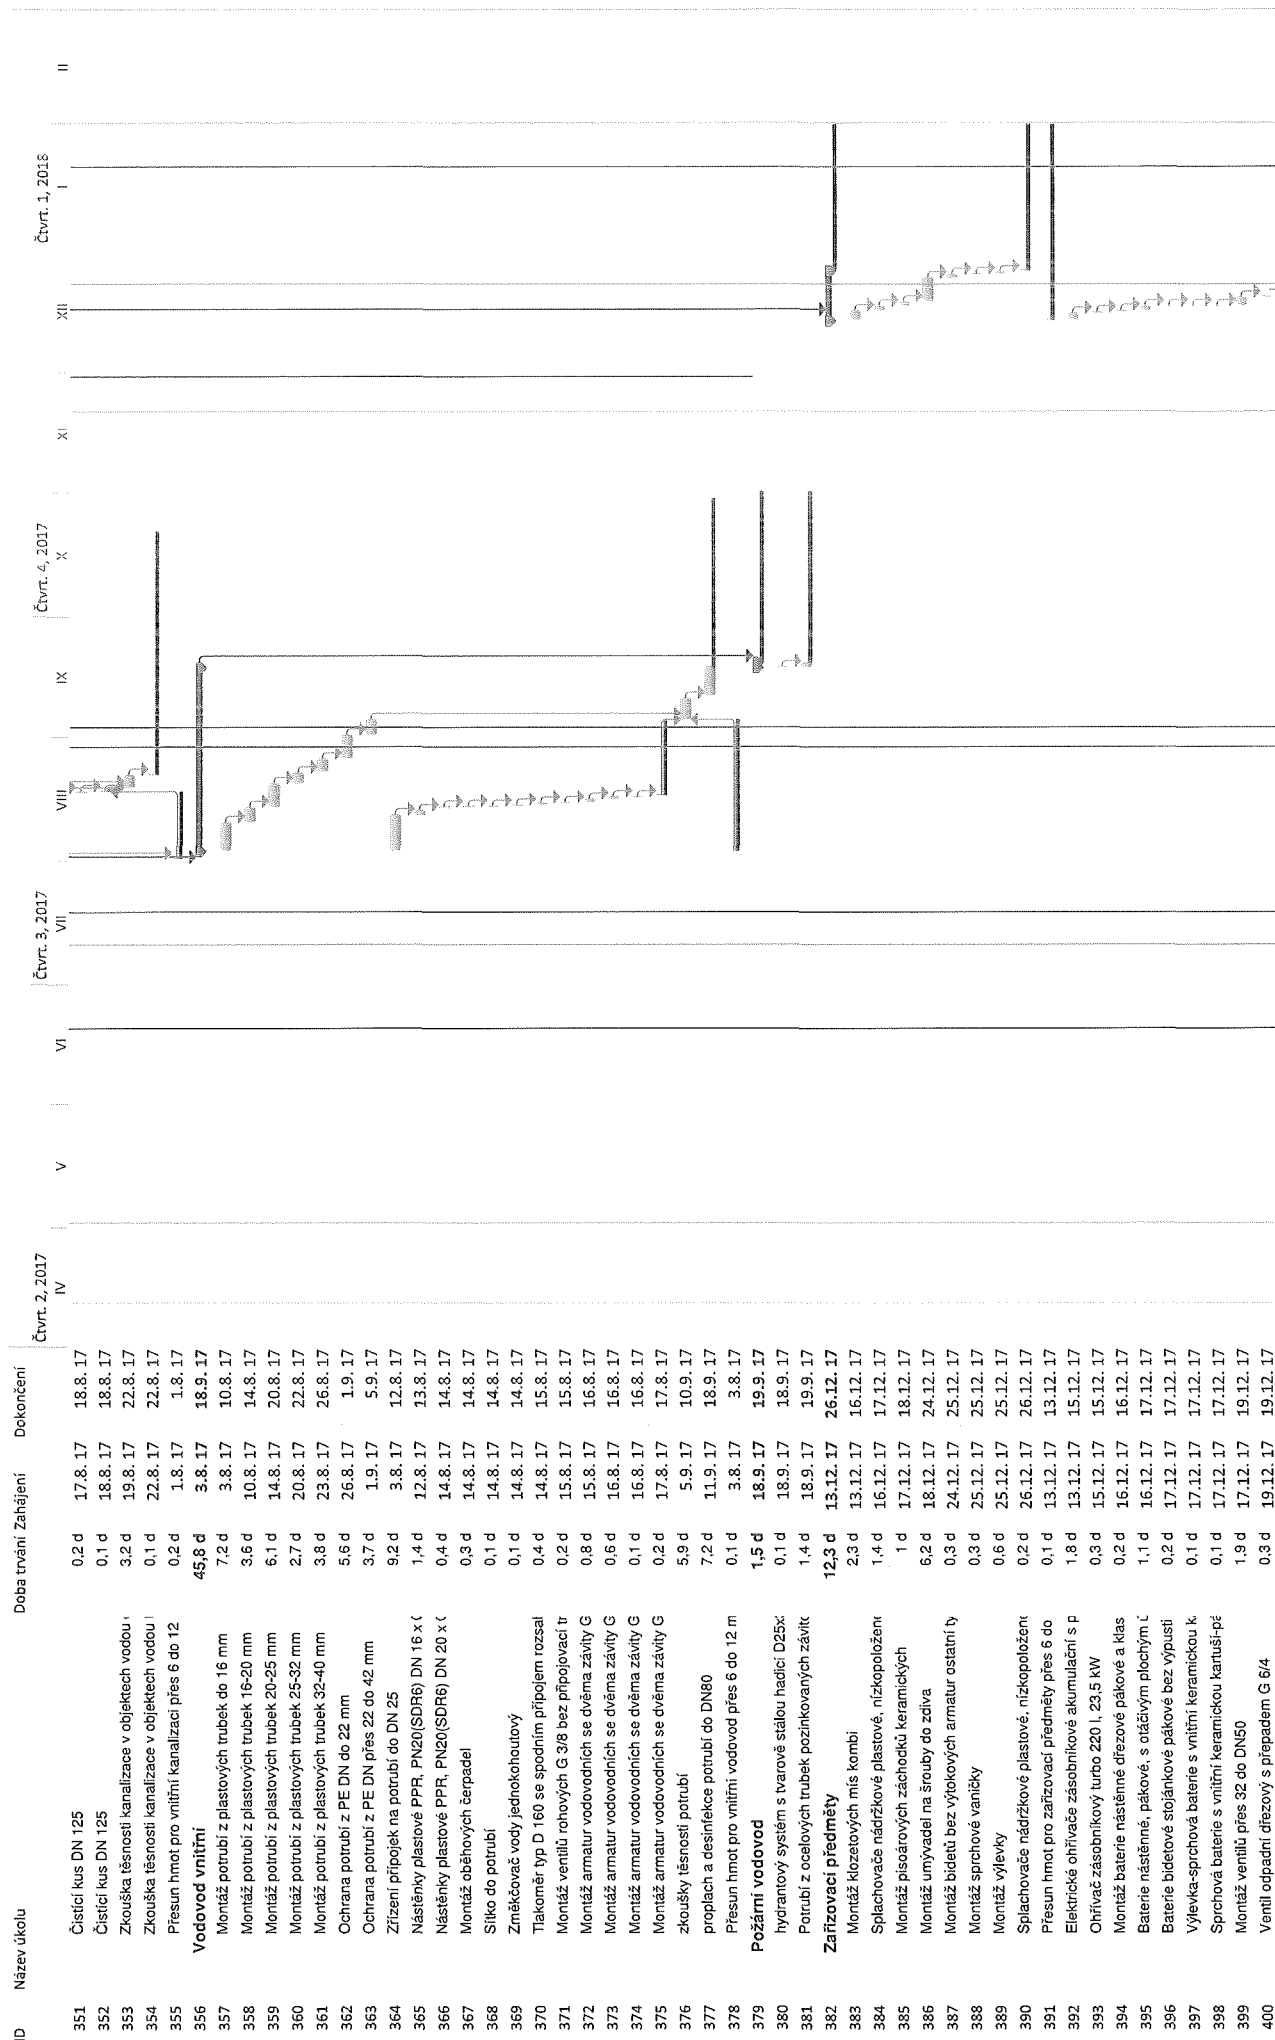




1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šetný, vama, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

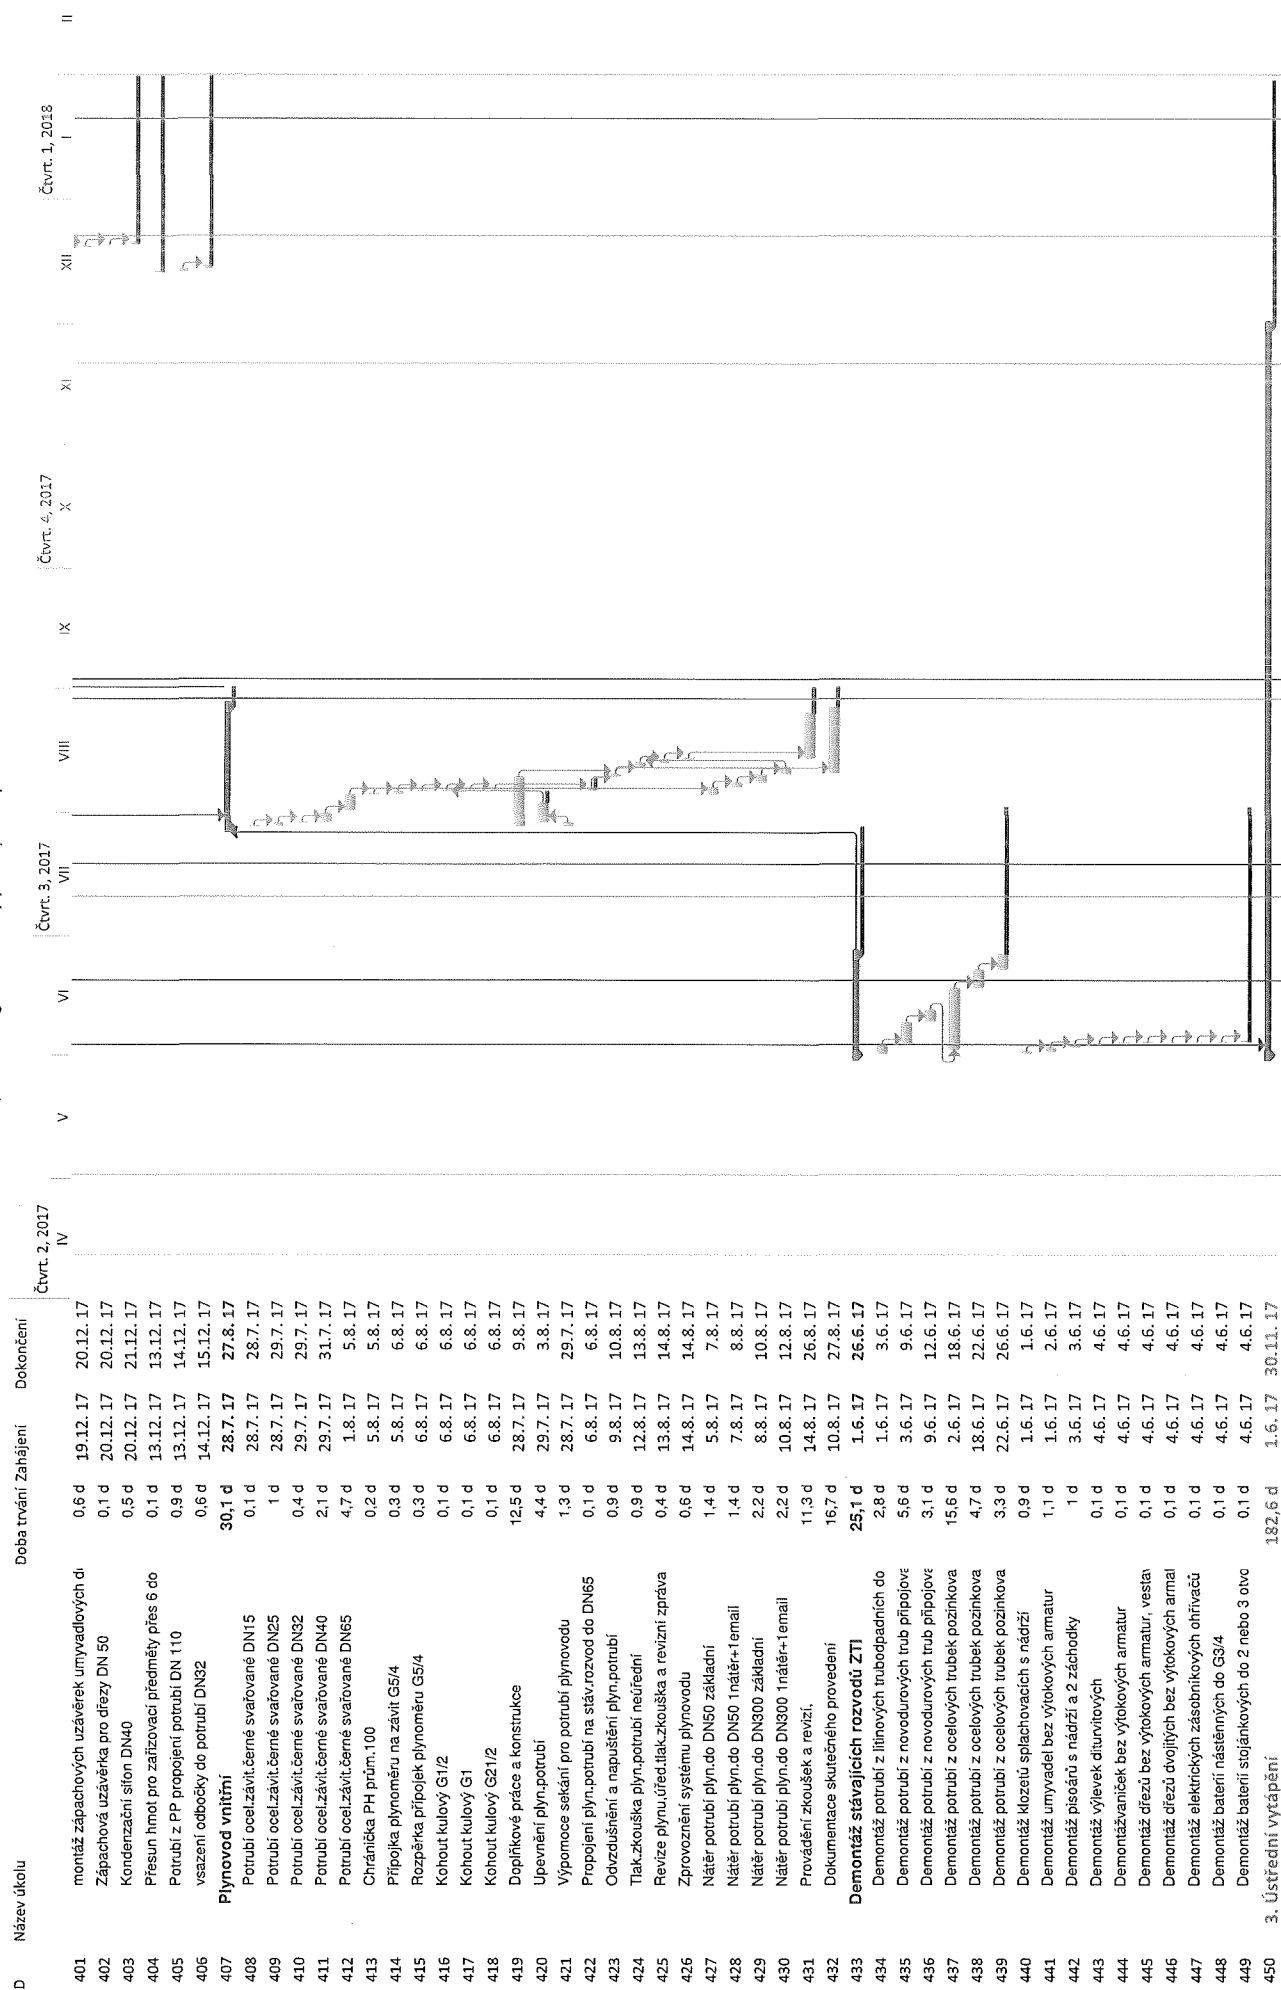

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
451	<b>0. Demontáž zařízení a elementů</b>	11,1 d	1.6.17	12.6.17
452	z toho demontáž topných těles - tělesa trubková	3 d	1.6.17	3.6.17
453	z toho demontáž topných těles - tělesa hlínková	2 d	4.6.17	5.6.17
454	z toho demontáž topných těles - tělesa článková	2 d	6.6.17	7.6.17
455	z toho demontáž rozvodů UT a armatur - cca 50	1,5 d	8.6.17	9.6.17
456	z toho demontáž rozvodů UT a armatur - cca 10	1,5 d	8.6.17	10.6.17
457	Úprava připojení a umístění stávajících článkových	0,8 d	11.6.17	11.6.17
458	Úprava a přemístění stávajících hlínkových těles	0,3 d	11.6.17	12.6.17
459	Odstraňování, přesun hmot	6 d	1.6.17	6.6.17
460	<b>1. Tělesa, otopné plochy</b>	10,4 d	30.10.17	9.11.17
461	Montáž těles	3,3 d	30.10.17	2.11.17
462	Montáž upravených/přemístěných stávajících	0,6 d	2.11.17	3.11.17
463	Sejmání a opětovné nandání těles po omítkách	3,6 d	3.11.17	6.11.17
464	Drobný montážní materiál - tělesova - cca 130 k	1,5 d	6.11.17	8.11.17
465	Zaregul. těles, výpoč. nastavení hydrauliky-provec	1,4 d	8.11.17	9.11.17
466	<b>2. Potrubní rozvody a izolace</b>	17,6 d	20.7.17	6.8.17
467	Montáž potrubí a izolací	16,1 d	20.7.17	5.8.17
468	Drobný montážní materiál (uchytby konzolky, obji	1,5 d	5.8.17	6.8.17
469	<b>3. Technologie systému UT, zdroj tepla a</b>	11,7 d	20.10.17	31.10.17
470	<b>vybavení kotelny, armatury systému</b>			
471	Revize stávající kotelny vč. vizuelní prohlídky	0,7 d	20.10.17	20.10.17
472	Rozdělovač, sběrač trubkový	0,2 d	21.10.17	21.10.17
473	Kotel závesný kondenzační plynový	0,8 d	21.10.17	21.10.17
474	Odvod spalin - typizované koaxiální odkouření p	0,4 d	22.10.17	22.10.17
475	Neutralizační box pro 1 kotel do výkonu 50kW n	0,3 d	22.10.17	22.10.17
476	MaF systému - typová regulace kotle systém ref	0,7 d	22.10.17	23.10.17
477	Akumulační nádrž pro akumulaci topné vody z p	0,8 d	23.10.17	24.10.17
478	Pojistná sada s pojist.ventilem akumulací nádr	0,6 d	24.10.17	24.10.17
479	Expanzní tlaková membránová nádobka např. NG	0,9 d	24.10.17	25.10.17
480	Dopuštěcí sestava pro doplňování systému UT -	0,7 d	25.10.17	26.10.17
481	Vodoměr fakturační Qn = 1,5 m3/h - DN 15	0,3 d	26.10.17	26.10.17
482	Dávkování inhibitoru koroze - nártubek DN15	0,5 d	26.10.17	27.10.17
483	Oběhové čerpadlo elektronické + modul průtok t	0,3 d	27.10.17	27.10.17
484	Kulový kohout PN 6/10 povrchově upravený nap	0,8 d	27.10.17	28.10.17
485	Filter se sítkem z Niro oceli závitový	0,1 d	28.10.17	28.10.17
486	ZK - zpětná klapka závitová	0,6 d	28.10.17	28.10.17
487	RV - Regulační ventil s měřením a uzavíráním n	0,1 d	29.10.17	29.10.17
488	RDT - Regulator diferenčního tlaku s měřením n	0,1 d	29.10.17	29.10.17
489	Vypouštěcí kohout povrchově upravený	1,1 d	29.10.17	30.10.17
490	Odvzdušňovací ventil automatický nebo ruční	0,8 d	30.10.17	31.10.17
491	Odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka	0,1 d	31.10.17	31.10.17
492	T - teploměr 0 - 120 °C	0,6 d	31.10.17	31.10.17
493	P - Tlakoměr 0 - 600KPa	0,2 d	31.10.17	31.10.17
494	Gumový kompenzátor ohvěni do potrubí např. Te	0,3 d	20.10.17	20.10.17
495	Teplotní a tlaková čidla, snímače - předpoklad c	0,1 d	20.10.17	20.10.17
496	Teplotní izolace plošná	0,3 d	20.10.17	20.10.17
497	Ostatní drobné komponenty rozvodu - šroubení,	1,5 d	21.10.17	22.10.17
498	Montáž armatur, úprav technologie tepla v 1, PP,	1 d	22.10.17	23.10.17
499	Drobný montážní materiál - armatury, zařízení -	1,1 d	23.10.17	24.10.17
500	<b>4. Ostatní</b>	<b>137,2 d</b>	<b>16.7.17</b>	<b>30.11.17</b>
	Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, dc	3 d	9.11.17	12.11.17


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, vana, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

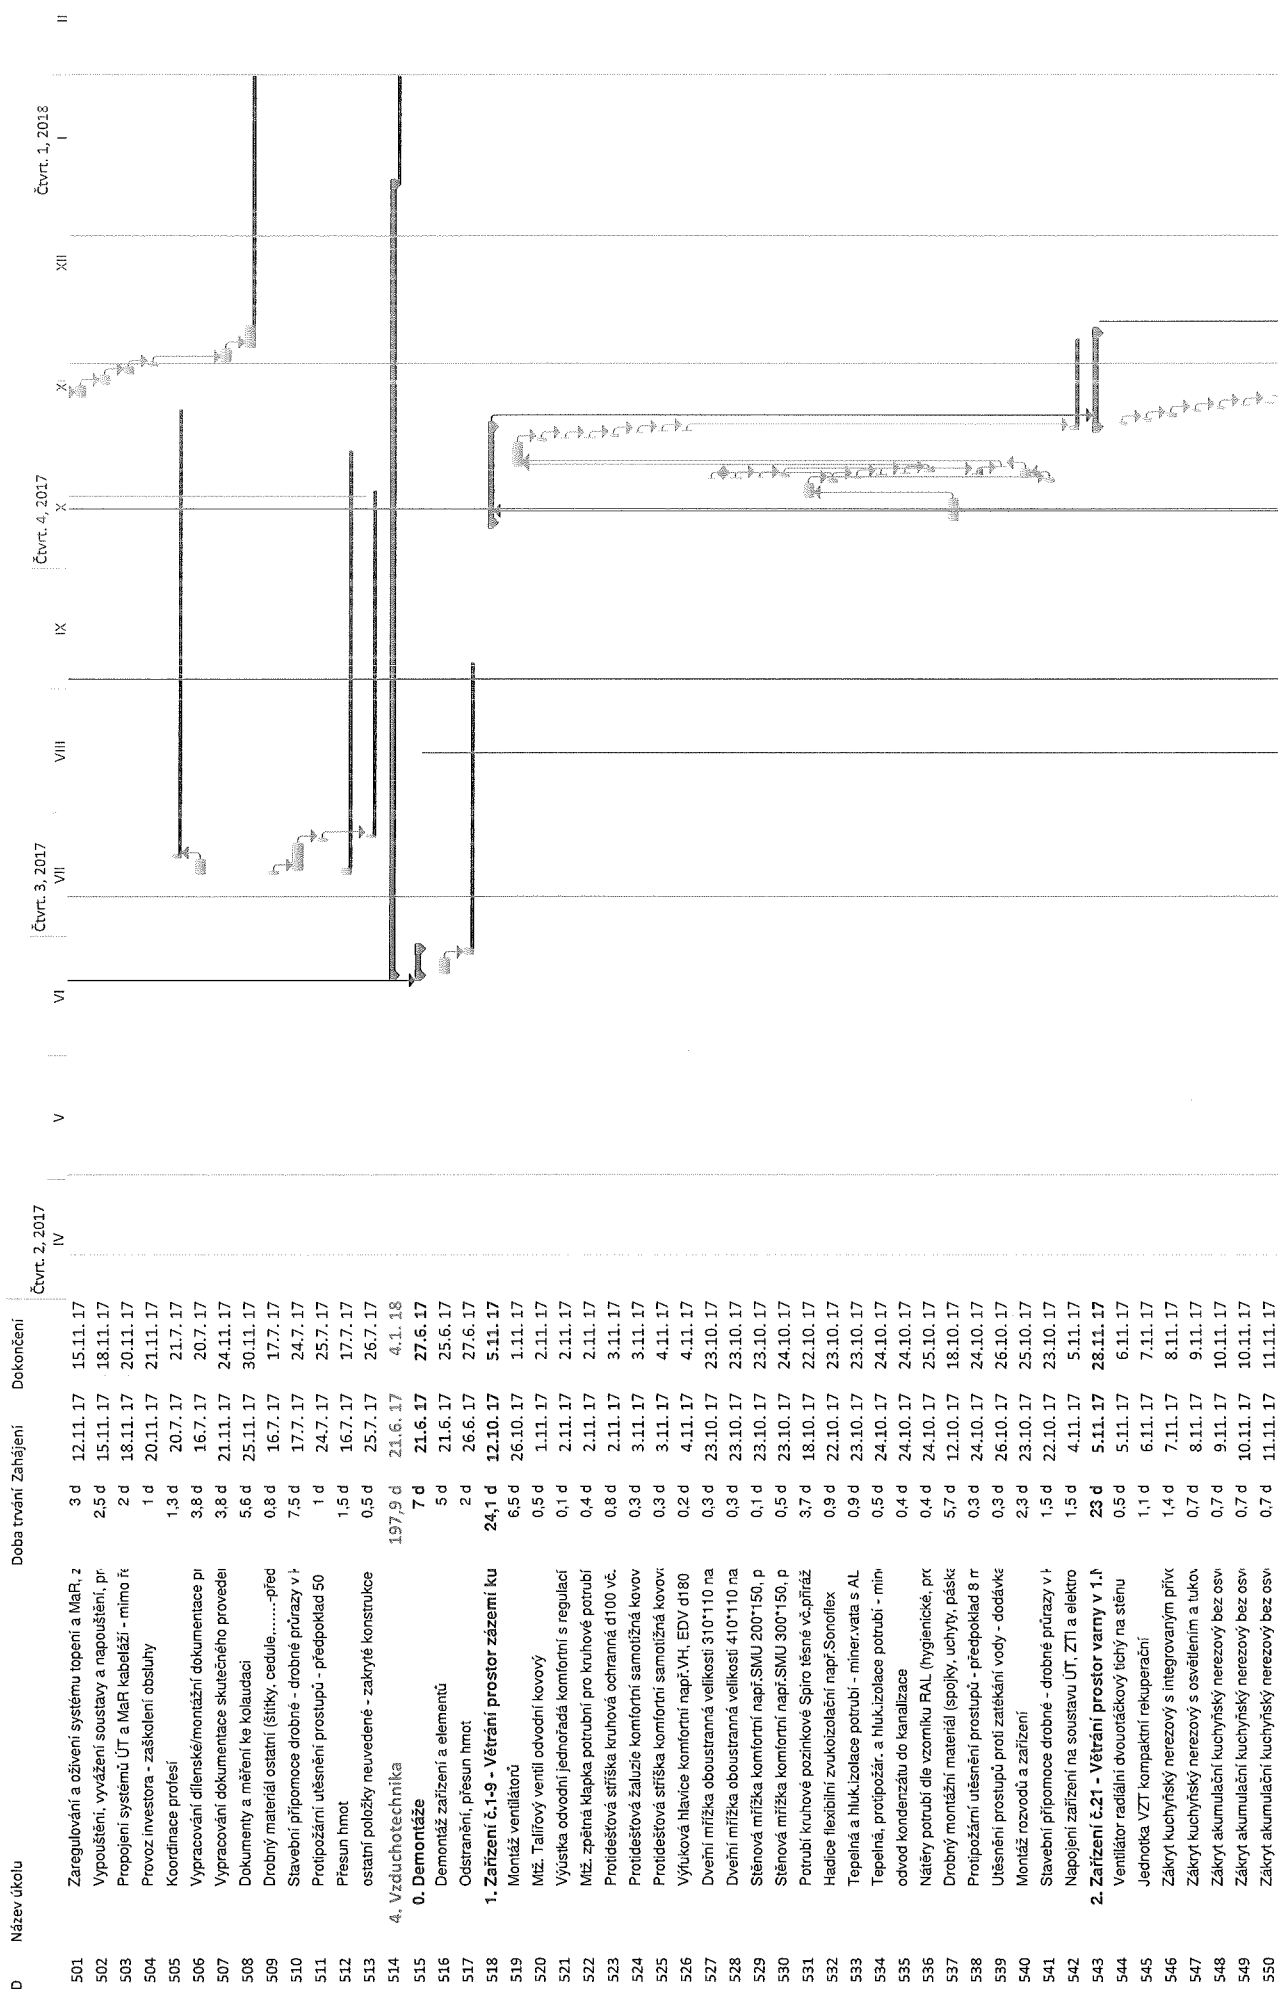


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Čtvrť 1, 2018	II
551	Protihluková žaluzie komfortní např.Klasik, Stav	0,3 d	11.11.17	11.11.17											
552	Mіз. tlumíc hluku čtyřhranný hygienický	1,8 d	11.11.17	13.11.17											
553	Mіз. uzavírací (regulační) klapka pro čtyřhranné	4,9 d	13.11.17	18.11.17											
554	Talířový ventil přívodní kovový např.KE125, ED1	0,1 d	5.11.17	5.11.17											
555	Talířový ventil odvodní kovový d200 např.KK, EI	0,2 d	6.11.17	6.11.17											
556	Anemostat drátový přívodní s přípojevacím boxem	1,2 d	6.11.17	7.11.17											
557	Výuska přívodní dvouřadá komfortní s regulací	1,4 d	7.11.17	8.11.17											
558	Výuska přívodní dvouřadá komfortní s regulací	0,3 d	8.11.17	9.11.17											
559	Výuska odvodní jednořadá komfortní s regulací	0,9 d	9.11.17	9.11.17											
560	Mіз. Regulační klapka potrubní ruční	1,8 d	10.11.17	11.11.17											
561	Výusková hlavice čtyřhranná komfortní 800*560(	0,2 d	11.11.17	11.11.17											
562	Protidešťová síťská kruhová ochranná d125 vč.	0,1 d	12.11.17	12.11.17											
563	Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.l.vč.přířaz	5,3 d	5.11.17	11.11.17											
564	Potrubí kruhové pozinkové např.Sate Click nebo	3 d	11.11.17	14.11.17											
565	Hadice flexibilní zvukoizolační např.Sonoflex	1 d	14.11.17	15.11.17											
566	Tepečná, protipožár. a hluk.izolace potrubí - min	4,8 d	15.11.17	19.11.17											
567	Tepečná, protipožár. a hluk.izolace potrubí - min	3,8 d	20.11.17	23.11.17											
568	požár.čidlo zplodinové např.VDK-10, Jesy vč.na	0,1 d	23.11.17	23.11.17											
569	odvod kondenzátu do kanalizace	1,6 d	23.11.17	25.11.17											
570	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, pr	1,9 d	25.11.17	27.11.17											
571	Drobný montážní materiál (spojky, uchytý, pásky	6,6 d	5.11.17	12.11.17											
572	Protipožární utěsnění prostupů - cca 7 míst do c	0,2 d	12.11.17	12.11.17											
573	Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka	0,3 d	13.11.17	13.11.17											
574	Montáž rozvodů a zařízení	0,3 d	12.11.17	12.11.17											
575	Stavební přípomocce drobné - drobné přírazky v l	2,3 d	12.11.17	15.11.17											
576	Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro	1,5 d	27.11.17	28.11.17											
577	<b>3. Zařízení č.15 - Větrání prostor šaten se z</b>	<b>31,5 d</b>	<b>11.9.17</b>	<b>12.10.17</b>											
578	Jednotka VZT kompaktní rekuperační nástřešní	1,1 d	23.9.17	24.9.17											
579	Ohřivač potrubí čtyřhranný teplovodní např.IBV	0,3 d	24.9.17	24.9.17											
580	Tlumíc hluku čtyřhranný hygienický např.GH 80C	0,3 d	24.9.17	25.9.17											
581	Tlumíc hluku čtyřhranný hygienický např.GH 80C	0,6 d	25.9.17	25.9.17											
582	Anemostat vířivý přívodní s přípojevacím boxem	1,2 d	25.9.17	26.9.17											
583	Anemostat vířivý odvodní s přípojevacím boxem	0,6 d	27.9.17	27.9.17											
584	Výuska přívodní dvouřadá komfortní s regulací	1,1 d	27.9.17	28.9.17											
585	Výuska odvodní jednořadá komfortní s regulací	0,2 d	28.9.17	28.9.17											
586	Výuska přívodní dvouřadá komfortní s regulací	0,7 d	28.9.17	29.9.17											
587	Výuska odvodní jednořadá komfortní s regulací	0,2 d	29.9.17	29.9.17											
588	Výuska odvodní jednořadá komfortní s regulací	0,2 d	29.9.17	29.9.17											
589	Mіз. požární klapka potrubní čtyřhranná např.Pk	0,8 d	22.9.17	22.9.17											
590	Mіз. Regulační klapka potrubní ruční pro čtyřhra	0,5 d	23.9.17	23.9.17											
591	Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.l.vč.přířaz	6,9 d	11.9.17	18.9.17											
592	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné vč.přířaz	3,4 d	18.9.17	21.9.17											
593	Hadice flexibilní zvukoizolační např.Sonoflex	0,6 d	21.9.17	22.9.17											
594	Tepečná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL	4,6 d	22.9.17	26.9.17											
595	Tepečná, protipožár. a hluk.izolace potrubí - min	5,6 d	26.9.17	2.10.17											
596	Tepečná, protipožár. a hluk.izolace potrubí - min	5,5 d	2.10.17	7.10.17											
597	Odvod kondenzátu do kanalizace	0,4 d	7.10.17	8.10.17											
598	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, pr	3 d	8.10.17	11.10.17											
599	Drobný montážní materiál (spojky, uchytý, pásky	8,2 d	11.9.17	19.9.17											
600	Protipožární utěsnění prostupů - cca 15 míst do	0,2 d	22.9.17	22.9.17											


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

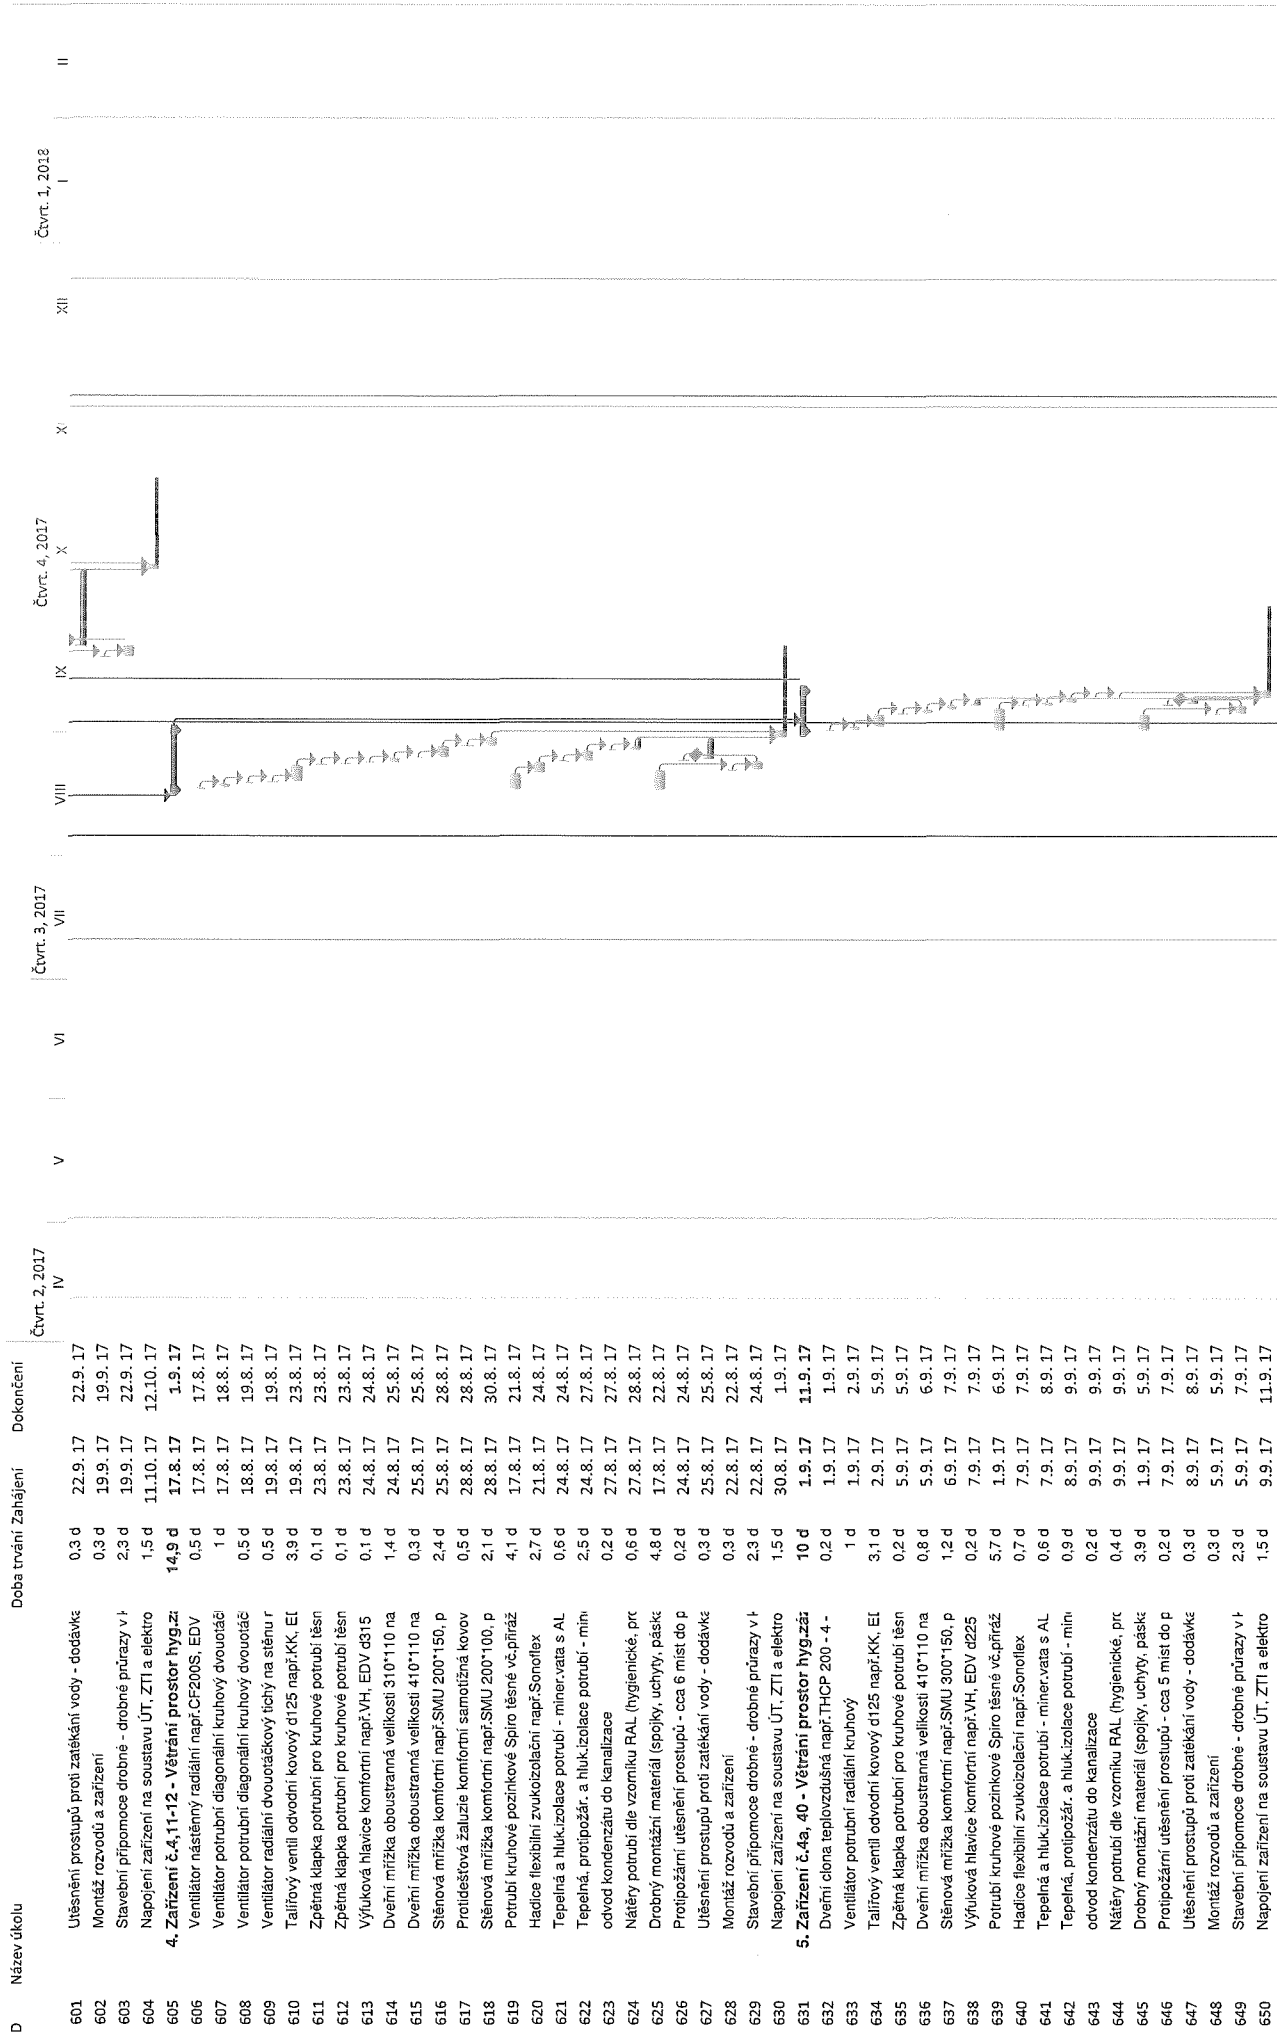


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

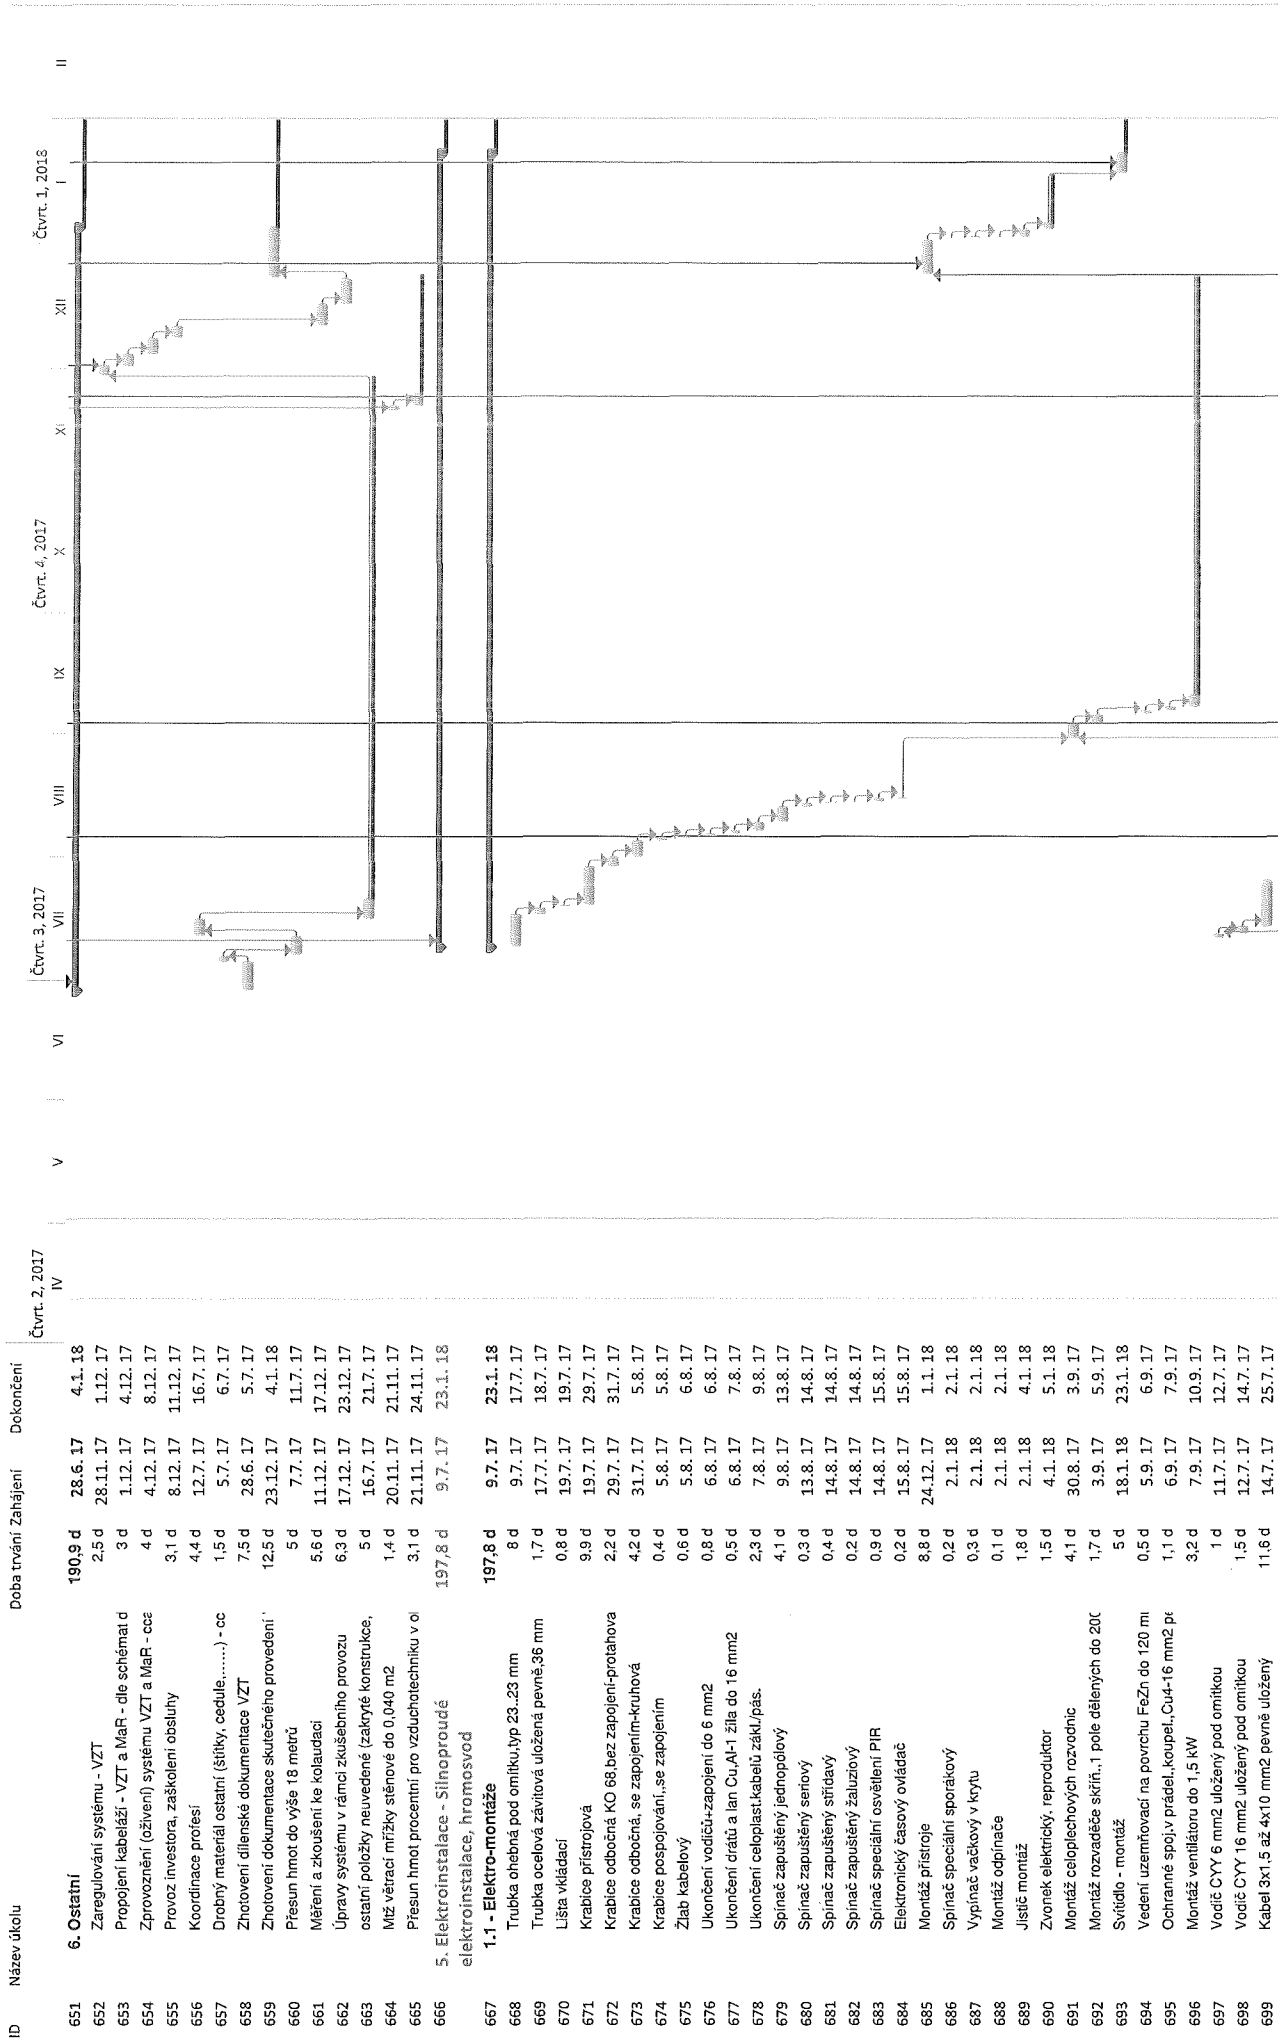

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

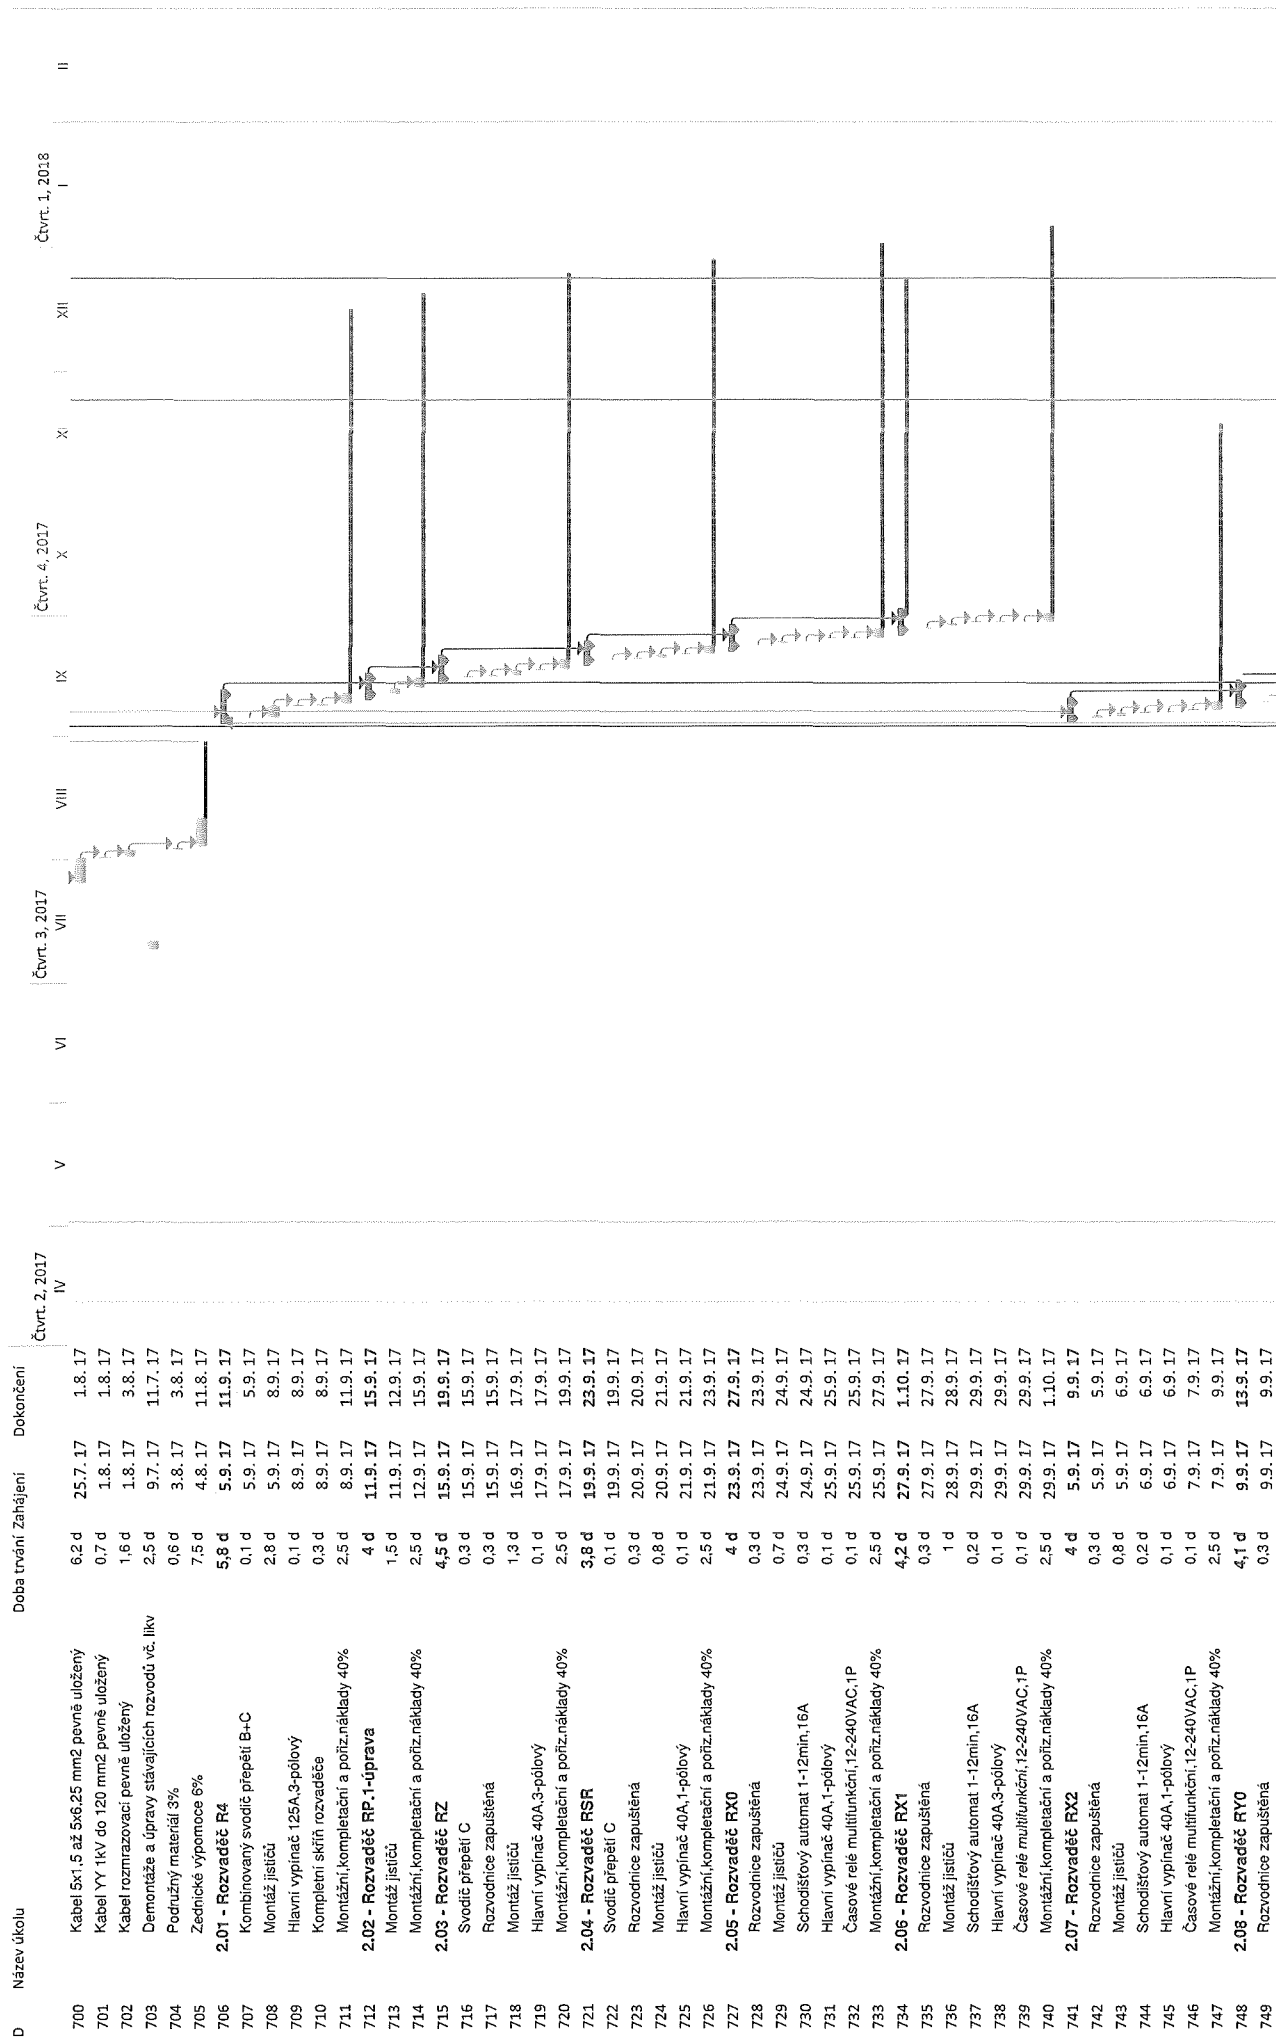


1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

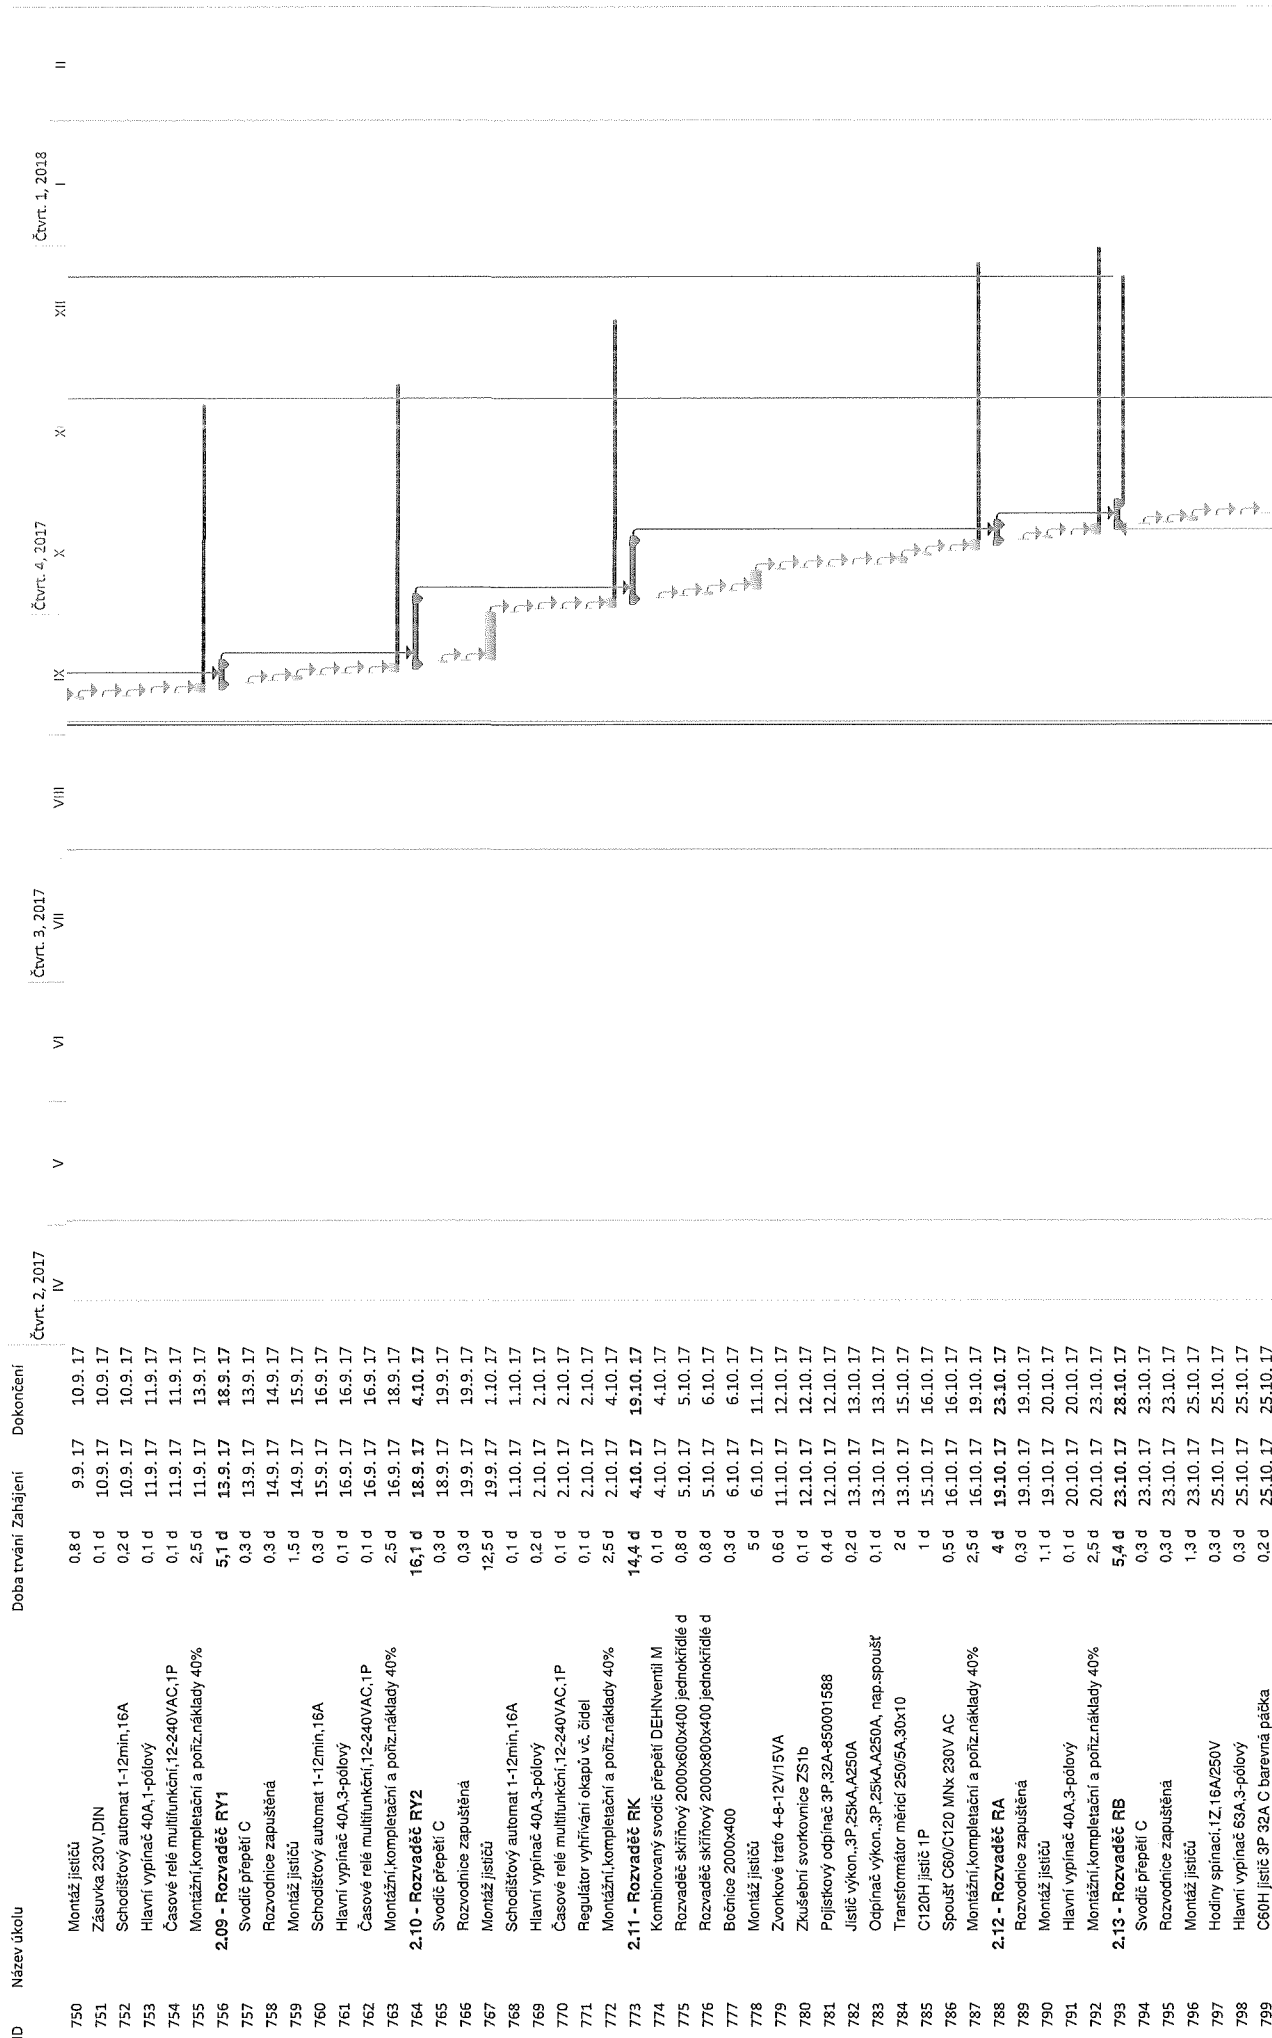




1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, vana, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

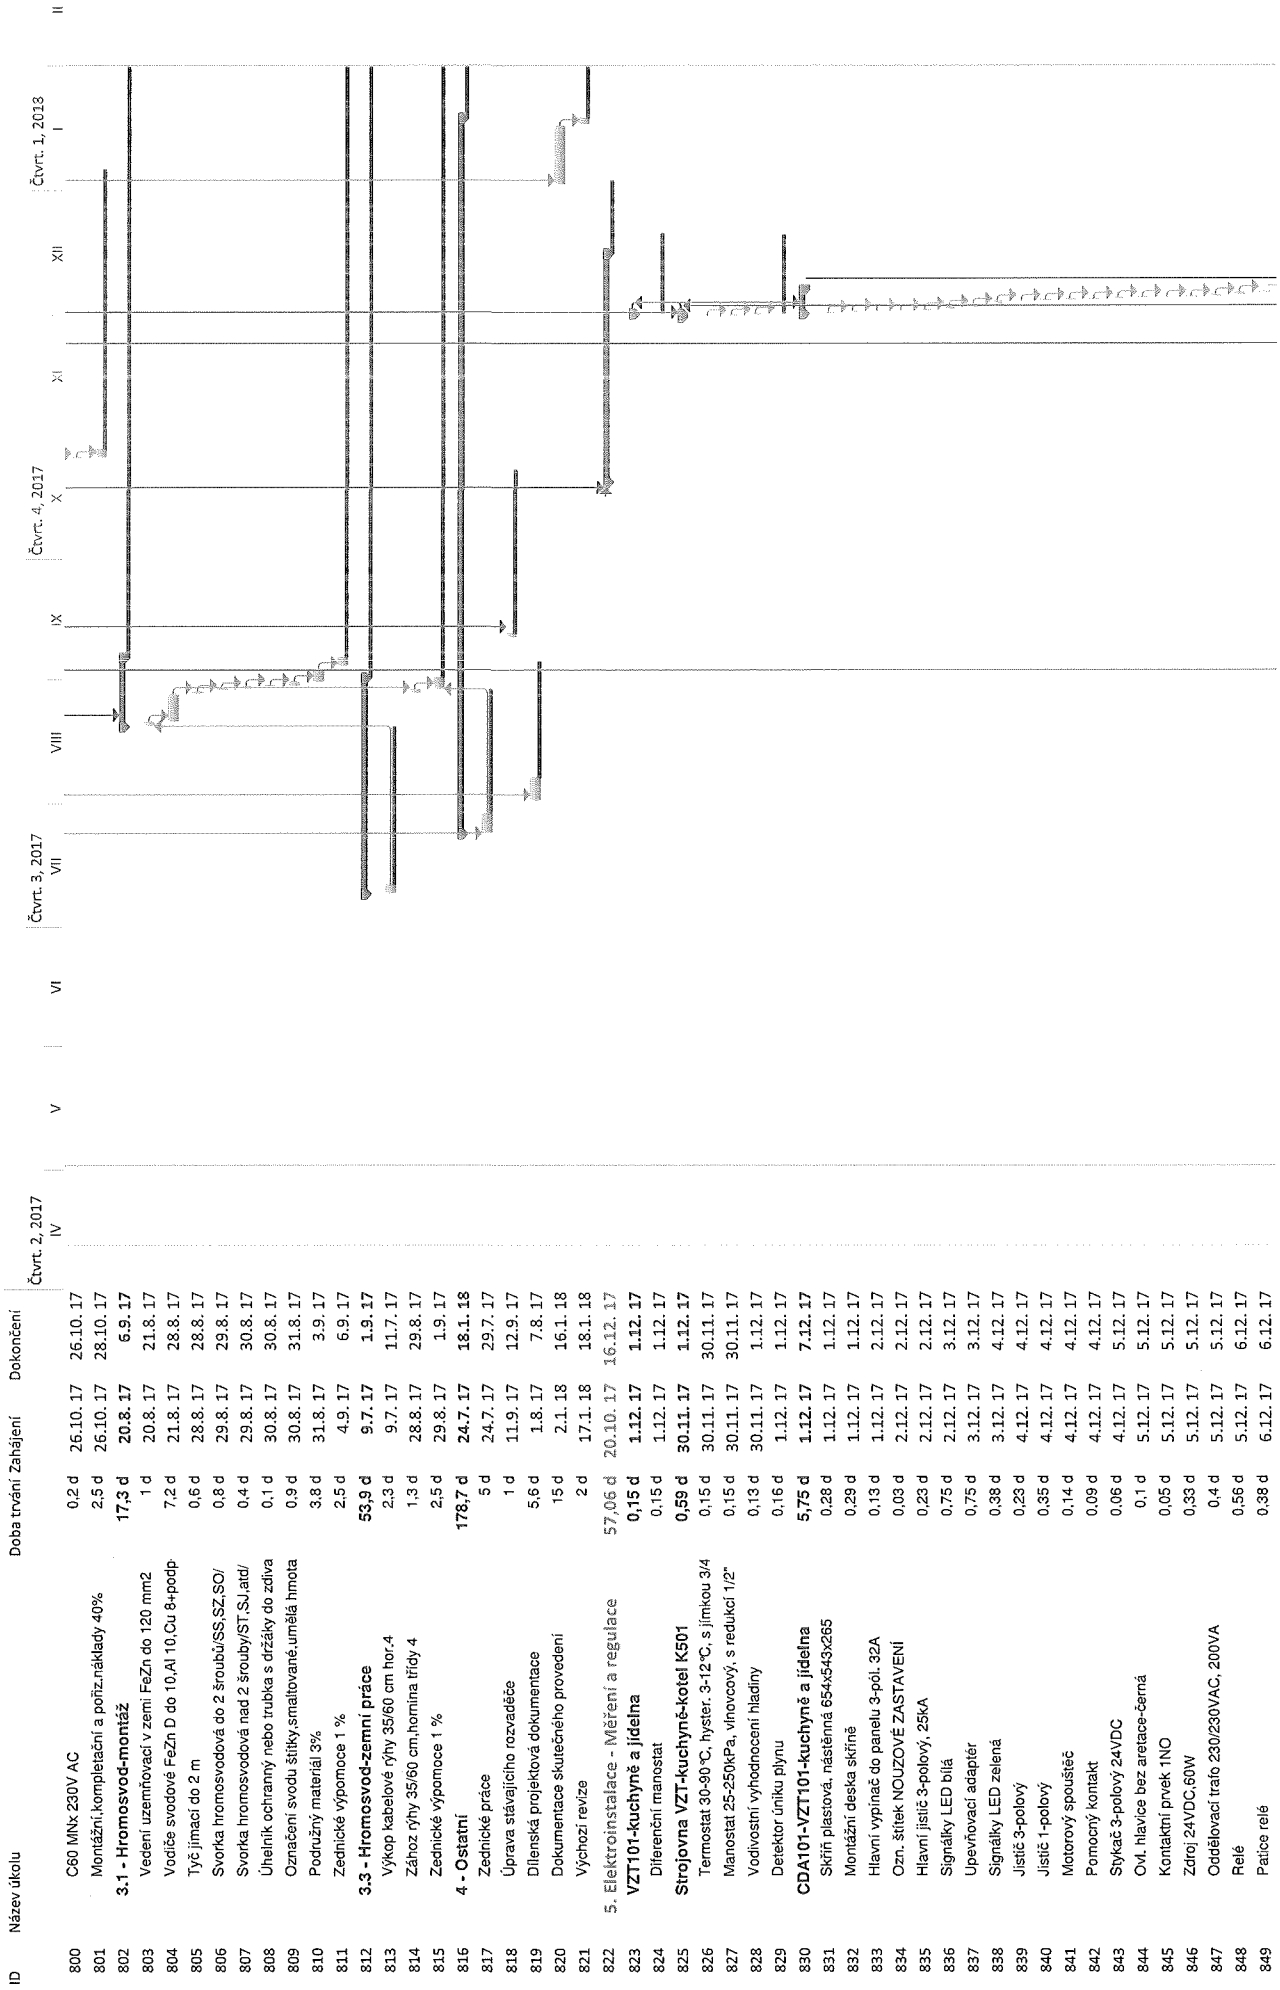

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
 Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

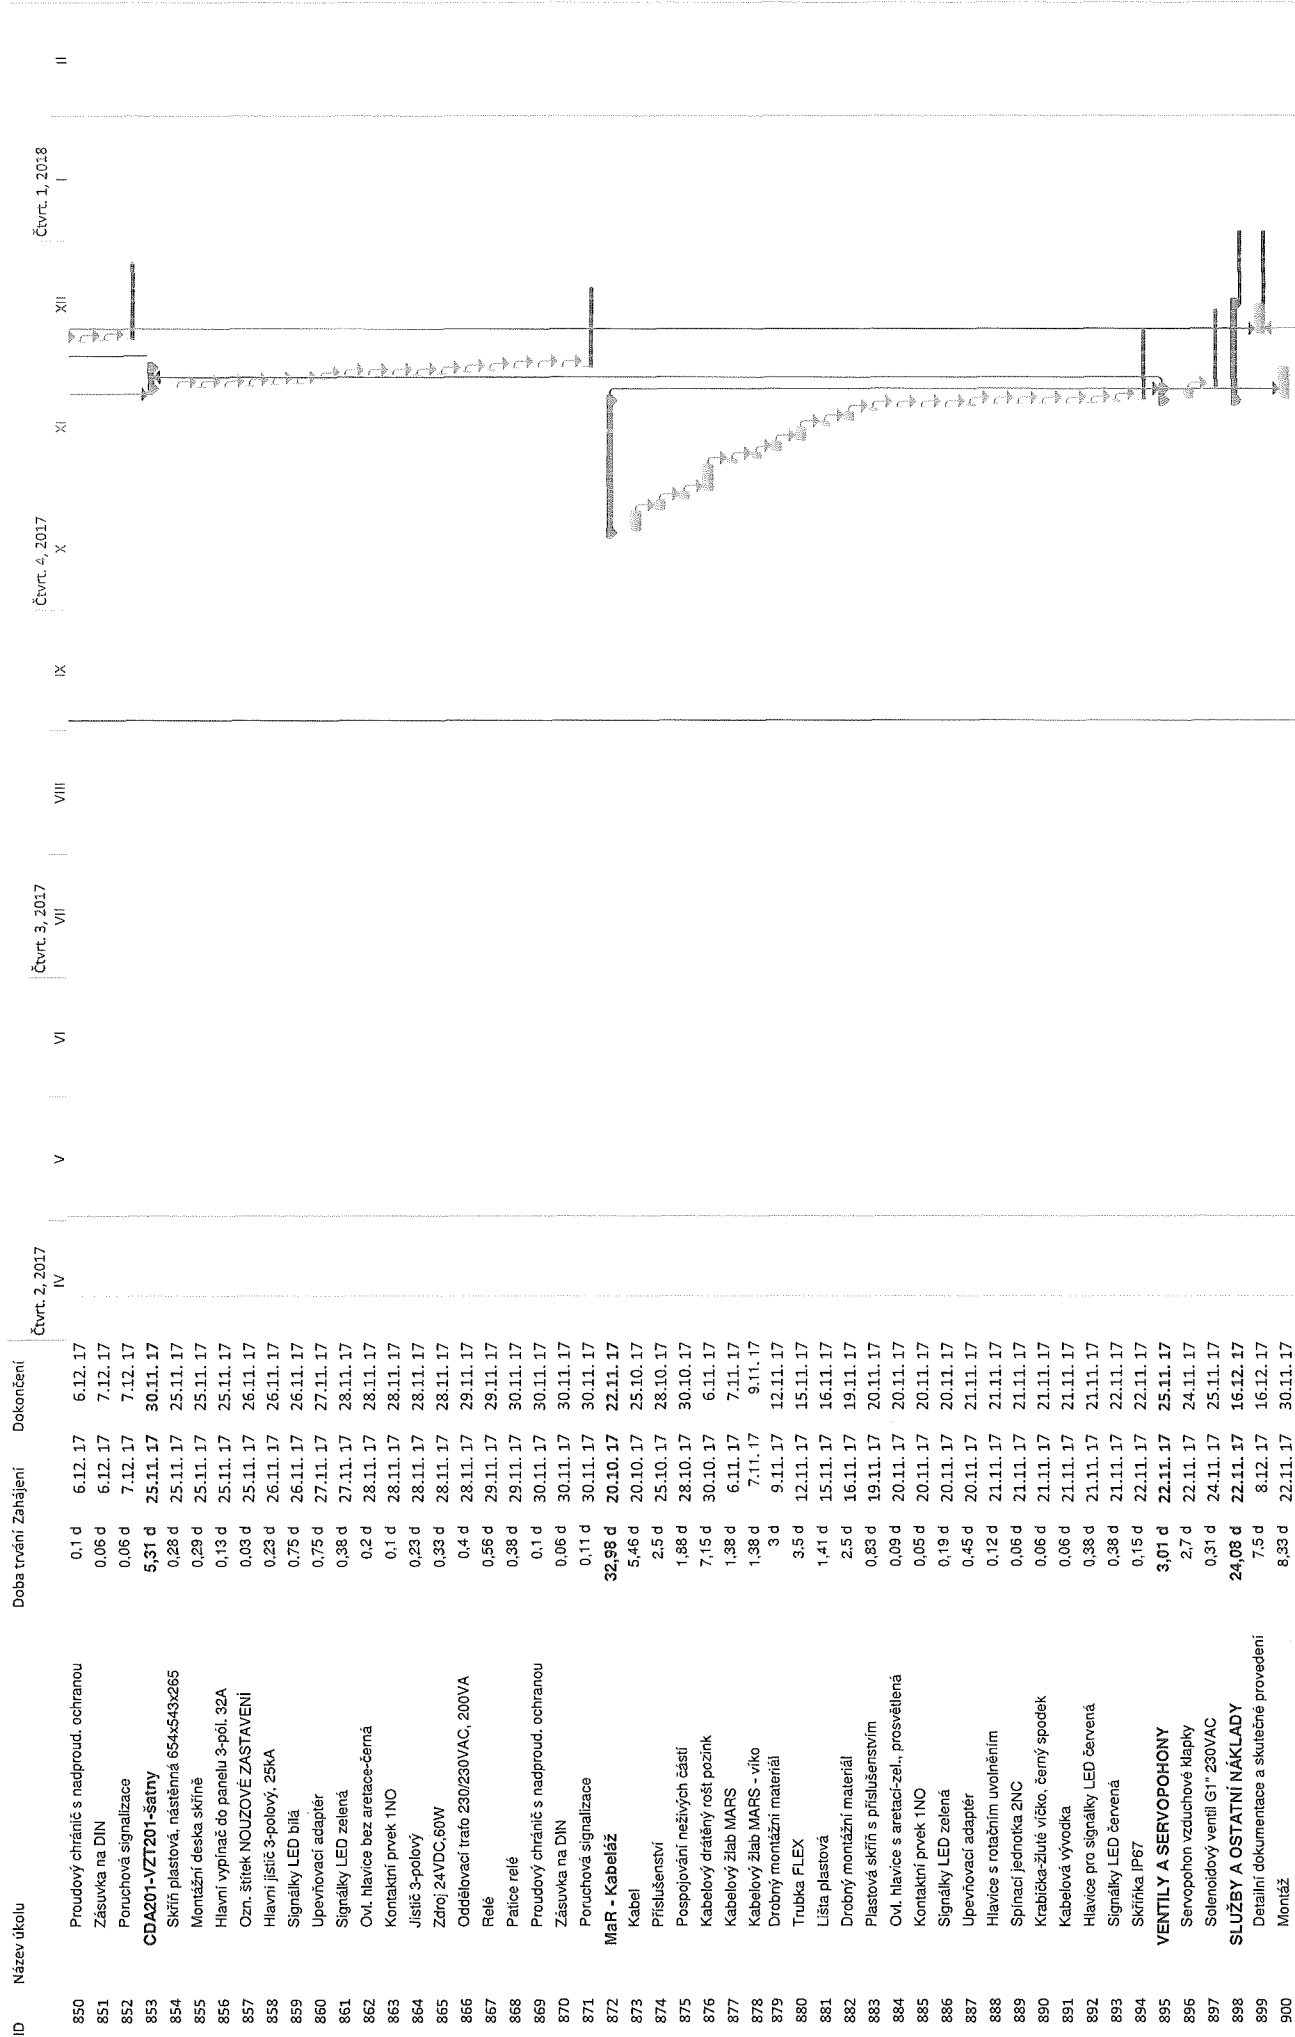

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
 Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť, 2017												Čtvrť, 1, 2018					
					IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II							
901	Oživení a uvedení do provozu	2,5 d	30.11.17	3.12.17																		
902	Revize elektro	3,75 d	3.12.17	6.12.17																		
903	Doprava věcné doby strávené na cestě	2 d	6.12.17	8.12.17																		
904	6. Gastro technologie	24,4 d	7.8.17	31.8.17																		
905	I. NP	18,2 d	13.8.17	31.8.17																		
906	139 příjem zboží a surovin	0,5 d	13.8.17	14.8.17																		
907	váha místková do 60 kg vodotěsná	0,5 d	13.8.17	14.8.17																		
908	136 suchý sklad	1,7 d	14.8.17	15.8.17																		
909	skladový regál komaxit	1,5 d	14.8.17	15.8.17																		
910	skladový regál komaxit	0,1 d	15.8.17	15.8.17																		
911	skladový regál komaxit	0,1 d	15.8.17	15.8.17																		
912	132 sklad chlazených a mražených surov	3 d	15.8.17	18.8.17																		
913	chladičí skříň 600 l	0,3 d	15.8.17	16.8.17																		
914	chladičí skříň 500 l Liebherr-stávající	0,9 d	16.8.17	16.8.17																		
915	mrazicí truhla 464 l	0,9 d	17.8.17	17.8.17																		
916	mrazicí truhla 300 l Liebherr-stávající	0,9 d	17.8.17	18.8.17																		
917	131 denní sklad	1,8 d	15.8.17	17.8.17																		
918	chladičí skříň dvoudvěřová	0,5 d	15.8.17	16.8.17																		
919	regál nerez s pěti přestavitelnými policemi	1,3 d	16.8.17	17.8.17																		
920	130 denní místnost	0,3 d	18.8.17	19.8.17																		
921	chladičnická-stávající	0,3 d	18.8.17	19.8.17																		
922	133 úklidová komora	1,1 d	19.8.17	20.8.17																		
923	výlevka keramická-odrávka stavby	0,5 d	19.8.17	19.8.17																		
924	police na úklidové prostředky	0,6 d	19.8.17	20.8.17																		
925	125a sklad odpadků	0,1 d	20.8.17	20.8.17																		
926	chladičnická	0,1 d	20.8.17	20.8.17																		
927	129 VARNA	18,2 d	13.8.17	31.8.17																		
928	příprava vajíec	1,8 d	13.8.17	15.8.17																		
929	chladičnická Šnaige 275 l-stávající	0,5 d	13.8.17	14.8.17																		
930	pracovní stůl s dřezem, polici a zásuvkou	0,4 d	14.8.17	14.8.17																		
931	police nástěnná nerez 2 etáže	0,4 d	14.8.17	14.8.17																		
932	nerezová výlevka s umyvadlem a bezkonte	0,5 d	14.8.17	15.8.17																		
933	příprava masa	0,4 d	15.8.17	15.8.17																		
934	pracovní stůl s dřezem, polici a zásuvkou	0,3 d	15.8.17	15.8.17																		
935	police nástěnná nerez	0,4 d	15.8.17	15.8.17																		
936	krájecí deska buková	0,4 d	15.8.17	15.8.17																		
937	pracovní stůl s polici a zásuvkami-stávající	0,4 d	15.8.17	15.8.17																		
938	police nástěnná	0,4 d	15.8.17	15.8.17																		
939	příprava zeleniny	0,8 d	15.8.17	16.8.17																		
940	pracovní stůl s polici a zásuvkami-stávající	0,5 d	15.8.17	16.8.17																		
941	mycí stůl s jedním dřezem 500x500	0,3 d	16.8.17	16.8.17																		
942	příprava těsta	0,4 d	16.8.17	16.8.17																		
943	pracovní stůl se zásuvkovým blokem	0,1 d	16.8.17	16.8.17																		
944	police nástěnná nerez	0,1 d	16.8.17	16.8.17																		
945	chlazený stůl se zásuvkami	0,1 d	16.8.17	16.8.17																		
946	univerzální šlehačí a hnětačí stroj-stávající	0,1 d	16.8.17	16.8.17																		
947	vaření	8,3 d	17.8.17	25.8.17																		
948	elektrický konvektomat 20xGN1/1 MKN-stř	0,2 d	21.8.17	21.8.17																		
949	stojan na GN	0,5 d	21.8.17	22.8.17																		
950	plynový konvektomat 20xGN 1/1 SCC Rat.	0,3 d	22.8.17	22.8.17																		

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŘEŠ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, varna, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání			Časový plán výstavby											
		Zahájení	Dokonečení		Čtvrť 2, 2017			Čtvrť 3, 2017			Čtvrť 4, 2017			Čtvrť 1, 2018		
					IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	
951	el. pánev Frima VOC 211-stávající	0,3 d	22.8.17	22.8.17												
952	závěsný odsavač par s přerušovačem tahu	0,5 d	22.8.17	23.8.17												
953	plynový sporák, 4 hořáky, nerezová varná p	0,5 d	23.8.17	23.8.17												
954	neutrální modul na soklu ve stejném prove	0,3 d	23.8.17	24.8.17												
955	rychlovarná multifunkční pánev s ručním v	0,6 d	24.8.17	24.8.17												
956	hygienický spoj pro pánev "pánev"U" 1000r	0,5 d	24.8.17	25.8.17												
957	podlahová vpusť s roštěm a guli nerez, var	0,5 d	17.8.17	17.8.17												
958	směšovací vodovodní baterie, opláštěno, r	0,5 d	18.8.17	18.8.17												
959	elektrický talový sporák, 4 topné zóny, plyn	0,3 d	18.8.17	18.8.17												
960	neutrální modul na soklu ve stejném provedení jako varná technologie	0,3 d	18.8.17	19.8.17												
961	elektrický rychlovarný kotel 150 l, kulatý dl	0,3 d	19.8.17	19.8.17												
962	neutrální modul na soklu ve stejném prove	0,1 d	19.8.17	19.8.17												
963	vodotěsné nerezové krycí nohou varného t	0,2 d	19.8.17	19.8.17												
964	elektrický rychlovarný kotel 300 l, hranatý c	0,4 d	19.8.17	20.8.17												
965	podlahová vpusť s roštěm a guli nerez, var	0,5 d	17.8.17	17.8.17												
966	závěsný odsavač par-dodávka VZT	0,3 d	20.8.17	20.8.17												
967	pracovní stůl pojízdný, spodní police, bez l	0,6 d	20.8.17	20.8.17												
968	pracovní stůl pojízdný, spodní police, bez l	0,6 d	21.8.17	21.8.17												
969	<i>výdej jídel</i>	3,8 d	25.8.17	29.8.17												
970	chladičnice na saláty, kompoty s prosklenýr	0,5 d	25.8.17	25.8.17												
971	mraznička Svalge 7xzásuvka-stávající	0,3 d	25.8.17	26.8.17												
972	pojízdná vodní lázeň, 4 dělené vany GN1/'	0,8 d	26.8.17	26.8.17												
973	vyhřívavý zásobník lařířů 2 tubusy, Blanco	1,5 d	26.8.17	28.8.17												
974	pojízdná vodní lázeň 2 dělené vany GN1/1	0,3 d	28.8.17	28.8.17												
975	nerezový parapet	0,1 d	28.8.17	28.8.17												
976	dráha na podnosy uzavřená nerez	0,1 d	28.8.17	28.8.17												
977	vozik na příbory a plata	0,1 d	28.8.17	28.8.17												
978	pojízdný stolek s termosy na nápoje, odkaj	0,1 d	29.8.17	29.8.17												
979	<i>mytí stolního nádobí</i>	1,5 d	29.8.17	30.8.17												
980	parapet nerez	0,1 d	29.8.17	29.8.17												
981	řídící stůl	0,2 d	29.8.17	29.8.17												
982	stůl se dvěma dřevy, tlakovou sprchou, ort	0,3 d	29.8.17	29.8.17												
983	mycí stroji s automatickým posuvem košů,	0,3 d	29.8.17	29.8.17												
984	výstupní válečkový stůl	0,2 d	30.8.17	30.8.17												
985	regál nerez 5 polic	0,4 d	30.8.17	30.8.17												
986	<i>mytí kuchyňského nádobí</i>	1,2 d	30.8.17	31.8.17												
987	mycí stůl s jedním dřevem a tlakovou sprc	0,3 d	30.8.17	30.8.17												
988	mycí stroji na kuchyňské nádobí	0,4 d	30.8.17	31.8.17												
989	odsavač par nad myšičku-dodávka VZT	0,1 d	31.8.17	31.8.17												
990	regál nerez, 3 moduly-stávající	0,3 d	31.8.17	31.8.17												
991	odkládací stůl-stávající	0,1 d	31.8.17	31.8.17												
992	<b>I. PP</b>	6,2 d	7.8.17	13.8.17												
993	<b>017 Šatna zaměstnanců</b>	0,9 d	12.8.17	13.8.17												
994	skříň šatní	0,4 d	12.8.17	13.8.17												
995	stůl jídelní	0,3 d	13.8.17	13.8.17												
996	židle	0,2 d	13.8.17	13.8.17												
997	<b>019 Sklad brambor a kořenové zeleniny</b>	3,3 d	7.8.17	10.8.17												
998	keramický obklad sítěn-stavba	1,3 d	7.8.17	8.8.17												
999	rohož dřevěná	0,1 d	8.8.17	8.8.17												
1000	rudl	0,3 d	10.8.17	10.8.17												
1001	vozik ploštinový 100kg	0,1 d	10.8.17	10.8.17												

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRŠÍ - stavební úpravy, nástavba a přístavba - šatny, vana, učebny  
Podrobný harmonogram - časový plán výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 2, 2017	V	VI	Čtvr. 3, 2017	VIII	IX	Čtvr. 4, 2017	XI	Čtvr. 1, 2018	II
1002	regál	1,5 d	8.8.17	10.8.17	IV									
1003	018 hrubá příprava brambor a kořenové zeleniny	2 d	10.8.17	12.8.17										
1004	škrabka brambor nerez, 20kg naplň	0,3 d	11.8.17	11.8.17										
1005	podlahová vpusť s roštem a guli, nerez	0,4 d	10.8.17	11.8.17										
1006	lapač škrobu a slupek	0,3 d	11.8.17	11.8.17										
1007	stolička	0,1 d	10.8.17	10.8.17										
1008	pracovní stůl s varovým dřezem	0,5 d	11.8.17	12.8.17										
1009	doprava, montáž, revíze, zaškolení obsluhy	2 d	10.8.17	12.8.17										
