

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 5	
			Datum změny: 10/2023	
„Administrativní budova LS Kraslice“				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektu:	Stavební díly:	
	☒ N ☐ IP ☐ NP	SO 01	Zemní práce	
Popis změny: Výkopy, hutněné zásypy v aktivní zóně – viz přílohy č.1-8, které jsou nedílnou součástí toho změnového listu.				
Dle projektové dokumentace bylo pro výstavbu uvažováno s využitím výkopku získaného na stavbě. Po posouzení kvality vytěžených zemin geologem tento konstatoval nevhodnost použití zemin do aktivní zóny konstrukce vozovky a parkoviště. Zodpovědný projektant následně doporučil náhradu zemin recyklátem resp.SDB 32/63. Na základě výsledku zkoušky zhutnění byla následně dohodnuta záměna materiálu SDB 32/63 na SDB 0/63.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta:		Datum:		Podpis:
		16.11.2023		
Dopady:	do projektové dokumentace (DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 02/2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 1 738 074,17 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I 1 738 074,17 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně			1 738 074,17 Kč
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			47 032 837,75 Kč
Zástupce zhotovitele – jméno:		Datum:	Podpis:	
		16.11.2023		
Zástupce objednatele – jméno:		Datum:	Podpis:	
		16.11.2023		
Zástupce TDI – jméno		Datum:	Podpis:	
		16.11.2023		

ZL 5 – náhrada nevhodné zeminy v aktivní zóně

P r ů v o d n í l i s t

Seznam příloh :

- č.1 Zpráva geologicko – průzkumných prací, (10/2022)
+ doplněk zprávy o prohlídce základové spáry, (21.11 2022)
- č.2 Prohlášení projektanta č.1, (2.3 2023)
- č.3 Statická zatěžkávací zkouška, (19.4 2023)
- č.4 Prohlášení projektanta č.2, (25.4 2023)
- č.5 2x Statická zatěžkávací zkouška, (18.5 2023)
- č.6 Souhlas AD (projektanta) s pokračováním stavby, (23.5 2023)
- č.7 Výpočet množství materiálu pro náhradní zásypy
- č.8 Položkový rozpočet

Věcná a časová posloupnost prací :

1.

Na základě zprávy geologicko – průzkumných prací a jejího dodatku, kterou vypracoval na základě rekognoskace lokality (po odtěžení zeminy na úroveň základové spáry 1.pp) RNDr. Tomáš Vylita, bylo rozhodnuto že zemina vytěžená při výkopových pracích není vhodná pro zpětné zásypy v aktivní zóně stavby a komunikací a musí být nahrazena vhodným materiálem.

- příloha č.1 - Zpráva geologicko – průzkumných prací
- zápisy z KD – SD č.1 – str. 08472, 08480, 08484

2.

Na základě posudku geologa navrhl [REDACTED] provést náhradu nevhodné zeminy betonovým recyklátem, popř. SBD 32/63 o tl. cca 35 cm.

Projektant požadoval vytvoření zkušebního pole o velikosti 2x2m z betonového recyklátu (v prostoru parkoviště) a na něm provedení statické zatěžkávací zkoušky.

- příloha č.2 - Prohlášení projektanta č.1
- zápisy z KD – SD č.1 – str. 08493, 08496

3.

Dne 19.4 2023 byla provedena statická zátěžová zkouška na vytvořeném zkušebním poli.

- příloha č.3 - Statická zatěžkávací zkouška
- zápisy z KD – SD č.1 – str. 08499

4.

Na základě výsledku provedené zátěžové zkoušky z níž vyplynulo že nebylo dosaženo minimální požadované únosnosti ($E_{def,2} = \min 30 \text{ Mpa}$) navrhl projektant Ing. Jiří Obozenko provést skladbu s vloženou geotextílií (500g) a vrstvu SDB 0/63 tl. 0,35m.

Pro ověření únosnosti navrženého souvrství požadoval novou statickou zatěžovací zkoušku na provedeném zkušebním poli.

Materiál SDB 0/63 navrhl použít též k zásypu 1.pp stavby na východní straně – pod přístavbou v úrovni 1.np a parkovištěm.

Únosnost požadoval ověřit též statickou zatěžkávací zkouškou.

- příloha č.4 - Prohlášení projektanta č.2
- zápisy z KD – SD č.2 – str. 02053

5.

Dne 18.5. 2023 byli provedeny zátěžové zkoušky na vytvořeném zkušebním poli a dále na násypu pod přístavbou (v úrovni základové spáry).

- příloha č.5 - 2x Statická zatěžkávací zkouška
- zápisy z KD – SD č.2 – str. 02057

6.

Na základě výsledků provedených zkoušek projektant odsouhlasil pokračování prací a provedení násypů dle jeho návrhu.

- příloha č.6

- zápisy z KD – SD č.2 – str. 02061

7.

Po odsouhlasení prací projektantem a na základě výzvy od TDI objednatele zhotovitel provedl výpočet množství nahrazované zeminy v aktivní zóně a předložil ZL č.5 k odsouhlasení.

- příloha č.7

- zápisy z KD – SD č.2 – str. 02063, 02076, 02078, 02085, 02089

8.

Položkový rozpočet

Dr. Vylita

AGUAS CF, s.r.o.

Geologické a balneotechnické práce



zapsáno u KS v Plzni, oddíl C, vl. 19548

Pražská silnice 841/43

360 01 Karlovy Vary

TE/fax

znalectví v oboru těžba (hydrogeologie), vodní

hospodářství (znečištění podzemních vod)

e-mail:

ZPRÁVA

geologicko-průzkumných prací

Prohlídka základové spáry

pro novou budovu Lesů ČR
Stříbrná u Kraslic

Č.ú. 2022/106 A

Karlovy Vary, říjen 2022

1. Úvod

V souladu s požadavkem LČR jsme dne 11.10. 2022 provedli rekognoskaci základové spáry nově konstruovaného objektu lesní správy na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná, obec Stříbrná.

2. Nálezy a zjištění

Kvartérní pokryv je v dotčeném území tvořen svahovými sedimenty charakteru písčitých hlín, hlinitých a jílovitých písků s polohami hlinito-úlomkovitých až kamenitých sutí. Nejsvrchnější vrstvu tvoří humózní horizont v mocnosti cca 0,20 m.

Obr. 1 Pohled na staveniště od J (11.10. 2022)




Horninový podklad je zde tvořen prokřemenělými chloriticko-sericitickými fylity. V rámci zemních prací s mělkým dosahem nebyl skalní fundament zastiženo.

Podzemní voda nebyla v základové spáře zastižena. Drobné nesoustředěné vývěry vázané na písčité polohy ve svahových sedimentech byly dokumentovány v odřezu svahu pod silnicí na východě území.

V základové spáře v celé ploše staveniště byly dokumentovány jílovitopísčité hlíny, jen místy s drobnými úlomky hornin, které lze dle ČSN 73 1005 klasifikovat jako zeminy tříd F3 MS až S5 SC. Podle ČSN EN ISO 14688-2 lze tyto zeminy zařadit do zemin saSi, sagrSi a sacSi.


Obr. 2 Penetrometrická měření v základové spáře (11.10. 2022)

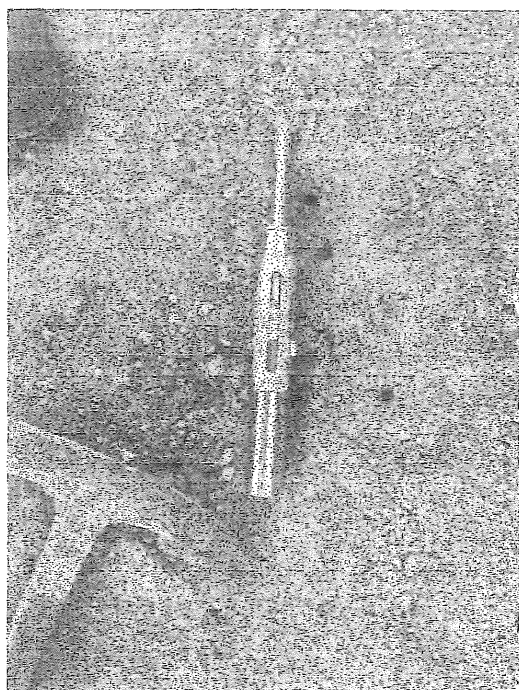

V době rekognoskace (polojasno, sucho, + 13°C) byla ověřena převažující tuhá konzistence těchto zemin. Pevnost v prostém tlaku ověřovaná ručním penetrometrem se pohybovala v intervalu hodnot 190 – 260 kPa.

Základová půda tvořená těmito zeminami se vyznačuje vyšším podílem jemnozrnné frakce, která způsobuje jejich vysokou namrzavost a rozbředavost. Tento typ zeminy je citlivý na změny vlhkosti, a proto je nutné ochránit základovou půdu zejména proti případnému převlhčení. Základová spára nesmí být vystavena dešti či zatopení apod.

Karlovy Vary, 12.10. 2022



Doplněk zprávy o prohlídce základové spáry

Na základě požadavku LČR zastoupených projektantem p. Radkem Paterou sdělujeme, že při rekognoskaci lokality pro výstavbu objektu lesní správy na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná, obec Stříbrná, dne 11.10. 2022 byly v obnažené základové spáře dokumentovány svahové sedimenty charakteru písčitých hlín, hlinitých a jílovitých písků, místy s drobnými úlomky hornin. Tyto zeminy byly dle ČSN 73 1005 klasifikovány jako zeminy tříd F3 MS až S5 SC a dle ČSN EN ISO 14688-2 jako zeminy saSi, sagrSi a sacSi. Mají vyšší podíl jemnozrnné frakce, která způsobuje jejich vysokou namrzavost a rozbředavost, jsou citlivé na změny vlhkosti a jsou obtížně zhutnitelné i při malých odchylkách od optimální vlhkosti dle Proctor Standard. Při rekognoskaci bylo shledáno poněkud vyšší vlhkost zemin v základové spáře, a proto nelze zeminy vytěžené při zemních pracích z prostoru staveniště bez dalšího detailního zkoumání hodnot jejich aktuální vlhkosti kontrolními zkouškami doporučit pro zpětné zásypy či podloží pro komunikace. Doporučujeme proto s ohledem na další postup prací již v méně příznivých klimatických podmínkách provést náhradu vytěžených zemin za vhodnější materiály (např. odval nebo betonový recyklát).


Karlovy Vary, 21.11. 2022



ZÁPIS z KD 8.9

15.11.22

Přítomni:



Zápis:

9/1 Zhotovitel předložit plán zimního opatření. TDI nemá připomínky.

9/2 Kácení dopravního nově smlouvo.

9/3 Jednání se zastupiteli obce se bude konat v rámci příštího KD.

9/4 Stanovisko od ČEZ dopravní nef-
dává.

9/5 Zhotovitel analyzoval neplatnost stanoviska od příslušného geologa k vhodnosti materiálu na budování zářezů mezi zářez. p. a. Byl navržen a schválen zářez odvalen. Zhotovitel určil předložit částeč. návrh.

9/6 Při realizaci byla zřítkna rada. P. - Chybný zřez od škodu šk. AD určí zářez. L. a. by nebylo nutné posouzet přiro.



9 Z KD 8.12

6-222

Figure 1

... ..

AD prověřit geologický průřez pro
DTSP roční plánování (navržený)
k.č. komunikací

- dále prověřit provádění obvodového zdiva s opěrnou zdí
- zhotovit zářez o provedení provedení stěny vnitřního schodiště z kř. bloků (zhr. bednění) - AD
- detail základu obl. nového zdiva ve základové desce a její zakrmití podle výroby levanu - AD
- viz bod 11/3 (emina krysu) - AD

12 - Oddělný oddržel souhlasní
střnovisko z čezu na přírodní
navrhu oběru k energii (emita
způsobu v. tažení)

Zhotovitel zaslal návrh ZL,
TL + AN se vyznačí do přílohy
ED

Zhotovitel předloží tech. list k
kvalifikační zkoušce na požad.

20.12.22

Zápis z kD č. 13

Přítomni:

Zápis:

13/1 - geologickým průzkumem z/1
geologem doporučeno odložení
převážně zeminy a nahrazení
zhuštěným podkladem (materiál)
Až zajistí staništní příslušného
projektanta, který navrhne skladbu
podkladu.

- bod dle 12/1 v bodě V k jednání
bodem písemná zpráva - dle 15.1.23

13/2 - Zhotovitel zaslal ZL 1-4 na
základě kterých zhotovitel připraví
Dodatek k SOA.

Příteli kD se bude konat 10.1.2023,
místo bude upřesněno telefonicky.

Zapsal:

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA č. 1

AKCE: Administrativní budova LS Kraslice na p. č. 13/1, k. ú. Stříbrná

STUPĚŇ PD: RDS

Zhotovitel:



Investor:

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,

500 08 Hradec Králové

V projektu bylo pro výstavbu počítáno s využitím zemín vyzískaných na stavbě. Dle vyjádření geologa však nejsou tyto zeminy vhodné do násypů.



Z tohoto důvodu projektant navrhuje výměnu za vhodný, nakupovaný materiál.

Doporučuji následující postup:

Zhotovitel připraví změnový rozpočet ve dvou variantách, nákup betonového recyklátu a nákup SDB 32/63 v požadovaném množství.

Provede se zhodnocení nabídky. Předpokládá se nižší cena za betonový recyklát.

Zhotovitel provede zkušební pole z betonového recyklátu velikostí min. 2m x 2m a provede statickou zatěžovací zkoušku. Zkouška bude vyhodnocena a odsouhlasí se další postup.



Přítomni

Zaps z KD č. 16.

2.3.2023

6.3.2023

Zaps

16/1 Dne 2.3.2023 se na stavbě uskutečnila
prac. schůzka s tímto zářerý.

- a) zástupce AD p. Dboedenko začal/předal
Problémům projektanta č. 1, kterým
reaguje na skutečnost nevhodných
zemín (stávajících) do nátypu a kterým
doporučuje provést zkušební pole 2x2m
2 bet. recyklatu s následnou statickou
zátěží zkušební.

- b) s odkazem na Zaps z KD č. 7/3
a 10/1 - přesán sjezd a křižovatky
- AD zapíše PD vč. projekční s
dotčenými orgány. Zástupce
dlec sešla s příslušnou zkušbou
na vlastní soubor s pozemním dotčením

- c) Původní odhadem stávající komunikace
bude řešeno na samostatném jednání
dne 16.3.2023 se zástupce in
Vsu - p. Skvrčekem

16/2 S ohledem na nevhodné klimatické
podmínky jsou slatě práce na
stavbě přerušeny.

Přítel KD a uskutečnil dne 16.3.2023
od 9⁰⁰ na stavbě

6. 6. 2023

Zápis z KD č. 19

Zápis

9/1 - V. Kobayashi vsela na zveřejnění návrhu
stavby - bude v budoucnu pokračována
se zastupováním OZS Stribina

12 - Pozadavky na AD

a) posunutí vjezdu - AD předložila cenovou
nabídku, je odsouhlasena ze strany
leg. CE bude zahájena inženýrská
činnost. Bude-li projekt se za-
stupem OZS ohledně převodu po-
zemí na

b) Konstrukční vrstva pod parkovištěm
bude určena po provedení geotechnické
zkoušky - předpoklad do konce 04/2023

c) změna kótování - předložila cenovou
nabídku, následně bude zahájena
projektová práce

d) změna dispozice v objektu - AD
zahájí projektovou práci

113 AD určí EAL koncepci prvků - ohro-
žení střechou, dle požadavků k CE;

Přítel KD se bude konat 13. 4. 2023,

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 108/23

Objednatel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Název stavby:

Administrativní budova LS Kraslice - Stříbrná

Objekt:

komunikace

Místo zkoušení:

zkušební místo zemní pláň

Konstrukční vrstva:


zemní pláň

Datum zkoušení:

19.4.2023

vzorek č.: 115/23

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	2,38
0,12	3,85
0,18	5,42
0,25	6,86
0,33	8,09
0,41	9,48
0,50	11,25
0,25	10,68
0,12	10,21
0,00	7,37
0,06	8,02
0,12	8,82
0,18	9,52
0,25	10,26
0,33	10,66
0,41	11,15

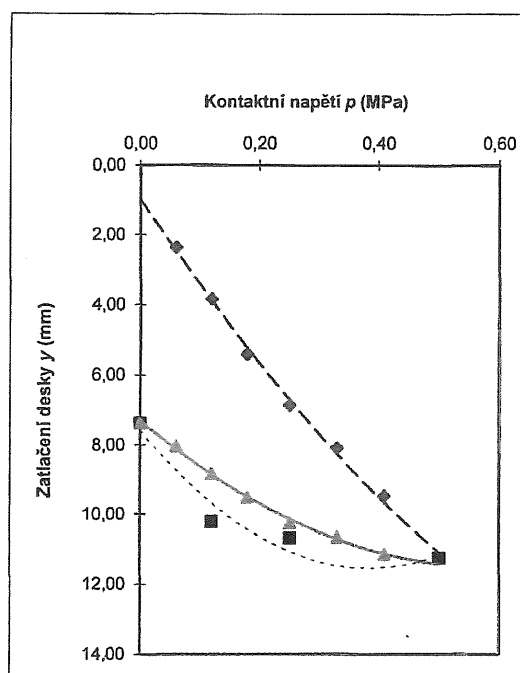


výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1.zatěžovací cyklus)	11,10	MPa
$E_{def.2}$ (2.zatěžovací cyklus)	27,21	MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)	2,45	

Zkoušel:



Zpracoval:



Schválil:



Protokol vydán dne:

19.4.2023

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Technická zkušební laboratoř s.r.o., Chebská 53, Sokolov, 356 01, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198

18.4.23

ÚT

Pocasi: 4-7°C

Prac.d. 8⁰⁰-14⁰⁰

Počel. prac. 5

Mech., strojn. práce

Popis prací:

- řezání cihelných bloků na tříky o tl. 8 cm
- provádění dozdívek nositel. zdivo (8 cm)

Zápis zhotovitele:

Po konzultaci se statikem [redacted]
bude chytajících 8 cm na nosný [redacted]
zdež dozděno pomocí narezaných
cihel použitých na stav. nosné zdivo [redacted]

Pocasi: 4-8°C Prac.d. 8⁰⁰-14⁰⁰

19.4.23

Počel. prac. 5 Mech.

ST

Popis prací:

- dovoz a uložení izolace - polystyren pro zateplení zdi ze ZB
- provádění nadstřešk
- a- tepelné izolace zdi ze ZB

Zápis zhotovitele:

- Dnešního dne byla v prostoru parkoviště provedena statická zkouška na vytvoření zkušebního prutu z betonu ve tvaru cyklofry (cca 2x2 m). Ze zkušby bude zpracována samostatný protokol [redacted]

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA Č. 2

AKCE: Administrativní budova LS Kraslice na p. č. 13/1, k. ú. Stříbrná

STUPĚŇ PD: RDS

Zhotovitel:

Investor: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

Zhotovitel stavby provedl v prostoru budoucí komunikace a parkoviště zkušební pole z betonového recyklátu o tl. 35 cm.

Na tomto zkušebním poli byla provedena dne 19.4 2023 statická zatěžovací zkouška.

Z výsledků zkoušky vyplývá, že nebylo dosaženo minimální požadované únosnosti 30MPa.

Z toho důvodu navrhuji provést skladbu s vloženou geotextilií (500 g) a vrstvu ŠDB 0/63 tl. 0,35m.

Únosnost navrženého souvrství bude ověřena na zkušebním poli statickou zatěžovací zkouškou.

Materiál ŠDB 0/63 bude použit též k zásypu 1.pp stavby na východní straně – pod přístavbou v úrovni 1.pp a parkovištěm.

Únosnost bude též ověřena statickou zatěžkávací zkouškou.

V Karlových Varech,

2.5/23
UT

Teplota: 3-14°C Prac.d. 8⁰⁰-17⁰⁰
 Počet prac. 6 Med. KA, bagr, v. deska
 Popis prací:

- kladení materiálů
- vibrování - kulturní deska pod 20 cm

Teplota: 3-14°C Prac.d. 8⁰⁰-17⁰⁰
 Počet prac. 6 Med. KA, bagr, v. deska
 Popis prací:

- kladení materiálů za ŽB stěnu
- postupné kulturní ual. - po 20 cm

4.5/23
OT

Teplota: 4-15°C Prac.d. 8⁰⁰-17⁰⁰
 Počet prac. 6 Med.: KA, bagr, v. deska
 Popis prací:

- kladení materiálů za ŽB stěnu
- postupné kulturní v. deska po 20 cm
- dovoz zásypaného mat. na stavbu

Zápis zhotovitele:

Dle vyjádření GP záložní zk. provedena ual.
 Polí (dne 19.4) nebyla. Bude provedeno nové
 sonarování dle jeho údajů (GEO TEX 500 + SDB 0/63)
 Záložní zkušební bude gaboráka.
 Zásep ukladu stěny obj. (1PP) bude proveden
 > materiál SDB 0/63.

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. D

protokol č.: 722/23

Objednatel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Název stavby:

Administrativní budova LS Kraslice - Stříbrná

Objekt:

administrativní budova

Místo zkoušení:

JZ přístavba

Konstrukční vrstva:


zemní pláň

Datum zkoušení:

18.5.2023

vzorek č.: 893/23

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,05	0,34
0,10	0,74
0,20	1,34
0,30	1,96
0,10	1,52
0,05	1,40
0,00	1,08
0,05	1,22
0,10	1,36
0,20	1,66
0,30	1,94

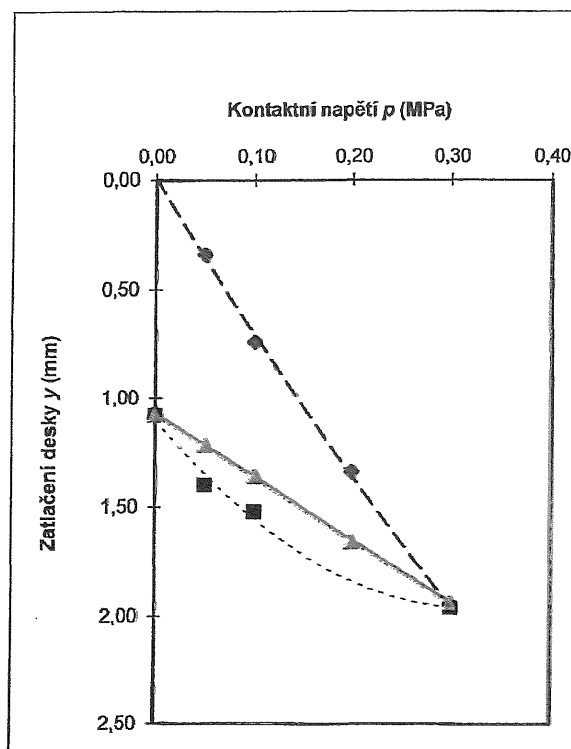

výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1. zatěžovací cyklus)	35,25	MPa
$E_{def.2}$ (2. zatěžovací cyklus)	80,34	MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)	2,28	

Zkoušel:

Zpracoval:

Schválil:

Protokol vydán dne:

19.5.2023

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Technická zkušební laboratoř s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 721/23

Objednatel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Název stavby:

Administrativní budova LS Kraslice - Stříbrná

Objekt:

parkoviště

Místo zkoušení:

SV roh parkoviště

Konstrukční vrstva:


zemní pláň

Datum zkoušení:

18.5.2023

vzorek č.: 892/23

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	0,54
0,12	1,10
0,18	1,52
0,25	2,02
0,33	3,08
0,41	4,34
0,50	5,58
0,25	5,08
0,12	4,52
0,00	3,24
0,06	3,52
0,12	3,86
0,18	4,18
0,25	4,50
0,35	5,04
0,45	5,56

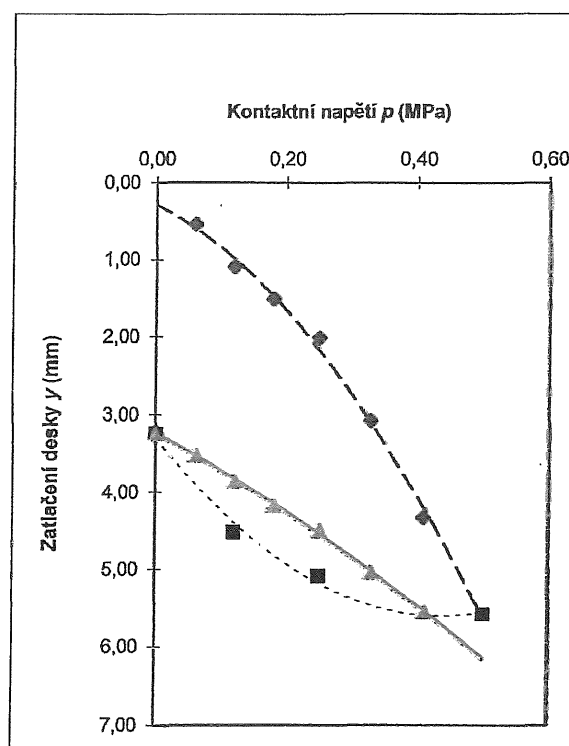

výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1.zatěžovací cyklus)	21,04	MPa
$E_{def.2}$ (2.zatěžovací cyklus)	43,51	MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)	2,07	

Zkoušel:

Zpracoval:

Schválil:

Protokol vydán dne:

19.5.2023

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Technická zkušební laboratoř s.r.o., Chebská 53, Sokolov, 356 01, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198

Zápis z KD č. 22

17.5.20

Přítomni:

Objednatel: p. Černý

Zhotovitel: p. Konečný, p. Těšitel

Tl: p. Kolařík

Předseda: p. Hach

Zaps:

22/1 - Kolize revizní šachty drenážní na JV straně objektu s plánovaným schodištěm - AS provést možný posun a případnou úpravou vnitřního schodiště

22/2 - Zhotovitel dle projektu zkusku z kulturního jádra v JV straně objektu, tak vnitřní v aktivní zóně konstrukce parkoviště na východní straně stavení. Kontrolní měření parkoviště bude podkladem pro určení následných vrstev konstrukce vozovky.

22/3 - Bylo dohodnuto, že drenáž v jižní části objektu bude odvedena samostatně do drenážní šachty. Zhotovitel z ní bude odvést do DPS

Příště KD se bude konat 1.6.2023 od 9. hod na stavbě

Re: Fwd: SZD Kraslice 23.5 '23

Dobrý den,
přikládám odpověď od p [REDACTED]

*Dobrý den,
zkoušky vyšly. Požadováno je $E_{def,2} \geq \min 30 \text{ MPa}$, poměr do 2,5. Můžete pokračovat ve výstavbě.*

[REDACTED]
Atelier MONarch s.r.o.

e-mail [REDACTED]

tel: + [REDACTED]
[REDACTED]

16.2023

Zápis z KO č. 23

Přítomni:


Zápis

23/1 - od 22/1 - změna v trase vjezdu
k souborům - trasa prověřena od
AO případný posun, resp. změna

23/2 - Zkouška zkušební prokázala
dostatečnou zkušební úroveň plánu -
potvrzeno emailem AO 23.5.2023

23/2 - TDI upozorňuje na časné předklá-
dání souhrnné práce pro fakturaci

Přítak KO se bude konat dne 8.6.2023
od 9.00 hod uveďte





Výpočet množství materiálu pro náhradní zásypy

1. Východní strana objektu – pod přístavbou a horním parkovištěm :

4,5m x 42,9m x 3,5m

Množství materiálu – 675 m³

2. Severní strana – pod venkovním schodištěm :

3m x 13m x 3,5/2m

Množství materiálu – 68 m³

3. Jih – parkoviště a komunikace :

0,35m x 1050m²

Množství materiálu – 367 m³

Celkem skutečně dodáno – 1085 m³

**Původní vytěžený materiál z výkopů bude použit na terénní úpravy na pozemku
objednatele (p.p.č. 13/1)**

Zápis z KD č. 249.5.23
ČT

Přítomni:

Zápis:


24/1 - AD předložila řešení vnějšího schodiště, zhotovitel předloží 2L-měřítko

24/2 - AD zatele emailem návrh kcha. řešení poruchové úpravy vnitřního schodiště vč. finálního řešení zahradní a sítě a schodiště

24/3 - Zhotovitel předloží návrh 2L k nahradám materiálu pro k.čmí vrstvy komunikace

24/4 - TDR objednatel se setká se zastupcem obce ohledně vřtakového potrubí a pozemků k plánovanému sjezdu

Příští KD se bude konat dne 15.6.23 od 9⁰⁰ na stavbě



Přítomni:

Zápis z KD č. 28.

27.7.23

Zápis:

28/1 - Běl projednal návrh ZL pro
doplňování konstrukčních vrstev
do komunikací

28/2 - Zhotovitel byl vyzván k předložení
návrhu parkovací

28/3 - Ostatní úkoly z předchozích
KD trvá - body č. 26/3, 27/3,
27/4

Příští KD se uskuteční 3.8.2023
od 9.00 hod na stavbě

Denní záznamy stavby:

List č.

02078

Data

3.8.

Zápis z KD č. 29

Přítomni:

Zápis:

29/1 - Zhotovitel zaslal návrh soupisu
práci za 07/25 ke kontrole.

29/2 - Úkoly z předchozích KD trvají
(viz bod 28/3)

29/3 - Zhotovitel má zpracován 2L
ke konstrukčním vstřevám ko-
munikací, bude zaslán emailem.

Přítel KD 7. 8. 2023 od 9.00 hod
na stavbě.

2945 2 KD C 31

792023

Dr. J. H. M. W.

Ull + Zinkoxid 1000g/ 500g pro 2a
03/2023

21/2 - ZL je v prirodničkovom Kriem

9/3 - Placova izluzka se otklonila uz
Parnasti zepis. Na 75 cm uvidena
A. c. glaberrima, v. de 0,25' dose-
gnut. Epiloma glabra
v. de 0,25'

9/5 - Fr. Stora Gudstuga, kyrka & prop. kl.
Larsenius Center skedda dottern
Storb. Klara, 80-årig, 84 kg, vorec
dödad. Rinnit schizofren 31 jan

DATE OF SELECTION: June 21, 98
UP TO DATE FOR STATE:

21.9.23

32/1 Dne 13.9.2023 se uskonalila
pracovní schůzka za účelem
vysvětlení výkladu a rozporů
v PD, ze schůzky k zánostat

2/2 AD zasto dopomog videti zminy
pa souvisejci v elektro mch v
3a. Lydnu

92/3. Ze strany AD byla poskytnuta na upravené pozice vslupních dveří do m.o. 005, 006, 105, 104, 116, 115

32/4 Anotovaný ZL od zhotovitele dle
projednaní ve samostatném jednání
Zhotovitel předložil ZL vč. smluvních
koeficientů

PRÍSLUŠNÍK KD se uskutční dne 5. 10. 2022
od 9.00 na starbě

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22h152
Stavba: Rozpočet platný - Administrativní_budova_LS_Kraslice

KSO:
Místo: Kraslice

CC-CZ:
Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
KONOPA

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podnikatele.

Cena bez DPH			1 738 074,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 738 074,17	364 995,58
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 103 069,75



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22h152

Stavba: Rozpočet platný - Administrativní_budova_LS_Kraslice

Místo: Kraslice

Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KONOPA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 738 074,17	2 103 069,75	
0201-ZL05	Změnový list 5 - Obsyp a úprava plochy štěrkodrt'	1 738 074,17	2 103 069,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet platný - Administrativní_budova_LS_Kraslice

Objekt:

0201-ZL05 - Změnový list 5 - Obsyp a úprava plochy šterkodrt'

KSO:

Místo: Kraslice

Zadavatel:

Zhotovitel:

KONOPA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 12. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 738 074,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 738 074,17	21,00%	364 995,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 103 069,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet platný - Administrativní_budova_LS_Kraslice

Objekt:

0201-ZL05 - Změnový list 5 - Obsyp a úprava plochy štěrkodrt'

Místo: Kraslice

Datum: 5. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KONOPA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 738 074,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 738 074,17

1 - Zemní práce

749 914,91

5 - Komunikace pozemní

468 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 474,50

998 - Přesun hmot

446 084,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet platný - Administrativní_budova_LS_Kraslice
Objekt:

0201-ZL05 - Změnový list 5 - Obsyp a úprava plochy štěrkodrt'

Místo: Kraslice
Zadavatel:
Zhotovitel: KONOPA

Datum: 5. 12. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 738 074,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 738 074,17

D 1 Zemní práce 749 914,91

1	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	700,000	143,00	100 100,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
" okolo budovy" 700,0

700,000

2	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	1 311,618	495,43	649 814,91	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------------	---	-----------	--------	------------	----------------

PP
VV
" okolo budovy" 700,0*1,67*1,1*1,02

1 311,618

02.01-D.1.1 – D.1.3 Sta – 13 – zemní práce – hloubené
vykopávky – 501 982,92 / 516 959,40 = +1,03 (481x1,03 =
495,43)

D 5 Komunikace pozemní 468 600,00

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 100,000	195,00	214 500,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 100,000	231,00	254 100,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 474,50

5	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 100,000	66,80	73 474,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m

02.01-D1.1 – D.1.3 Sta. – 91 – Doplnující kce. a práce poz.
Komunikaci – 5349,29 / 4885,20 = 1,095 (61x1,095 = 66,795)

D 998 Přesun hmot 446 084,76

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 312,014	340,00	446 084,76	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
