

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/12

Číslo ZBV:

37

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 37 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.3	-86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37	-86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/12

Číslo ZBV:

37

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	96	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek

1) Vrstva SAL:

Změna během výstavby řeší skutečně provedené množství asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL, oproti předpokladu PDPS na stavebním objektu SO 102. Vrstva byla položena v úsecích, kde po odfrézování stávajících AB vrstev byla zachována podkladní CB deska s příčnými a podélnými spárami, nebo byla změněna niveleta vozovky a konstrukce upravena po dohodě s projektantem RDS a TDI na skladbu 130 mm, kde podkladní vrstvu tvoří SAL. Změnu množství dokládáme přiloženými měřičskými protokoly z provedených úseků a zápisy ve stavebních denících úseku SO 102. Dále dokládáme vyjádření AD č. 69 (příl. č. 14) a souhlasné stanovisko objednatel. Změna se týká pol. č. 39 a 44 cenové navýšení činí 1 596 621,07 Kč.

2) Zábradlí na vtoku propustku km 12,925

V PDPS bylo uvažováno s vybouráním kamenného propustu a jeho nahrazením novým propustem DN 1000 délky 15 m s odlážděním vtoku s šikmými čely z lomového kamene do betonového lože. Po odstranění vegetace a vybourání starého propustu byl zřízen nový s tím, že byl dodlážděn celý vtok dle skutečného přilehlého terénu a dodatečně na stavbě dohodnuto s projektantem a TDI zřídit kolem zpevněného vtoku z důvodu bezpečnosti chodců (v blízkosti jsou nemovitosti) ocelové atypické zábradlí (viz. vyjádření AD č. 67 - příl. č. 15). Toto dodatečně naprojektoval projektant RDS (viz výkres). S tímto bezpečnostním zařízením souhlasil objednatel. Změna se týká pol. č. 15, 16, 18, 19, 61, 62, 157, 158 a 225 cenové výši 1 704,25 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64

Technická pomoc Objednatel

jméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Karel Šimek

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

jméno

Ing. David Dvořáček

datum

podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.

jméno

Miroslav Valenta

datum

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 37**

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 629 024,10	16 645 920,33	123 379 842,79	10 016 896,23

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-86 929,80	1 684 180,84	18 330 101,17	16,17%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-6 715 953,90	124 977 093,83	11 614 147,27	10,25%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 37													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	2,865	2,550	4 417,49	1 391,51	0,00	11 264,60	12 656,11	11 264,60	809,52%
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	15 026,390	2,550	504,88	7 585 236,34	0,00	1 287,44	7 586 523,78	1 287,44	0,02%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	10 728,540	2,550	16,70	179 124,03	0,00	42,58	179 166,61	42,58	0,02%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	22 700,091	4,845	138,17	3 135 802,14	0,00	669,43	3 136 471,57	669,43	0,02%
39	565125000R	Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm	M2	13 995,000	20 155,500	6 160,500	246,93	3 455 785,35	0,00	1 521 212,27	4 976 997,62	1 521 212,27	44,02%
44	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2	M2	40 367,809	46 528,309	6 160,500	12,24	494 101,98	0,00	75 404,52	569 506,50	75 404,52	15,26%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%
62	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	10,000	0,000	-10,000	7 829,44	78 294,40	-78 294,40	0,00	0,00	-78 294,40	-100,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	2,250	2,250	4 160,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
158	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	100,00%
		Celkem						14 938 371,15	- 86 929,80	1 684 180,84	16 535 622,19	1 597 251,04	10,69%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	37
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/12

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37	22	
08 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
09 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
10 Listy SD - SAL	15	
11 Geodetické protokoly - SAL	42	
12 Vyjádření AD SAL	1	
13 Výkres - zábradlí	1	
14 Vyjádření AD č. 69 - SAL	1	
15 Vyjádření AD č. 67 - zábradlí	1	
16 Listy SD - zábradlí	1	
17 Fotodokumentace - zábradlí	1	
18 Zápis Ing. Klofáče do obch. rejstříku	2	
19 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku	6	
20 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	96	

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm SoD 13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A] 2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B] 11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C] 549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D] Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E] ZBV ZBV č. 10 dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A] dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B] A+B=102,400 [C] ZBV č. 17 dle geodetických protokolů km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2 km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A] km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B] km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C] km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D] km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2 km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2 km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2 km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečně dofrézování prům. tl. 62 mm - připočet plochy 125,6 m2=125,600 [H] km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy -1654 m2=-1 654,000 [I] km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy -580,5 m2=- 580,500 [J] km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2 km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K] km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm - odpočet plochy -459 m2=- 459,000 [L]	M2	27 731,600	14 739,000	-12 992,600	59,90	1 661 122,84	-784 390,50	6 133,76	882 866,10	-778 256,74	-46,85%
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm SoD 5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A] ZBV č. 17 dle geodetických protokolů km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A] km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm 2374,1 m2=2 374,100 [B] km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm 2272,6 m2=2 272,600 [C] km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm 595,5 m2=595,500 [D] km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm 851,1 m2=851,100 [E] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm 190 m2=190,000 [F] km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm 1654 m2=1 654,000 [G] km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 140 mm 580,5 m2=580,500 [H] km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm 1302 m2=1 302,000 [I] km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm 459 m2=459,000 [J] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm 1411,0 m2=1 411,000 [K] A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]	M2	13 516,000	26 736,600	13 220,600	109,73	1 483 110,68	0,00	1 450 696,43	2 933 807,11	1 450 696,43	97,81%
7	113155332	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm SoD 13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]	M2	13 995,000	13 995,000	0,000	74,99	1 049 485,05	0,00	0,00	1 049 485,05	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	113155333	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	87,43	964 090,61	0,00	0,00	964 090,61	0,00	0,00%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm											
		SoD 11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]											
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	22 029,000	0,000	166,82	3 674 877,78	0,00	0,00	3 674 877,78	0,00	0,00%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD 5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 002,000 [A] 11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B] Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]											
10	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	88,000	88,000	0,000	91,95	8 091,60	0,00	0,00	8 091,60	0,00	0,00%
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých											
		SoD 48+20+20=88,000 [A]											
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	5 001,680	679,180	122,97	531 537,83	0,00	83 518,76	615 056,59	83 518,76	15,71%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD 910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor. řezu=4 322,500 [A] ZBV č. 13 Odkop svahu se svahovými stupni km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I] ZBV č. 20 odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210 1.050.37260.0=42.180 [A]											
12	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	1 701,750	1 701,750	0,000	84,05	143 032,09	0,00	0,00	143 032,09	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD 11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]											
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	4 077,490	4 077,490	0,000	122,97	501 408,95	0,00	0,00	501 408,95	0,00	0,00%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A] 11027*0.27 Štěrka hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B] Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]											
14	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	3 694,800	3 694,800	0,000	84,05	310 547,94	0,00	0,00	310 547,94	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD 910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A] 1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B] 182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C] Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]											
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	2,865	2,550	4 417,49	1 391,51	0,00	11 264,60	12 656,11	11 264,60	809,52%

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) SoD 4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A] 2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B] 1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C] 4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D] 1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E] Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F] ZBV č. 13 dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A] ZBV č. 20 odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A] ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845	T	22 695,246	23 990,533	1 295,287	138,17	3 135 802,14	0,00	178 969,80	3 314 771,94	178 969,80	5,71%
20	171201211a	Poplatek za zemník Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) SoD 1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A] 2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B] 1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C] 182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D] Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]	T	10 481,925	10 481,925	0,000	23,03	241 398,73	0,00	0,00	241 398,73	0,00	0,00%
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách SoD 14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]	M3	182,700	182,700	0,000	254,57	46 509,94	0,00	0,00	46 509,94	0,00	0,00%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C] ZBV č. 20 1,9*60=114,00 [A] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]	M2	11 027,000	11 587,300	560,300	33,80	372 712,60	0,00	18 938,14	391 650,74	18 938,14	2,25%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 12 pro ZBV 37													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle URS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 318,585=318,585											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	2,250	2,250	4 160,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,75*12											
158	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle URS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 6+4+6+4=20											
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
		Cena položky dle URS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 6+4+6+4=20											
		Celkem						113 362 946,56	- 6 715 953,90	18 330 101,17	124 977 093,83	11 614 147,27	10,25%

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/37

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

1) Vrstva SAL množství změna

Skutečně provedené množství asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL, oproti předpokladu PDPS na stavebním objektu SO 102 se předpokládá větší. Vrstva bude položena v úsecích, kde po odfrézování stávajících AB vrstev bude zachována podkladní CB deska s příčnými a podélnými spárami, nebo bude změněna niveleta vozovky a konstrukce upravena po dohodě s projektantem RDS a TDI na skladbu 130 mm, kde podkladní vrstvu tvoří SAL.

2) Zábradlí na vtoku propustku km 12,925

Na stavbě bylo dohodnuto s projektantem a TDI zřídit kolem zpevněného vtoku z důvodu bezpečnosti chodců (v blízkosti jsou nemovitosti) ocelové zábradlí. Toto dodatečně naprojektoval projektant RDS.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s větším provedením množství asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL oproti předpokladu PDPS na objektu SO 102 a se zřízením ocelového zábradlí kolem zpevněného vtoku z důvodu bezpečnosti na vtoku propustku v km 12,925.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem



Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek



SO102

Datum: 31.3.2023 Den týdne: PA

středisko: 811/26AC

Název akce: 11/102 HR. HL. H. PRAHY - STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰oba: 4⁰⁰ - 16⁰⁰

(jména a příjmení):

JAROSLAV ŠTÍPEK, OLEH RUCHKA, JIŘÍ LUKAŠ, MYKHAILO CHENDET,
VYTAHIL HOVISTE, VÁCLAV ZEMEN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAL
DIVIŠ, JAN JURÍK, KAREL FENCL

nmy:

LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 3x NAKLADNÍ AUTO, MOTOROVÁ PILA,
VIBRAČNÍ DESKA DPU

dené práce:

- ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z KRAJNIC + ODVOZ NA HEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ KÁCENÍ KŘOVIN V KM 11,820 - 12,100 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) + ODVOZ KŘOVIN NA HEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ VÝKOPU PRO ROZŠÍŘENÍ CB DESKY V KM 11,820 - 12,440 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) - DLE ZÁDISU Z POCHŮŽKY DNE 29.3.2023 + HUTNĚNÍ VIBRAČNÍ DESKOU DPU

ZÁPIS ZHOTOVITELĚ:

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELĚ (Jr. STRABAG a.s.) MARTIN LIŠA UPOZORŇUJE
TDI STAUBY P. MIROSLAVA VALENTA NA NÁSLEDUJÍCÍ STAV. PRŮJ.
PROVÁDĚNÍ ZH44 PRO ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ CB DESKY V
KM 11,480 - 12,440 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ) BYLA
ZJIŠTĚNA NEDOSTATEČNÁ TLOUŠŤKA STÁVAJÍCÍ CB DESKY V
NĚKTERÝCH ÚSECÍCH REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE SO 102
V KM 11,480 - 12,440 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANICENÍ. BYLA
PROVEDENA FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ CB DESKY V MÍSTĚCH MATE-
TLOUŠŤEK.

ZÁPIS TDI: TLOUŠŤEK STAV. CB DESKY V KM 11,480 - 12,440 P.J. POZADUJI ZDOKUMENTOVAT
PO PROFILECH. TŽV. V KAŽDEM PROFILU
CÍLOM BUDE POŘÍZENO FOTO V KŘÍŽOVÝCH

př 102

Datum: 29.9.2022 Den týdne: ČT

Nákladové středisko: STRABAG

Název akce:

11/102 M2. M2. M. PRAM, PŘEMOŘICE, DEKONTAMINACE, 1. STÁVA

Počasí:

POLEHNO, OBLOHA, RÁNO + 12, PO. + 14°C, DPOL. + 16°C

Pracovní doba: 9⁰⁰-18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰-12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

VÁCLAV ZATHEJ, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAEL DÍVĚ, KARL FENCL,
OLEK RUTKA, JAROSLAV ŠÍP, JAROSLAV LEHČEK, VASIL KAD,
MICHAEL CHENDEK

Mechanismy:

LIEBHERR 944, CAT 963C (KOTROVKA), FORZA 4/2101, DEOPIC VÚ,
HEDORER CÍPEK, ZIMNÍKOVNÍ AUTO, LIEBHERR 944

Materiál:

REGULAČNÍ KAMEN, BETON, POKRYVNÁ PRÁKOVÁ MOTA PŘED

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

PRACOVNÍ OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉ MOTA PŘED
8. REGULAČNÍHO KAMENE OD STAVOVÉHO ÚSEKU V KM 11,650 -
11,800 LÉVA STRANA VE VÝŠI STAVOVÉHO
- PRACOVNÍ OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉ MOTA PŘED
KAMENE POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO MOTA PŘED V KM 11,650 -
11,800 LÉVA STRANA VE VÝŠI STAVOVÉHO
- PRACOVNÍ OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO
POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650 (VÝMĚNA NIVELÉTY - LÉVA STRANA
VE VÝŠI STAVOVÉHO) + PRACOVNÍ OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO
- PRACOVNÍ OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650 (VÝMĚNA
VÝŠI)
- PRACOVNÍ OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650
LÉVA STRANA VE VÝŠI STAVOVÉHO) (NEODSTATEČNÁ TROUČKA POKRYVNÉHO
POKRYVNÉHO

PRACOVNÍ OBLASTI: PRACOVNÍ OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO
POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650 (VÝMĚNA NIVELÉTY) A VÝMĚNA POKRYVNÉHO
V KM 11,300 - 11,650 LÉVA STRANA VE VÝŠI STAVOVÉHO DOKO B. OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO
POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO OD OB. DOKO. DOKO B. OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO
POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650 LÉVA STRANA VE VÝŠI STAVOVÉHO V PÁSI 2m, PO
OB. DOKO V KM 11,300 - 11,650 LÉVA STRANA VE VÝŠI STAVOVÉHO V PÁSI 2m, PO
KONSTRUKCI A POKRYVNÉHO S DOKO POKRYVNÉHO, AD STAVY A OBLASTI STAVY BILA
KONSTRUKCI O OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650 A O OBLASTI
OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650 LÉVA STRANA VE VÝŠI
POKRYVNÉHO, DOKO POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO V KM 11,300 - 11,650
LÉVA STRANA VE VÝŠI STAVOVÉHO BILA OBLASTI (VÝMĚNA POKRYVNÉHO POKRYVNÉHO
AD STAVY)

Podpis zástupce investora (TDI):

So 102/

Den týdne: 80

disko: 841/B6AC Název akce: 11/102 HZ. 17. 1992
+ 13°C, 20°C + 16°C

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

éna a příjmení): JOSEF KUHN, MICHAEL KUHN

~~INFILTRATION CAPACITY: 10 kg/m²~~

práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

GENUS INACTIVITILE: GASTRUPUS INACTIVITILE (F. PIERCE & A.S.)

PRŮTOK LÍŽE ŽLÁZ PRŮTOK DVOU VÝSTRA P. MĚŘENÍ
 O POUŽITÍ POUŽITÍ, INFILTRACÍHO POUŽITÍHO POUŽITÍHO
 1,2 kg/m² A O POUŽITÍ POUŽITÍHO POUŽITÍHO POUŽITÍHO
 ADOPTIVNÍ POUŽITÍ POUŽITÍHO POUŽITÍHO POUŽITÍHO
 POUŽITÍHO POUŽITÍHO POUŽITÍHO POUŽITÍHO POUŽITÍHO
 25-15-60 V KM 11,500-11,800 LÍŽE POUŽITÍHO POUŽITÍHO

25.11.60 в км 11,500 - 11,800 20000

ЗАПИСЬ ДИ: 10 ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ А НА ЗАДАЧЕ
ВЫВОДЯЩИМ НА ПЕРВЫЙ КОНТРОЛЬ.
ЭКАТЕР ПОДЛИН ПОКРАСКИ ГЛАВ
КРЕТОВ ДРВ. ПОПРЯЖКА (КОНТРОЛЬ
ЗЕЛЕНА = КИВ. ПОДЛИН ЦЕТ (20000
ПОПРЯЖКА).

...is zástupce investora (TDI):

So 102

Datum: 5.10.2022

Den tȳdne: 85

středisko: PHK602

Název akce: 11/1021 H.R. R.L. H. 179

Pracovní přestávka: 300 - 200

dob: 500 - 700

mení): KROZOV BERTEN, KRANTSELA, JEDZIŁKA, ZDENEK LUDSKÝ,
RUDOLFA, MICHAEL CHENDEK, KARL KAD, JAROSLAV ŠPILSKÝ, PATRIK
LEMBURKA, MATOUŠ PRUDKÝ, KAREL FERNOL, MICHAEL DITR,
JAN JUREK

is my:

LIBBNER AG, LIBBNER 94, ZWISCHENHOF, HBR. DESERD OPL,
FINANCIAL WORLD, DISTRIBUTOR, KENSKI VUE

ial:

Rt 8 modif, vol 16 + PIB de 195-60, DESULFONATION, BETUN,
CONJUGATION DIVERSE LIGNES DE, PRODUITS PATEUR

ušky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

ne dodavatelů a jejich činnosti): - poskytnutí požadovaných zdravotních materiálů
všechny zdravotní péči včetně léčby a rehabilitace
120 - 1500 Kč měsíčně za osobu s těžkým zdravotním postižením, +

✓ 2m 11,300 - 11,800 15TH
ACQUANT! KALE! HATT
ACQUANT! KALE! HATT

11,300 - 11,800 LEV0

PROVĚŘENÍ: 17.000-17.500 -
- PROVĚŘENÍ: 25.15-60 V km 17.800-17.800 -
- 16.17.18 + 17.18.19 + 17.19.20 + 17.20.21 + 17.21.22 + 17.22.23 + 17.23.24 + 17.24.25 + 17.25.26 + 17.26.27 + 17.27.28 + 17.28.29 + 17.29.30 + 17.30.31 + 17.31.32 + 17.32.33 + 17.33.34 + 17.34.35 + 17.35.36 + 17.36.37 + 17.37.38 + 17.38.39 + 17.39.40 + 17.40.41 + 17.41.42 + 17.42.43 + 17.43.44 + 17.44.45 + 17.45.46 + 17.46.47 + 17.47.48 + 17.48.49 + 17.49.50 + 17.50.51 + 17.51.52 + 17.52.53 + 17.53.54 + 17.54.55 + 17.55.56 + 17.56.57 + 17.57.58 + 17.58.59 + 17.59.60 + 17.60.61 + 17.61.62 + 17.62.63 + 17.63.64 + 17.64.65 + 17.65.66 + 17.66.67 + 17.67.68 + 17.68.69 + 17.69.70 + 17.70.71 + 17.71.72 + 17.72.73 + 17.73.74 + 17.74.75 + 17.75.76 + 17.76.77 + 17.77.78 + 17.78.79 + 17.79.80 + 17.80.81 + 17.81.82 + 17.82.83 + 17.83.84 + 17.84.85 + 17.85.86 + 17.86.87 + 17.87.88 + 17.88.89 + 17.89.90 + 17.90.91 + 17.91.92 + 17.92.93 + 17.93.94 + 17.94.95 + 17.95.96 + 17.96.97 + 17.97.98 + 17.98.99 + 17.99.100 + 18.00.101 + 18.01.102 + 18.02.103 + 18.03.104 + 18.04.105 + 18.05.106 + 18.06.107 + 18.07.108 + 18.08.109 + 18.09.110 + 18.10.111 + 18.11.112 + 18.12.113 + 18.13.114 + 18.14.115 + 18.15.116 + 18.16.117 + 18.17.118 + 18.18.119 + 18.19.120 + 18.20.121 + 18.21.122 + 18.22.123 + 18.23.124 + 18.24.125 + 18.25.126 + 18.26.127 + 18.27.128 + 18.28.129 + 18.29.130 + 18.30.131 + 18.31.132 + 18.32.133 + 18.33.134 + 18.34.135 + 18.35.136 + 18.36.137 + 18.37.138 + 18.38.139 + 18.39.140 + 18.40.141 + 18.41.142 + 18.42.143 + 18.43.144 + 18.44.145 + 18.45.146 + 18.46.147 + 18.47.148 + 18.48.149 + 18.49.150 + 18.50.151 + 18.51.152 + 18.52.153 + 18.53.154 + 18.54.155 + 18.55.156 + 18.56.157 + 18.57.158 + 18.58.159 + 18.59.160 + 18.60.161 + 18.61.162 + 18.62.163 + 18.63.164 + 18.64.165 + 18.65.166 + 18.66.167 + 18.67.168 + 18.68.169 + 18.69.170 + 18.70.171 + 18.71.172 + 18.72.173 + 18.73.174 + 18.74.175 + 18.75.176 + 18.76.177 + 18.77.178 + 18.78.179 + 18.79.180 + 18.80.181 + 18.81.182 + 18.82.183 + 18.83.184 + 18.84.185 + 18.85.186 + 18.86.187 + 18.87.188 + 18.88.189 + 18.89.190 + 18.90.191 + 18.91.192 + 18.92.193 + 18.93.194 + 18.94.195 + 18.95.196 + 18.96.197 + 18.97.198 + 18.98.199 + 18.99.200 + 19.00.201 + 19.01.202 + 19.02.203 + 19.03.204 + 19.04.205 + 19.05.206 + 19.06.207 + 19.07.208 + 19.08.209 + 19.09.210 + 19.10.211 + 19.11.212 + 19.12.213 + 19.13.214 + 19.14.215 + 19.15.216 + 19.16.217 + 19.17.218 + 19.18.219 + 19.19.220 + 19.20.221 + 19.21.222 + 19.22.223 + 19.23.224 + 19.24.225 + 19.25.226 + 19.26.227 + 19.27.228 + 19.28.229 + 19.29.230 + 19.30.231 + 19.31.232 + 19.32.233 + 19.33.234 + 19.34.235 + 19.35.236 + 19.36.237 + 19.37.238 + 19.38.239 + 19.39.240 + 19.40.241 + 19.41.242 + 19.42.243 + 19.43.244 + 19.44.245 + 19.45.246 + 19.46.247 + 19.47.248 + 19.48.249 + 19.49.250 + 19.50.251 + 19.51.252 + 19.52.253 + 19.53.254 + 19.54.255 + 19.55.256 + 19.56.257 + 19.57.258 + 19.58.259 + 19.59.260 + 19.60.261 + 19.61.262 + 19.62.263 + 19.63.264 + 19.64.265 + 19.65.266 + 19.66.267 + 19.67.268 + 19.68.269 + 19.69.270 + 19.70.271 + 19.71.272 + 19.72.273 + 19.73.274 + 19.74.275 + 19.75.276 + 19.76.277 + 19.77.278 + 19.78.279 + 19.79.280 + 19.80.281 + 19.81.282 + 19.82.283 + 19.83.284 + 19.84.285 + 19.85.286 + 19.86.287 + 19.87.288 + 19.88.289 + 19.89.290 + 19.90.291 + 19.91.292 + 19.92.293 + 19.93.294 + 19.94.295 + 19.95.296 + 19.96.297 + 19.97.298 + 19.98.299 + 19.99.300 + 20.00.301 + 20.01.302 + 20.02.303 + 20.03.304 + 20.04.305 + 20.05.306 + 20.06.307 + 20.07.308 + 20.08.309 + 20.09.310 + 20.10.311 + 20.11.312 + 20.12.313 + 20.13.314 + 20.14.315 + 20.15.316 + 20.16.317 + 20.17.318 + 20.18.319 + 20.19.320 + 20.20.321 + 20.21.322 + 20.22.323 + 20.23.324 + 20.24.325 + 20.25.326 + 20.26.327 + 20.27.328 + 20.28.329 + 20.29.330 + 20.30.331 + 20.31.332 + 20.32.333 + 20.33.334 + 20.34.335 + 20.35.336 + 20.36.337 + 20.37.338 + 20.38.339 + 20.39.340 + 20.40.341 + 20.41.342 + 20.42.343 + 20.43.344 + 20.44.345 + 20.45.346 + 20.46.347 + 20.47.348 + 20.48.349 + 20.49.350 + 20.50.351 + 20.51.352 + 20.52.353 + 20.53.354 + 20.54.355 + 20.55.356 + 20.56.357 + 20.57.358 + 20.58.359 + 20.59.360 + 20.60.361 + 20.61.362 + 20.62.363 + 20.63.364 + 20.64.365 + 20.65.366 + 20.66.367 + 20.67.368 + 20.68.369 + 20.69.370 + 20.70.371 + 20.71.372 + 20.72.373 + 20.73.374 + 20.74.375 + 20.75.376 + 20.76.377 + 20.77.378 + 20.78.379 + 20.79.380 + 20.80.381 + 20.81.382 + 20.82.383 + 20.83.384 + 20.84.385 + 20.85.386 + 20.86.387 + 20.87.388 + 20.88.389 + 20.89.390 + 20.90.3

15. ПИТЕРУ СТАНИСЛАВУ ЗАУРЕ, КУДЕТМ,
- ПОВИДЕН, ПОВОРНО ПОСТАВКУ ЗАУРЕ,
- ПОВИДЕН, ПОВОРНО ПОСТАВКУ ЗАУРЕ, КУДЕТМ,
- ПОВИДЕН, ПОВОРНО ПОСТАВКУ ЗАУРЕ, КУДЕТМ,

$M_{300} - M_{800}$ - PRAHA
- KUTÁVSKO, POKROK VE VÝVOJI
PRAHA

2. МАТЕМАТИКА - 1,000 ЛОТОВ - ПІДПИСАНО ПЕ ВАНДЕР
 3. МАТЕМАТИКА - 1,000 ЛОТОВ - ПІДПИСАНО ПЕ ВАНДЕР

[illegible]

- POUŽITÍ VODNÉHO ROZPOVĚDILU V LHM B, 980 -

2. OESULASIN 40 TABLETS IN
1450 BOTTLES FROM 15 PATROL TERRITORY
1450 BOTTLES FROM 15 PATROL TERRITORY

$\frac{1}{2}$, 570 1510 PRAHA - KONE PLASTY V KM 14,1
- PRAGUE - KONE PLASTY V KM 14,1
 $\frac{1}{2}$, 570 1510 PRAHA - KONE PLASTY V KM 14,1

$\frac{1}{2} \cdot 200 = 100$ (по 100) + $\frac{1}{2} \cdot 430$ (по 215) + $\frac{1}{2} \cdot 250$ (по 125) = 217,5

Podpis zástupce investora (TDI):

So 102 ✓

Den tȳdne: ÚT

lisko: 31/12/2020 Nazev akce: 1. 1. 2021
 1. 1. 2021, 1. 1. 2021, 1. 1. 2021, 1. 1. 2021, 1. 1. 2021

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

na a příjmení): JAROSLAV ŠPÍSEK, OLGA KUTNÁ, JOSEF
BENDR, VASTA KLAD, FRANTIŠEK VEJDOVKA, MILAN BERTIN, MICHAEL DIVIČ,
JOSEF PRŮCHA, JOSEF UHLÍČ,

LIBBHEU GR, LIBBHEU 914, ST NARADONI AUTO, 2x FORU TRANSIT,
MORBOVA BRATKA. PAKI

PLASTOVÉ ROVĚŽI SVP DN 400, REGULÁČNÍ KÁMEN, BETON, PŘESK 12.00mm

práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVÁDĚNÍ PŘEPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PRAVÉ A LEVÉ PŘÍKOPY MOSTU POZOG) S MÍSTNÍM DO STŘEŠNÍM VÝVODNÍM POD MOSTEM (POVLÁČKA PLASTOVÁ ROVR DO BETONOVÉHO LOKA)
- PROVÁDĚNÍ OBŠIRNÉ PVC ROVR (PRAVÉ A LEVÉ PŘÍKOPY MOSTU POZOG) PÍKOP 400 mm
- PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ PRÁCE ASFALTOBETONU + ODBOURÁNÍ V KM 11,580 - 11,450 PRAVÁ STRANA VE PÍKOPU STANOVENÍ + ODPOVĚDNÝ PÍKOP NA MĚŘIDLOSTANU
- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ STÁRNUTÉHO KOMUNIKACE V DISKUSIONNÍHO KANALU DO BETONOVÉHO LOKA V KM 11,300 - 11,400 LEVÁ STRANA VE PÍKOPU STANOVENÍ

JÁDIS ZMOTOVITELE: JÁSTUPICE ZMOTOVITELE
 (F. STABAG a.s.) MARTIN LITA ŽADÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY
 INKUBAČ O PŘEVÝŠENÍ KONSTRUKČNÍ KAPATY 8 SE 5/6,
 V KM 14,580 - 14,450 PRANA PRANA 15 POKRÝ STAVIČENÍ
 A O POKRÝTÍ POKRÝTÍ POKRÝTÍ POKRÝTÍ POKRÝTÍ
 30 kg/m² A POKRÝTÍ POKRÝTÍ POKRÝTÍ POKRÝTÍ
 900 16+PVB, 900 11+PVB, 900 11+PVB.

1015 VDI: PO VIERAŤNOM KONTROLE A ZA PODPORU VÝROBKATEĽ
KONTROL. ZÁKŤNÍK POUKOLNÍ POUKOLNÍ, TĚL
V ČERVENÉM ÚSTĚ. //

zástupce investora (TD

So 102 ✓

Datum: 7.12.2022 Den týdene: 37.

středisko: 84/2600 Název akce: 11/1023 PR. 12.12.1992
PR. 12.12.1992, 25.10 + 7.11, 20.12. + 3.1. 2002. 4.10 Pracovní přes

Pracovní přestávka: 11³⁰ - 12⁰⁰

oba: 700-76

(jména a příjmení): ROBERT GIBSON, ROBERT
FRANKLIN, JIM, LUNER, ZDENEK

۱۲۸۵ قمری

.ny:

ACR 76+50/30, POUKOVANÍ POKRÝV 0,3 kg/m², ACR 76+PTB 25/13-60
POUKOVANÍ POKRÝV 1,2 kg/m², ACR 77+PTB 45/10-60, DISKOLACI
KOTVEN, BETON, ACR 8 1750 KF

né práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVÁDĚNÍ VLOŽENÍ PRÁHU ŽELEZA
KOMUNIKACE A DEKUBAČNÍHO KATÉNE DO BETONOVÉHO
LOŽE V KM 11,300 - 11,400 PRÁVA KE SMĚRU STAVBY
- PROVÁDĚNÍ ODVOZU NEVYHODNĚNÉHO VÝPOČKÉHO MATERIÁLU
A NEVYHODNĚNÉ NA PŘÍRODU PODTÝČEM
- PROVÁDĚNÍ VLOŽENÍ DEKUBAČNÍHO KATÉNE DO BETONOVÉHO
V KM 11,500 - 11,550 PRÁVA KE SMĚRU STAVBY +
HUTNĚNÍ VLOŽENÍ KATÉNY
- PROVÁDĚNÍ INFLTRAČNÍHO PRONÁVACÍHO PASTÉKU 0,3 kg/m²
- PROVÁDĚNÍ VLOŽENÍ DEKUBAČNÍHO KATÉNE DO BETONOVÉHO
V KM 11,500 - 11,550 PRÁVA KE SMĚRU STAVBY
- PROVÁDĚNÍ VLOŽENÍ DEKUBAČNÍHO KATÉNE DO BETONOVÉHO
PRÁVA KE SMĚRU STAVBY + HUTNĚNÍ VLOŽENÍ KATÉNY
- PROVÁDĚNÍ INFLTRAČNÍHO PRONÁVACÍHO PASTÉKU 0,3 kg/m²
- PROVÁDĚNÍ VLOŽENÍ DEKUBAČNÍHO KATÉNE DO BETONOVÉHO
V KM 11,500 - 11,550 PRÁVA KE SMĚRU STAVBY + HUTNĚNÍ
HUTNĚNÍ VLOŽENÍ KATÉNY
- PROVÁDĚNÍ INFLTRAČNÍHO PRONÁVACÍHO PASTÉKU 0,3 kg/m²
- PROVÁDĚNÍ VLOŽENÍ DEKUBAČNÍHO KATÉNE DO BETONOVÉHO
V KM 11,500 - 11,550 PRÁVA KE SMĚRU STAVBY + HUTNĚNÍ
HUTNĚNÍ VLOŽENÍ KATÉNY

dpis zástupce investora (TDI)

SO 102

Datum: 3.5.2023

Den týdne: 8

Název akce: M102 M2. M2. D. PRÁTI, ŠK. NOVICE, DISKONTEKURCE, II. Křato
 Podací: POLARNO, RÁNO +6°C, POZ. +1°C, ZPRAV. +1°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTECKÝ, ALŠA PAVELÍČ, VIKTOR ŠTÍPEK, OLGA
 RUDKA, MATOUŠ POKROKIL, MICHAL ŠTĚPÁNEK, PAVEL KAD, PAVEL HARTIG,
 VIKTOR ŠTĚPÁNEK, FRANTIŠEK VEDLIČKA, MICHAL DITK, KARL FENOL,
 ANTONÍN TENCAL

Mechanismy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, KONTAKT JELNÍ NEKLADNÝ, BRUSLE,
 SYMULOVANÍ AUTO, MOTOROVÁ PŘÍČKA, BOVEX, VLADIVO WAGNER,
 2x FORD TRANSIT, KOLEK HARTIG, VIBRAČNÍ DESKA DTV.

Materiál: REGULÁČNÍ KOTVEN, 85102, SC 516, OBELNÍK II. 100mm, ED FE. 0/32mm

Čoušky: REGULÁČNÍ KOTVENÍ 85102 (2x ED FE. 0/32mm)

Provedené práce: - PROVEDENÍ ODPOŘEDNÍ STAVU TĚLESA KONTAKTU SO 102
 8 REGULÁČNÍHO KOTVEN DO BETONOVÉHO LOKU V KM 11,935-
 11,930 PRÁVÍ STĚNA VE STŘEDU STANOVENÍ

OPIS ZAMONTÁŽE: ZAMONTÁŽE ZAMONTÁŽE (F. STRABAG a.s.)

MONTÁŽ LÍČA ŠK. NOVICE ZAMONTÁŽE ZAMONTÁŽE ZAMONTÁŽE ZAMONTÁŽE
 INVESTOR P. MIROSLAV VALENTIN O POUŽITÍ PROVEDENÍ
 KONTAKTU V KOTVEN 8 SC 516 V KM 11,935-11,930 PRÁVÍ STĚNA VE STŘEDU
 STANOVENÍ

- PROVEDENÍ KONTAKTU V KOTVEN 8 SC 516 V KM 11,935-11,930 PRÁVÍ STĚNA
 VE STŘEDU STANOVENÍ + MONTÁŽ SC 516 KOTVEN HARTIG + 180. DESKA

- PROVEDENÍ POUŽITÍ OBELNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOKU
 V KM 11,935-11,930 PRÁVÍ STĚNA VE STŘEDU STANOVENÍ
 (ODPRAVĚNÍ OBELNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOKU) - POUŽITÍ OBELNÍKŮ
 A DI-800

- PROVEDENÍ KONTAKTU V KOTVEN 8 ED FE. 0/32mm A PRÁVÍ
 STĚNU V KM 11,935-11,930 PRÁVÍ STĚNA VE STŘEDU
 STANOVENÍ

OPIS ZAMONTÁŽE:

PRÁVÍ ODPOŘEDNÍ STAVU TĚLESA V KM 11,935-11,930 PRÁVÍ *

Podpis zástupce investora (TDI):

So 102

Datum: 3.5.2023 Den týdne: 81.

ové středisko: 841200 Název akce: 11/102 AR. HL. 17. PRAT, STACHOVICKÉ, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Pracovní přestávka:

ni doba:
nici (jména a příjmení):

ismy:

ené práce:

* PRÁVA KE STŘEŠÍ STANOVENÍ BTL BUDĚNÍ MOŽNOSTÍ
STAV. V OSE KONSTRUKCE JE TLUMĚKA STÁVAJÍCÍ
OS DESKY OCA 180-190 mm. PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO
ATOLTOVÉHO SVĚTLÍ A STÁVAJÍCÍ OS DESKY NA PRÁVÉ
STĚNĚ KE STŘEŠÍ STANOVENÍ NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ
OLE RDS V km 11,060-11,180 BUDE OSTRHOVÁ STÁVAJÍCÍ
OS DESKA V TLUMĚCE 80-90 mm A TÍŽ NEVYHODNĚNÍ.
BUDĚNÍ BUDOVY RDS PROJEKTANTA A AD STAVBY O NÁVRHU
BUDĚNÍ TOHOTO ÚŘEČU. BILA PROVĚŘENA FOTOZDOKUMENTACE
V PROFILU 80 10 m.
DOLE V km 11,180-11,060 A 11,180-11,300 LEVÁ PRÁVA KE
STŘEŠÍ STANOVENÍ SE NACHÁZÍ PŘESAH STÁVAJÍCÍ OS DESKY
30 OSU NOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO OCELOVÉHO SLUPIDLA, NEŽE
PROVĚŘIT GERANĚNÍ OCELOVÝCH SLUPKŮ. TO DOHODĚ S RDS
TROUBATNĚM A AD STAVBY BUDE PROVĚŘENO BUDĚNÍ
STÁVAJÍCÍ OS DESKY V km 11,180-11,060 A 11,180-11,300
A NÁKLONNÉ ODBOURÁNÍ A OSTRHOVÍ BUDĚNÍ STÁVAJÍCÍ
OS DESKY

ZAPIS TDI: BEČKA NA VEDOMÍ

is zástupce investora (TDI

PO 702

Datum: 15.12.2022 / Den týdne: 7.

žve středisko: 1000
 - 1000 05.10 - 30, 102. 00, 2002. 00
 ní doba: 300 - 13 30

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní postup:

ní doba: 300 - 79 30

nici (jména a příjmení): EDENIEK KOUTENSKÝ, VARSILAV ŠÍPSE, VASIL VLAST, MIKHAL
CHANDER, OLEA DICKA, EDENIEK KOUTA, MATOUŠ PASKOVIČ,
VARSILAV ŠÍPSE

diál: A216+, P28 P2001F, INFILTRACIÓ, PARACEL, GASTRITIS

šky:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - poskytování úsluh stavebnictví v km
- stavební práce

17,300 - 17,800 PRÁVA PRANA VS PINEJ
- PRÁVĚNÍ POKLÁDKY ASKAZIORETOVÉ DROVNÍKOST
AUL 10+ V RM 17,300 - 17,800 PRÁVA PRANA VS PINEJ PINEJEN
17,300 - 17,800 PRÁVA PRANA VS PINEJ PINEJEN

ACEL 10+ V RM 11,300-11,600 PRAVO PRÁNE 15 V
- PROVÁDĚNÍ: SPONOVACÍHO INFILTRAČNÍHO POSTUPU V RM 11,300-11,600
V RM 11,300-11,600

POSLE SRUČANJE JE PITERU PRANIO ENI

- PROJEKCIJA: POZADNA IZ PRAVOG STRANIČENJA
POZADNA STRANICA IZ PRAVOG STRANIČENJA
- PROJEKCIJA: POZADNA IZ STRANIČENJA IZ PRAVOG STRANIČENJA
PROJEKCIJA: POZADNA IZ STRANIČENJA IZ PRAVOG STRANIČENJA

PROTI PLEBNI KONTAKT
PISANO JE PRILEP JAVNO

STENA KE PRŮZ HODNĚNÍ
- PROVÁDĚNÍ PRŮZVODNOSTI DO PRŮZVODNOSTI ETUDE, $0,32 \text{ kg/m}^2$

ZÁPIS DÍ: POPLÁDKA AJS: VYROVNÁNÍ PRŮTOKU AČL 6T
I MODIFIKOVANÝM POSILKEM A POPLÁDKA
PRŮTOKU JAL 6TLY PROVEDENÍ BEZ
POPLÁDKY DÍ 2 DEKODU KONTROLNÍM
KONTROLNÍM PODMÍNĚM NE JIN 756121

Podpis zástupce investora (T

So 102 ✓

Datum: 9.5.2023

Den týdne: 07

středisko: 831/2600

Název akce: 11/102 HE. HL. 17. PRAMT, ŽIŠCHOVICE, DISKONTEJNORCE, II. STADI

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

oba: 300 - 1700

Pracovní přestávka:

mení): VÍSLAV ZEMEN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, JAROSLAV ŠÍPKE,
JAN LŠEČKA, HONŮR POKOČIL, EDUARD KOTENSKÝ, VILHILM HRTÍK,
MICHAEL CHENDET, KOSTA VLAD, MICHAEL DÍVÉ, PAVEL FENC, ANTONÍN
FENC

my:

LIEBHERR 914 + HYDRAUL. VLADOVO, LIEBHERR 912, KONTAKT ŽELNI NARLADE,
EXFORD TRAKTORI, 3 + NABAVNA AUTO, DOVOZOVÁ BRÁNA,
KOMPLEKSY + HODICKÝ PŘÍSTROJ

INFILTRAÇÃO: 10 kg/m², 1,2 kg/m²

y:

dené práce:

- [illegible]

REZULTATY STANOVISU
PODPA + PÍSE V JEDNÉ ÚPRAVĚ
ZÁPLN PDI: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE A NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍCH
VÝLEDKŮ KONTROLOVANÝ ZKOUŠEK POKYBY POKYBY
HRAV VĚTRNÉ POKYBY V CÍLEVNĚM ÚPRAVĚ. (Když
vzduchová rychlost v km 10,840 - 10,880 a
v m/s 10,840 - 10,880 - 12,140/m²)

- HAV VOETIVE POSTBILU V KEM 10,840 - 10,880 @
 - PROVIŠDENÍ INFILTRACNÍHO POSTBILU KVAL. V KEM 10,880 - 10,060 @ 11,180 - 11,300 - 12/123/m²
 11,060 - 11,180 - 10/123/m² @ V KEM 10,880 - 10,060 @ 11,180 - 11,300 - 12/123/m²
 ČÍSLO STAVBYVEDOUČÍHO:

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis zástupce investora (TDI):

RABAG

80 102

Datum: 10.5.2013 Den týdne: ST.

Středisko: 3110719

Název akce: 11/102) AK. M. D. PRAHA, ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Doba: 800 - 1330

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Místa (jména a příjmení):

KARLOUŠ BENEŠ, FRANTIŠEK JEDLIČKA, JAROSLAV JIŘEK,
OLEK RUDKA, MATOUŠ POKOŠIL, ZDENĚK KOUTENSKÝ, MICHAEL
CHENDEK, VÁCLAV KAD, VÍTALÍK HOTTŠIK

Místa:

LIBEREC 9R, LIBEREC 9R + HYDRAULICKÉ KLADIVO, KRAJEC
OŠETŘENÍ NABÍZKA, 3x NABÍZKA, 3x NABÍZKA, 3x NABÍZKA, 3x NABÍZKA,
HATIT, EL. OŠETŘENÍ, KRAJEC, KRAJEC, KRAJEC, KRAJEC

Místa:

AC 16+, PZ 8 MODIF, INFILTRAČNÍ PASTVÍK POUŽITÍ 0,3 kg/m²,
AC 16+ PZ 8 MODIF, MONOLITICKÁ HOŘKÁ VÝST, (D. PZ 0/32 mm),
INFILTRAČNÍ PASTVÍK, KRAJEC, 1,2 kg/m², OŠETŘENÍ KRAJEC, BETA

Místa:

Ovedené práce:

- PROVÁDĚNÍ PORUŠENÍ ASFALTOBETONOVÉ VÝSTI AC 16+
V KM 10,840 - 11,060 A 11,060 - 11,300 LEŽÍ ŠIRKA
VE ŠTĚRU STANOVENÍ + HUTNĚNÍ ASFALTOBETONU VÁLCEM HATIT
- PROVÁDĚNÍ PORUŠENÍ ASFALTOVÉ VÝSTI SE SUTĚROVOU ODZVONITÍ
PODÍ ŠTĚRU ŠTĚRU ŠTĚRU ŠTĚRU ŠTĚRU ŠTĚRU ŠTĚRU ŠTĚRU
11,060 - 11,300 LEŽÍ ŠIRKA VE ŠTĚRU STANOVENÍ + HUTNĚNÍ
PZ 8 MODIF. VÁLCEM HATIT
- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO PASTVÍKU 0,3 kg/m² V KM 10,840 - 11,300
LEŽÍ ŠIRKA VE ŠTĚRU STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ PORUŠENÍ ASFALTOBETONOVÉ VÝSTI AC 16+ MODIF
V KM 10,840 - 11,300 LEŽÍ ŠIRKA VE ŠTĚRU STANOVENÍ + HUTNĚNÍ
ASFALTOBETONU VÁLCEM HATIT
- PROVÁDĚNÍ BOROVNÍ ŠKALNÍHO MASIVU V KM 10,840 POUŽÍ ŠIRKA
VE ŠTĚRU STANOVENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ
MASIVU NA HEDERONOVÉ (HUTNĚNÍ POUŽÍ ŠTĚRU STANOVENÍ + HUTNĚNÍ
VÝST
- OŠETŘENÍ NABÍZKA POUŽÍ ŠKALNÍHO MASIVU (EL. OŠETŘENÍ + VÁLCE
BETA 104)
- PROVÁDĚNÍ PORUŠENÍ POKRYTÍ HEDERONOVÉ VÝSTI DO BETONOVÉHO LOKU
V KM 10,840 POUŽÍ ŠIRKA VE ŠTĚRU + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ
HEDERONOVÉ VÝSTI (D. PZ 0/32 mm + HUTNĚNÍ HEDERONOVÉ
VÝST)
- PROVÁDĚNÍ VÝSTI OŠETŘENÍ ŠKALNÍHO MASIVU V KM 10,840 POUŽÍ ŠIRKA
PO 102 V KM 10,840 - 11,060 POUŽÍ ŠIRKA VE ŠTĚRU STANOVENÍ
+ OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ
HEDERONOVÉ VÝSTI (HUTNĚNÍ POUŽÍ ŠTĚRU STANOVENÍ + HUTNĚNÍ
HEDERONOVÉ VÝST)
- PROVÁDĚNÍ VÝSTI OŠETŘENÍ ŠKALNÍHO MASIVU V KM 10,840 POUŽÍ ŠIRKA
PO 102 V KM 10,840 - 11,060 POUŽÍ ŠIRKA VE ŠTĚRU STANOVENÍ
+ OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ + OŠETŘENÍ
HEDERONOVÉ VÝSTI (HUTNĚNÍ POUŽÍ ŠTĚRU STANOVENÍ + HUTNĚNÍ
HEDERONOVÉ VÝST)

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis zástupce investora (TDI):

ABAG

(6 102)

Datum: 10.5.2023

Den týdne: ST

středisko: 841/2020

Název akce:

11/102 HR. HL. 17. PRAM, STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Pracovní přestávka:

oba:

(jména a příjmení):

smy:

y:

dené práce:

ZÁKLADY ZHOTOVITELE:

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (F. MĚSÁŘA a.s.) MARTIN LIŠA ZÁKLADY ZHOTOVITELE

POSOUZENÍ INVESTORA P. MĚSÁŘA KOLEM O POVOLENÍ PROVEDENÍ

INFILTRAČNÍHO POSTŘIKU EDULEI 1,2 kg/m² V KM 13,900 - 14,100

POSAVÁ PRÁHA VE PÍŠEJI A PROVEDENÍ VTRHOVACÍ VERTY ACO 16+

DLE RDS, ASFALTOVÉ VERTY SE ZVÝŠENOU ODALNOSTI PROTI PÍŠEJI

TRAMIN PAL 8 MĚSÍČNÍ, ACO 16+PTB A ACO 11+PTB V KM 13,900 - 14,100

PRÁHA PRÁHA VE PÍŠEJI STANOVENÍ

ZADÍ TDI: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE A NA ZÁKLADĚ
TOHATOVNĚ TL. CRY (MIN. 120MM) POVOLENÍ
POKLÁDKU HAV V UVEDENÉH CÍPECH
VŠETNĚ PODTRIKU- PROVEDENÍ INFILTRAČNÍHO POSTŘIKU EDULEI 1,2 kg/m²
V KM 13,900 - 14,100 POSAVÁ PRÁHA VE PÍŠEJI STANOVENÍ
(DISTRIBUTOŘ)

Podpis zástupce investora (T)

SO 102

Datum: 11.5.2013

Den týdne: ÚT

Pracovní středisko: 81/80AC

Název akce: 11/102 HZ. HZ. 17. PRAN7, JIŠCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. STÁPI

Pracovní doba: 300 -

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

FRANTIŠEK JEDLIČKA, VÁCLAV ŠESTEN, JAROSLAV ŠTÍPKE, PATEK, LEHČEK, OLGA RUDKA, MATEJŠ POKROČIL, ZDENĚK KOTENSKÝ, VÍTAL KAD, VITAZ HATSK, MICHAL CHENDEY, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENC, ANTONÍN MENCÍ

Mechanismy:

LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, 3x NÁVLAČNÍ AUTO, 2x FORD TRANSIT, FINISER LÖGGE, 3x VÁLCE HATT, MOTOROVÁ PŘÍRADA

Materiál:

REGULAČNÍ LÁTEK, BETON, ŽÁKOVÁ DLAŽBA, LEONČÍŠE, ACI 16+, PÁZ 2 MODIF., ACI 16+ PITS, PRONOSACÍ POSTELK 0,3 kg/m² a 1,2 kg/m²

Koušky:

Provedené práce:

- PROVÁDĚNÍ ODVOZU NEVÝHODNÉHO VÝPOVĚDNÍHO MATERIÁLU
- 8. REKONSTRUKCE NA PŘÍRADU HAT 17
- PROVÁDĚNÍ DLAŽBY PRAMENŮ TĚLESA KOTENSKÉHO SO 102
- 3. REGULAČNÍHO LÁTEK DO BETONOVÉHO LÁTKU V km 11,830 - 11,830
- PRAMEN PŘÍRADA VE PŘÍRADU STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ DLAŽBY + DLAŽBY ŽÁKOVÉ DLAŽBY
- V km 11,225 - 11,225 LÁTKA PŘÍRADA VE PŘÍRADU STANOVENÍ
- (ODVOZAT POUŽIT)
- PROVÁDĚNÍ POUŽITÍ VTRUŠNÝCH PŘÍRADOVÝCH VTRUŠNÝCH
- ACI 16+ DLAŽBA V km 13,200 - 14,100 PŘÍRADA PŘÍRADA
- VE PŘÍRADU STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ PRONOSACÍHO POSTELKU NA VTRUŠNÝCH VTRUŠNÝCH 1,2 kg/m²
- PROVÁDĚNÍ PŘÍRADOVÝCH VTRUŠNÝCH VTRUŠNÝCH PŘÍRADU
- PŘÍRADA TĚLESA PÁZ 2 MODIF. + HUTNĚNÍ VTRUŠNÝCH VTRUŠNÝCH
- V km 13,200 - 14,100 PŘÍRADA PŘÍRADA VE PŘÍRADU STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ PRONOSACÍHO POSTELKU 0,3 kg/m² V km 13,200 - 14,100
- PŘÍRADA PŘÍRADA VE PŘÍRADU STANOVENÍ
- PROVÁDĚNÍ POUŽITÍ PŘÍRADOVÝCH VTRUŠNÝCH VTRUŠNÝCH ACI 16+ PITS
- V km 13,200 - 14,100 PŘÍRADA PŘÍRADA VE PŘÍRADU STANOVENÍ +
- HUTNĚNÍ VTRUŠNÝCH VTRUŠNÝCH
- PROVÁDĚNÍ PRONOSACÍHO POSTELKU 0,3 kg/m² V km 13,200 - 14,100
- PŘÍRADA PŘÍRADA VE PŘÍRADU STANOVENÍ + LÁTKA LÁTKA (PRONOSACÍ
- POSTELK 0,3 kg/m²)
- PROVÁDĚNÍ PRONOSACÍHO POSTELKU 0,3 kg/m² V km 13,200 - 14,100
- LÁTKA PŘÍRADA VE PŘÍRADU STANOVENÍ + LÁTKA LÁTKA (PRONOSACÍ
- POSTELK 0,3 kg/m²)

Podpis stavebního:

Podpis zástupce investora (TDI):

80 102

Datum: 26.5.2023

Den týdne: Pá

disko: 8/1202 Název akce: 11/1021 HE. AL. II. PRÁZD, ŠECHOVICE, DISKONTEJNICE, I. etapa

- RÁDIO + 10°C, POZ + KVC, ODPOZ + 120°C
- 7⁰⁰ - 13³⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ena a příjmení): JOSEF BOUTENKA, KASL VAD, MICHAL CHENDEZ, MILOUT
HRTSYK, JEDOUK POKOŠIL, OLEA RUCHA, JATRIK LEMBOKA,
MICHAL DITK, MARIE FENC, ANTONÍN HENCL, FRANTIŠEK
JEDLIČKA, JOSEF BOUTENKALIBEREC 914, LIBEREC 914, KRATKÉ ŽELNÍ NARODNÍ, 914 MÍRADOV
AUTO, FINIŠER KÖELE, 3x MÍRADOV, 3x MÍRADOV, 3x MÍRADOV,
MÍRADOV 102C 30/37 XF4, ACP 16+, SŽL 8 MODIF., ACP 16+ MODIF., POSTÁVKA 0,3 kg/m²
(SPROVNACÍ SŽL 8), SPÁROVACÍ MÍRADOV SŽL

práce:

- PROVÁDĚNÍ POUZDŘIT ASFALTOBETONU ACP 16+ V KM 10,840 - 10,880 A 11,060 - 11,180 PRÁVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY + KUPNĚNÍ ASFALTOBETONU KALCI MAMM
- PROVÁDĚNÍ POUZDŘIT ASFALTOVÉ KAPUT SE ŽUTŘENOU KVALITOU POUZDŘIT TAVENÍ SŽL 8 MODIF. V KM 10,880 - 11,060 A V KM 11,180 - 11,300 PRÁVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY
- PROVÁDĚNÍ POSTÁVKY SPROVNACÍ SŽL 8 0,3 kg/m² V KM 10,840 - 11,300 PRÁVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY
- PROVÁDĚNÍ POUZDŘIT ASFALTOBETONU ACP 16+ SŽL V KM 10,840 - 11,300 PRÁVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY + KUPNĚNÍ ASFALTOBETONU KALCI MAMM
- PROVÁDĚNÍ BETONOVÉHO PRÁVU V KM 10,8963 - 10,903 PRÁVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY S BETONU C 30/37 XF4
- PROVÁDĚNÍ SPÁROVACÍ REGULAČNÍHO ROKTENE DO BETONOVÉHO LOŽE SPÁROVACÍ MÍRADOV SŽL V KM 11,180 - 11,830 PRÁVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY
- ODPOZ. NEVYPOVĚDĚNÝ MÍRADOVÝ MÍRADOV SŽL 8, MÍRADOV SŽL 8 NA PRÁVÉ STRANĚ V KM 11,060 - 11,380 PRÁVÁ
- PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU PRÁVÉ STRANĚ V KM 11,060 - 11,380 PRÁVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY (POZÁTKY PRÁVÍ KAPUT)

s zástupce investora (TDI):

Datum: 1.6.2023

Den týdne: 57

Název akce:

Název akce: 11/12) M.B. II. PLOCHY, EŘCHOVICKÉ, REKONSTRUKCE, I. ETAP.

ρλώο + 110€, Ρολ. + 190€, αβΡολ. + 250€

Pracovní přestávka: 14⁰⁰ - 12⁰⁰

příjmení): Václav Jelen, František Jedlička, Jaroslav Štítek,
Michal Dine, Karel Fenc, Antonín Henc, Petr Lehečka,
Lad Rucard, Matouš Ruskouil, Vítal Hrtík, Václav Hlad, Michal
Hendel

1. KRAJEC 9R, LIEBACE 9R, PRAVETEC JEJINI NALLADU, 8x NALLADU AUTO,
NEKEJ DOBELE, 3x VALEO MMTI, KROPICI' US, 3x FORD TRANSI,
AUTODOTI/CHADU.

5, ACL 16+, PROVOZACI' POSTARIZ 93 kg/m², ~~20~~ SAL & MODIF, ACL 16+PB,
UTARIZ, C 20/25, PROVOZACI' POSTARIZ 92 kg/m²

- poskytnutí zdravotní péče osobám dožadujícím se zdravotní péče
1055 zdravotní služby v km 11,330-11,330 PRÁVA
PRÁVA VE SPRAVĚ SPRÁVNÍ

STANO VE STŘEDU STAVIČENÍ 1515
POKOJENÍ, VÍŠKOV STAVIČENÍ V km 13,060 - 13,380 ~~1515~~ STANO
VE STŘEDU STAVIČENÍ (POŠTISK POVOZÍ KLEBY)

பொருள்: பருவம் (LAPENI) - INFILTRATION (பெருக்கி / kg/m^2)

5000/501 V km 14,100 - 14,425 PEARLS PEARLS VS PRASEL STANIČENI

SLUŠ PŘEDNÍ VE PŘEDNÍ STANICI + HUBNĚNÍ VERTIK. VÁLCE HATT

ovládání právnického subjektu / Registrační
ovládání právnického subjektu / Registrační

NEW TALKIN BGS P MODIF. Y km 14,700 - 14,725 PLANT PLANT

Prírodné podmienky + klíma / vďaka veľkej hustote

ROVNANÍ SPONOVACÍHO POKRYTÍU $\sigma_s 93 \text{ kg/m}^2$ V LEMU M_1 , $M_0 - M_1$, M_2

SINCE JANUARY IS THE BEST TIME TO VISIT - 30

DEVI 9013250K7 RTA2208 BTNN BK 16+PDR V km 13,100 - 13,425

5' PJCANE 1/5 PRAKU STANJE NI' + HUMANI' AGL 16 + PITS VOLCI HADIT

505 m³ spravovacieho pastierku 0,3 kg/m²

2. PROPOSIZIONE ESISTENZIALE per R^n/R^m ESISTE, U

25 km: 1 km k 920 - pravá strana ve velké stanici!

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 6a/2020

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha vrstvy SAL – km 10,250 – 10,360 - vpravo

SAL

Plocha: 505.0 m²

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil:	22.6.2020	Josef Tůma
Zpracoval:	22.6.2020	Josef Tůma
Ověřil:	29.6.2020	Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




DAVLE PLOCHY FREZOVANÍ K 22.6.2020

PLOCHA FREZOVANÍ 4 cm 580,5 m²

PLOCHA FREZOVANÍ 10 cm 505,0 m²

PLOCHA SANACE 38,2 m²

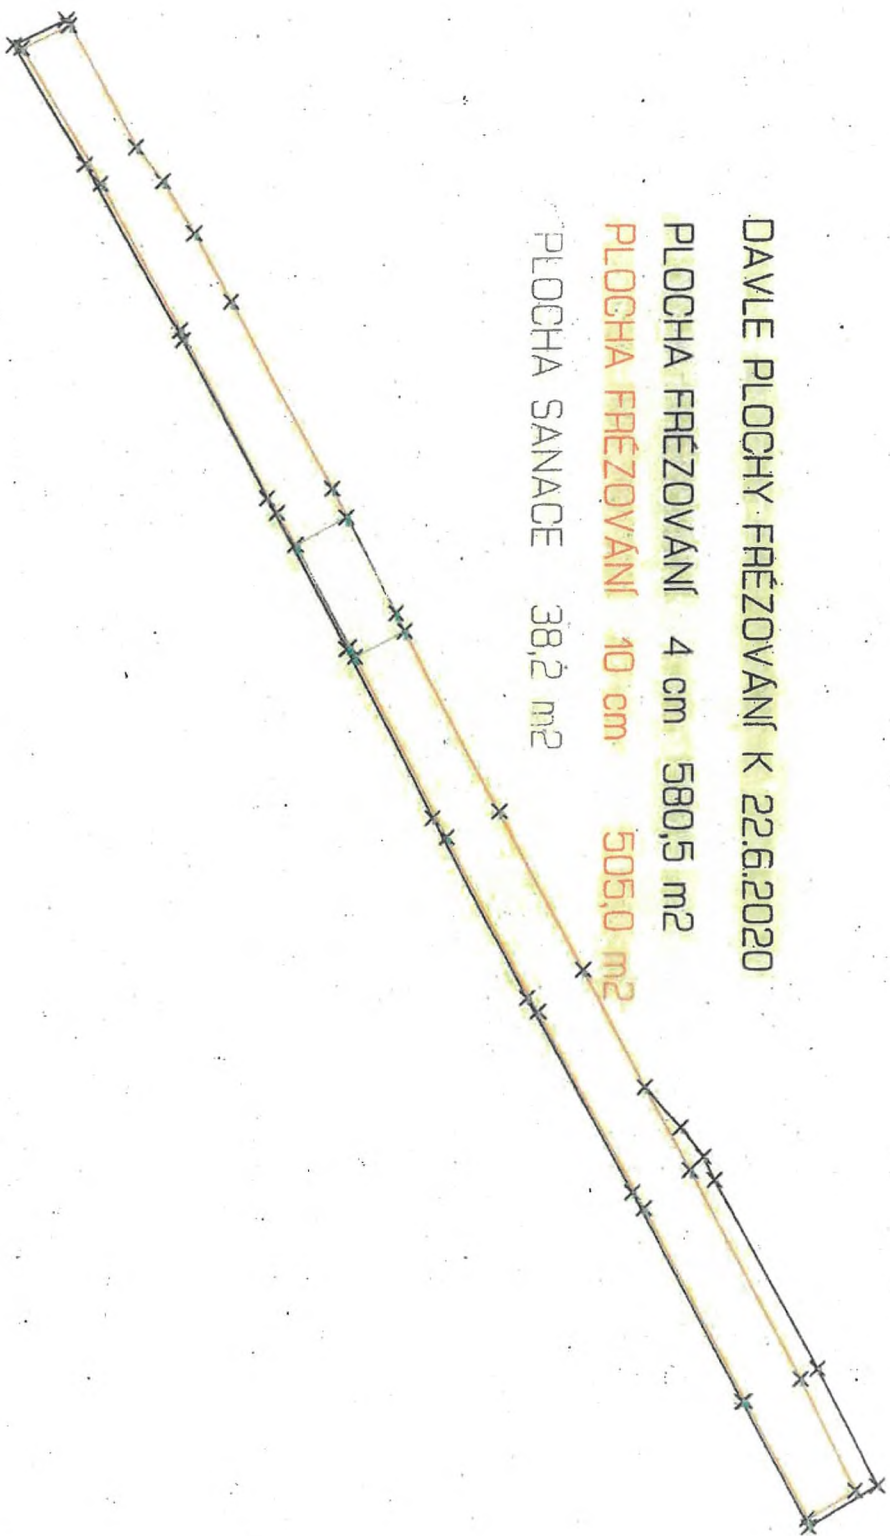

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 13/2020

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Plocha nové živičné vozovky – km 12,440 – 12,850

Vlevo:

ACO	1936 m ²
ACL	1931 m ²
ACP	1927 m ²

Vpravo:

ACO	1761 m ²	prům. tl. 42,4 mm
ACL	1818 m ²	prům. tl. 60,2 mm
SAL	1873 m ²	prům. tl. 31,0 mm
ACL - spodní	1342 m ²	prům. tl. 30,7 mm

Plocha geomříží: 315 m²

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 10.-11.2020

Zpracoval: 24.11.2020

Ověřil: 24.11.2020

Ing. S.Bílek

Ing. S.Bílek

Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. ŠII 60/21

STAVBA: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II
OBJEKT: SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice
úsek B

Kontrolní měření SAL

km	vlevo 0,5 m od okraje			sklon			osa			vpravo 0,5 m od okraje			sklon		
	proj.	měření	rozdíl	tloušťka	proj.	měření	proj.	měření	rozdíl	tloušťka	proj.	měření	rozdíl	tloušťka	proj.
10,520															
10,540															
10,560															
10,580															
10,600															
10,620															
10,640															
10,660															
10,680	202,965	202,954	-11		-2,5	-2,53	203,059	203,049	-10						
10,700	203,026	203,015	-11		-2,5	-2,56	203,120	203,111	-9						
10,720	203,007	203,009	2		-2,5	-2,51	203,101	203,103	2						
10,740	202,949	202,950	1		-2,5	-2,40	203,043	203,040	-3						
10,760	202,892	202,891	-1		-2,5	-2,40	202,986	202,981	-3						
10,780															
10,800															
10,820															
10,840															

Výška: max.odchylka +20, -20 mm
max.rozdíl +2; -11 mm

prům.rozdíl: -4,5 mm

Celková plocha : 450 m²

Ověření výsledk
podle § 13 odst.
24.8.2021

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 78/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 12,822 – 13,202 - vpravo

Plocha asfaltových vrstev

ACO -	km 12,822 – 13,202	1551,4 m ²
ACL -	km 12,846 – 13,202	1530,7 m ²
SAL -	km 12,846 – 13,201	1562,3 m ²

Geomříž	podélně	759,7 m ²
	příčně	100,1 m ²

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přílohy:

Zaměřil: 29.9.2021

Ing. S. Bílek

Zpracoval: 30.9.2021

Ing. S. Bílek

Ověřil: 30.9.2021

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 100/2021

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A,B – plocha konstrukčních vrstev v km 10,360 – 10,841

KSC - vpravo	1490,5 m ²
SAL - vpravo	2203,3 m ²
ACP - vpravo	52,1 m ² ✓
ACL - vpravo	2198,2 m ² + vyrovnávky 164,3 m ²
ACO	4065,6 m ² (L+P)

geomříže

km 10,525 – 10,580	š. 2 m	101 m ²
km 10,680 – 10,840	š. 2 m	320 m ²

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 11.2021

Zpracoval: 10.11.2021

Ověřil: 10.11.2021

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 15/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A – km 10,000 – 10,250 - vlevo

Plocha konstrukčních vrstev

SO 102

ACL -	km 10,000 – 10,117	685,0 m ²
	km 10,130 – 10,250	512,1 m ²
ACP -	km 10,000 – 10,117	700,1 m ²
	km 10,130 – 10,190	274,6 m ²
SAL -	km 10,190 – 10,250	251,9 m ²
SC -	km 10,000 – 10,117	713,1 m ²
	km 10,130 – 10,250	362,8 m ²
ŠD -	km 10,000 – 10,117	733,6 m ²
	km 10,130 – 10,250	376,3 m ²

SO 204

ACL -	km 10,117 – 10,130	80,9 m ²
ACP -	km 10,117 – 10,130	81,4 m ²
SC -	km 10,117 – 10,130	82,8 m ²

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
náčrt

Zaměřil: 3.-4.2022
Zpracoval: 14.4.2022
Ověřil: 14.4.2022

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek A

Plocha konstrukčních vrstev - km 10,000 – 10,250 – vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747773.92	1064711.60	202.68
2	747772.71	1064711.18	202.68
3	747752.40	1064707.89	202.57
4	747742.69	1064706.46	202.55
5	747723.69	1064703.75	202.55
6	747703.73	1064700.96	202.54
7	747683.95	1064698.16	202.57
8	747662.95	1064695.50	202.71
9	747663.94	1064689.35	202.79
10	747684.71	1064692.36	202.71
11	747704.59	1064695.12	202.70
12	747722.18	1064697.60	202.69
13	747744.15	1064700.76	202.70
14	747753.69	1064702.32	202.71
15	747773.41	1064705.89	202.81
16	747775.46	1064706.19	202.80
17	747778.10	1064706.34	202.81
18	747780.46	1064706.62	202.81
19	747782.16	1064707.17	202.79
20	747784.25	1064707.84	202.79
21	747789.52	1064709.15	202.78
22	747789.67	1064708.85	202.79
23	747792.44	1064709.58	202.77
24	747793.59	1064709.97	202.77
25	747794.89	1064710.52	202.75
26	747797.42	1064711.69	202.74
27	747798.90	1064712.34	202.74
28	747801.27	1064713.09	202.74
29	747812.34	1064716.49	202.71
30	747821.71	1064719.98	202.73
31	747828.84	1064722.85	202.76
32	747828.85	1064727.56	202.66
33	747819.90	1064723.95	202.61
34	747810.93	1064720.72	202.61
35	747802.23	1064717.91	202.62
36	747797.35	1064716.99	202.61
37	747831.03	1064723.74	202.75
38	747786.60	1064714.29	202.64
39	747778.89	1064712.64	202.66
41	747840.12	1064727.72	202.78
42	747849.15	1064732.12	202.82
43	747858.01	1064736.59	202.85
44	747866.95	1064741.23	202.87
45	747875.77	1064745.78	202.88
46	747884.69	1064750.42	202.88
47	747893.60	1064755.06	202.88
48	747898.78	1064757.81	202.92
49	747896.60	1064762.19	202.80
50	747892.12	1064759.27	202.75
51	747882.52	1064754.26	202.77
52	747873.67	1064749.64	202.76
53	747856.15	1064740.54	202.74
54	747847.28	1064736.10	202.72
55	747837.79	1064731.52	202.68
122	747847.78	1064734.81	202.68
127	747861.64	1064741.93	202.72
132	747878.22	1064750.55	202.72
137	747894.48	1064758.97	202.71

MOST
MOST

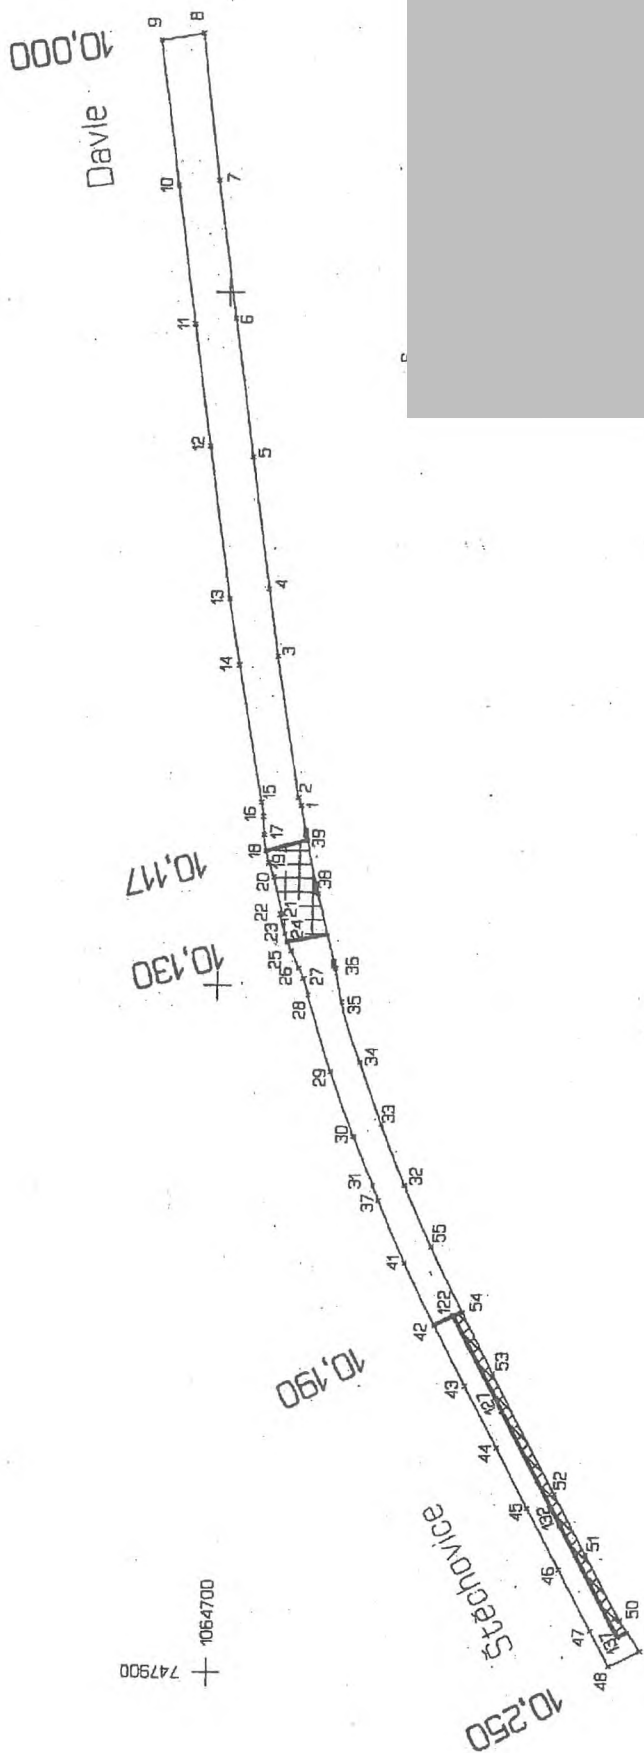

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5		číslo zakázky		Ing. S. Brlek		výkres číslo		
		overlil		14.4. 2022				
		datum						
		číslo ověřen						
akce: I/102 Hr. I. Města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 102 – Rekonstrukce vozovky,– Davle – Stěchovice Úsek A – km 10,000 – 10,250 – plocha konstrukčních vrstev								
		záměřil		Ing. Stanislav Brlek	datum	3.-4. 2022	měřtko	1:1000
		kreslil		Ing. Stanislav Brlek	datum	14.4.2022	souř. systém	S-JTSK
							výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 49/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,297 – 11,780 – vlevo – plocha živice

ACL:
SO 102 - km 11,297 – 11,780 2130 m² tl. 60 mm
SO 206 - km 11,363 – 11,377 63 m² tl. 60 mm
ACL – vyrovnávka:
km 11,534 – 11,780 1125 m² prům tl. 44 mm
SAL:
SO 102 – km 11297 – 11,780 2175 m² tl. 30 mm

geomříže:
328,1 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 10.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 21.10.2022 Ing. S. Bílek
Ověřil: 21.10.2022 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Km 11,297 – 11,780 – vlevo – plocha živice

Seznam souřadnic


Bod	Y	X	Výška
101	748226.68	1065685.48	204.30
102	748227.11	1065685.31	204.30
103	748229.09	1065674.99	204.27
104	748230.15	1065668.74	204.25
105	748225.79	1065667.98	204.13
106	748229.14	1065648.00	204.08
107	748233.61	1065649.05	204.21
108	748237.03	1065629.27	204.16
109	748232.64	1065628.32	204.05
110	748234.69	1065616.02	204.09
111	748239.41	1065617.10	204.17
118	748224.00	1065677.78	204.16
119	748223.19	1065682.14	204.19
120	748221.41	1065693.55	204.25
121	748225.69	1065691.67	204.35
122	748226.20	1065691.79	204.32
123	748224.69	1065703.27	204.37
124	748220.26	1065702.51	204.29
127	748216.43	1065727.22	204.24
128	748220.91	1065728.01	204.32
131	748213.31	1065747.40	204.25
132	748217.87	1065747.76	204.35
135	748210.33	1065766.91	204.28
136	748214.81	1065767.53	204.37
139	748207.09	1065787.08	204.30
140	748211.69	1065787.32	204.40
143	748204.15	1065806.19	204.33
144	748208.53	1065807.02	204.43
147	748201.10	1065826.04	204.34
148	748205.47	1065826.84	204.44
151	748198.00	1065845.88	204.34
152	748202.46	1065846.63	204.44
155	748194.93	1065865.64	204.34
156	748199.42	1065866.34	204.44
160	748191.85	1065885.30	204.35
161	748196.67	1065886.04	204.46
164	748188.80	1065905.08	204.34
165	748193.90	1065906.03	204.45
168	748185.71	1065925.09	204.28
169	748190.22	1065925.65	204.38
172	748182.71	1065944.72	204.26
173	748187.12	1065945.44	204.36
176	748179.78	1065964.49	204.20
177	748184.19	1065965.21	204.30
180	748176.96	1065984.24	204.14
181	748181.34	1065985.01	204.24
184	748178.36	1066005.94	204.19
185	748174.11	1066004.67	204.10
188	748175.92	1066024.61	204.13
189	748171.40	1066024.16	204.04
192	748173.17	1066044.43	204.12
193	748168.79	1066043.93	204.01
196	748170.57	1066064.08	204.09
197	748166.14	1066063.40	203.98
200	748168.05	1066084.12	204.07
201	748163.56	1066083.66	203.96
202	748166.83	1066094.27	204.07
203	748162.30	1066093.50	204.01

Geomříža

502	748238.75	1065619.88	206.17
503	748237.42	1065626.89	206.16
504	748235.71	1065636.67	206.17
505	748233.99	1065646.67	206.20

506	748232.23	1065656.47	206.22
507	748230.57	1065666.39	206.24
508	748229.60	1065671.65	206.26
509	748221.85	1065721.65	206.33
510	748220.95	1065727.44	206.33
511	748219.50	1065737.37	206.34
512	748218.07	1065747.05	206.35
513	748216.37	1065757.17	206.23
514	748214.83	1065767.04	206.20
515	748213.33	1065777.04	204.39
516	748211.74	1065786.79	204.40
517	748210.26	1065796.80	204.42
518	748208.63	1065806.71	204.44
519	748207.52	1065815.09	204.46
520	748205.60	1065826.48	204.44
521	748204.14	1065835.65	204.45
522	748202.52	1065846.19	204.44
523	748201.01	1065856.11	204.45
524	748199.44	1065865.98	204.44
525	748185.94	1065952.78	204.34
526	748196.45	1065885.73	204.46
527	748193.42	1065905.40	204.45
528	748191.87	1065915.30	204.42
529	748184.71	1065961.72	204.31
530	748183.44	1065970.62	204.29
531	748182.06	1065979.59	204.26
532	748180.70	1065989.54	204.23
533	748179.31	1065999.55	204.21
534	748177.86	1066009.57	204.18
535	748172.19	1066051.96	204.10
536	748167.44	1066088.40	204.07

SO 206



11,780

11,534

11,373

11,363

11,297

STHABAG a.s. Kacrkova 982/41, Praha 5		čas záznamy	Ing. S. Blah
		ověř	21.03.2022
		datum	
		čas ověření	
čas 11/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa I SO 102 Rekonstrukce vozovky, Dvle - Stěchovice Úsek B, km 11297 - 11780 - vlevo - plochy zvlive výkres číslo			
záměr	Ing. Stanislav Blah	datum	10.2022
kresl	Ing. Stanislav Blah	datum	21.10.2022
		metrsko	1 : 2000
		souř. systém	S-JTSK
		výšk. systém	Bpr

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 63/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 14,424 – 14,580 – vpravo – plochy konstrukčních vrstev

ŠD	-	602,3 m ²	tl. 220 mm	
SC	-	580,8 m ²	tl. 150 mm	
ACP	-	569,3 m ²	tl. 50 mm	SAL 143,3 m ² tl. 30 mm
ACL	-	701,8 m ²	tl. 60 mm	
ACO	-	684,1 m ²	tl. 40 mm	

SO 103 - REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi
Úsek A – km 14,580 – 14,609 – vpravo – plochy konstrukčních vrstev

ŠD	-	153,6 m ²	tl. 150 mm
ŠD	-	153,6 m ²	tl. 200 mm
ACP	-	153,6 m ²	tl. 90 mm
ACL	-	153,6 m ²	tl. 60 mm
ACO	-	158,3 m ²	tl. 40 mm

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	11.-12.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	8.12.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	8.12.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek C km - 14,424 – 14,580 – vpravo – plocha konstrukčních vrstev

SO 103 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - PRŮTAH ŠTĚCHOVICEMI

Úsek A km - 14,580 – 14,609 – vlevo – plocha konstrukčních vrstev

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747721.73	1068670.44	206.06
2	747729.58	1068663.89	206.07
3	747737.14	1068657.34	206.07
4	747739.58	1068655.14	206.08
5	747745.10	1068649.94	206.05
6	747748.18	1068653.35	206.06
7	747742.53	1068658.43	206.17
8	747735.51	1068664.51	206.16
9	747726.46	1068672.26	206.15
10	747719.69	1068677.75	206.12
11	747716.45	1068674.69	206.03
12	747707.86	1068681.34	205.96
13	747710.56	1068684.99	206.06
14	747702.41	1068690.97	206.00
15	747699.76	1068687.31	205.91
16	747691.36	1068693.32	205.89
17	747692.67	1068697.82	205.97
18	747683.02	1068704.53	205.95
19	747680.46	1068700.86	205.87
20	747670.27	1068707.82	205.89
21	747672.66	1068711.60	205.95
22	747661.38	1068719.24	205.97
23	747658.97	1068715.58	205.91
24	747651.12	1068720.91	205.91
26	747644.53	1068730.54	205.97
27	747642.12	1068727.02	205.89
29	747638.13	1068734.66	205.96
30	747629.15	1068740.37	205.92
31	747622.93	1068744.30	205.91
32	747621.86	1068745.00	205.91
33	747616.79	1068748.23	205.88
34	747615.99	1068748.74	205.89
35	747613.46	1068750.39	205.87
36	747612.69	1068751.02	205.86
37	747612.00	1068751.70	205.81
38	747609.22	1068754.90	205.69
39	747608.71	1068755.47	205.68
40	747608.19	1068754.99	205.71
41	747595.93	1068761.11	205.81
42	747594.85	1068758.76	205.80
43	747594.67	1068758.40	205.80
44	747603.11	1068754.90	205.88
45	747602.95	1068754.57	205.88
47	747593.38	1068755.56	205.90
48	747600.80	1068751.90	205.92
49	747608.70	1068747.65	205.88
50	747617.19	1068742.95	205.84
51	747623.85	1068739.04	205.88
52	747631.77	1068733.87	205.87
53	747636.16	1068730.97	205.88

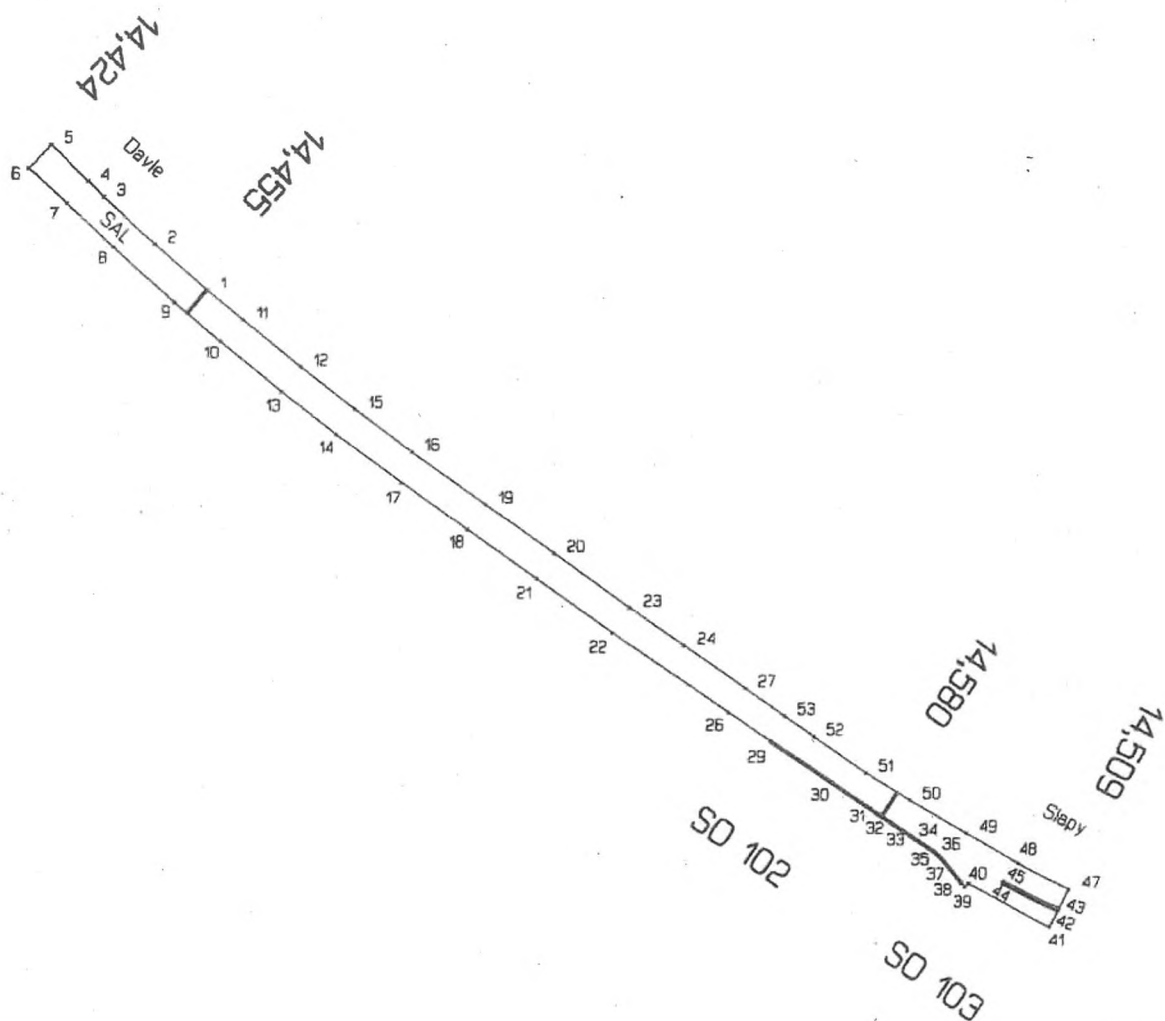

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				overil	
				datum	
				číslo ověření	
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa II SO 102, SO 103 Úsek C km 14,424 - 14,580 Úsek A 14,580 - 14,509					výkres číslo
				mřítko	1 : 1000
zameril	Ing. Stanislav Brlek	datum	11.-12.2022	souř. systém	S-JTSK
kresil	Ing. Stanislav Brlek	datum	8.12.2022	výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 66/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,298 – 11,780 – vpravo – plocha živice

ACL:	SO 102 - km 11,298 – 11,780	1916,4 m ²	tl. 60 mm
	SO 206 - km 11,363 – 11,377	63,0 m ²	tl. 60 mm ✓
SAL:	SO 102 – km 11,298 – 11,780	1957,4 m ²	tl. 30 mm
ACL - vyrovnávka:	km 11,298 – 11,780	2000,1 m ²	prům tl. 29 mm
ACP:	SO 206 – km 11,363 – 11,377	63,0 m ²	tl. 50 mm ✓

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	12.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	20.12.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	20.12.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Km 11,298 – 11,780 – vpravo – plocha AB vrstev vozovky

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
1	748223.88	1065737.60	204.20	
2	748221.56	1065751.75	204.21	
3	748217.17	1065751.02	204.30	
4	748222.38	1065718.73	204.29	
5	748226.60	1065719.29	204.21	
6	748229.37	1065700.59	204.27	
7	748225.13	1065699.97	204.36	
8	748226.22	1065691.81	204.30	
9	748225.79	1065691.57	204.28	
10	748226.84	1065685.46	204.26	
11	748227.19	1065685.31	204.25	
12	748233.31	1065675.95	204.14	
13	748229.06	1065675.13	204.21	
14	748232.31	1065656.56	204.17	
15	748236.38	1065657.13	204.09	
16	748239.95	1065637.80	204.03	
17	748235.72	1065636.98	204.11	
18	748239.18	1065618.00	204.14	
19	748239.36	1065617.07	204.18	
20	748243.55	1065618.78	204.05	
21	748243.72	1065617.89	204.08	
22	748231.91	1065684.10	204.13	
24	748231.59	1065686.55	204.40	
25	748230.66	1065692.49	204.43	
26	748230.29	1065694.92	204.32	
55	748219.71	1065736.75	204.28	
56	748214.58	1065769.25	204.31	
57	748218.70	1065770.12	204.26	
58	748215.72	1065789.51	204.29	
59	748211.55	1065789.01	204.37	
60	748208.47	1065808.26	204.40	
61	748212.62	1065809.09	204.30	
62	748209.72	1065827.94	204.29	
63	748205.55	1065827.22	204.40	
64	748207.92	1065839.52	204.28	
65	748203.72	1065839.25	204.41	
66	748200.74	1065857.98	204.41	
67	748205.00	1065858.67	204.31	
68	748201.91	1065878.04	204.31	
69	748197.76	1065877.43	204.39	
70	748183.22	1066002.52	204.14	STERBINA
71	748182.86	1066002.47	204.15	STERBINA
73	748178.97	1066002.48	204.15	
74	748177.23	1066014.60	204.10	
75	748181.13	1066015.16	204.12	STERBINA
76	748181.50	1066015.20	204.12	STERBINA
77	748178.76	1066035.19	204.07	STERBINA
78	748178.40	1066035.15	204.07	STERBINA
80	748174.64	1066033.98	204.06	
81	748172.23	1066051.94	204.03	
82	748176.05	1066052.57	203.96	
83	748173.70	1066071.14	203.91	
84	748169.77	1066070.71	204.01	
85	748167.59	1066087.63	204.00	
86	748166.79	1066093.50	204.04	
87	748166.69	1066094.28	204.09	
88	748170.61	1066093.98	203.96	
89	748170.41	1066094.79	203.99	
90	748178.21	1066037.01	203.94	BUS
91	748178.94	1066035.97	204.00	BUS
92	748179.73	1066033.41	204.04	BUS
93	748181.92	1066028.91	204.15	BUS
94	748183.70	1066016.14	204.15	BUS
95	748183.74	1066013.16	204.12	BUS
96	748183.99	1066009.14	204.12	BUS

97	748184.54	1066004.37	204.13	BUS
98	748184.37	1066001.91	204.09	BUS
99	748183.80	1066001.76	204.10	BUS
101	748187.08	1065975.63	204.12	
102	748182.83	1065975.19	204.22	
103	748185.66	1065955.32	204.30	
104	748190.09	1065955.96	204.19	
105	748192.31	1065940.65	204.21	
106	748187.99	1065940.19	204.32	
107	748190.83	1065922.06	204.33	
108	748194.97	1065922.45	204.25	
109	748198.42	1065900.96	204.29	
110	748194.18	1065900.54	204.38	
111	748196.96	1065882.39	204.37	
112	748201.26	1065882.98	204.31	





11,780

11,723

11,686

SO 206

11,298

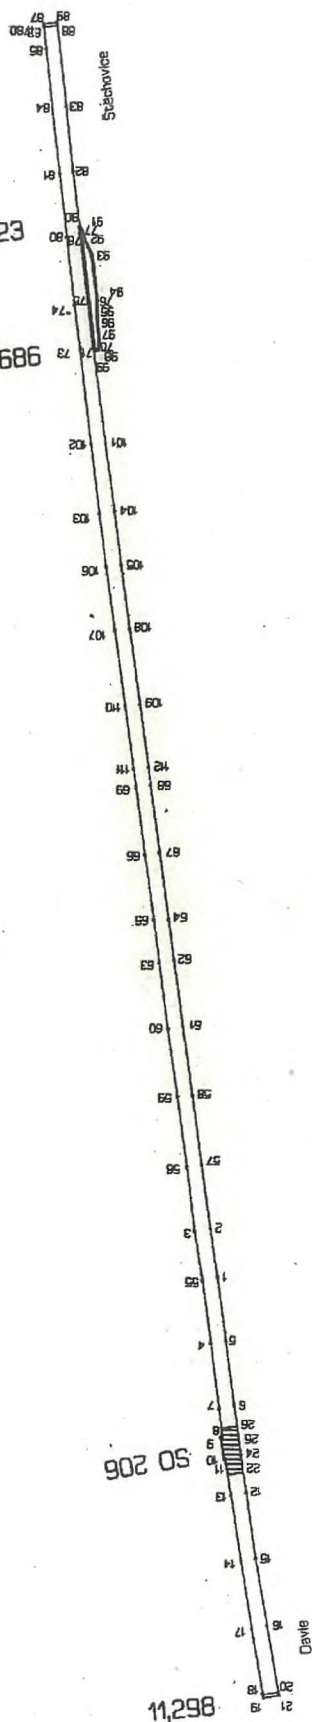

STRABAG a.s. Kačířkova 982/41, Praha 5		číslo zakázky		Ing. S. Blah		výkres číslo	
		ověřil		datum			
		číslo ověřen		20.12.2022			
akce		1/102 H. H. Másta Praha - Stáňovice, rekonstrukce, etapa I SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stáňovice Úsek B, km 11,298 - 11,780 - AB vrstvy vozovky					
záměr	Ing. Stanislav Blah	datum		12.2022		bez	
kresla	Ing. Stanislav Blah	datum		20.12.2022		sov. systém S-JTSK výř. systém Bv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 10/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 11,771 – 12,436 – vlevo

ŠD	-	1527,0 m ²	tl. 250 mm
SC	-	1463,1 m ²	tl. 150 mm
SAL	-	2982,7 m ²	tl. 30 mm
ACL	-	2964,4 m ²	tl. 60 mm
ACO	-	2922,9 m ²	tl. 40 mm

Plocha geomříží - 390,8 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	3.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	21.3.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	21.3.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Plochy konstrukčních vrstev vozovky v km 11,771 – 12,436 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
1	748154.95	1066152.42	204.03
2	748157.43	1066132.73	204.01
3	748159.92	1066113.42	204.00
4	748162.38	1066093.44	204.01
5	748163.53	1066084.11	203.99
6	748167.91	1066084.66	204.09
7	748166.85	1066094.05	204.11
8	748164.26	1066113.77	204.11
9	748161.72	1066133.64	204.12
10	748135.05	1066311.60	203.76
11	748156.70	1066173.25	204.16
12	748152.41	1066172.86	204.06
13	748149.87	1066192.85	204.10
14	748154.20	1066193.19	204.20
15	748151.71	1066213.07	204.24
16	748147.94	1066212.52	204.12
17	748146.63	1066217.35	204.13
18	748145.65	1066222.48	204.13
19	748143.96	1066236.23	204.14
20	748143.98	1066238.39	204.15
21	748143.59	1066242.46	204.15
23	748137.61	1066291.47	204.13
24	748140.07	1066271.36	204.13
25	748142.47	1066252.00	204.15
26	748149.23	1066232.86	204.23
27	748146.79	1066252.73	204.24
28	748144.34	1066272.58	204.24
29	748141.86	1066292.36	204.24
30	748139.39	1066312.22	204.27
31	748136.95	1066332.12	204.32
32	748132.65	1066331.78	204.22
33	748130.14	1066351.85	204.24
34	748134.44	1066352.15	204.35
35	748132.07	1066371.81	204.36
36	748127.75	1066371.27	204.25
37	748125.26	1066391.34	204.26
38	748129.57	1066391.70	204.37
40	748127.10	1066411.66	204.38
41	748122.75	1066411.11	204.28
42	748120.30	1066431.01	204.31
43	748124.65	1066431.40	204.41
44	748122.15	1066451.34	204.44
45	748117.86	1066450.80	204.34
46	748115.38	1066470.74	204.37
47	748119.74	1066471.27	204.48
48	748114.85	1066510.71	204.47
49	748117.30	1066490.86	204.47
52	748112.87	1066490.67	204.36
53	748110.46	1066510.46	204.37
54	748107.98	1066530.42	204.38
56	748112.41	1066530.60	204.47
57	748109.93	1066550.46	204.49
58	748105.60	1066550.03	204.38
59	748103.15	1066569.84	204.39
60	748107.47	1066570.32	204.49
61	748104.98	1066590.18	204.49
62	748100.63	1066589.65	204.38
63	748098.14	1066609.72	204.38
64	748102.50	1066609.98	204.48
65	748100.09	1066629.76	204.49
66	748095.76	1066629.20	204.39
67	748093.27	1066649.31	204.39

68	748097.66	1066649.66	204.49	
69	748090.74	1066669.26	204.38	
70	748095.20	1066669.55	204.49	
71	748092.74	1066689.47	204.49	
72	748088.37	1066688.76	204.39	
73	748090.24	1066709.16	204.50	
75	748085.71	1066708.56	204.27	
76	748083.23	1066729.92	204.41	
77	748081.40	1066744.65	204.42	
78	748082.42	1066744.81	204.45	
101	748101.38	1066616.91	204.31	GEOMRIZ
102	748101.28	1066620.62	204.35	GEOMRIZ
103	748098.28	1066644.97	204.35	GEOMRIZ
104	748098.13	1066645.86	204.35	GEOMRIZ
105	748095.96	1066663.42	204.36	GEOMRIZ
106	748091.52	1066678.34	204.29	GEOMRIZ
107	748090.08	1066706.47	204.36	GEOMRIZ
108	748087.94	1066724.23	204.37	GEOMRIZ
109	748103.50	1066602.72	204.35	GEOMRIZ
110	748103.86	1066599.57	204.35	GEOMRIZ
111	748105.06	1066589.62	204.34	GEOMRIZ
112	748106.19	1066580.51	204.34	GEOMRIZ
113	748107.20	1066572.42	204.35	GEOMRIZ
114	748110.10	1066549.60	204.34	GEOMRIZ
115	748111.88	1066535.41	204.35	GEOMRIZ
116	748113.37	1066522.51	204.34	GEOMRIZ
117	748116.43	1066497.89	204.35	GEOMRIZ
118	748119.31	1066474.47	204.33	GEOMRIZ
120	748132.18	1066370.79	204.22	GEOMRIZ
121	748129.75	1066390.24	204.24	GEOMRIZ
122	748126.73	1066413.95	204.25	GEOMRIZ
123	748125.38	1066425.24	204.28	GEOMRIZ
124	748123.48	1066439.86	204.29	GEOMRIZ
125	748123.20	1066442.47	204.30	GEOMRIZ
126	748122.73	1066446.40	204.30	GEOMRIZ
127	748121.66	1066455.55	204.32	GEOMRIZ
128	748134.44	1066350.52	204.36	GEOMRIZ
129	748136.09	1066338.51	204.19	GEOMRIZ
130	748137.97	1066322.49	204.14	GEOMRIZ
131	748140.15	1066304.82	204.12	GEOMRIZ
132	748140.93	1066299.20	204.10	GEOMRIZ
133	748144.09	1066273.87	204.11	GEOMRIZ
134	748145.57	1066261.77	204.12	GEOMRIZ
135	748147.29	1066248.35	204.10	GEOMRIZ
136	748148.06	1066241.65	204.10	GEOMRIZ
137	748149.18	1066232.94	204.10	GEOMRIZ
138	748149.48	1066230.45	204.09	GEOMRIZ
139	748156.86	1066171.75	204.02	GEOMRIZ
140	748159.05	1066153.05	203.99	GEOMRIZ
141	748159.97	1066147.56	203.99	GEOMRIZ
142	748160.75	1066141.47	203.99	GEOMRIZ
143	748163.54	1066120.03	203.98	GEOMRIZ
144	748164.96	1066108.71	203.98	GEOMRIZ
145	748165.39	1066105.45	203.98	GEOMRIZ
146	748166.87	1066094.29	203.94	GEOMRIZ

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 22/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 10,833 – 11,299 – vlevo – konstrukční vrstvy

ŠD	km 10,833 – 10,881 -	231,5 m ²	tl. 220 mm
	km 11,060 – 11,182 -	590,3 m ²	tl. 220 mm
SC	km 10,833 – 10,881 -	229,6 m ²	tl. 150 mm
	km 11,060 – 11,182 -	577,5 m ²	tl. 150 mm
SAL	km 10,881 – 11,060 -	827,4 m ²	tl. 30 mm
	km 11,182 – 11,299 -	467,8 m ²	tl. 30 mm
ACP	km 10,833 – 10,881 -	225,5 m ²	tl. 50 mm
	km 11,060 – 11,182 -	561,1 m ²	tl. 50 mm
	km 11,190 – 11,299 -	410,8 m ²	tl. 51,2 mm
ACL	km 10,833 – 11,299 -	2064,0 m ²	tl. 60 mm
ACO	km 10,833 – 11,299 -	2016,3 m ²	tl. 40 mm

Geomříže 388,8 m²
Zámková dlažba 32,2 m²
Štěrbínový žlab 30 m
Osazení svodidel:
km – 10,840 – 11,300 - 436 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 5.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 18.5.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 18.5.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

- VÝPOČET

II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Nová vozovka v km 10,833 – 11,299 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška	
1	748309.02	1065241.83	203.35	GEOMŘÍŽ
2	748308.56	1065237.28	203.33	GEOMŘÍŽ
3	748307.91	1065232.05	203.30	GEOMŘÍŽ
4	748306.55	1065222.21	203.28	GEOMŘÍŽ
5	748305.01	1065212.24	203.25	GEOMŘÍŽ
6	748302.81	1065200.46	203.20	ŽIVICE
7	748299.68	1065187.13	203.15	ŽIVICE
8	748296.83	1065175.67	203.11	ŽIVICE
9	748293.16	1065162.16	203.06	ŽIVICE
10	748288.86	1065163.32	202.93	ŽIVICE
11	748289.44	1065167.80	202.90	SVODIDLO
12	748292.30	1065178.77	202.93	SVODIDLO
13	748292.80	1065178.72	202.99	ŽIVICE
14	748295.95	1065191.50	203.01	ŽIVICE
15	748295.43	1065191.60	202.97	SVODIDLO
16	748297.93	1065202.30	203.00	SVODIDLO
17	748298.41	1065202.27	203.05	ŽIVICE
18	748299.47	1065209.71	203.01	SVODIDLO
19	748299.93	1065209.71	203.08	GEOMŘÍŽ
20	748302.23	1065209.10	203.16	GEOMŘÍŽ
21	748300.54	1065212.98	203.10	GEOMŘÍŽ
22	748300.92	1065214.85	203.10	GEOMŘÍŽ
23	748302.88	1065213.70	203.17	GEOMŘÍŽ
24	748302.26	1065222.76	203.13	GEOMŘÍŽ
25	748302.54	1065224.65	203.13	GEOMŘÍŽ
26	748304.65	1065224.00	203.20	GEOMŘÍŽ
27	748302.46	1065227.20	203.06	SVODIDLO
28	748303.89	1065240.29	203.13	SVODIDLO
29	748303.53	1065232.25	203.16	GEOMŘÍŽ
30	748303.76	1065234.34	203.17	GEOMŘÍŽ
31	748305.89	1065233.72	203.23	GEOMŘÍŽ
32	748304.10	1065237.44	203.19	GEOMŘÍŽ
33	748304.35	1065239.48	203.19	GEOMŘÍŽ
34	748306.46	1065238.88	203.26	GEOMŘÍŽ
35	748304.59	1065242.21	203.21	GEOMŘÍŽ
36	748304.74	1065244.16	203.22	GEOMŘÍŽ
37	748306.83	1065243.52	203.28	GEOMŘÍŽ
38	748305.29	1065252.23	203.24	GEOMŘÍŽ
39	748305.37	1065253.71	203.24	GEOMŘÍŽ
40	748305.53	1065256.97	203.25	GEOMŘÍŽ
41	748307.76	1065256.79	203.32	GEOMŘÍŽ
42	748305.01	1065256.12	203.19	SVODIDLO
43	748305.31	1065266.68	203.26	SVODIDLO
44	748305.71	1065262.07	203.27	GEOMŘÍŽ
45	748305.85	1065271.82	203.31	GEOMŘÍŽ
46	748305.63	1065281.78	203.33	GEOMŘÍŽ
47	748305.05	1065284.21	203.28	SVODIDLO
48	748304.29	1065296.37	203.30	SVODIDLO
49	748305.09	1065291.74	203.36	GEOMŘÍŽ
50	748304.28	1065301.65	203.40	GEOMŘÍŽ
51	748304.10	1065303.58	203.40	GEOMŘÍŽ
52	748303.18	1065311.24	203.42	GEOMŘÍŽ
53	748301.79	1065320.96	203.46	GEOMŘÍŽ
54	748301.48	1065322.94	203.47	GEOMŘÍŽ
55	748300.97	1065322.89	203.42	SVODIDLO
56	748300.09	1065330.68	203.50	GEOMŘÍŽ
57	748298.07	1065340.42	203.52	GEOMŘÍŽ
58	748297.30	1065341.72	203.51	SVODIDLO
59	748295.63	1065348.55	203.51	SVODIDLO
60	748293.68	1065355.32	203.51	SVODIDLO
61	748297.07	1065344.98	203.53	GEOMŘÍŽ

62	748293.63	1065359.85	203.59	GEOMŘÍŽ
63	748293.20	1065361.71	203.60	GEOMŘÍŽ
64	748295.89	1065370.21	203.75	GEOMŘÍŽ
65	748298.07	1065360.88	203.72	GEOMŘÍŽ
66	748300.37	1065350.85	203.69	GEOMŘÍŽ
67	748301.47	1065345.86	203.67	GEOMŘÍŽ
68	748302.45	1065341.42	203.66	GEOMŘÍŽ
69	748304.45	1065331.68	203.64	GEOMŘÍŽ
70	748306.24	1065321.66	203.61	GEOMŘÍŽ
71	748307.65	1065311.84	203.57	GEOMŘÍŽ
72	748308.80	1065302.00	203.55	GEOMŘÍŽ
73	748309.63	1065291.94	203.51	GEOMŘÍŽ
74	748310.16	1065281.93	203.48	GEOMŘÍŽ
75	748310.33	1065272.02	203.45	GEOMŘÍŽ
76	748310.12	1065261.98	203.42	GEOMŘÍŽ
77	748309.78	1065253.45	203.39	GEOMŘÍŽ
78	748309.70	1065251.94	203.39	GEOMŘÍŽ
79	748274.19	1065463.34	203.89	ŽIVICE
80	748278.73	1065443.98	203.87	ŽIVICE
81	748283.28	1065424.41	203.85	ŽIVICE11100
82	748287.77	1065404.96	203.80	ŽIVICE
83	748292.24	1065385.64	203.77	ŽIVICE
84	748290.99	1065371.15	203.63	GEOMŘÍŽ
85	748289.18	1065378.99	203.65	GEOMŘÍŽ
86	748288.77	1065380.99	203.65	GEOMŘÍŽ
87	748292.10	1065359.67	203.53	SVODIDLO
88	748289.51	1065366.71	203.52	SVODIDLO
89	748287.24	1065372.54	203.49	SVODIDLO
90	748285.62	1065376.26	203.29	SVODIDLO
91	748284.01	1065380.11	202.87	SVODIDLOK
92	748288.35	1065380.37	203.56	SVODIDLOK
93	748287.34	1065384.47	203.55	SVODIDLOK
94	748288.02	1065384.06	203.66	ŽIVICE
95	748283.35	1065403.82	203.68	ŽIVICE
96	748282.76	1065403.78	203.63	SVODIDLO
97	748278.29	1065423.31	203.66	SVODIDLO
98	748278.82	1065423.55	203.72	ŽIVICE
99	748274.22	1065443.09	203.75	ŽIVICE
100	748273.63	1065443.25	203.69	SVODIDLO
101	748269.17	1065462.22	203.69	SVODIDLO
102	748269.74	1065462.26	203.76	ŽIVICE
103	748265.21	1065481.91	203.81	ŽIVICE
104	748264.67	1065481.84	203.75	SVODIDLO
105	748260.27	1065501.25	203.86	SVODIDLO
107	748259.74	1065505.86	203.92	GEOMŘÍŽ
108	748257.23	1065517.62	203.96	GEOMŘÍŽ
109	748256.57	1065517.90	203.90	SVODIDLO
110	748255.48	1065525.47	203.98	GEOMŘÍŽ
111	748253.28	1065535.11	203.99	GEOMŘÍŽ
112	748252.26	1065537.24	203.97	SVODIDLO
113	748248.92	1065554.85	204.04	GEOMŘÍŽ
114	748247.54	1065558.40	204.03	SVODIDLO
115	748246.77	1065564.68	204.05	GEOMŘÍŽ
116	748246.35	1065566.63	204.05	GEOMŘÍŽ
117	748244.71	1065576.66	204.06	GEOMŘÍŽ
118	748244.20	1065573.62	204.01	SVODIDLO
119	748243.47	1065576.77	204.14	SVODIDLOK
120	748243.26	1065573.85	204.23	OBRUBNIK
121	748244.29	1065574.03	204.21	OBRUBNIK
122	748244.55	1065574.20	204.21	OBRUBNIK
123	748244.61	1065574.57	204.20	OBRUBNIK
124	748244.62	1065574.57	204.06	ŠTERB. ŽLAB
125	748245.04	1065574.67	204.05	ŠTERB. ŽLAB
126	748243.80	1065578.45	204.23	OBRUBNIK
127	748243.70	1065578.40	204.23	OBRUBNIK
128	748242.32	1065578.12	204.27	OBRUBNIK
129	748242.21	1065588.08	204.10	GEOMŘÍŽ
130	748240.15	1065597.72	204.10	GEOMŘÍŽ
131	748239.18	1065600.21	204.26	OBRUBNIK
132	748239.07	1065600.20	204.26	OBRUBNIK
133	748237.61	1065599.92	204.29	OBRUBNIK
134	748236.70	1065604.26	204.29	OBRUBNIK

135	748237.74	1065604.49	204.27	OBRUBNIK
136	748238.09	1065604.43	204.28	OBRUBNIK
137	748238.30	1065604.17	204.27	OBRUBNIK
138	748238.33	1065604.16	204.12	ŠTERB. ŽLAB
139	748238.72	1065604.22	204.12	ŠTERB. ŽLAB
140	748238.34	1065601.35	204.21	SVODIDLOK
141	748237.42	1065605.11	204.10	SVODIDLO
142	748238.02	1065605.73	204.12	GEOMRIŽ
143	748235.75	1065615.62	204.12	GEOMRIŽ
144	748235.29	1065617.59	204.12	GEOMRIŽ
145	748239.22	1065618.26	204.18	GEOMRIŽ
146	748239.55	1065616.46	204.19	GEOMRIŽ
147	748234.79	1065617.46	204.08	SVODIDLO
148	748236.20	1065613.58	204.11	ŽIVICE
149	748240.02	1065614.22	204.19	ŽIVICE
150	748241.60	1065606.42	204.20	GEOMRIŽ
151	748243.65	1065596.50	204.17	GEOMRIŽ
152	748245.74	1065586.77	204.17	GEOMRIŽ
153	748247.87	1065577.16	204.15	GEOMRIŽ
154	748250.55	1065565.31	204.15	GEOMRIŽ
155	748252.76	1065555.63	204.14	GEOMRIŽ
156	748255.03	1065545.69	204.11	GEOMRIŽ
157	748257.25	1065536.00	204.10	GEOMRIŽ
158	748259.57	1065526.26	204.08	GEOMRIŽ
159	748261.83	1065516.59	204.06	GEOMRIŽ
160	748264.03	1065506.90	204.03	GEOMRIŽ
161	748265.34	1065501.57	204.02	GEOMRIŽ
162	748260.93	1065500.59	203.90	GEOMRIŽ
164	748269.65	1065482.90	203.94	ŽIVICE
165	748305.34	1065214.21	0.00	GEOMRIŽ
166	748306.89	1065224.18	0.00	GEOMRIŽ
167	748308.15	1065234.04	0.00	GEOMRIŽ
168	748308.75	1065239.25	0.00	GEOMRIŽ
169	748309.15	1065243.84	0.00	GEOMRIŽ
170	748310.13	1065263.99	0.00	GEOMRIŽ
171	748305.78	1065264.07	0.00	GEOMRIŽ
172	748305.83	1065273.83	0.00	GEOMRIŽ
173	748310.29	1065274.01	0.00	GEOMRIŽ
174	748310.06	1065283.92	0.00	GEOMRIŽ
175	748305.55	1065283.78	0.00	GEOMRIŽ
176	748304.95	1065293.73	0.00	GEOMRIŽ
177	748309.48	1065293.95	0.00	GEOMRIŽ
178	748308.58	1065303.97	0.00	GEOMRIŽ
179	748307.32	1065313.84	0.00	GEOMRIŽ
180	748302.92	1065313.22	0.00	GEOMRIŽ
181	748305.88	1065323.64	0.00	GEOMRIŽ
182	748304.02	1065333.65	0.00	GEOMRIŽ
183	748299.71	1065332.64	0.00	GEOMRIŽ
184	748301.98	1065343.36	0.00	GEOMRIŽ
185	748297.62	1065342.39	0.00	GEOMRIŽ
186	748296.62	1065346.93	0.00	GEOMRIŽ
187	748301.00	1065347.81	0.00	GEOMRIŽ
188	748295.98	1065349.86	0.00	GEOMRIŽ
189	748295.52	1065351.80	0.00	GEOMRIŽ
190	748299.89	1065352.81	0.00	GEOMRIŽ
191	748297.59	1065362.76	0.00	GEOMRIŽ
192	748291.43	1065369.18	0.00	GEOMRIŽ
193	748295.42	1065372.16	0.00	GEOMRIŽ
194	748293.55	1065380.02	0.00	GEOMRIŽ
195	748293.07	1065382.02	0.00	GEOMRIŽ
196	748260.48	1065502.54	0.00	GEOMRIŽ
197	748264.85	1065503.52	0.00	GEOMRIŽ
198	748259.34	1065507.83	0.00	GEOMRIŽ
199	748263.58	1065508.85	0.00	GEOMRIŽ
200	748261.37	1065518.54	0.00	GEOMRIŽ
201	748255.09	1065527.36	0.00	GEOMRIŽ
202	748259.09	1065528.21	0.00	GEOMRIŽ
203	748252.87	1065537.08	0.00	GEOMRIŽ
204	748256.78	1065537.95	0.00	GEOMRIŽ
205	748251.12	1065544.83	0.00	GEOMRIŽ
206	748250.68	1065546.71	0.00	GEOMRIŽ
207	748254.56	1065547.59	0.00	GEOMRIŽ

208	748248.45	1065556.79	0.00	GEOMŘÍŽ
209	748252.28	1065557.59	0.00	GEOMŘÍŽ
210	748250.10	1065567.27	0.00	
211	748244.28	1065578.61	0.00	
212	748247.43	1065579.12	0.00	
213	748242.64	1065586.08	0.00	
214	748245.31	1065588.72	0.00	
215	748240.50	1065595.84	0.00	
216	748243.22	1065598.46	0.00	
217	748237.53	1065607.65	0.00	
218	748241.18	1065608.40	0.00	
219	748257.66	1065515.69	0.00	



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 23/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 13,694 – 14,114 – vpravo – konstrukční vrstvy

SAL	-	1859,9 m ²	tl.	30 mm
ACL	-	1837,3 m ²	tl.	60 mm
ACO	-	1799,8 m ²	tl.	40 mm

Vyrovňávka:
km – 13,788 – 13,934 - 299,4 m² tl. 40,7 mm

Geomříže: 124,3 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	5.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	24.5.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	24.5.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických čísel
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 20



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C, km 13,694 – 14,114 – vpravo - konstrukční vrstvy

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
1	748007.07	1068106.58	205.82	
2	748008.21	1068100.47	205.81	GEOMŘÍŽ
3	748008.61	1068098.36	205.81	GEOMŘÍŽ
4	748010.49	1068088.05	205.82	
6	748016.84	1068049.66	205.78	GEOMŘÍŽ
7	748017.09	1068047.75	205.77	GEOMŘÍŽ
8	748019.04	1068033.09	205.77	
9	748019.18	1068031.91	205.76	GEOMŘÍŽ
10	748019.49	1068029.93	205.77	GEOMŘÍŽ
11	748020.75	1068019.13	205.75	
12	748022.27	1068005.43	205.71	
13	748023.17	1067997.32	205.69	
14	748023.49	1067995.91	205.69	
15	748027.60	1067996.19	205.80	
16	748027.03	1068002.50	205.85	
17	748026.54	1068008.10	205.83	
18	748025.26	1068021.32	205.88	
19	748024.15	1068030.37	205.89	GEOMŘÍŽ
20	748023.88	1068032.31	205.89	GEOMŘÍŽ
22	748021.54	1068048.34	205.87	GEOMŘÍŽ
23	748021.27	1068050.21	205.88	GEOMŘÍŽ
24	748019.31	1068062.41	205.90	
25	748018.33	1068068.42	205.90	GEOMŘÍŽ
26	748017.97	1068070.34	205.90	GEOMŘÍŽ
27	748013.71	1068069.65	205.79	GEOMŘÍŽ
28	748014.01	1068067.74	205.79	GEOMŘÍŽ
29	748015.19	1068085.88	205.91	
30	748012.73	1068099.14	205.91	GEOMŘÍŽ
31	748012.29	1068101.01	205.91	GEOMŘÍŽ
32	748007.53	1068125.14	205.91	GEOMŘÍŽ
33	748007.16	1068127.06	205.91	GEOMŘÍŽ
34	748004.12	1068142.48	205.92	
35	748002.21	1068152.60	205.92	GEOMŘÍŽ
36	748001.85	1068154.51	205.93	GEOMŘÍŽ
37	747999.03	1068169.35	205.94	GEOMŘÍŽ
38	747998.61	1068171.27	205.95	GEOMŘÍŽ
39	747995.52	1068186.85	205.96	
44	747992.50	1068201.95	205.95	GEOMŘÍŽ
46	747992.18	1068203.88	205.95	GEOMŘÍŽ
47	747990.46	1068212.65	205.97	GEOMŘÍŽ
48	747990.11	1068214.55	205.97	GEOMŘÍŽ
49	747987.11	1068229.89	205.98	GEOMŘÍŽ
50	747986.65	1068232.04	205.98	GEOMŘÍŽ
51	747983.95	1068245.75	205.98	GEOMŘÍŽ
53	747983.59	1068247.67	205.98	GEOMŘÍŽ
54	747980.39	1068264.61	205.99	
55	747978.53	1068274.39	205.99	
56	747974.29	1068273.52	205.89	
57	747977.62	1068256.98	205.90	
58	747979.57	1068246.90	205.90	GEOMŘÍŽ
59	747979.92	1068245.16	205.90	GEOMŘÍŽ
60	747982.66	1068231.09	205.88	GEOMŘÍŽ
61	747983.08	1068229.11	205.89	GEOMŘÍŽ
62	747986.02	1068213.75	205.88	GEOMŘÍŽ
63	747986.41	1068211.84	205.87	GEOMŘÍŽ
64	747988.15	1068203.19	205.86	GEOMŘÍŽ
65	747988.54	1068201.18	205.85	GEOMŘÍŽ
66	747991.83	1068184.23	205.87	
67	747994.52	1068170.47	205.85	GEOMŘÍŽ
68	747994.94	1068168.56	205.85	GEOMŘÍŽ
69	747997.85	1068153.71	205.83	GEOMŘÍŽ
70	747998.22	1068151.71	205.84	GEOMŘÍŽ

71	748001.27	1068135.97	205.83	
72	748003.22	1068126.27	205.83	GEOMRIŽ
73	748003.59	1068124.38	205.83	GEOMRIŽ
74	747960.54	1068349.98	206.19	GEOMRIŽ
75	747961.14	1068348.26	206.06	GEOMRIŽ
76	747965.92	1068332.23	206.06	
77	747969.73	1068317.35	206.04	GEOMRIŽ
78	747970.16	1068315.48	206.04	GEOMRIŽ
79	747971.41	1068310.08	206.03	GEOMRIŽ
80	747971.87	1068308.14	206.04	GEOMRIŽ
81	747974.97	1068293.01	206.03	
82	747976.88	1068283.02	206.03	GEOMRIŽ
83	747977.25	1068281.11	206.02	GEOMRIŽ
84	747973.04	1068280.29	205.92	GEOMRIŽ
85	747972.73	1068282.21	205.93	GEOMRIŽ
86	747970.48	1068293.72	205.94	
87	747967.57	1068307.11	205.93	GEOMRIŽ
88	747967.20	1068308.97	205.93	GEOMRIŽ
89	747965.92	1068314.50	205.94	GEOMRIŽ
90	747965.51	1068316.25	205.94	GEOMRIŽ
91	747961.69	1068331.18	205.95	
92	747956.93	1068346.92	205.96	GEOMRIŽ
93	747956.38	1068348.76	205.96	GEOMRIŽ
94	747949.84	1068367.58	205.96	
95	747943.31	1068383.41	205.98	
96	747937.59	1068396.26	205.98	
97	747934.31	1068403.32	205.98	
98	747938.29	1068405.10	206.08	
99	747937.56	1068406.68	206.03	
100	747933.81	1068404.81	205.95	
101	747942.93	1068395.33	206.08	
102	747947.82	1068384.26	206.08	
103	747952.30	1068373.22	206.07	
104	747956.70	1068361.25	206.07	

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 25/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 10,833 – 11,295 – vpravo – konstrukční vrstvy

ŠD ✓	781,4 m ²	tl. 220 mm
SC ✓	764,2 m ²	tl. 150 mm
ACP ✓	746,5 m ²	tl. 50 mm
SAL ✓	1414,5 m ²	tl. 30 mm
ACL ✓	2155,0 m ²	tl. 60 mm
ACO ✓	2106,2 m ²	tl. 40 mm

Geomříže: 457,5 m² ✓

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	5.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	30.5.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	30.5.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

Úsek B


10,833 – 11,295 – vpravo – plocha konstrukčních vrstev

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
1	748273.75	1065483.75	203.92	
2	748269.10	1065503.65	203.90	
3	748265.06	1065502.39	204.01	
4	748260.77	1065520.98	204.06	
5	748264.87	1065522.58	203.95	
6	748260.40	1065541.78	203.97	
7	748260.36	1065543.39	203.96	
8	748260.53	1065550.49	203.97	
9	748260.03	1065556.52	203.99	
10	748259.69	1065558.08	204.02	OBR
11	748256.89	1065571.35	204.13	OBR
12	748251.17	1065579.95	204.03	ST
13	748251.54	1065580.05	204.03	ST
15	748247.51	1065578.72	204.15	
16	748250.93	1065563.61	204.14	
17	748254.96	1065563.29	204.02	ST
18	748255.32	1065563.36	204.01	ST
19	748259.59	1065544.95	203.99	ST
20	748259.23	1065544.87	203.99	ST
22	748255.14	1065544.90	204.10	
23	748260.40	1065543.50	203.97	GEO
24	748260.74	1065540.50	203.97	GEO
25	748261.33	1065538.13	203.96	GEO
26	748254.70	1065546.73	204.11	GEO
27	748253.40	1065552.51	204.12	GEO
28	748252.48	1065556.56	204.13	GEO
29	748250.26	1065566.33	204.14	GEO
30	748245.41	1065587.87	204.16	GEO
31	748244.51	1065592.03	204.16	GEO
32	748243.34	1065597.64	204.17	GEO
33	748239.91	1065614.27	204.19	
34	748263.49	1065528.56	203.96	GEO
35	748265.05	1065521.99	203.94	GEO
36	748265.80	1065518.45	203.94	GEO
37	748266.82	1065513.90	203.93	GEO
38	748267.94	1065508.92	203.91	GEO
39	748274.06	1065463.71	203.88	
40	748278.18	1065464.44	203.95	
41	748282.92	1065444.19	203.97	
42	748278.80	1065443.28	203.86	
43	748283.22	1065424.21	203.84	
44	748287.44	1065424.92	203.94	
45	748291.72	1065406.52	203.90	
46	748287.47	1065405.93	203.81	
47	748291.74	1065387.64	203.77	
48	748295.89	1065388.42	203.88	
49	748299.92	1065370.74	203.83	
50	748295.93	1065369.76	203.74	
51	748299.74	1065353.49	203.69	
52	748303.75	1065354.58	203.78	
53	748307.53	1065337.67	203.72	
54	748308.19	1065337.19	203.67	
55	748311.02	1065322.76	203.62	
56	748310.71	1065322.57	203.66	
57	748310.51	1065322.30	203.67	
58	748310.49	1065321.91	203.67	
59	748306.16	1065321.78	203.59	
60	748306.37	1065342.94	203.74	GEO
61	748305.41	1065347.32	203.76	GEO

62	748304.18	1065352.78	203.78	GEO
63	748310.82	1065319.27	203.66	GEO
64	748311.68	1065314.08	203.57	GEO
65	748309.61	1065313.80	203.60	GEO
66	748312.25	1065308.31	203.64	
67	748308.08	1065307.82	203.54	
68	748313.23	1065298.95	203.62	
70	748257.66	1065571.49	204.20	
71	748257.00	1065574.33	204.15	
72	748256.03	1065575.54	204.11	
74	748254.86	1065579.03	204.11	
75	748254.09	1065580.01	204.10	
76	748253.05	1065581.07	204.09	
77	748252.30	1065581.69	204.07	
78	748251.33	1065582.02	204.04	
79	748248.76	1065593.65	204.04	
82	748246.73	1065603.96	204.06	
84	748246.83	1065605.31	204.07	
85	748246.32	1065605.89	204.07	
86	748244.93	1065612.84	204.08	
87	748244.92	1065613.52	204.06	
88	748244.61	1065614.28	204.09	
89	748244.42	1065615.04	204.08	
91	748247.81	1065598.77	204.04	GEO
92	748249.79	1065588.84	204.04	GEO
98	748304.98	1065212.97	203.26	GEO
99	748309.26	1065212.35	203.39	GEO
100	748308.16	1065206.81	203.35	GEO
101	748306.19	1065207.20	203.30	GEO
102	748306.22	1065197.41	203.31	
103	748306.30	1065196.72	203.32	
104	748306.88	1065196.15	203.31	
105	748304.12	1065184.96	203.23	
106	748303.28	1065184.62	203.28	
107	748300.82	1065174.71	203.23	
108	748297.08	1065160.87	203.16	
109	748292.99	1065162.06	203.07	
110	748296.59	1065175.36	203.12	
111	748300.99	1065193.17	203.18	
112	748304.07	1065207.72	203.24	
113	748306.55	1065223.08	203.29	GEO
114	748310.85	1065222.42	203.41	GEO
115	748307.87	1065232.99	203.31	GEO
116	748312.29	1065232.59	203.44	GEO
117	748313.34	1065242.60	203.49	GEO
118	748308.93	1065242.87	203.36	GEO
119	748309.67	1065252.95	203.38	GEO
120	748314.03	1065252.92	203.52	GEO
121	748314.32	1065262.97	203.54	GEO
122	748310.19	1065262.99	203.41	GEO
125	748310.19	1065273.01	203.44	GEO
126	748314.42	1065273.11	203.56	GEO
127	748314.23	1065283.55	203.59	GEO
128	748310.01	1065282.94	203.48	GEO
129	748309.42	1065293.03	203.51	GEO
130	748313.60	1065293.08	203.62	GEO
131	748308.40	1065304.93	203.55	
132	748269.57	1065483.00	203.94	
151	748251.12	1065582.36	204.04	
152	748254.57	1065583.49	204.19	
153	748259.01	1065579.49	204.31	
154	748255.43	1065577.03	204.10	

11,295

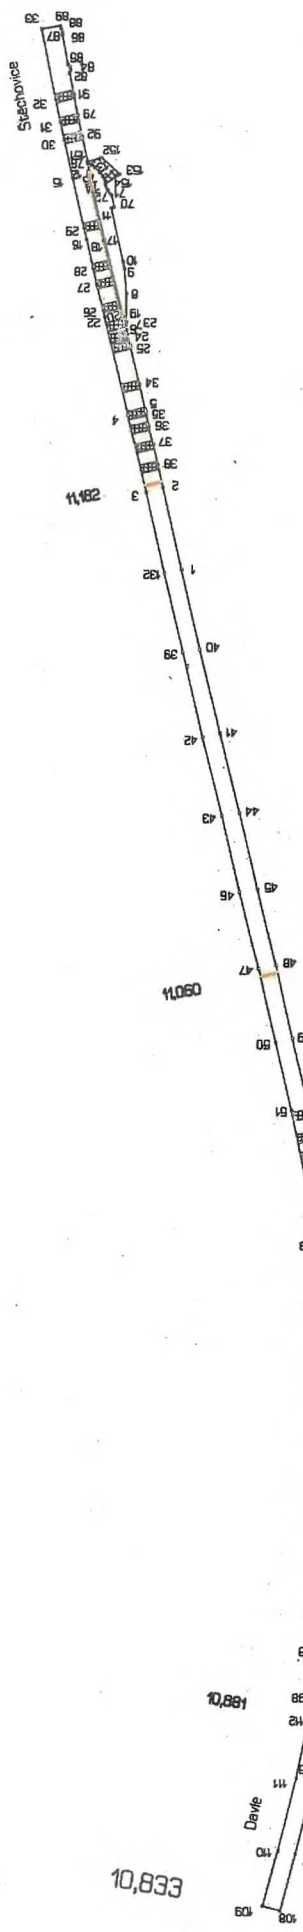

10,833

10,881

11,060

11,182

STRABAG a.s. Kadřkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky		Ing. S. Blšek	
				ověřil		datum	
				datum		30.5.2023	
				datum ověření		výkres číslo	
úsek	I/102 Hr. Hl. Města Prahy – Stachovice, rekonstrukce, etapa II						
	SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle – Stachovice						
	Úsek B, km 10,840 – 10,245 –						
záměr	Ing. Stanislav Blšek	datum	5.2023	metriky	bez		
kreslil	Ing. Stanislav Blšek	datum	30.5.2023	autor systém	S-JTSK	Bov	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 30/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 13,693 – 14,430 – konstrukční vrstvy

km 14,112 – 14,430 – pravá strana

SAL ✓	-	1482,0 m ²	tl.	30 mm
ACL ✓	-	1639,0 m ²	tl.	60 mm
Vyrovnávka		257,0 m ²	tl.	52 mm
ACO ✓	-	1622,0 m ²	tl.	40 mm

Geomříže: 146,3 m²

km 13,693 – 14,430 – levá strana

ACO ✓	-	3178,1 m ²	tl.	40 mm
-------	---	-----------------------	-----	-------

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil: 6.2023

Zpracoval: 23.6.2023

Ověřil: 23.6.2023

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



III/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

Úsek C, km 13,693 – 14,430 - konstrukční vrstvy



Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
1	747883.51	1068483.01	205.99	GEO
2	747892.20	1068471.48	205.97	
3	747900.44	1068460.23	205.96	
4	747906.10	1068451.90	205.97	GEO
5	747912.18	1068442.68	205.97	
6	747915.77	1068436.90	205.97	GEO
7	747921.06	1068428.11	205.96	
8	747927.53	1068416.69	205.97	
9	747934.51	1068403.08	205.96	
10	747938.58	1068404.83	206.07	
11	747932.32	1068417.25	206.06	
12	747924.87	1068430.65	206.06	
13	747919.62	1068439.39	206.06	
14	747915.73	1068445.92	206.06	
15	747909.73	1068455.09	206.06	
16	747904.54	1068462.52	206.08	OBR
17	747903.70	1068464.37	206.10	OBR
18	747901.53	1068470.50	206.15	OBR
19	747901.22	1068470.41	206.14	OBR
20	747894.80	1068479.46	206.16	OBR
21	747891.52	1068483.54	206.14	OBR
22	747887.27	1068486.26	206.09	OBR
23	747886.71	1068486.53	206.09	OBR
24	747876.47	1068499.45	206.09	OBR
26	747860.94	1068511.60	206.00	
27	747864.53	1068514.41	206.07	OBR
28	747853.50	1068520.90	206.00	
29	747842.29	1068534.85	206.01	
30	747844.34	1068541.43	206.00	DREN
31	747844.56	1068548.61	206.17	DREN
32	747834.77	1068556.38	206.13	OBR
33	747825.72	1068563.52	206.13	OBR
34	747825.13	1068564.29	206.11	OBR
35	747825.00	1068564.31	206.12	
37	747813.87	1068570.08	206.06	
38	747823.75	1068557.71	206.03	
39	747833.09	1068546.28	206.02	GEO
41	747855.42	1068518.49	206.01	GEO
42	747857.65	1068515.71	206.01	GEO
43	747872.39	1068497.16	205.99	GEO
45	747857.79	1068522.79	206.09	OBR
46	747856.52	1068524.31	206.09	OBR
47	747850.14	1068532.36	206.09	GEO
48	747844.73	1068539.09	206.09	OBR
49	747843.94	1068540.09	206.09	OBR
50	747843.77	1068540.96	206.08	OBR
51	747831.42	1068557.70	206.12	GEO
52	747828.77	1068561.10	206.13	GEO
53	747819.98	1068569.93	206.13	
54	747817.26	1068573.18	206.14	
55	747808.70	1068583.85	206.14	
56	747805.08	1068581.03	206.07	
57	747812.74	1068571.51	206.06	GEO
59	747799.55	1068595.21	206.16	GEO
60	747795.95	1068592.51	206.07	GEO
61	747784.09	1068606.77	206.08	
62	747787.59	1068609.96	206.17	
63	747776.82	1068615.36	206.09	GEO
64	747780.45	1068618.50	206.18	GEO
65	747765.70	1068628.03	206.09	GEO
66	747769.19	1068631.34	206.18	GEO
67	747760.04	1068634.25	206.09	GEO
68	747764.01	1068637.11	206.19	GEO
69	747750.49	1068644.27	206.11	
70	747744.22	1068650.70	206.09	GEO

71	747742.47	1068652.28	206.09	GEO
73	747744.05	1068657.00	206.19	
74	747755.60	1068645.94	206.20	
75	747762.44	1068638.79	206.19	
101	748010.37	1068089.08	205.80	
102	748006.21	1068088.25	205.70	
103	748009.32	1068070.06	205.69	
104	748013.61	1068070.48	205.78	
105	748016.56	1068051.85	205.77	
106	748012.36	1068050.97	205.68	
107	748014.91	1068032.11	205.68	
108	748019.16	1068032.34	205.76	
109	748021.44	1068013.48	205.73	
110	748023.55	1067995.80	205.69	
111	748019.11	1067995.46	205.58	
112	748018.69	1068000.22	205.60	
113	748018.44	1068002.57	205.63	
114	748018.11	1068005.09	205.63	
115	748017.71	1068007.57	205.65	
116	748017.17	1068011.83	205.66	
125	748006.81	1068108.17	205.81	ZED
126	748002.63	1068107.32	205.70	
127	747998.99	1068125.89	205.72	
128	748003.18	1068126.79	205.82	
129	747999.42	1068145.81	205.83	
130	747995.26	1068144.88	205.73	
131	747991.61	1068163.68	205.73	
132	747995.76	1068164.76	205.83	
133	747991.86	1068184.53	205.86	
134	747987.61	1068183.82	205.75	
135	747983.82	1068203.07	205.74	
136	747988.04	1068203.82	205.85	
137	747984.48	1068222.43	205.87	
138	747980.17	1068221.57	205.76	
139	747976.57	1068239.70	205.77	
140	747980.89	1068240.52	205.88	
141	747952.61	1068360.07	205.96	
142	747948.43	1068358.46	205.85	
143	747952.33	1068346.97	205.84	
144	747956.66	1068348.00	205.95	
145	747954.79	1068339.24	205.85	
146	747959.00	1068340.25	205.95	
147	747962.48	1068328.41	205.94	
148	747958.18	1068327.33	205.84	
149	747961.20	1068315.38	205.83	
150	747965.54	1068316.14	205.93	
151	747968.20	1068304.25	205.93	
152	747963.92	1068303.29	205.82	
154	747966.46	1068291.25	205.82	
155	747970.78	1068291.86	205.93	
156	747973.19	1068279.68	205.91	
157	747968.84	1068279.12	205.81	
158	747971.29	1068267.02	205.80	
159	747975.57	1068267.60	205.91	
160	747977.97	1068255.61	205.90	
161	747973.64	1068254.91	205.80	
163	747946.93	1068362.66	205.85	
164	747951.13	1068364.17	205.96	
165	747946.58	1068375.86	205.95	
166	747942.47	1068374.18	205.85	
167	747937.69	1068385.51	205.87	
168	747941.74	1068387.16	205.97	
169	747936.43	1068398.85	205.98	
170	747932.54	1068396.76	205.87	
171	747927.06	1068407.81	205.88	
174	747921.24	1068418.74	205.88	
175	747915.11	1068429.47	205.88	
178	747908.67	1068440.01	205.88	
179	747901.92	1068450.36	205.87	
182	747894.86	1068460.50	205.87	
183	747887.63	1068470.42	205.87	
210	747737.84	1068650.55	205.97	
211	747740.92	1068653.78	206.09	
213	747747.31	1068641.41	206.00	


214	747751.53	1068637.06	206.00	OBR
215	747755.09	1068633.30	205.94	OBR
216	747762.12	1068625.77	205.97	OBR
217	747762.06	1068625.72	205.97	OBR
218	747763.51	1068624.27	206.00	
219	747771.73	1068614.96	205.99	
220	747779.73	1068605.53	205.98	
221	747787.62	1068596.01	205.97	
222	747795.37	1068586.45	205.97	
223	747803.13	1068576.78	205.96	
224	747810.85	1068567.16	205.95	
225	747818.56	1068557.50	205.94	
226	747826.29	1068547.84	205.92	
227	747833.99	1068538.21	205.92	
228	747841.71	1068528.55	205.90	
229	747849.45	1068518.93	205.90	
230	747857.17	1068509.29	205.89	
231	747864.87	1068499.64	205.89	
232	747872.55	1068489.96	205.88	
233	747880.18	1068480.28	205.89	



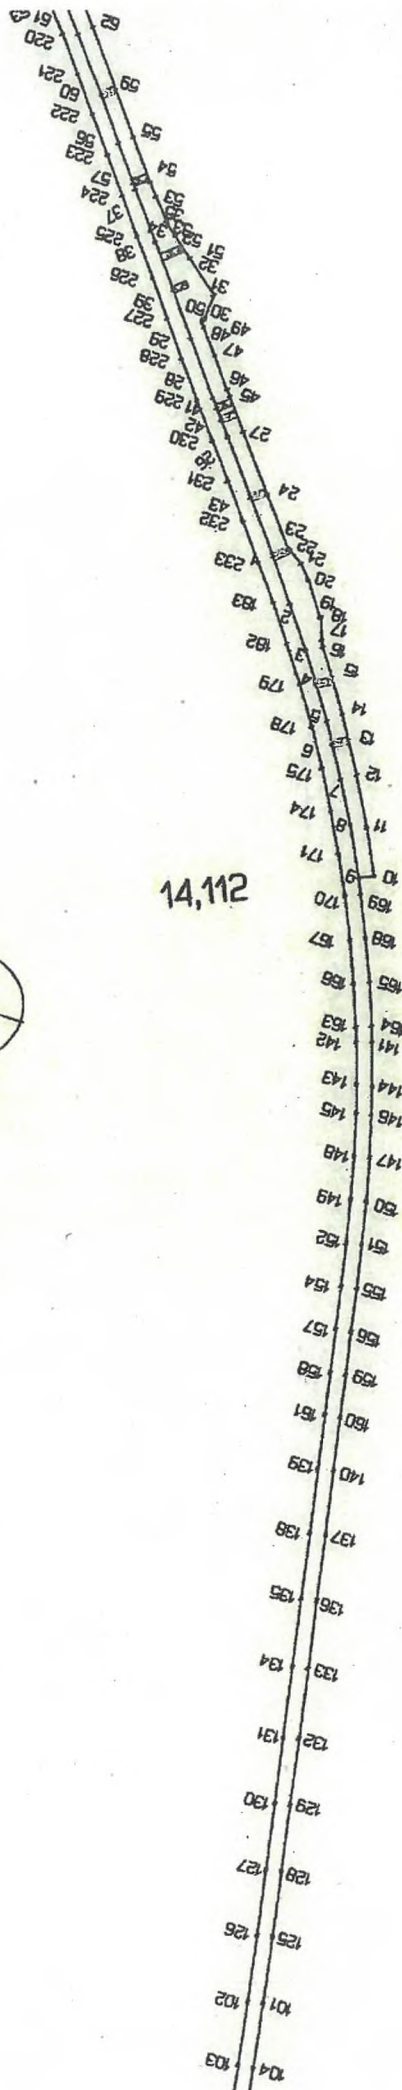


STRABAG a.s.		číslo zakázky
Kadřínkova 982/41, Praha 5		ověřil
		datum
		číslo ověření
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stachovice, rekonstrukce, etapa I		


SITUACE
M 1:100

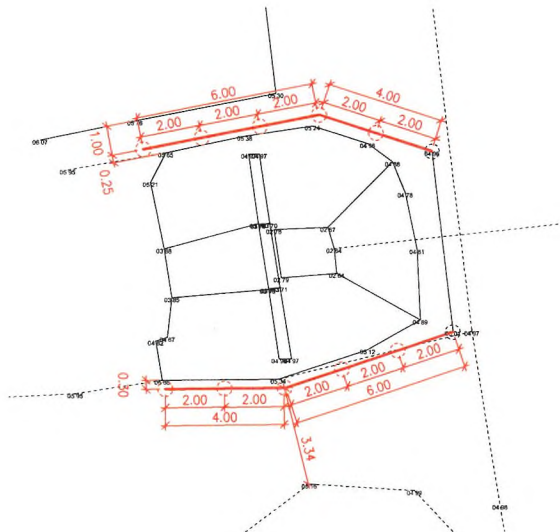


DETAIL - OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ - POHLED
M 1:50 (KÓTOVÁNO V MM)

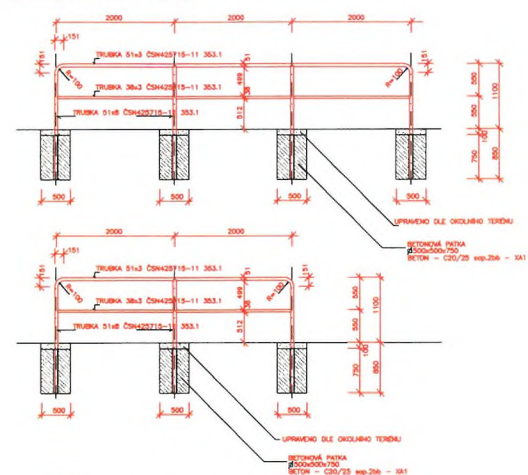


POZNÁMKA
• POUŽITÍ OCELOVÝCH TRUBKOVÝCH ZÁBRADLÍ
• OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
• OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
• OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ




PROPUSTEK DN 1000 V KM 12.925000

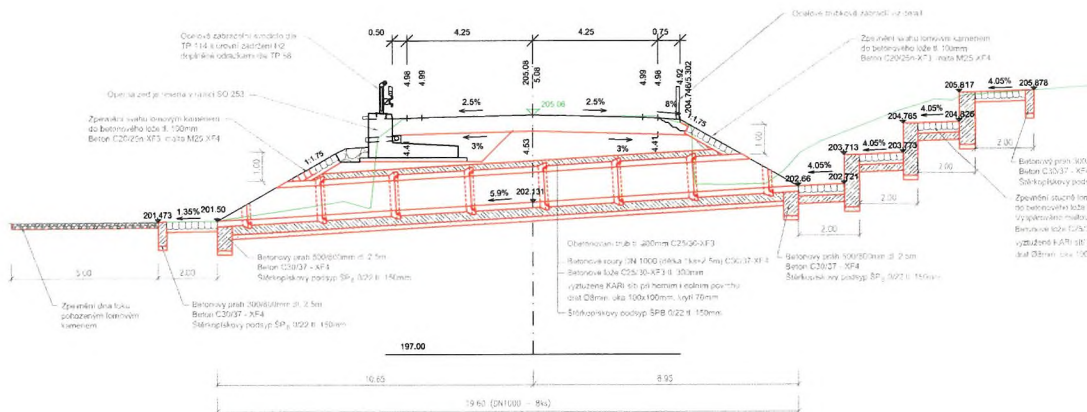

POHLED NA VTOK V KM 12.925000



ŘEZ PROPUSTKEM DN 1000 V KM 12.925000

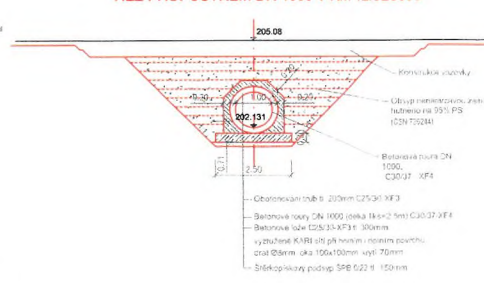

a	doplňené výkresy zobrazení se dvěma pol. (celk. šířky 4 m) + situace	13.05.22	Očíslo
b			
c			
d	změny text změny - odůvodnění	datum	podpis

IV/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II SO 102-B

OBJEDAVATEL STAVBY	Krajská správa a údržba silnic Středočeského újezdu, p.o. Zbraslav 11 192 21 Praha 5 IČ 00000001	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
PROJEKTANT	PRAGOPROJEKT, a.s. K Rybníku 168/16 147 00 Praha 4 - Braník IČ 0272387	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

PROJEKTANT	Pontex, spol. s r.o. Bělová 158/1 147 00 Praha 4 - Braník IČ 02723439	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
PROJEKTANT	STRABAG, a.s. Kaučková 95/4 158 00 Praha 5 IČ 00000001	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

PROJEKTANT	ateliernpromika Mladá 9/223 150 00 Praha 5 IČ 00000001	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Růžička Ing. Tomáš Růžička	SOUBĚRNÝ SYSTÉM S ÚST. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4372/2023/DDv
Datum: 21. 6. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 69 - SO 102, frézování, SAL

Byli jsme požádáni o vyjádření k výměrám položek řešících frézování stávající vozovky a pokládku vrstvy SAL při realizaci vozovky nové.

Frézování je v přípravné dokumnetaci řešeno pomocí následujících položek:

- frézování živičného krytu tl. 100 mm,
- frézování živičného krytu tl. 200 mm,
- frézování betonového krytu tl. 40 mm,
- frézování betonového krytu tl. 50 mm,
- frézování betonového krytu tl. 100 mm.

Typ a výměra položek vychází v návrhu rekonstrukce zpracovaného na základě diagnostického průzkumu vozovky. Diagnostický průzkum vozovky byl proveden v obvyklém rozsahu. Skládal se z vizuální prohlídky, bodových destruktivních sond, bodového měření únosnosti a georadarového měření. Dokumentace skutečného provedení konstrukcí vozovky se nedochovala. Jelikož podklady k zakrytým konstrukcím byly obecně pouze bodové, jsou výměry uvedené v přípravné dokumnetaci pouze odborným odhadem.

Během realizace stavby došlo ke zpřesnění technického řešení i rozsahu jednotlivých prací. Důvody byly především následující:

- potřeba úpravy výškového řešení komunikace na základě zpřesnění podkladů (zaměření) nebo změny stavu (změna navazujících ploch),
- zastižení jiné tloušťky vrstvy než bylo předpokládáno (jednak u asfaltobetonových vrstev, jednak u cementobetonových vrstev, jejichž ponechání předpokládalo min. zbytkovou tl. po úpravě sklonu),
- zastižení lokálních asfaltobetonových nálitků na cementobetonové vrstvě,
- zastižení výrazného poškození zakrytých vrstev (nevhodně sanované rýhy u inž. sítí, výrazná degradační poškození),
- zastižení jiné šířky zakrytých vrstev (jedná se především o cementobetonové vrstvy nedosahující k okraji vozovky).

Výše uvedné důvody vyvolaly potřebu nárůstu výměry příslušných položek.

S výše uvedenou problematikou úzce souvisí zpřesnění rozsahu použití vrstvy proti šíření trhlin SAL. Její rozsah byl upřesněn na základě skutečně zastižených poměrů.

Provedli jsme kontrolu rozsahu skutečně výměr a za AD nemáme připomínky.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. M
2. Objednatel, KSÚS, Ing. A
3. TDI, Pragoprojekt, a. s., I
4. Strabag, a. s., Karel Šimek
5. Strabag, a. s., Martin Lísá
6. Atelier PROMIKA, s. r. o.



KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4366/2023/DDv
Datum: 18. 6. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: 

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 67 - SO 102, zábradlí u propustku v km 12.925

Ve vyjádření č. 44 ze dne 22. 5. 2022 jsme sdělili stanovisko AD k zajištění okrajů vodoteče. Obecně nejsou okraje vodoteče předmětem řešené stavby a problematika jejich zajištění je věcí správce vodoteče.

Při realizaci propustku v km 12.925 bylo po odstranění náletové vegetace a nánosů a usazení nové konstrukce zjištěno, že tvar terénu v těsné blízkosti propustku vykazuje lokálně sklon strmější než 1:1 při hloubce přesahující 2 m.

S ohledem na blízkost nemovitostí požaduje AD v tomto případě doplnit k propustku silniční bezpečnostní zábradlí.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. M
2. Objednatel, KSÚS, Ing. A
3. TDI, Pragoprojekt, a. s.,
4. Strabag, a. s., Karel Šime
5. Strabag, a. s., Martin Lís
6. Atelier PROMIKA, s. r. o

SO 10U

Datum: 2.6.2013

Den týdne: Pá

disko: SHIBOLU Název akce: 11/10U HE. HL. II. PRATY, STŘEDNÍ, DISCONTINUOUS, E. STŘE
 20, R. 200 + 800, POZ. + 1200, 2000 + 1200
 200 - 1200

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

na a příjmení: POKRÝVÁČ JEDLIČKA, MIKUL DUVIS, PATEIK, LEHČEK, JAROSLAV
 ŠTÍPČEK, KARL FENC

LÍBBAŘE 91U, 11/10U HE. HL. II. PRATY, STŘEDNÍ, DISCONTINUOUS, E. STŘE
 20, R. 200 + 800, POZ. + 1200, 2000 + 1200

ACO 11 + PNB, OCELOVÉ SÁBRADLÍ

- áče:
- PROVÁZENÍ POKRÝVÁČ JEDLIČKA, MIKUL DUVIS, PATEIK, LEHČEK, JAROSLAV
 POKRÝVÁČ JEDLIČKA, MIKUL DUVIS, PATEIK, LEHČEK, JAROSLAV
 - PROVÁZENÍ POKRÝVÁČ JEDLIČKA, MIKUL DUVIS, PATEIK, LEHČEK, JAROSLAV
 POKRÝVÁČ JEDLIČKA, MIKUL DUVIS, PATEIK, LEHČEK, JAROSLAV
 - PROVÁZENÍ POKRÝVÁČ JEDLIČKA, MIKUL DUVIS, PATEIK, LEHČEK, JAROSLAV
 POKRÝVÁČ JEDLIČKA, MIKUL DUVIS, PATEIK, LEHČEK, JAROSLAV

tupce investora (TDI):



USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/259/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel. +420 724 370 591

e-mail

Datum: 2. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

**Ing. Milan PEŠKA
Technicko-provozní náměstek**

**Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 37 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice.

Zhotovitel stavby dne 11. 8. 2023 předložil a 22. 8. 2023 doplnil návrh ZBV č. 37 SO 102 (102/12) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Asfaltová vrstva SAL, zábradlí propustku km 12,925).

Návrh změny řeší skutečně provedenou plochu asfaltové vrstvy proti šíření trhlin SAL. Rozsah změny byl určen na základě stavu podkladní CB desky (min. zbytková tloušťka 120 mm po odfrézování stávajících asf. vrstev) viz stanovisko AD č. 69 z 21. 6. 2023.

Konstrukce vozovky s asf. vrstvou SAL byla provedena v úsecích:

Km 10,190 – 10,250 vlevo (251,9 m²)
Km 10,680 – 10,760 vlevo (450 m²)
Km 10,881 – 11,060 vlevo (827,4 m²)
Km 11,182 – 11,299 vlevo (467,8 m²)
Km 11,297 – 11,780 vlevo (2175 m²)
Km 11,771 – 12,436 vlevo (2982,7 m²)

Km 10,250 – 10,360 vpravo (505 m²)
Km 10,360 – 10,841 vpravo (2203,3 m²)
Km 10,833 – 11,295 vpravo (1414,5 m²)
Km 11,298 – 11,780 vpravo (1957,4 m²)
Km 12,440 – 12,850 vpravo (1873 m²)
Km 12,846 – 13,201 vpravo (1562,3 m²)
Km 13,694 – 14,114 vpravo (1859,9 m²)
Km 14,112 – 14,430 vpravo (1482,0 m²)
Km 14,424 – 14,580 vpravo (143,3 m²)

Změna ovlivnila výměry položek č. 39, 44.

Dále bylo z důvodu bezpečnosti osazeno ocelové trubkové zábradlí kolem nátoky propustku v km 12,925 viz stanovisko AD č. 67 z 18. 6. 2023.

Změna ovlivnila výměry položek č. 15, 16, 18, 19, 61, 62 a nové položky č. 157, 158, 225.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 37 (102/12) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Asfaltová vrstva SAL, zábradlí propustku km 12,925).

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/12) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/13

Číslo ZBV:

38

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 38 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
38.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
38.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
38.3	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
38.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
38.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
38	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/13

Číslo ZBV:

38

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	59	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla

V PDPS v úseku km 13,720-14,140 SO 102 se uvažovalo pouze s demontáží stávajících betonových svodidel a jejich zpětnou montáží po zřízení nových konstrukčních vrstev vozovky. Při demontáži stávajících betonových svodidel se ukázalo značné opotřebení hlavně ve spojích a po odstranění nánosů ze stávající pravé krajnice i nedostatečná šíře pravé poloviny vozovky (PDPS uvažovalo 4,25 m od osy, skutečnost 3,75m a lokálně i 3,60 m). Zároveň bylo zjištěno, že přilehlý skalní masiv za pravou krajnicí není "dostatečně hladký a proto po dohodě s projektantem RDS (příl. č. 8), AD (příl. č. 11) a objednatelem (příl. č. 16) bylo dohodnuto následující. Stávající betonová svodidla nahradit novými betonovými jednostrannými výšky 1,2 m podél celého přilehlého masivu a tím eliminovat nebezpečí boční překážky. Tento úsek je rozdělen na dva úseky, délky 124 m a 84 m (propojen v prostoru nové HV ocelovým svodidlem délky 9 m s přesahy). Pod novým betonovým svodidlem je navrženo provést novou betonovou desku šíře 1,5 m tl. 0,20 m, která spočívá na ŠD podsypu. U HV v km 13,892 bylo provedeno zpevnění odlážděním ze žulových kostek do betonového lože a zakončeno podél hrany vozovky betonovou palisádou. Změna se týká pol. č. 63, 64, 93, 104, 119, 121-123, 126-129, a nových pol. č. 130, 140 141, 159-172.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
--	-------	------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
---	-------	---------------------	-------	--------

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
-------------------------------------	-------	------------------	-------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
---	-------	--	-------	--------

Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
-------------------------------	-------	------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
---	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
--	-------	-----------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
------------	-------	--	-------	--------

	Číslo paré:
--	-------------

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 38

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 715 953,90	18 330 101,17	124 977 093,83	11 614 147,27

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 530 172,61	19 860 273,78	17,52%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-6 715 953,90	126 507 266,44	13 144 319,88	11,59%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 38													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	70,000	24,000	135,29	6 223,34	0,00	3 246,96	9 470,30	3 246,96	0,00%
104	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	4 826,200	5 034,200	208,000	116,82	563 796,68	0,00	24 298,56	588 095,24	24 298,56	4,31%
119	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	3 369,614	171,784	13,82	44 194,01	0,00	2 374,05	46 568,06	2 374,05	5,37%
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	T	79 690,604	82 095,580	2 404,976	7,03	560 224,95	0,00	16 906,98	577 131,93	16 906,98	3,02%
122	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	11 138,845	11 239,165	100,320	27,06	301 417,15	0,00	2 714,66	304 131,81	2 714,66	0,90%
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	155 943,830	156 837,590	893,760	0,58	90 447,42	0,00	518,38	90 965,80	518,38	0,57%
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 416,259	63,840	34,54	357 572,55	0,00	2 205,03	359 777,58	2 205,03	0,62%
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 197,830	3 369,614	171,784	34,54	110 453,05	0,00	5 933,41	116 386,46	5 933,41	5,37%
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5 047,476	5 220,856	173,380	147,76	745 815,05	0,00	25 618,63	771 433,68	25 618,63	3,43%
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 220,856	173,380	29,55	149 152,92	0,00	5 123,38	154 276,30	5 123,38	3,43%
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	Kč	0,000	7 717,175	7 717,175	1,00	0,00	0,00	7 717,17	7 717,17	7 717,17	100,00%
140	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého	M2	0,000	15,000	15,000	30,40	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	100,00%
141	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	0,000	15,000	15,000	608,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
159	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm	M2	0,000	315,000	315,000	64,80	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00%
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	0,900	0,900	585,00	0,00	0,00	526,50	526,50	526,50	100,00%
161	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m	kus	0,000	75,000	75,000	216,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
162	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	M3	0,000	47,250	47,250	4 180,00	0,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	100,00%
163	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	560,00	0,00	0,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	100,00%
164	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	138,00	0,00	0,00	8 818,20	8 818,20	8 818,20	100,00%
165	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	M2	0,000	315,000	315,000	167,00	0,00	0,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	100,00%
170	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	48,000	48,000	139,52	0,00	0,00	6 696,96	6 696,96	6 696,96	100,00%
166	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	0,000	75,000	75,000	181,00	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
167	911381124a	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)	M	0,000	48,000	48,000	1 381,67	0,00	0,00	66 320,16	66 320,16	66 320,16	100,00%
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
171	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
172	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Celkem						6 175 063,44	0,00	1 530 172,61	7 705 236,05	1 530 172,61	24,78%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	38
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/13

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38	25	
08 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti	1	
09 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
10 Stanovisko projektanta RDS	4	
11 Vyjádření AD č. 61	1	
12 Geodetické protokoly	2	
13 Fotodokumentace	2	
14 Listy SD	11	
15 Faktura - pamětní deska	2	
16 Vyjádření objednatele k likvidaci svodidel	1	
17 Zápis Ing. Klofáče do obch. Rejstříku	2	
18 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku	6	
19 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	59	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	23 990,533	1 295,287	138,17	3 135 802,14	0,00	178 969,80	3 314 771,94	178 969,80	5,71%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD 4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A] 2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B] 1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C] 4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D] 1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E] Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F] ZBV č. 13 dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A] ZBV č. 20 odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A] ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845											
20	171201211a	Poplatek za zemník	T	10 481,925	10 481,925	0,000	23,03	241 398,73	0,00	0,00	241 398,73	0,00	0,00%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD 1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A] 2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef. 2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B] 1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C] 182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D] Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]											
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	182,700	0,000	254,57	46 509,94	0,00	0,00	46 509,94	0,00	0,00%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
		SoD 14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]											
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	11 587,300	560,300	33,80	372 712,60	0,00	18 938,14	391 650,74	18 938,14	2,25%
		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C] ZBV č. 20 1,9*60=114,00 [A] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	29 671,000	29 731,300	60,300	3,65	108 299,15	0,00	220,09	108 519,24	220,09	0,20%
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného											
		SoD 13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A] ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A]											
111	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	M2	4 580,000	4 580,000	0,000	376,22	1 723 087,60	0,00	0,00	1 723 087,60	0,00	0,00%
		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm											
		SoD 4580*0.5*2=4 580,000 [A]											
112	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	2 444,000	2 844,000	400,000	291,03	711 277,32	0,00	116 412,00	827 689,32	116 412,00	16,37%
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního											
		SoD 2374 VLEVO=2 374,000 [A] 70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B] Celkem: 2374+70=2 444,000 [C] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	10,000	0,000	1 727,08	17 270,80	0,00	0,00	17 270,80	0,00	0,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou											
		SoD 2 dle situace vč. sloupků=2,000 [A] 6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B] Celkem: 2+8=10,000 [C]											
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	2,000	0,000	103,62	207,24	0,00	0,00	207,24	0,00	0,00%
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol											
115	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	M	13,000	13,000	0,000	1 135,27	14 758,51	0,00	0,00	14 758,51	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm											
		13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]											
116	966008116R	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	15,000	15,000	0,000	1 892,11	28 381,65	0,00	0,00	28 381,65	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm											
		15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]											
117	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	7,000	7,000	0,000	287,85	2 014,95	0,00	0,00	2 014,95	0,00	0,00%
		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm											
118	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	M2	10,000	110,900	100,900	84,40	844,00	0,00	8 515,96	9 359,96	8 515,96	1009,00%
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým											
		SoD 10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 13 pro ZBV 38													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											
171	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											
		Celkem						113 362 946,56	- 6 715 953,91	19 860 273,78	126 507 266,44	13 144 319,88	11,59%

Položka

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Objednatel:

Zhotovitel:

Skupina změn

Data

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

102/13

38

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

3

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

PRAGOPROJEKT a.s.
Miroslav Valenta, TDI
K Ryšánci 1668/16
Praha 4
147 54

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS_010/23

Ing. Ctibor
mobil:

Praha,
18.5.2023

Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. Etapa

Věc: Doporučení projektanta RDS č. 21 – nedostatečná šířka pravé poloviny vozovky v km 13,720 -14,140, výměna a doplnění bet. svodidel

Po odstranění betonových svodidel vpravo v km 13,764 – 13,800, dl. 36 m a km 13,843 – 13,892, dl. 49 m, (celkem 85 m), a násosů z pravé krajnice v km cca km 13,720 – 14,140 bylo zjištěno, že **pravá polovina vozovky nemá oproti očekávání PDPS v tomto úseku šíři 4,25 m**, tak jako v ostatních částech trasy, ale pouze cca 3,75 m, lokálně min. 3,60 m. Dle PDPS měla být v tomto úseku provedena výměna asfaltových vrstev vozovky. Zároveň bylo po odstranění napadané suti ze skály zjištěno, že přilehlý skalní masiv není „dostatečně hladký“. U stávajícího bet. svodidla bylo zjištěno, že není vzájemně spojeno kotvicími prvky a některé díly vykazují různý stupeň poškození. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji následující:

1. Stávající bet. svodidlo nahradit **novým betonovým jednostranným výšky 1,2 m v rozsahu podél celého přilehlého skalního masivu, tj.**
 - km 13,7647 – 13,8887, dl. 124 m,
 - km 13,8963 – 13,9803, dl. 84 m, (celkem 208 m)

Oba úseky budou vzájemně propojeny ocelovým svodidlem H1 dl. 7,6 m. (z důvodu umístění horské vpusti). Pod bet. svodidlem bude provedena podkladní bet. deska tl. 0,2 m a šířky 1,5 m viz příloha vzorový příčný řez.

2. Vzhledem k nutnému doplnění bet. svodidla v celém úseku s přilehlým skalním masivem viz bod 1) bude zachována stávající šířka zpevnění a bude provedena konstrukce vozovky v souladu s PDPS. Šířka jízdního pruhu bude 3,5 m rovněž v souladu s PDPS. V kombinaci s doplněnými bet. svodidly není podél skalního masivu dostatečný prostor na rozšíření pravé poloviny vozovky na š. 4,25 m. Při pokládce asf. hutněných směsí bude minimalizován příčný přesah jednotlivých vrstev, tak, aby šířka vozovky v obrusné vrstvě byla maximální (optimálně alespoň 3,75 m). Za hranou zpevnění bude těsně přiléhat podkladní beton pod bet. svodidlo. Vodicí čára š. 0,25 m bude umístěna u hrany zpevnění. Viz příloha vzorový příčný řez.



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273


Na vědomí:

zhotovitel: Strabag, Ing. Karel Šimek

za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Čtěr

Příloha: vzorový příčný řez, situace bet. svodidla

SIL. II/102
NOVÉ BETONOVÉ SVODIDLO TYPU
NEW JESSEY V KRAJINICI

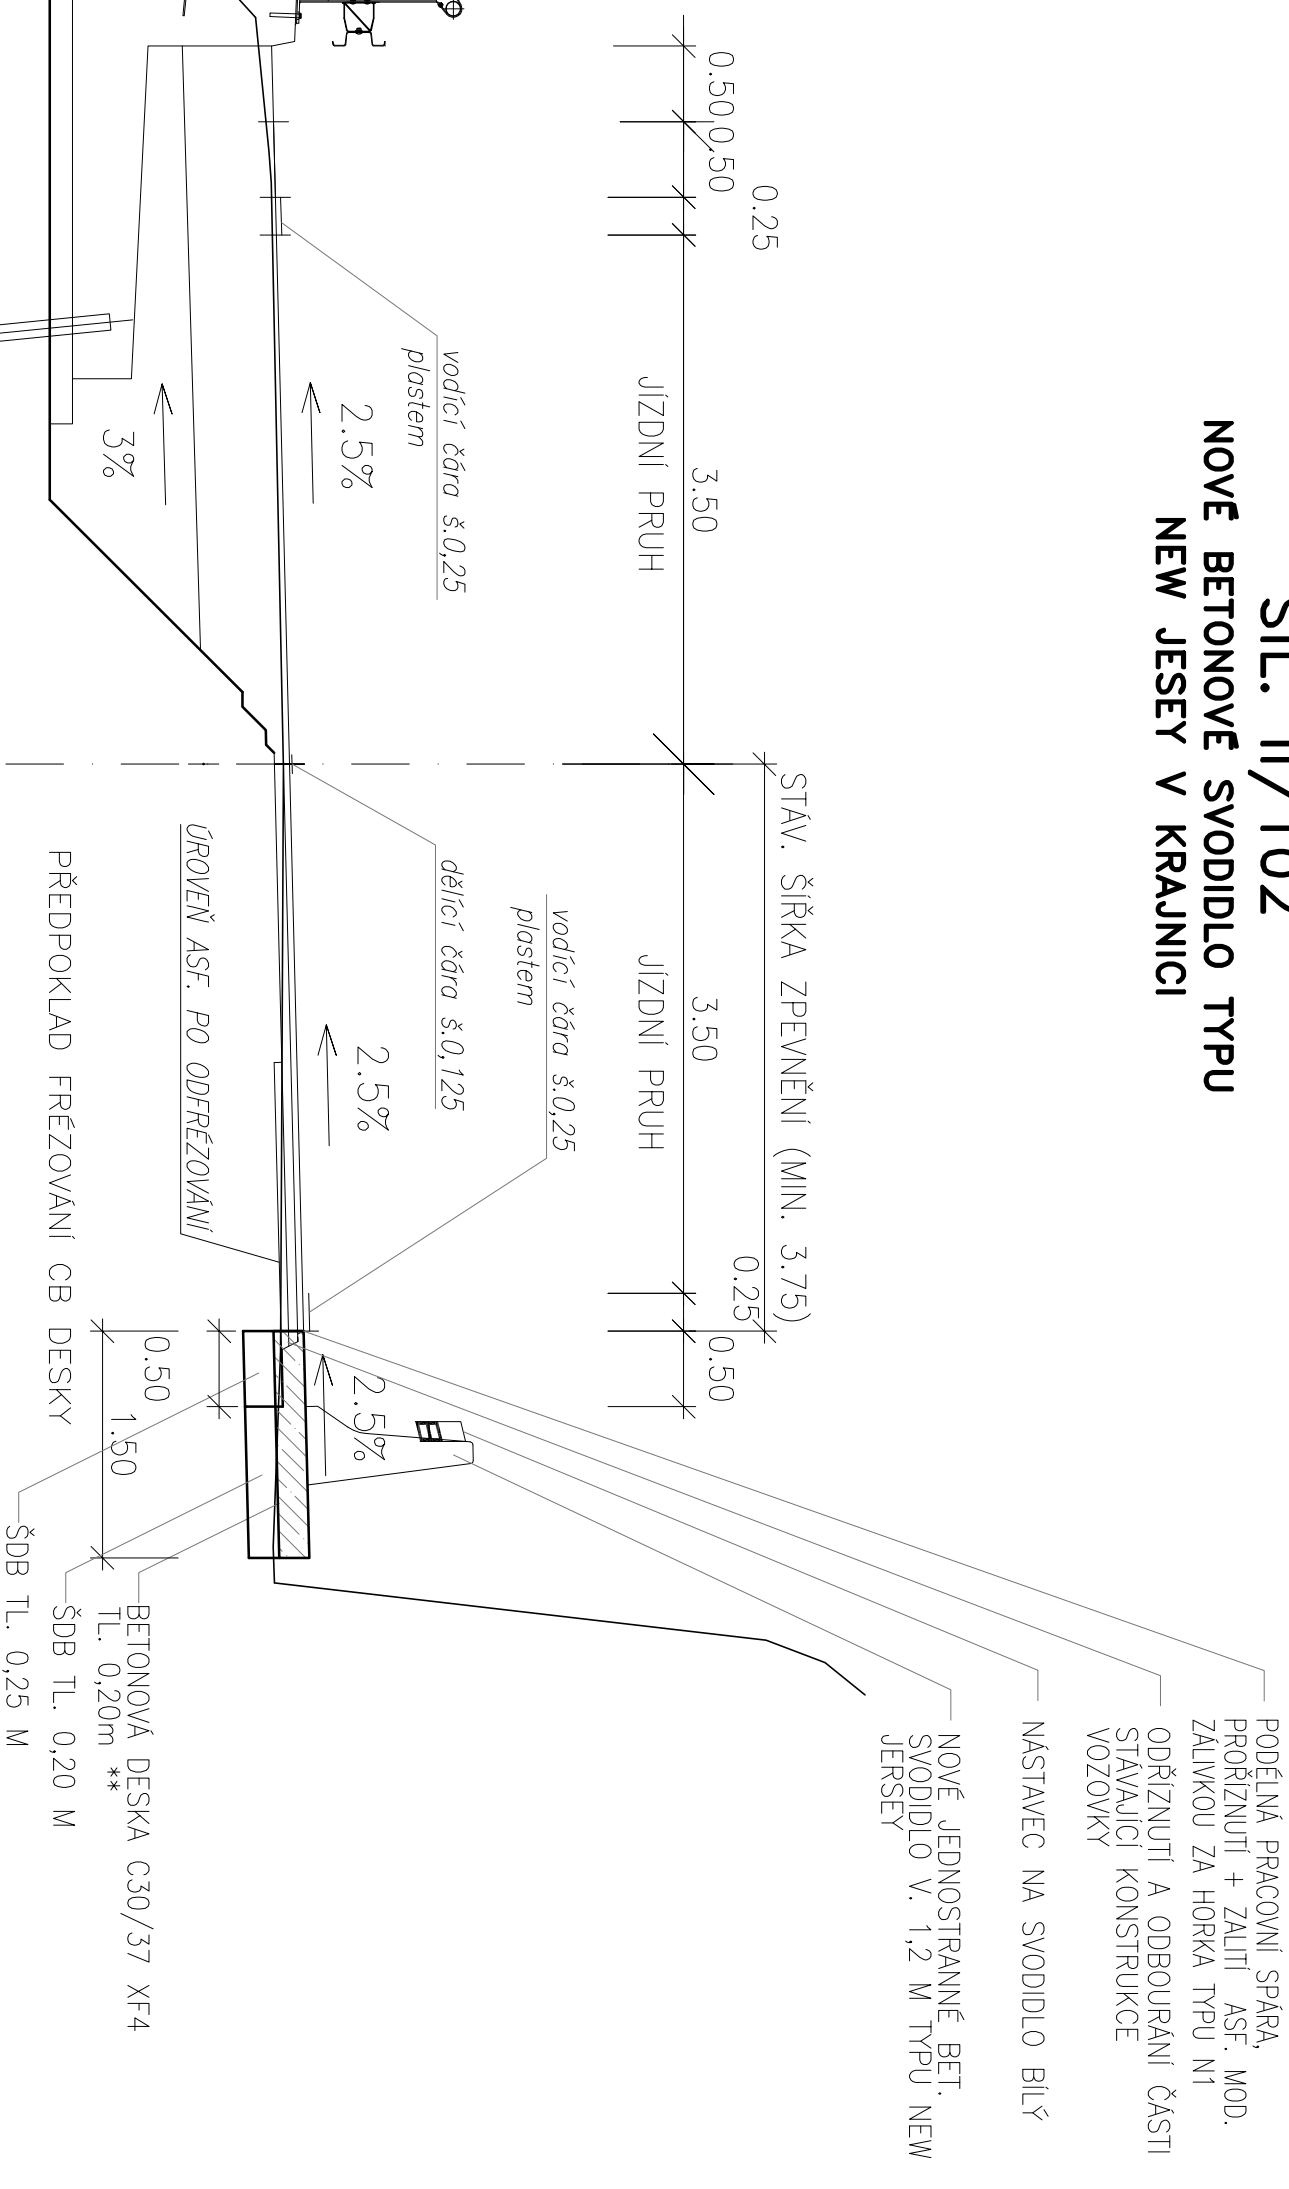

POZN:

**** PO 2,5M BUDOU PROŘÍZNUTY PŘÍČNÉ SPÁRY, KTERÉ BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PRUŽNÝM TMELEM**

Č. přílohy	
Akce:	II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II
Objekt:	S0 102-C REKONSTRUKCE VOZOVKY, DAVLE – ŠTĚCHOVICE – ÚSEK C
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍLOŽNÉ ŘEZY – DETAIL – KRANICE S BET. SVODIDLEM 1:100
	 atelierpromika projektová činnost i v deparách

II/102 - SMĚR ŠTĚCHOVICE

13,89 výměna stávajícího propustku za n
výměna stávajícího svodidla v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 84 m (vč. náběhového a přechodového dílu)
pod výtokem je pohoz lomovým ka
km 13.8963 – 13.9803 betonové jednostranné svodidlo v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 84 m (vč. náběhového a přechodového dílu)
podkladní beton km 13.896 – 13.981

13.8887 – 13.8963 ocelové svodidlo úrovně zadržení H1, dl. 7,6 m

km 13.7647 – 13.8887 betonové jednostranné svodidlo v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 124 m (vč. náběhového a přechodového dílu)
podkladní beton km 13.764 – 13.889

II/102 - SMĚR DAVLE

13,89 výměna stávajícího propustku za n
výměna stávajícího svodidla v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 84 m (vč. náběhového a přechodového dílu)
pod výtokem je pohoz lomovým ka
km 13.8963 – 13.8963 ocelové svodidlo úrovně zadržení H1, dl. 7,6 m

km 13.7647 – 13.8887 betonové jednostranné svodidlo v. 1,2 m úrovně zadržení H2, dl. 124 m (vč. náběhového a přechodového dílu)
podkladní beton km 13.764 – 13.889



a				
b				
c				
č. změny	text změny – odvodnění		datum	podpis

II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II		SO 102-C	
---	--	----------	--

OBJEDNATEL STAVBY		SCHVÁLĚNÍ RAZITNO DATUM PODPS:	
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 130 21 Praha 5 IC 0006001			

TECHNICKÝ DOZOR		SCHVÁLĚNÍ RAZITNO DATUM PODPS:	
 PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1688/16 147 54 Praha 4 IC 45272387			

AUTORSKÝ DOZOR		SCHVÁLĚNÍ RAZITNO DATUM PODPS:	
 Pontex, spol. s r.o. Bezova 1688/1 147 00 Praha 4 - Braník IC 40763439			

ZHOTVITEL STAVBY		SCHVÁLĚNÍ RAZITNO DATUM PODPS:	
 STRABAG, a.s. Kadřkova 982/4 158 00 Praha 5 IC 60638744			

ZPRACOVATEL RDS		SOURAČNÍKOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV	
 atelierpromika projektová činnost v dopravě Michnova 9/223 160 00 Praha 6 IC 26060273		SCHVÁLĚNÍ RAZITNO DATUM PODPS:	

VYPRACOVAL	Ing. Jiří Čilbor	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Čilbor
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Čilbor	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Másek
AKCE			

STAVBNÍ OBJEKT		II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II	
SO 102-C REKONSTRUKCE VOZOVKY, DAVLE - ŠTĚCHOVICE - ÚSEK C			
PRÍLOHA	C. PRÍLOHY		Č. PRÍRÉ

DETAIL BET. SVODIDLA			
KM 13,793 - 13,980			
STUPEŇ	RDS	DATUM	05/2023
MĚRÍTKO	1:500	FORMÁT	4xA4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek
Mobil +420 602 224 685
karel.simek@strabag.com

Naše značka:
KSÚS_/38

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Při demontáži stávajících betonových svodidel v km 13,720-14,140 SO 102 se ukázalo značné opotřebení hlavně ve spojích a po odstranění nánosu ze stávající pravé krajnice i nedostatečná šíře pravé poloviny vozovky (PDPS uvažovalo 4,25 m od osy, skutečnost 3,75 m a lokálně i 3,60 m). Zároveň bylo zjištěno, že přilehlý skalní masiv za pravou krajnicí není "dostatečně hladký" a proto po dohodě s projektantem RDS a objednatelem bylo dohodnuto následující. Stávající betonová svodidla nahradit novými betonovými jednostrannými výšky 1,2 m podél celého přilehlého masivu a tím eliminovat nebezpečí boční překážky. Tento úsek je rozdělen na dva úseky, délky 124 m a 84 m (propojen v prostoru nové HV ocelovým svodidlem délky 7,6 m). Pod novým betonovým svodidlem je navrženo provést novou betonovou desku šíře 1,5 m tl. 0,20 m, která spočívá na ŠD podsypu. Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. U HV bude provedeno zpevnění odlážděním ze žulových kostek do betonového lože.

Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s.
Ustřední 423/62
102 00 Praha 10 Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jiranič. Zápis v obchodním rejstříku. Městský soud v Praze
IČO 60836744, DIČ CZ60836744

strana 1 z 1

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s výměnou opotřeбенých svodidel a novou betonovou deskou pod těmito svodidly v km 13,270 – 14,140 SO102.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem


Ing. ~~Milan~~ Peška
technicko – provozní náměstek



KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č.j.: Px4314/2023/DDv

Datum: 24. 5. 2023

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa

Vyjádření autorského dozoru č. 61 - SO 102, km 13.720-14.140 vpravo, šířka vozovky, betonová svodidla

Zástupcem zhotovitele jsme byli informováni, že po zahájení prací spočívající v odstranění nánosů a demontáži stávajících betonových svodidel na pravé polovině vozovky v úseku v km 13.720 až 14.140 byly zjištěny následující skutečnosti:

- celková šířka pravé poloviny vozovky je menší než očekávaných 4,25 m,
- povrch přilehlého sklaního masivu je nerovný a lokálně se ve spodní části přibližuje k vozovce,
- některá betonová svodidla jsou poškozená, navíc došlo ke krádeži spojek segmentů betonových svodidel.

Zjištěné skutečnosti jsme ověřili místním šetřením.

Zhotovitel předložil řešení navržené projektantem RDS. Řešení jsme za AD posoudili a považujeme ho za vhodné. **Požadujeme postupovat dle návrhu projektanta RDS definovaném ve vyjádření č. 21 ze dne 18. 5. 2023.**

Požadované řešení rekapitulujeme takto:

- stávající betonové svodidlo bude nahrazeno novým betonovým svodidlem výšky 1,2 m podél celého sklaního masivu v km 13.765-13.889 a km 13.896-13.980 s přerušením v místě horské vpusti,
- oba úseky betonového svodidla budou v oblasti horské vpusti propojeny ocelovým svodidlem, úrovně zadržení H1,
- bude zachována stávající šířka zpevnění vozovky, optimálně alespoň 3,75 m,
- konstrukce vozovky bude provedena dle přípravné dokumentace,
- beton pod betonové svodidlo bude přilchat těsně za hranu zpevnění,
- jízdní pruh bude vyznačen v šířce 3,5 m dle přípravné dokumentace.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

210 6 (4p)



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 36/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Demontáž starých betonových svodidel

km 13,763 – 13,799 – vpravo 36 m
km 13,843 – 13,891 – vpravo 48 m
km 14,351 – 14,399 – vpravo 48 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	17.7.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	17.7.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 39/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Osazení nových betonových svodidel

km 13,764 – 13,888 – vpravo 124 m
km 13,895 – 13,979 – vpravo 84 m

propojení ocelovým svodidlem
km 13,887 – 13,896 – vpravo 9 m

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.


Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil:	2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	4.8.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	4.8.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





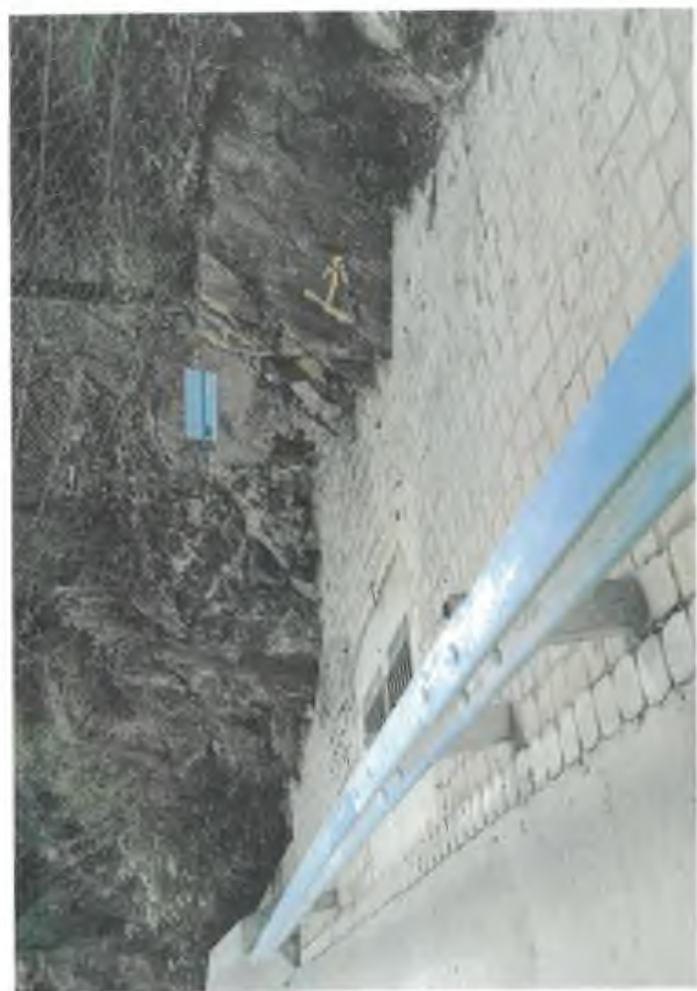

So 102

Datum: 29.5.2023

Den tjdne: 10

Uředitelka: 8/1/2022 Název akce: 11401 PG. HL. 17. PRAMAT, STROMOVKA, DISKONTEKCE, 1. ELEM

Medisko: 5/12/2012 14:00
2000, 2000 + 1700, 2000 + 2000, 2000 + 2000

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

ba: 750 - 1200

ba: 7⁵⁰ - 12³⁰
(jména a příjmení): EDUARD BONTANCO, MIROSLAV BERNI, FERDINÁND KROVÁK,
REDAK, LAMBERT, MIROSLAV ŠÍPIL, PROBÍR PUSKAL, OLGA RUOME,
MIROSLAV ČERNÝ, KOSTA NED, MIROSLAV PROBÍR, MIROSLAV DÍVÝ, MIROSLAV
PROBÍR, ANTONÍN STACH

IV. INTERVIEW OR WORKSHEET OR RESEARCH ONLINE RESEARCH, INTERVIEW INTERVIEW,
EXPERIMENT INTERVIEW, INTERVIEW INTERVIEW, INTERVIEW INTERVIEW, INTERVIEW INTERVIEW

SC 11 + P/B, SPARKING HATCH COVER

té práce: - prohlášení maximální akustického výkonu ACOM + PAB v
km 10,540 - 11,300 pevná stěna ke prům. stěnování +
hlušení akustického výkonu ACOM + PAB všechny hady
 - odraz nevyvolaného vlnového středu z tradičního
na relativně nové tradiční
 - prohlášení akustického výkonu ACOM v km 13,300 - 14,100 pevná stěna
ke prům. stěnování 14,130
 - prohlášení ACOM v km 14,120 - 14,140 pevná stěna ke prům.
stěnování
 - prohlášení akustického výkonu z relativně nové tradiční stěny 10L
v km 14,120 - 14,130 pevná stěna ke prům. stěnování +
odraz akustického výkonu na tradiční
 - prohlášení akustického výkonu stěnování tradičního stěnování stěnování v akustické stěny
odraz akustického výkonu na tradiční
 - prohlášení akustického výkonu akustického stěnování stěnování stěnování
prům. stěnování stěnování 10L + odraz akustického výkonu z relativně

DATE SUBMITTED: 28/08/2023 (F. 2023. 2. 1.)

[illegible]

s zástupce investora (TDI)

TRABAG

SO 102

Datum: 22. 6. 2023

Den týdne: ČU

Název akce:

11/102) PR. 12. 11. 2021, ČESKÉ LÁZEŇSKÉ KURORTY, 1. ETAPA

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní středisko:

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

Pracovní doba:

8⁰⁰ - 17³⁰

Pracovní (jména a příjmení):

JAN KOTENEC, KOSTA HLAV, MICHAEL CHENADEY, MOTOUS FOSKOLIL,

JAN KOTENEC, KOSTA HLAV, MICHAEL CHENADEY, MOTOUS FOSKOLIL,

Pracovní:

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

KURORTY, PR. 12. 11. 2021, ČU.

So 102 ✓

Den tydnø:

středisko: 97110200 Kačab 27712
183000 25000 + 900 502 + 7300 ADPR + 12500

Pracovní přestávka: $10^{30} - 10^{40}$

ci (jména a příjmení): FRANÇOIS GUYEN, FERNANDEZ, JEDLIČKA, MICHAEL DINE,
BOUD HENRI, BOUDOU CHIRIK, PATRICK LEBLANC, OLIVIER DUBOIS,
MARTIN Vlado, MICHAEL CHENOUET, YVES YVETTE

LIEBHERR 914, LIEBHERR 916, LIEBHERR 920, LIEBHERR 922, LIEBHERR 924, LIEBHERR 926, LIEBHERR 928, LIEBHERR 930, LIEBHERR 932, LIEBHERR 934, LIEBHERR 936, LIEBHERR 938, LIEBHERR 940, LIEBHERR 942, LIEBHERR 944, LIEBHERR 946, LIEBHERR 948, LIEBHERR 950, LIEBHERR 952, LIEBHERR 954, LIEBHERR 956, LIEBHERR 958, LIEBHERR 960, LIEBHERR 962, LIEBHERR 964, LIEBHERR 966, LIEBHERR 968, LIEBHERR 970, LIEBHERR 972, LIEBHERR 974, LIEBHERR 976, LIEBHERR 978, LIEBHERR 980, LIEBHERR 982, LIEBHERR 984, LIEBHERR 986, LIEBHERR 988, LIEBHERR 990, LIEBHERR 992, LIEBHERR 994, LIEBHERR 996, LIEBHERR 998, LIEBHERR 1000

(3) $75.0/32 \text{ min}$, RETURNS PROD 1.020, PROD 1.020, RETURNS PROD 1.020

ené práce:

- PROVÁZENÍ SPRAVNOSTI PRÁVKY 8 (2) TB. 613mm V
- 1mm 14,40 - 14,40 PRÁVÉ STRANĚ VE SMĚRU STAVBY +
- 14,40 PRÁVÉ STRANĚ VE SMĚRU STAVBY
- PROVÁZENÍ KRESBY BETONOVÝCH PRÁVKY PRO BETONOVÉ SLABIKY
- PROVÁZENÍ KRESBY + MONTÁŽ STAVBY BETONOVÝCH PRÁVKY
- PRÁVÉ STRANĚ V 1mm 14,40 - 14,35 PRÁVÉ STRANĚ
- VE SMĚRU STAVBY
- PROVÁZENÍ KRESBY A ROZMĚRŮ BETONOVÝCH PRÁVKY V 1mm 14,40
- 14,35 PRÁVÉ STRANĚ VE SMĚRU STAVBY

ROZÍPŘE ŽIVOTNÍHO CYKLU: DLE POKROČILÝCH PRACÍ
PROJEKČNÍ A VÝPOČETNÍ POKROČILÝCH CÍŮ, JE V DANÉM MÍSTĚ
V KM 14,300 - 14,400 PRÁKOVÝ STĚNA KE VNĚJŠÍ STAVĚNÍ, LOKALIZOVANÁ
24 PRÁKOVÝCH POKROČILÝCH CÍŮ POKROČILÝCH CÍŮ. V DANÉM
MÍSTĚ JE POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ
OKROČILÝ POKROČILÝ. PO POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ
OKROČILÝ POKROČILÝ. V TĚCH OKROČILÝCH ŽIVOTNÍHO CYKLU
V KM 14,300 - 14,400 PRÁKOVÝ STĚNA KE VNĚJŠÍ STAVĚNÍ SE POKROČILÝ
OKROČILÝ CÍŮ. DLE VÝPOČETNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU POKROČILÝ SE
KE POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ
PO POKROČILÝ A POKROČILÝ POKROČILÝ POKROČILÝ
PO POKROČILÝ A POKROČILÝ OKROČILÝ ŽIVOTNÍHO CYKLU SE
POKROČILÝ DO ŽIVOTNÍHO CYKLU POKROČILÝ POKROČILÝ

pis zástupce Investora (TDI):

PO 102/

Datum: 28.5.2023 Den týdne: NE

středisko: PHILIPAL Název akce: 11/100 HB. 12. D. PRAMIT, STŘEDOPRAV, PŘEKONTOUČNÉ, PŘEKONTOUČNÉ, PŘEKONTOUČNÉ

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Oba: 9⁰⁰ - 11⁰⁰

(jména a příjmení): MICHAEL BARNES, HELEN HATFIELD

ny: MOTOROVÝ PŘEKONTOUČNÝ, VIBROČNÁ DESKA, PŘEKONTOUČNÝ

PO 10. 5/31mm

né práce - PRACOVNÍ DESKA (MONTÁŽNÍ PRÁCE) PŘEKONTOUČNÝ PŘEKONTOUČNÝ
PO 10 (PŘEKONTOUČNÝ PRÁCE) PŘEKONTOUČNÝ PŘEKONTOUČNÝ
11. 10. 2023 - 13. 10. 2023 PRACOVNÍ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ
PRACOVNÍ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ
PRACOVNÍ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ
PRACOVNÍ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ
PRACOVNÍ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ PRÁCE PŘEKONTOUČNÝ

80 102

Datum: 26.5.2023

Den tjdna: PC

Název akce: 11/101 PE. A2. II. PRAM, BŘEHOVÉ, BRONŠTAVICE, I. etapa

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

(mení): ZDANĚNÍ BUDISNOV, ROSTA KRAJ, MICHAL GRONDEZ, PAVEL
HUTYSK, PETRČEK PRUKOSIL, ALEX RUPIKA, JATROK LEBOŠKA,
OTOMAL DVIČ, MARCEL FENC, ANTONÍN HENCL, FOMTŘOBE
JEDLIČKA, MICHAEL ŠELEN

1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 26

30/39 1st, 2nd 16+, 3rd 2nd 16+, 4th 16+ MODIF. POSTERIOR. 93/94
SPRINGER, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 262

- POVLÁČENÍ PODKLADU ASFALTOBETONU PR 16+ V KM 10,840-10,850
A 11,060-11,160 PRÁVA STRANA KE STŘEDU POKLÁČENÍ + MĚŘENÍ
ASFALTOBETONU KŘÍČNÍ HEDVÍ
POVLÁČENÍ PODKLADU ASFALTOBETONU PR 16+ V KM 10,850-11,060 P
POVLÁČENÍ PODKLADU PR 16+ MODIF. V KM 10,850-11,060 P
V KM 11,160-11,300 PRÁVA STRANA KE STŘEDU POKLÁČENÍ
POVLÁČENÍ PODKLADU PR 16+ MODIF. 0,3 kg/m² V KM 10,840-11,300
PRÁVA STRANA KE STŘEDU POKLÁČENÍ
POVLÁČENÍ PODKLADU ASFALTOBETONU PR 16+ PR 16+ V KM 10,840-11,800
PRÁVA STRANA KE STŘEDU POKLÁČENÍ + MĚŘENÍ ASFALTOBETONU
KŘÍČNÍ HEDVÍ
V KM 11,800-11,803 PRÁVA STRANA KE STŘEDU POKLÁČENÍ + MĚŘENÍ
POVLÁČENÍ PODKLADU PR 16+ MODIF. 0,3 kg/m² V KM 11,803-11,803

[illegible]

So far

Den tydne: 81

středisko:

Název akce: 11/102) Hl. hl. 17. posaz, Šišomovské, 25.000 Kč, 4. 8. 1991

[illegible]Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

dob: 30-11-20

imici (mèna e pì)meni)

[illegible]

anatomy

LIBRARY QN, LIBRARY 914, HEARST BORN' NARRAGANSETT, LA FORD TRANKT,
3x NARRAGANSETT AUTO, JAMESON (BOSTON WIS.)

Add:

Rečnice: KAMEN, BETON, DROBNÉ KOŠTY

75KV

ZAPIS YD: Po vizuálnom kontrole u súb podmiestky
vzhľadom na výšku a šírku. Zobrazení
poklonu. Poklonu. HAV VETNE POKLONU
U WERN 10/840 - M. 1000 P.S. *Clery*

vedené práce:

- "PROJEKČNÍ" ODSADŽENÍ ŠKALY JELSKA KOTANICE (10 KM)
V KM 11, 250 - 11, 350 PRÁHA - ÚSTANÍ KE (MĚLI) STANČENÍ
S EXHIBITIONÁLNÍM PRŮBĚH DO BETONOVÉHO POŠE
COPES, NERADNOSTNÍHO VIKOPOROVANÍ MATERIÁLU S NEJEDNODUŠNÝM
SPOJENÍM AOLT "MOCN"
- "PROJEKČNÍ" ÚSTANÍ STANČENÍ V KM 10, 840 - 11, 300 PRÁHA
(PRÁHA KE STANČENÍ) STANČENÍ (STANČENÍ)
- "PROJEKČNÍ" ODSADŽENÍ, ODSADŽENÍ PRÁHA ODSADŽENÍ PRÁHA V
GRE KOTANICE - ODSADŽENÍ PRÁHA PRÁHA PRÁHA PRÁHA
- "PROJEKČNÍ" ODSADŽENÍ PRÁHA PRÁHA PRÁHA PRÁHA PRÁHA
PRÁHA V KM 13, 2612 - 13, 2613 A KM 13, 2613 - 13, 2613
- "PROJEKČNÍ" ODSADŽENÍ PRÁHA PRÁHA PRÁHA PRÁHA PRÁHA
PRÁHA PRÁHA KE STANČENÍ STANČENÍ
- "PROJEKČNÍ" ÚSTANÍ STANČENÍ V KM 11, 060 - 11, 350 PRÁHA
PRÁHA KE STANČENÍ (PRÁHA PRÁHA PRÁHA)

[illegible]

Podpis stavebyvedoucího: _____

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis zástupce investora (TDI):

PG 102

Datum: 13.5.2023

Den týdne: ú

Středisko: Střelice

Název akce: 11/100 HG.M. 11. ročník, úřadovna, rekonstrukce, 1. etapa

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Jména a příjmení:

FRANTIŠEK NEJEDLIK, MICHAL DUVÁK, RUDOLF FENC, ANTONÍN
HRAD, MIROSLAV ŠÍPŠEK, ZDENĚK MALÝ, VILÉM HEDVÍBK,
MICHAL ČERNÝ, JIŘÍ POSPÍŠIL, OLGA DVOŘÁK

Práce:

LIŠKAŘI PR, 3. etapa, 1. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

Práce:

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

REKONSTRUKCE, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,
11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník, 11. ročník,

SO 102

Datum: 25.4.2013 Den týdne: ÚT

Místní úřadové středisko: Město Náměstí akce: III/102 PR. 14. 17. PR. 17, ŠKOLNICE, REKONSTRUKCE II. ETAPA

Pracovní doba: 9⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): EDUARD KOTVÁŘEK, MICHAEL CHENAVET, JOSEF KAD, MICHAEL
HARTSEK, JERONIM ŠPILSKÝ, OLGA KUČKOVÁ, JIŘÍ KREJČÍK,
JAN KUBER, KRAJČEK JERONIM, MICHAEL DILK, KARL KENC

Mechanismy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 914, 2x KAMMANN RTO, 2x SY FORD TRAKT.

Materiál: REKONSTRUKCE KOSTELNÍ, BETON, LAMOVÝ ŠOKOVÝ PRŮVOD

Koušky:

- Provedené práce:
- provedení odjezdu lanového záchranného systému na
divokém potoku v km 17,919 1810 + provedení práce ke
střední staniční
 - provedení odjezdu systému ke střední staniční SO 102
s rekognoskací kamery do betonového lože v km 17,930 - 17,930
provedení práce ke střední staniční
 - provedení odjezdu systému ke střední staniční SO 102
v km 17,900 - 17,910 provedení práce ke střední staniční + práce
návrh s pracovním na měřidlování
 - provedení odjezdu systému ke střední staniční SO 102
provedení s pracovním kamery SO 102 na měřidlování
v km 17,964 - 17,900 a v km 17,943 - 17,992 provedení práce
ke střední staniční

Zástupce investora (TDI):

So 102/

Datum: 18.1.2022 Den týdne: ÚT

iko: 871130001 Název akce: 11/120 AG. 12. 11. 2021, ŠTĚPNOVICE, BRDARDOVICE, 1. ETAPA

Pracovní přestávka:

a a příjmení):

Seznam zaměstnanců:

AMERIKO DNE 08.08.2022 ZAMĚSTNANCI (F. PRÁCE A.S.)
MĚŘENÍ DLE POKYNU A K NEODSTRANĚNÉ JÍŠCE
POKRYTÍ PLOCHY ROZSAH V DM 13,310 - 14,140 + VÍŠKA
A DOPLNĚNÍ SET. MODULU

Seznam zaměstnanců: ZAMĚSTNANCI F. PRÁCE A.S.
MĚŘENÍ DLE POKYNU A K NEODSTRANĚNÉ JÍŠCE
POKRYTÍ PLOCHY ROZSAH V DM 13,310 - 14,140 + VÍŠKA
A DOPLNĚNÍ SET. MODULU

ZADÁNÍ TDI: NA ZÁKLADĚ VÝPOČTŮ VÝLEDKŮ
KONTROL. ZKOUŠEK NA ZEMĚ PLOCH
POKRYTÍ PLOCHY ROZSAH V DM 13,310 - 14,140 + VÍŠKA
A DOPLNĚNÍ SET. MODULU



Dodavatel: INTERSIGN, s.r.o.

Libušská 109/258

142 00 Praha 4 - Libuš

Česká republika

IČ: 28912748

DIČ: CZ28912748

www.intersign.cz

Spis.značka: C 152740 Městský soud v Praze

Registrační č.: 14124 Puncovní úřad v Praze

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 4291419001/5500

SWIFT kód: RZBC CZ PP

IBAN kód: CZ285500000004291419001

Příjemce:

Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00

Praha 5, ČR

Způsob dopravy: Vlastní**FAKTURA - daňový doklad****72300167**

Objednávka: 2022/ZGAC/0050

Zakázka: 20223875

Ref. kód: RC-KST-CZ-841-ZGAC Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: 72300167

Odběratel:

Strabag a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

ČR

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 23.02.2023

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 24.01.2023

Datum vystavení: 24.01.2023

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ
[CZK]Sleva
%Sazba Celkem bez DPH
DPH v % [CZK]

Fakturuje Vám

cedule EU / Štěchovice II.

•	Cedule hliníková, GX620(AF8) - Gravoxal matný stříbrný - 2 mm, 400x300 mm	1	8 690,00	21	8 690,00
•	Krytka ozdobná duralová - stříbrná GX620, v ceně	4	0,00	21	0,00

8 690,00

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	8 690,00	1 824,90	0,00	8 690,00	1 824,90

Zaokrouhlení: 0,10 Kč

K úhradě: 10 515,00 Kč

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: *Markéta Sýkorová

Tel.: 241 727 075

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER
SYSTEM

QR platba telefonem

STRABAG A.S.

KAČÍRKOVA 982/4
CZ-158 00 PRAHA 5 - JINONICE

Č. dodavatele: 2235546
Číslo dokladu: 72300167
Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZGAC
Barcode: CZP07483

INTERSIGN, S.R.O.

LIBUŠSKÁ 109/258
CZ-142 00 PRAHA 4-LIBUŠ

1.2.2023

Schvalovací list INVOICE4U

Datum	Uživatel	Druh
26.1.2023 13:05	Trejbalová Hana	ekonomický schvalovatel
27.1.2023 8:43	Lísa Martin	ekonomický schvalovatel
30.1.2023 13:38	Šimek Karel	ekonomický schvalovatel
1.2.2023 7:52	Hauser Vladimír	ekonomický schvalovatel
1.2.2023 16:52	Novák Tomáš	věcný schvalovatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Strabag a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

č.j. 6969/23/KSÚS/KLT/MOT
ev.č. 54285/2023-KSÚS

Vyřizuje/telefon

K. Motál

Praha

4.9.2023

Věc: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II.etapa – použitá betonová svodidla

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/102 a to včetně součástí a příslušenství silnice sděluje ve věci použitých betonových svodidel:

Jedná se o celkem 48 metrů značně opotřebovaných betonových svodidel, jejichž stavební stav neumožňuje jejich další použití jako silniční zádržný systém. Z důvodu špatného stavu předmětných svodidel zajistí zhotovitel stavby „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa“ jejich likvidaci.

S pozdravem

Karel Motál
vedoucí oblasti Kladno

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Poděště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/258/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datum: 30. 10. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 38 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice.

Zhotovitel stavby dne 15. 8. 2023 předložil a 23. 8. 2023 doplnil návrh ZBV č. 38 SO 102 (102/13) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Betonová svodidla).

Návrh změny řeší nahrazení poškozených betonových svodidel novými včetně provedení podkladního betonu v km 13,764 - 13,980 a dalších souvisejících prací (pokládka dlažby ze žulových kostek, osazení bet. ohrub) viz stanovisko AD č. 61 z 24. 5. 2023.

Dále byla na žádost objednatele osazena pamětní deska v km 13,892.

Změna ovlivnila výměry položek č. 63, 64, 93, 104, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129 a nové položky č. 130, 140, 141, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 38 (102/13) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Betonová svodidla)

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/13) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.

[REDACTED]
M. Valenta

Technický dozor investora

Na vědomí:

Ing. Karel Šimek
