

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/14

Číslo ZBV:

39Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 39 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.3	-6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
39	-6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

5

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/14		Číslo ZBV: 39
Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5				
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 137 počet listů		Paré č. Příjemce 1 Objednatel 2 Zhotovitel 3 Projektant (AD) 4 Stavební dozor 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)		
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny: Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene Tato změna řeší požadavek správce toku Povodí Vltavy s.p. (příloha č. 8 a 16), ke kterému projektant zpracoval změnu RDS č. 4 (příl. č. 14), ke které se vyjádřil AD - vyjádření AD č. 23, 46,64 a email z 5.9.2022 (příl. č. 9, 10, 15 a 17). V PDPS bylo uvažováno s úpravou levého násypového svahu SO 102 rekonstrukce vozovky Davle-Štěchovice II.část v dále popisovaném staničení: - km 10,001-10,111,10,200-10,250 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity tzyp B2, - km 10,930-10,960 ,11,00-11,031 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity typ B2 - km 10,960-11,000 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1 - km 11,053-11,359 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,25 typ A - km 11,359-11,381 jiná inženýrská konstrukce typ C3(opevnění kolem mostu SO 206) - km 11,520-11,667 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity typ B2 - km 11,690-11,847 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1 - km 11,847-11,971 a 12,020-12,440 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity typ B2 - km 11,980-12,020 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,25 typ A - km 13,150-13,190 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1 - km 14,410-14,460 úhlová zeď typ C1, - km 14,470-14,580 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,75 typ A - km 11,718-11,970 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1 Toto vychází z koordinační situace stavby a TZ. Při dalších úpravách svahů (v návaznosti na stavební práce již nárokované v ZBV č. 13) se opět pod nánosem vegetace objevilo původní břehové opevnění lomovým kamenem. Na základě požadavku správce toku Povodí Vltavy s.p. a souhlasu objednatele na zhotovení opevnění jak bylo provedeno před vybouráním starého narušeného opevnění se veškerá zpevnění na levé straně silničního tělesa v návaznosti na ZBV č. 13 provedla dle typu B1 což dokladujeme měřičskými protokoly ÚOZI stavby, které jsou přílohou této změny (příl. č. 18) a dopracovány v RDS SO 102 a jsou také součástí DSPS a zaměřeny ve skutečném provedení. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-6 111 253,89		5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30
Technická pomoc Objednatele jméno Ing. Lubomír Smetana datum podpis				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Karel Šimek datum podpis				
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. David Dvořáček datum podpis				
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. jméno Miroslav Valenta datum podpis				
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis				
Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Milan Peška datum podpis				
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis				
Zhotovitel jméno Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč datum podpis				
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 39**

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-6 715 953,90	19 860 273,78	126 507 266,44	13 144 319,88

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-6 111 253,89	5 276 219,41	25 136 493,19	22,17%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-12 827 207,79	125 672 231,96	12 309 285,40	10,86%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	122101103.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	5 438,400	1 115,900	122,97	531 537,83	0,00	137 222,22	668 760,05	137 222,22	25,82%
16	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	16 809,280	1 785,440	504,88	7 585 236,34	0,00	901 432,95	8 486 669,29	901 432,95	11,88%
17	171151222	Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m	M2	2 275,000	0,000	-2 275,000	1 323,12	3 010 098,00	-3 010 098,00	0,00	0,00	-3 010 098,00	-100,00%
18	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	12 511,430	1 785,440	16,70	179 124,03	0,00	29 816,85	208 940,88	29 816,85	16,65%
19	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	26 087,582	3 392,336	138,17	3 135 802,14	0,00	468 719,07	3 604 521,21	468 719,07	14,95%
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	6 813,600	4 463,600	43,01	101 073,50	0,00	191 979,44	293 052,94	191 979,44	36,22%
24	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150	M2	11 345,000	80,110	-11 264,890	36,89	418 517,05	-415 561,79	0,00	2 955,26	-415 561,79	-99,29%
31	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	4 463,600	-759,800	581,54	3 037 616,04	-441 854,09	0,00	2 595 761,95	-441 854,09	-14,55%
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	0,000	-3,000	3 481,56	10 444,68	-10 444,68	0,00	0,00	-10 444,68	-100,00%
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	4 463,600	-762,800	2 927,76	15 301 644,86	-2 233 295,33		13 068 349,53	-2 233 295,33	-14,60%
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	4 372,743	4 061,876	51,81	16 106,019	0,00	210 445,80	226 551,82	210 445,80	1306,63%
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	61 218,402	56 866,264	5,76	25 068,315	0,00	327 549,68	352 617,99	327 549,68	1306,63%
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	Kč	0,000	26 386,609	26 386,609	1,00	0,00	0,00	26 386,61	26 386,61	26 386,61	100,00%
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu a uložení	M2	0,000	4 463,600	4 463,600	44,17	0,00	0,00	197 157,21	197 157,21	197 157,21	100,00%
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	1 562,260	1 562,260	763,00	0,00	0,00	1 192 004,38	1 192 004,38	1 192 004,38	100,00%
137	636195111R	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	M2	0,000	4 463,600	4 463,600	357,00	0,00	0,00	1 593 505,20	1 593 505,20	1 593 505,20	100,00%
		Celkem						33 352 268,80	- 6 111 253,89	5 276 219,41	32 517 234,32	- 835 034,48	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

1		Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	377 812 002,59
	2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	393 785 103,26
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	476 479 974,94
	3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,23%
4=(25/1)*100		Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100		Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,87%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	16 735 368,02
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,43%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 343 600,78

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	15,67%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,24%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	63 891 804,96
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	188 906 001,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč
14=137366000-37	

40= (19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,87%																	
				- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
				Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimus (15% nebo limit 137 366 000,- Kč)
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	- 25 958 548,45	41 931 649,12	15 973 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 515 664,79	35 699 508,81	12 183 844,02	59 215 173,60	- 62 553,68	3 656 232,12	4 551 524,00	4 676 631,36	3 998 392,61
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skálního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tloušťek AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbínové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostříku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatfídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--

1,05%
3 998 392,61
133 367 607,39

5 -
» minimis
limit 15 %
$38=(37/1)*100$
1,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,42%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,63%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	39
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/14

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 39 pro ZBV 14	28	
08 Povodí Vltavy	1	
09 Vyjádření AD č. 23	3	
10 Vyjádření AD č. 46	8	
11 Stanovisko projektanta RDS č. 4	1	
12 Oznámení zhotovitele o změně	1	
13 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
14 Vyjádření Povodí Vltavy - spárování	1	
15 E-mail AD - 5.9.2022	1	
16 Požadavek Povodí Vltavy	1	
17 Vyjádření AD č. 64	1	
18 Geodetické protokoly	60	
19 Fotodokumentace	4	
20 Listy SD	17	
21 Zápis Ing. Klofáče do obch. rejstříku	2	
22 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku	6	
23 Stanovisko TDS k ZBV 39	1	
Počet listů celkem	137	

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce													
1	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	M2	50,000	150,900	100,900	91,95	4 597,50	0,00	9 277,76	13 875,26	9 277,76	201,80%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek											
		SoD 100*0.5 stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]											
2	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	60,000	60,000	0,000	91,95	5 517,00	0,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00%
		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
		SoD (20*0.5)+(100*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]											
3	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	26,23	289 238,21	0,00	0,00	289 238,21	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
		SoD 11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrka s příměsí jemnozrné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]											
4	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	102,45	1 129 716,15	0,00	0,00	1 129 716,15	0,00	0,00%
		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm											
		SoD 11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]											
5	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	27 731,600	14 739,000	-12 992,600	59,90	1 661 122,84	-784 390,50	6 133,74	882 866,08	-778 256,76	-46,85%
		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD 13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A] 2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B] 11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C] 549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D] Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E] ZBV ZBV č. 10 dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A] dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B] A+B=102,400 [C]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102						
								Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZBV č. 17 dle geodetických protokolů km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2 km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A] km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B] km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C] km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D] km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2 km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2 km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2 km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - připočet plochy 125,6 m2=125,600 [H] km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy -1654 m2=-1 654,000 [I] km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy -580,5 m2=- 580,500 [J] km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2 km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm - odpočet plochy -1302 m2=-1 302,000 [K] km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm - odpočet plochy -459 m2=- 459,000 [L] A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=-13 095,000 [M]												
6	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 516,000	26 736,600	13 220,600	109,73	1 483 110,68	0,00	1 450 696,43	2 933 807,11	1 450 696,43	97,81%	
		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm												
		SoD 5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A] ZBV č. 17 dle geodetických protokolů km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A] km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm 2374,1 m2=2 374,100 [B] km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm 2272,6 m2=2 272,600 [C] km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm 595,5 m2=595,500 [D] km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm 851,1 m2=851,100 [E] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm 190 m2=190,000 [F] km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm 1654 m2=1 654,000 [G] km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 140 mm 580,5 m2=580,500 [H] km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.140 mm 1302 m2=1 302,000 [I] km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022 prům. tl.181 mm 459 m2=459,000 [J] km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm 1411,0 m2=1 411,000 [K] A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]												
7	113155332	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	13 995,000	13 995,000	0,000	74,99	1 049 485,05	0,00	0,00	1 049 485,05	0,00	0,00%	
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm												
		SoD 13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]												
8	113155333	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	11 027,000	11 027,000	0,000	87,43	964 090,61	0,00	0,00	964 090,61	0,00	0,00%	
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm												
		SoD 11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	22 029,000	22 029,000	0,000	166,82	3 674 877,78	0,00	0,00	3 674 877,78	0,00	0,00%
		Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm											
		SoD 5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 002,000 [A] 11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B] Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]											
10	113202111	Výthání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	88,000	88,000	0,000	91,95	8 091,60	0,00	0,00	8 091,60	0,00	0,00%
		Výthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
		SoD 48+20+20=88,000 [A]											
11	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	6 117,580	1 795,080	122,97	531 537,83	0,00	220 740,99	752 278,82	220 740,99	41,53%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD 910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A] ZBV č. 13 Odkop svahu se svahovými stupni km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I] ZBV č. 20 odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210 1,9*0,37*60,0=42,180 [A]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V)*0,25=1115,9 [T]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	1 701,750	1 701,750	0,000	84,05	143 032,09	0,00	0,00	143 032,09	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD 11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]											
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	4 077,490	4 077,490	0,000	122,97	501 408,95	0,00	0,00	501 408,95	0,00	0,00%
		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD 5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A] 11027*0.27 Štěrka hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B] Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]											
14	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	M3	3 694,800	3 694,800	0,000	84,05	310 547,94	0,00	0,00	310 547,94	0,00	0,00%
		Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3											
		SoD 910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A] 1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B] 182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C] Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]											
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	0,315	2,865	2,550	4 417,49	1 391,51	0,00	11 264,60	12 656,11	11 264,60	809,52%
		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných											
		SoD 5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A] ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,85*12=2,55											
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	17 491,010	2 467,170	504,88	7 585 236,34	0,00	1 245 624,79	8 830 861,13	1 245 624,79	16,42%
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
		SoD 1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A] 4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B] 2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C] 4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D] 2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75 dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E] Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F] ZBV č. 13 dle pol. 122101103 637=637,000 [A] ZBV č. 20 odvoz odkopané zeminydle pol. č. 122101103 42,18=42,18 [A] ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,85*12=2,55											
		ZBV č. 39 dle pol. č. 122101103 1115,9=1115,9 [A] 111301111 4463,60*0,15=669,54 [B] A+B=1 785,44 [C]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	171151222	Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m	M2	2 275,000	0,000	-2 275,000	1 323,12	3 010 098,00	-3 010 098,00	0,00	0,00	-3 010 098,00	-100,00%
		Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m											
		SoD 910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]											
		ZBV č. 39 odpočet neprovádělo se -2275,000=-2275,00											
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	13 193,160	2 467,170	16,70	179 124,03	0,00	41 201,74	220 325,77	41 201,74	23,00%
		Uložení sypaniny na skládky											
		SoD 4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A] 4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B] 4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C] 2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D] Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E] ZBV č. 13 dle pol. 122101103 637=637,000 [A] ZBV č. 20 vykopaná zemina 42,18=42,18 [A] ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,85*12=2,55 ZBV č. 39 dle pol. č. 1622701105 1785,44=1785,44 [A]											
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	27 382,869	4 687,623	138,17	3 135 802,14	0,00	647 688,87	3 783 491,01	647 688,87	20,65%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD 4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A] 2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B] 1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C] 4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D] 1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E] Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F] ZBV č. 13 dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A] ZBV č. 20 odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A] ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845 ZBV č. 39 dle pol. č. 171201201 1785,44*1,9=3 392,336 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	171201211a	Poplatek za zemník	T	10 481,925	10 481,925	0,000	23,03	241 398,73	0,00	0,00	241 398,73	0,00	0,00%
		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
		SoD 1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A] 2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B] 1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C] 182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D] Celkem: 3233,325+4204,2+2679+365,4=10 481,925 [E]											
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	182,700	182,700	0,000	254,57	46 509,94	0,00	0,00	46 509,94	0,00	0,00%
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách											
		SoD 14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]											
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	11 587,300	560,300	33,80	372 712,60	0,00	18 938,14	391 650,74	18 938,14	2,25%
		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C] ZBV č. 20 1,9*60=114,00 [A] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
23	182201101	Svahování násypů	M2	2 350,000	7 664,800	5 314,800	43,01	101 073,50	0,00	228 589,55	329 663,05	228 589,55	36,22%
		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině											
		SoD (420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A] ZBV č. 13 dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102						
								Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [U]												
24	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	11 345,000	80,110	-11 264,890	36,89	418 517,05	-415 561,78	0,00	2 955,27	-415 561,78	-99,29%	
		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm												
		SoD 490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A] 910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B] 4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C] Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D] ZBV č. 39 odpočet, neprovádělo se -11264,89=-11 264,890 [A]												
25	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	20,49	232 459,05	0,00	0,00	232 459,05	0,00	0,00%	
26	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	KG	283,625	283,625	0,000	155,44	44 086,67	0,00	0,00	44 086,67	0,00	0,00%	
27	184802631	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,26	48 329,70	0,00	0,00	48 329,70	0,00	0,00%	
		Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko												
28	185803113	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	11 345,000	0,000	4,61	52 300,45	0,00	0,00	52 300,45	0,00	0,00%	
		Ošetření travníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1												
29	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	340,350	340,350	0,000	556,12	189 275,44	0,00	0,00	189 275,44	0,00	0,00%	
		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2												
		SoD 11345.000*0.01*3=340,350 [A]												
		2 Zakládání												
30	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm	M3	16,530	16,530	0,000	3 321,98	54 912,33	0,00	0,00	54 912,33	0,00	0,00%	
		Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm												
		SoD 1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A] 2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B] Celkem: 1.53+15=16,530 [C]												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39														
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								102						
								Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4 Vodorovné konstrukce												
31	45131777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	5 223,400	5 314,800	91,400	581,54	3 037 616,04	-441 854,09	495 006,85	3 090 768,80	53 152,76	1,75%	
		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého												
		ZBV č. 13 dle geoetického zaměření Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]												
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5223,4=-5 223,400 [V] celkem U+V=- 759,800 [W]												
32	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	9,950	9,950	0,000	8 203,04	81 620,25	0,00	0,00	81 620,25	0,00	0,00%	
		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek												
		SoD (0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3 =9,950 [A]												
33	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	M3	3,000	0,000	-3,000	3 481,56	10 444,68	-10 444,68	0,00	0,00	-10 444,68	-100,00%	
		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu												
		SoD 5.0*3.0*0.2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]												
		ZBV č. 39 odpočet neprovádělo se -3,00=-3,00												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 Komunikace pozemní											
34	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	M2	63,750	63,750	0,000	152,90	9 747,38	0,00	0,00	9 747,38	0,00	0,00%
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD (0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A] 20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B] Celkem: 7.75+56=63,750 [C]											
35	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	M2	6 552,000	6 552,000	0,000	154,21	1 010 383,92	0,00	0,00	1 010 383,92	0,00	0,00%
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm											
		SoD (910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]											
36	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	17 520,100	17 910,100	390,000	215,26	3 771 376,73	0,00	83 951,40	3 855 328,13	83 951,40	2,23%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm											
		SoD 11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A] 910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B] Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]											
		ZBV č. 20 podklad ze ŠD v rozšíření 1,9*60=114,00 [A]											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
37	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	3 731,000	3 731,000	0,000	298,95	1 115 382,45	0,00	0,00	1 115 382,45	0,00	0,00%
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm											
		SoD 910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]											
38	564951413R	Recyklovaná směs (v mísicím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm	M2	19 007,200	0,000	-19 007,200	174,41	3 315 045,75	-3 315 045,75	0,00	0,00	-3 315 045,75	-100,00%
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
		SoD 11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A] 5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B] Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]											
		ZBV č. 23 odpočet původního množství -19 007,20 nahrazeno novou položkou č. 151											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	565125000R	Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm	M2	13 995,000	20 155,500	6 160,500	246,93	3 455 785,35	0,00	1 521 212,27	4 976 997,62	1 521 212,27	44,02%
		Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm											
		SoD 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]											
		ZBV č. 37 vrstva SAL Geodetický protokol D 6/2020 505,00=505,000 [A] D 13/2020 1873,00=1 873,000 [B] Š II 60/2021 450,00=450,000 [C] Š II 78/2021 1562,30=1 562,300 [D] Š II 100/2021 2203,30=2 203,300 [E] Š II 15/2022 251,90=251,900 [F] Š II 49/2022 2175,00=2 175,000 [G] Š II 63/2022 143,30=143,300 [H] Š II 66/2022 1957,40=1 957,400 [I] Š II 10/2023 2982,70=2 982,700 [J] Š II 22/2023 827,40+467,80=1 295,200 [K] Š II 23/2023 1859,90=1 859,900 [L] Š II 25/2023 1414,50=1 414,500 [M] Š II 30/2023 1482,00=1 482,000 [N] odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [O] Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 160,500 [P]											
40	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	18 180,800	18 882,900	702,100	235,41	4 279 942,13	0,00	165 281,36	4 445 223,49	165 281,36	3,86%
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm											
		SoD 11027*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A] 5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B] Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]											
		ZBV č. 21 protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo vrstva navíc 52,1=52,100 [A]											
41	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm	M2	3 435,000	3 435,000	0,000	402,88	1 383 892,80	0,00	0,00	1 383 892,80	0,00	0,00%
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm											
		SoD 4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]											
130	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	M2	2 034,900	2 034,900	0,000	362,06	736 755,89	0,00	0,00	736 755,89	0,00	0,00%
		Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm											
		SoD (11027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]											
42	572531131	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	M	6 674,400	6 674,400	0,000	128,96	860 730,62	0,00	0,00	860 730,62	0,00	0,00%
		Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm											
		SoD 21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]											
43	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	38 153,750	38 803,750	650,000	28,06	1 070 594,23	0,00	18 239,00	1 088 833,23	18 239,00	1,70%
		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2											
		SoD 11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A] 13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B] 5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C] Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]											
		ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2	M2	40 367,809	47 238,609	6 870,800	12,24	494 101,98	0,00	84 098,59	578 200,57	84 098,59	17,02%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2											
		ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A]											
		ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]											
		ZBV č. 37 vrstva SAL dle pol. č. 565125000R 6160,50 m2											
45	573231113R	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2	M2	41 348,000	41 554,400	206,400	30,47	1 259 873,56	0,00	6 289,01	1 266 162,57	6 289,01	0,50%
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2											
		SoD 11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E] Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]											
		ZBV ZBV č. 10 42,1 dle zaměření =42,100 [A]											
		ZBV č. 21 protokol Š II 100/21 km 10,360 -10,841 vpravo ACL 16 vyrovňávka tl. 60 mm.....164,3 m2 - připočet (vrstva navíc) 164,30=164,300 [A]											
46	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	40 698,000	41 408,300	710,300	241,37	9 823 276,26	0,00	171 445,11	9 994 721,37	171 445,11	1,75%
		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
		SoD 11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D] Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]											
		ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A]											
		ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	44 402,580	43 003,980	-1 398,600	327,65	14 548 505,34	-685 017,86	226 766,57	14 090 254,05	-458 251,29	-3,15%
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm											
		SoD 11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A] 13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B] 2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C] (5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D] (4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E] 183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F] Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G] ZBV ZBV č. 10 42,1 dle zaměření =42,100 [A] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A] ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 km 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. prům tl. 84,1 mm -2255=-2 255,000 [A] protokol Š II 100/2021 km 10,360 -10,841 vpravo ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm (vrstva navíc) 164,3=164,300 [B] A+B=-2 090,700 [C]											
48	578133131	Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	3 250,000	0,000	-3 250,000	518,12	1 683 890,00	-1 683 890,00	0,00	0,00	-1 683 890,00	-100,00%
		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm											
		SoD 1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A] ZBV ZBV č. 12 odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250											
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	5 226,400	5 314,800	88,400	2 927,76	15 301 644,86	-2 233 295,33	2 492 109,31	15 560 458,84	258 813,98	1,69%
		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu											
		SoD (2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A] 970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B] 910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C] Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D] ZBV č. 13 dle geoetického zaměření Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102						
								Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7=188,700 [M] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [N] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [O] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [P] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [Q] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [R] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [S] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [T] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] odpočet původního množství -5226,4=-5 226,400 [V] celkem U+V=- 762,800 [W]												
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	60,000	60,000	0,000	396,53	23 791,80	0,00	0,00	23 791,80	0,00	0,00%	
		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2												
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	M2	12,000	12,000	0,000	237,30	2 847,60	0,00	0,00	2 847,60	0,00	0,00%	
		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní												
		SoD 60°0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]												
8		Trubní vedení												
56	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	609,76	1 219,52	0,00	0,00	1 219,52	0,00	0,00%	
		vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm												
57	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	676,46	1 352,92	0,00	0,00	1 352,92	0,00	0,00%	
		vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm												
55	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 041,47	2 082,94	0,00	0,00	2 082,94	0,00	0,00%	
		vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm												
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	M	20,000	20,000	0,000	1 295,34	25 906,80	0,00	0,00	25 906,80	0,00	0,00%	
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150												
		2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]												
53	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	35 858,74	35 858,74	0,00	0,00	35 858,74	0,00	0,00%	
		Vpustí kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm												
54	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	2,000	2,000	0,000	6 416,78	12 833,56	0,00	0,00	12 833,56	0,00	0,00%	
		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální												
58	898121129	Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	M	32,000	32,000	0,000	5 181,24	165 799,68	0,00	0,00	165 799,68	0,00	0,00%	
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600												
		SoD 13+19 sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	898161134	Sanace potrubí vložkování skelným rukávem DN 1000 tl.8,0 mm	M	32,000	32,000	0,000	22 912,62	733 203,84	0,00	0,00	733 203,84	0,00	0,00%
		Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000											
		SoD 13+19 sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]											
60	899131115R	Bourání uličních vpustí kompletních	KUS	3,000	3,000	0,000	1 344,82	4 034,46	0,00	0,00	4 034,46	0,00	0,00%
		Výměna šachtového rámu [technologii Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]											
		SoD 2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]											
		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
67	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	KUS	66,168	66,168	0,000	363,84	24 074,57	0,00	0,00	24 074,57	0,00	0,00%
69	40445175	odrazka na svodidla V.1.B	KUS	54,800	54,800	0,000	716,16	39 245,57	0,00	0,00	39 245,57	0,00	0,00%
		odrazka na svodidla V.1.B											
71	40445175a	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	4,000	0,000	941,84	3 767,36	0,00	0,00	3 767,36	0,00	0,00%
73	404454040	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,000	1,000	0,000	1 306,83	1 306,83	0,00	0,00	1 306,83	0,00	0,00%
74	404454070	značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 862,95	3 725,90	0,00	0,00	3 725,90	0,00	0,00%
75	404454320	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm	KUS	2,000	2,000	0,000	1 377,06	2 754,12	0,00	0,00	2 754,12	0,00	0,00%
62	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	10,000	0,000	-10,000	7 829,44	78 294,40	-78 294,40	0,00	0,00	-78 294,40	-100,00%
		ZBV č. 37 neprovádělo se											
93	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	70,000	24,000	135,29	6 223,34	0,00	3 246,96	9 470,30	3 246,96	52,17%
		ZBV č. 38 podklad pod svodidla 12*2=24											
97	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	13,000	0,000	1 784,45	23 197,85	0,00	0,00	23 197,85	0,00	0,00%
99	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	20,000	0,000	6 372,85	127 457,00	0,00	0,00	127 457,00	0,00	0,00%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	10,000	0,000	-10,000	863,54	8 635,40	-8 635,40	0,00	0,00	-8 635,40	-100,00%
		ZBV č. 37 neprovádělo se											
63	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	M	2 740,000	2 749,000	9,000	1 093,82	2 997 066,80	0,00	9 844,38	3 006 911,18	9 844,38	0,33%
		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]											
		SoD 150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A] 2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B] Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 39/2023 km 13,887-13,896 vpravo 9=9											
64	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m	M	48,000	208,000	160,000	5 181,24	248 699,52	0,00	828 998,40	1 077 697,92	828 998,40	333,33%
		SoD 24+24=48,000 [A]											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 39/2023 km 13,764-13,888 vpravo 124 m km 13,895-13,979 vpravo 84 m 124+84=208 odpočet původního množství -48 208-48=160,00											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,000	2 302,78	55 266,72	0,00	0,00	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m											
		SoD 24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]											
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,000	276,33	18 304,10	0,00	0,00	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního											
		SoD (2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]											
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,000	217,61	11 925,03	0,00	0,00	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD 2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]											
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	4,000	0,000	316,63	1 266,52	0,00	0,00	1 266,52	0,00	0,00%
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,000	609,08	3 045,40	0,00	0,00	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly											
		SoD 2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]											
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,000	995,95	4 979,75	0,00	0,00	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu											
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	7,000	0,000	995,95	6 971,65	0,00	0,00	6 971,65	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky											
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	2 450,000	0,000	13,24	32 438,00	0,00	0,00	32 438,00	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní											
		SoD 2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]											
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	137,000	0,000	19,57	2 681,09	0,00	0,00	2 681,09	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní											
		SoD 35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]											
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,000	11,51	12 085,50	0,00	0,00	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní											
		SoD 550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]											
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	9 466,000	9 466,000	0,000	23,03	218 001,98	0,00	0,00	218 001,98	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní											
		SoD 9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]											
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	116,750	0,000	110,53	12 904,38	0,00	0,00	12 904,38	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní											
		SoD 100 V13a - dle situace=100,000 [A] 10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B] 3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C] Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]											
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	18,000	0,000	234,88	4 227,84	0,00	0,00	4 227,84	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní											
		SoD (3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]											
84	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	2 450,000	2 450,000	0,000	39,15	95 917,50	0,00	0,00	95 917,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní											
		SoD 2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]											
85	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	M	137,000	137,000	0,000	55,27	7 571,99	0,00	0,00	7 571,99	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní											
		SoD 35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	1 050,000	1 050,000	0,000	39,15	41 107,50	0,00	0,00	41 107,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní											
		SoD 550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]											
87	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	9 466,000	9 466,000	0,000	78,29	741 093,14	0,00	0,00	741 093,14	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní											
		SoD 9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]											
88	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	116,750	116,750	0,000	385,71	45 031,64	0,00	0,00	45 031,64	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní											
		SoD 100 V13a - dle situace=100,000 [A] 10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B] 3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C] Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]											
89	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	M2	18,000	18,000	0,000	690,83	12 434,94	0,00	0,00	12 434,94	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní											
		SoD (3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]											
90	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	13 103,000	13 103,000	0,000	2,88	37 736,64	0,00	0,00	37 736,64	0,00	0,00%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky											
		SoD 2450+137+1050+9466 dle pol. 9151111111, 9151111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]											
91	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	M2	134,750	134,750	0,000	6,91	931,12	0,00	0,00	931,12	0,00	0,00%
		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy											
		SoD 116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 9151311115=134,750 [A]											
92	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	46,000	46,000	0,000	518,95	23 871,70	0,00	0,00	23 871,70	0,00	0,00%
		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
		SoD 29+17 dle situace=46,000 [A]											
94	919122122	Těsnění spár záhlívkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	M	696,000	46,000	-650,000	116,82	81 306,72	-75 933,00	0,00	5 373,72	-75 933,00	-93,39%
		Utěsnění dilatačních spár záhlívkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlívkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm											
		SoD 1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A] 46 podél obrubníku=46,000 [B] Celkem: 650+46=696,000 [C] ZBV ZBV č. 12 odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky. 12 odpočet -650											
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m	KUS	227,500	227,500	0,000	4 029,86	916 793,15	0,00	0,00	916 793,15	0,00	0,00%
		Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm											
		SoD 910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]											
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	13,000	13,000	0,000	3 333,04	43 329,52	0,00	0,00	43 329,52	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm											
		SoD 13 v km 13,89=13,000 [A]											
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	M	20,000	20,000	0,000	5 724,70	114 494,00	0,00	0,00	114 494,00	0,00	0,00%
		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm											
		SoD 20 v km 12,925=20,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	M3	29,680	29,680	0,000	4 081,06	121 125,86	0,00	0,00	121 125,86	0,00	0,00%
		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25											
		SoD (13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]											
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	T	0,077	0,077	0,000	32 954,10	2 537,47	0,00	0,00	2 537,47	0,00	0,00%
		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2											
		SoD ((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]											
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	M2	3 185,000	3 185,000	0,000	176,12	560 942,20	0,00	0,00	560 942,20	0,00	0,00%
		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m											
		SoD 910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]											
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	M2	40 698,000	40 698,000	0,000	102,22	4 160 149,56	0,00	0,00	4 160 149,56	0,00	0,00%
		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií											
		SoD 11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A] 13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B] Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]											
104	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	M	4 826,200	5 068,200	242,000	116,82	563 796,68	0,00	28 270,44	592 067,12	28 270,44	5,01%
		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry											
		SoD (55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A] 4580 podélná spára=4 580,000 [B] (4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C] Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D] ZBV ZBV č. 10 33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A] ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208											
105	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	M	5 585,200	4 935,200	-650,000	130,38	728 198,38	-84 747,00	0,00	643 451,38	-84 747,00	-11,64%
		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
		SoD (55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A] 46 podél obrubníku=46,000 [B] 4580 podélná spára=4 580,000 [C] (4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D] 650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E] Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F] ZBV č. 12 odpočet -650											
106	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	M	2 290,000	2 290,000	0,000	95,49	218 672,10	0,00	0,00	218 672,10	0,00	0,00%
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m											
		SoD 4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN	M	32,000	32,000	0,000	481,28	15 400,96	0,00	0,00	15 400,96	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm											
		SoD 8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A] 8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B] 2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C] Celkem: 8+8+16=32,000 [D]											
108	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	M	16,000	16,000	0,000	96,26	1 540,16	0,00	0,00	1 540,16	0,00	0,00%
		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m											
		SoD (19-8)+(13-8) =16,000 [A]											
109	938902500R	Čištění stávajících uličních vpustí	KUS	43,000	43,000	0,000	2 562,99	110 208,57	0,00	0,00	110 208,57	0,00	0,00%
		SoD 7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A] 29 UV dle situace=29,000 [B] Celkem: 14+29=43,000 [C]											
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	M2	29 671,000	29 731,300	60,300	3,65	108 299,15	0,00	220,09	108 519,24	220,09	0,20%
		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného											
		SoD 13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A] ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A]											
111	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	M2	4 580,000	4 580,000	0,000	376,22	1 723 087,60	0,00	0,00	1 723 087,60	0,00	0,00%
		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm											
		SoD 4580*0.5*2=4 580,000 [A]											
112	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	M	2 444,000	2 844,000	400,000	291,03	711 277,32	0,00	116 412,00	827 689,32	116 412,00	16,37%
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního											
		SoD 2374 VLEVO=2 374,000 [A] 70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B] Celkem: 2374+70=2 444,000 [C] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	10,000	10,000	0,000	1 727,08	17 270,80	0,00	0,00	17 270,80	0,00	0,00%
		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou											
		SoD 2 dle situace vč. sloupků=2,000 [A] 6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B] Celkem: 2+8=10,000 [C]											
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	2,000	0,000	103,62	207,24	0,00	0,00	207,24	0,00	0,00%
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol											
115	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	M	13,000	13,000	0,000	1 135,27	14 758,51	0,00	0,00	14 758,51	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm											
		13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	966008116R	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	15,000	15,000	0,000	1 892,11	28 381,65	0,00	0,00	28 381,65	0,00	0,00%
		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm											
		15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]											
117	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	7,000	7,000	0,000	287,85	2 014,95	0,00	0,00	2 014,95	0,00	0,00%
		Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm											
118	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	M2	10,000	110,900	100,900	84,40	844,00	0,00	8 515,96	9 359,96	8 515,96	1009,00%
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným											
		SoD 10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]											
	997	Přesun sutě											
119	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 197,830	3 573,854	376,024	13,82	44 194,01	0,00	5 196,65	49 390,66	5 196,65	11,76%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD 3197.83=3 197,830 [A]											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] dle pol. č. 153 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm (276*0,6)*0,25*2=82,8 [C] (A+B)*0,22*2,0+82,8=204,24 [D]											
		ZBV č. 38 dle pol. č. 113107223 a 132151101 325,5*(0,25+0,3)/2*1,9+0,9*1,9=171,784											
120	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 494,356	2 494,356	0,000	13,82	34 472,00	0,00	0,00	34 472,00	0,00	0,00%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD 741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]											
121	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	79 690,604	84 954,940	5 264,336	7,03	560 224,95	0,00	37 008,28	597 233,23	37 008,28	6,61%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD (3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]											
		ZBV ZBV č. 27 dle pol. č. 997221551 204,24*14=2859,36 [A]											
		ZBV č. 38 dle pol. č. 997221551 171,784*14=2404,976											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	11 138,845	11 239,165	100,320	27,06	301 417,15	0,00	2 714,66	304 131,81	2 714,66	0,90%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km											
		SoD 2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A] ZBV č. 38 svodidlo (36+48+48)*0,76=100,32											
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	155 943,830	156 837,590	893,760	0,58	90 447,42	0,00	518,38	90 965,80	518,38	0,57%
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD 11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A] ZBV č. 38 dle pol. č. 997221561 63,84*14=893,76											
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	310,867	5 309,345	4 998,478	51,81	16 106,02	0,00	258 971,15	275 077,17	258 971,15	1607,92%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km											
		SoD 11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A] ZBV č. 13 dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A] ZBV č. 15 žlab 69,4*0,134=9,300 [A] podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B] svodidlo 400*0,042=16,800 [C] A+B+C=66,972 [D] ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] (A+B)*0,15*2,3=95,220 [C] ZBV č. 39 dle pol. 114203102 1562,26*2,6=4061,876 [A]											
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	4 352,138	74 330,830	69 978,692	5,76	25 068,31	0,00	403 077,27	428 145,58	403 077,27	1607,92%
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
		SoD 310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A] ZBV č. 13 do vzdálenosti 15 km dle pol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 [A] ZBV č. 15 do vzdálenosti 15 km dle pol č. 997221571 66,972*14=937,608 [A] ZBV ZBV č. 27 dle pol. č. 997221571 95,22*14=1 333,080 [A] ZBV č. 39 dle pol. č. 997221571 4061,876*14=56866,264 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	10 352,419	10 561,651	209,232	34,54	357 572,55	0,00	7 226,87	364 799,42	7 226,87	2,02%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového											
		SoD 310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A] 10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B] Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C] ZBV č. 15 dle pol č. 997221571 50,172=50,172 [A] ZBV ZBV č. 27 dle pol. č. 9777221571 95,22=95,220 [A] ZBV č. 38 svodidlo (36+48)*0,76=63,84											
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	3 197,830	4 348,264	1 150,43	34,54	110 453,05	0,00	39 735,99	150 189,04	39 735,99	100,00%
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
		SoD 3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A] ZBV č. 13 dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A] ZBV ZBV č. 27 dle pol. č. 997221551 204,24=204,24 [A] ZBV č. 38 dle pol. č. 997111551 171,784=171,784											
	998	Přesun hmot											
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	5 047,476	5 752,793	705,32	147,76	745 815,05	0,00	104 217,64	850 032,69	104 217,64	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu											
		ZBV č. 13 dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A] ZBV č. 38 svodidlo160*0,76=121,6 dlažba 15*0,101=1,515 palisáda 75*0,6702=50,265 celkem 121,60+1,515+50,265=173,38											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	5 047,476	5 752,793	705,32	29,55	149 152,92	0,00	20 842,12	169 995,04	20 842,12	100,00%
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m											
		ZBV č. 13 dle pol. 998225111 851,2*0,614=522,637 [A]											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]											
		ZBV č. 38 dle pol. č. 998225111 173,38=173,38											
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	60 337,73	60 337,725	1,00	0,00	0,00	60 337,73	60 337,73	60 337,73	100,00%
		Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací											
		"ZBV ZBV č. 10 217,26=217,260 [A]											
		ZBV ZBV č. 13 19214,04=19 214,040 [A]"											
		ZBV č. 15 3566,36=3566,36											
		ZBV č. 20 1048,17=1048,17											
		ZBV č. 27 2188,111=2188,111											
		ZBV č. 38 7717,175=7717,175											
		ZBV č. 39 26 386,609=26 386,609											
131	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	0,000	34,000	34,00	81,10	0,00	0,00	2 757,40	2 757,40	2 757,40	100,00%
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm											
		ZBV ZBV č. 10 33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU	M2	0,000	5 400,600	5 400,600	44,17	0,00	0,00	238 544,50	238 544,50	238 544,50	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11											
		ZBV č. 13 Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]											
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	1 860,110	1 860,110	763,00	0,00	0,00	1 419 263,94	1 419 263,94	1 419 263,94	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 851*0,35=297,850 [A]											
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,7 [V] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,60=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,30=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,70=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,50=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,40=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,50=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,70=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T] 4463,60*0,35=1 562,26[W]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	0,000	936,000	936,000	74,90	0,00	0,00	70 106,40	70 106,40	70 106,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m 6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]											
135	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	M3	0,000	637,000	637,000	964,00	0,00	0,00	614 068,00	614 068,00	614 068,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 01											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 13 dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A] km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B] km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C] km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D] km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E] km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F] km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G] km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]											
136	452313141R	ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění	M3	0,000	91,875	91,875	3 200,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F] A+B+C+D+F=91,875 [G]											
137	636195111R	Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů	M2	0,000	5 314,800	5 314,800	357,00	0,00	0,00	1 897 383,60	1 897 383,60	1 897 383,60	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou dle geodetického zaměření km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A] km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D] km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E] km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F] A+B+C+D+E+F=851,200 [G]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102						
								Celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ZBV č. 39 geodetické protokoly Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo 89,90=89,900 [A] Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo 191,10=191,100 [B] Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo 112,90=112,900 [C] Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo 63,0+55,20-77=41,200 [D] Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo 191,60=191,600 [E] Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo 67,90+268,30=336,200 [F] Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo 303,20=303,200 [G] Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo 187,80=187,800 [H] Š II 47/2022 km 11,671-11,780 vlevo 215,0=215,000 [I] Š II 53/2022 km 14,462-14,580 vlevo 249,30=249,300 [J] Š II 62/2022 km 11,056-11,140 vlevo 214,20=214,200 [K] Š II 65/2022 km 11,340-11,400 vlevo 47,0+160,30=207,300 [L] Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo 188,7 =188,700 [T] Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo 165,6=165,600 [M] Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo 805,3=805,300 [N] Š II 8/2023 km 11,780-11,971 vlevo 231,10+1,7=232,800 [O] Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo 75,40+21,5=96,900 [P] Š II 13/2023 km 14,425 vlevo 22,4=22,400 [Q] Š II 16/2023 km 11,928-12,060 vpravo 279,5=279,500 [R] Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo 332,7=332,700 [S] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U]												
138	69321023	celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U]	M2	0,000	1 076,400	1 076,400	144,00	0,00	0,00	155 001,60	155 001,60	155 001,60	100,00%	
		Cena položky dle ÚRS 2021 02												
		ZBV č. 13 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28 vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo 6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratiné 15% 6*(3,5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]												
139	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm	M2	0,000	170,300	170,300	149,00	0,00	0,00	25 374,70	25 374,70	25 374,70	100,00%	
		Cena položky dle ÚRS 2021 02												
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A] žulové kostky 100,9=100,900 [B] A+B=170,300 [C]												
140	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého	M2	0,000	115,900	115,900	30,40	0,00	0,00	3 523,36	3 523,36	3 523,36	100,00%	
		Cena položky dle ÚRS 2021 02												
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žulové kostky 100,9=100,900 [A] ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15												

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	M2	0,000	115,900	115,900	608,00	0,00	0,00	70 467,20	70 467,20	70 467,20	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 krajnice ze žulových kostek km 13,2-13,7 100,9=100,900 [A]											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2=15											
142	59227029	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60	M	0,000	76,340	76,340	415,00	0,00	0,00	31 681,10	31 681,10	31 681,10	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 64,9 m+ 10% ztratiné žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]											
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]											
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z betonu tl. 100 mm	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	0,00	18 807,40	18 807,40	18 807,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	0,00	5 128,66	5 128,66	5 128,66	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4=69,400 [A]											
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	0,00	145 290,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B]											
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm 1,7*60,0=102,000 [A]											
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02											
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 4,99m tl. 120-200 mm průměrná tl. 160 mm 5,0*52,0=300,00 [A]											
149	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	M2	0,000	2 259,400	2 259,40	244,00	0,00	0,00	551 293,60	551 293,60	551 293,60	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo ACP 16 prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	577135132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	1 342,000	1 342,00	270,00	0,00	0,00	362 340,00	362 340,00	362 340,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/01											
		ZBV č. 21 protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc) 1342=1 342,000 [A]											
151	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	0,000	4 510,000	4 510,00	349,00	0,00	0,00	1 573 990,00	1 573 990,00	1 573 990,00	100,00%
		Cena převzata z ÚRS 2021/02											
		ZBV č. 21 protokol Š II 89/21 13,199 - 13,696 vlevo ACL 16 modif. tl. 100 mm tloušťka 2x50 2255*2=4 510,000 [A]											
152	567123114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	19 283,200	19 283,20	256,33	0,00	0,00	4 942 862,66	4 942 862,66	4 942 862,66	100,00%
		cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)											
		ZBV č. 23 nahrazuje pol. č. 38 19007,2=19 007,200 [A]											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
153	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	441,600	441,600	110,00	0,00	0,00	48 576,00	48 576,00	48 576,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] (183,8+92,2)*0,6=165,600 [C] A+B+C=441,600 [C]											
154	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	0,000	276,000	276,000	256,00	0,00	0,00	70 656,00	70 656,00	70 656,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 geodetický protokol Š II 51/2022 92,2 m2=92,200 [A] geodetický protokol Š II 58/2022 183,8 m2 =183,800 [B] A+B=276,000 [C]											
155	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	M2	0,000	165,600	165,600	240,00	0,00	0,00	39 744,00	39 744,00	39 744,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm 276*0,6=165,600 [A]											
156	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	M	0,000	318,585	318,585	293,00	0,00	0,00	93 345,40	93 345,40	93 345,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2022 02											
		ZBV ZBV č. 27 318,585=318,585											
157	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	0,000	2,250	2,250	4 160,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 0,5*0,5*0,75*12											
158	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	0,000	20,000	20,000	192,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 6+4+6+4=20											
225	74910606	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	KUS	0,000	10,000	10,000	6 110,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	
		Cena položky dle ÚRS 2023 02											
		ZBV č. 37 zábradlí propustek 6+4+6+4=20m											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	0,000	315,000	315,000	64,80	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	20 412,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 krajnice pod svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-139803 210*1,5m=315,00 tl. 250-300mm											
160	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	0,900	0,900	585,00	0,00	0,00	526,50	526,50	526,50	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 1,0*0,25*0,15*24=0,9											
161	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m	KUS	0,000	75,000	75,000	216,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 u HV 7,5/0,11*1,1=75											
162	273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	M3	0,000	47,250	47,250	4 180,00	0,00	0,00	197 505,00	197 505,00	197 505,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 betonový práh pod nová svodidla km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*1,5*0,15=47,25											
163	273351121	Zřízení bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	560,00	0,00	0,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 km 13,7647-13,8887 km 13,8963-13,9803 210*2*0,15+1,5*0,15*4=63,90											
164	273351122	Odstranění bednění základových desek	M2	0,000	63,900	63,900	138,00	0,00	0,00	8 818,20	8 818,20	8 818,20	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 viz pol. č. 274354111											
165	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm	M2	0,000	315,000	315,000	167,00	0,00	0,00	52 605,00	52 605,00	52 605,00	100,00%
		cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 pod nová svodidla 210*1,5=315,00											
166	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	KUS	0,000	75,000	75,000	181,00	0,00	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2023 01											
		ZBV č. 38 7,5/0,11*1,1=75											
170	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	0,000	48,000	48,000	139,52	0,00	0,00	6 696,96	6 696,96	6 696,96	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 103 pol.č. 16											
		ZBV č. 38 pod stávající svodidlo 48*1,0=48,000 [A]											
167	911381124a	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m montáž s přesunem (bez dodávky)	M	0,000	48,000	48,000	1 381,67	0,00	0,00	66 320,16	66 320,16	66 320,16	100,00%
		položka převzata z SoD SO 901pol. č. 911EC3											
		dle geodetického protokolu Š II 36/2023 km 14,351-14,399 vpravo 48 m											

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14 pro ZBV 39													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								102					
								Celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	911381824	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m	M	0,000	132,000	132,000	939,00	0,00	0,00	123 948,00	123 948,00	123 948,00	100,00%
		URS 2023/1											
		ZBV č. 38 geodetický protokol Š II 36/2023 km 13,763-13,799 vpravo 36m km 13,843-13,891 vpravo 48m km 14,351-14,399 vpravo 48m 36+48+48=132											
171	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	M2	0,000	16,500	16,500	1 610,00	0,00	0,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 okolo HV 7,5*2*1,1=16,5											
172	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	0,000	208,000	208,00	77,60	0,00	0,00	16 140,80	16 140,80	16 140,80	100,00%
		Cena dle URS 2023/1											
		ZBV č. 38 nové betonové svodidlo 208=208											
		Celkem						113 362 946,56	- 12 827 207,79	25 136 493,19	125 672 231,96	12 309 285,40	10,86%

Položka

Název a evidenční číslo Stavby:

Název stavebního objektu/provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Objednatel:

Zhotovitel:

Skupina změn

Data

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

102/14

39

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

3

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 38
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOLEČNOST

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVL-24823/2021/253

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Markéta Bártová/243

DATUM
6.4.2021

věc Návrh na změnu konstrukčního řešení provádění úseků břehového opevnění v rámci opravy komunikace II/102 Praha - Štěchovice, II. etapa

Obracejme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace II/102 Praha – Štěchovice, II. Etapa s žádostí o prověření možnosti projekční změny konstrukce opevnění komunikace v některých úsecích na levém břehu nádrže Vrané.

Jedná se o úseky:

- 10,360 – 10,381 (TYP A – prostý svah se zatravněním)
- 10,381 – 10,420 (TYP B2 – svah s obalovanými geokompozity) -
- 10,420 – 10,659 (TYP A – prostý svah se zatravněním)
- 10,730 – 10,830 (TYP A – prostý svah se zatravněním)

Zpracovaná RDS v některých úsecích navrhuje umístění gabionových stěn či prostého svahu se zatravněním v místech, kde se nachází původní opevnění břehu kamennou rovnatinou nebo dlažbou do betonu.

Domníváme se tedy, že by bylo účelné opravit či doplnit konstrukci opevnění svahu v původním rozsahu a materiálu.

Žádáme o zvážení našeho návrhu z důvodu zachování pohledové celistvosti a jednotnosti konstrukcí opevnění levého břehu, tak aby opevnění komunikace bylo v těchto úsecích provedeno konstrukcí „TYP B1 odláždění svahu do sklonu“, tak jak je to prováděno v ostatních částech stavby, kde se v rámci stavby opravují břehy a kde byl původně břeh také proveden uložením kamene do betonového lože či opevněn kamennou rovnatinou.

S pozdravem

Ing. Libor Peška

vedoucí střediska – Vltava kaskáda

Co : vlastní

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 3094/2021/DDv

Datum: 13. 4. 2021

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: +

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa

Vyjádření autorského dozoru č. 23 - požadavek PVL na opevnění svahu tělesa vlevo v km 10.36–10.83

Byli jsme požádáni o vyjádření k požadavku Povodí Vltavy (PVL) na úpravu svahu tělesa SO 102 v km 10.36–10.83. Zemní těleso komunikace tvoří v předmětném úseku levý břeh nádrže VD Vrané. Požadavek PVL je přílohou vyjádření.

V PDPS bylo řešení svahu zemního tělesa navrženo takto:

- úsek km 10.360–10.381: typ A,
- úsek km 10.381–10.420: typ B2,
- úsek km 10.420–10.659: typ A,
- úsek km 10.659–10.683: typ C3 - oblast mostu SO 205,
- úsek km 10.683–10.930: typ B1

Jednotlivé typy jsou definovány zjednodušeně takto:

- typ A: prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1.75,
- typ B1: odlážděný svah do sklonu 1:1.25,
- typ B2: svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity,
- typ C3: jiná inženýrská konstrukce, typický most, svahy jsou odlážděny.

PVL požaduje provést v úsecích km 10.360–10.659 a km 10.730–10.830 svahy tělesa v úpravě typ B1, tj. jako odlážděné. Důvodem je snaha materiálově a vzhledově sjednotit stávající a navazující novou část tělesa. Požadavek PVL je zřejmý z dopsiu, který je přílohou vyjádření.

Návrh řešení svahu tělesa byl v PDPS proveden na základě znalostí a stavu a podoby konstrukcí aktuální v době zpracování přípravné dokumentace. Přítomnost dlažby nebyla na většině úseků zřejmá. Dlažba byla překryta silnou vrstvou nánosů a zarostlá náletovou vegetací. Přítomnost dlažby byla zjištěna až po zahájení zemních prací.

Posoudili jsme předložený požadavek a **za AD požadujeme, aby bylo řešení svahu v předmětném úseku provedeno dle požadavku PVL, tj. se odlážděným svahem.**

Parametry dlážděného svahu budou následující:

- nově odláždění bude v patě plynule napojeno na zachovávané odláždění,
- sklon dlážděného svahu bude max. 1:1,
- dlažba bude provedena jako spárovaná cementovou maltou, opáření omezí prorůstání vegetace dlažbou,

- v případě sklonu větším než 1:1.25 bude stabilita zlepšena uložení jednoosých geomříží HDPE pevností v tahu 50 kN/m při 5% protažení a to min. ve dvou rovinách (při cca výšce svahu do 3.0 m) s tím, že obě geomříže budou zakotveny v podkladním betonu pro dlažbu, nebo podobným způsobem,
- zásyp bude proveden nenamrzavou zeminou/kamenivem vhodnou do aktivní zóny,
- před realizací nového násypu musí být provedeno zatřídění zeminy stávajícího násypu geotechnikem, TDI a AD a to i s ohledem na geosyntetika uvažovaná pro zabudování.

Konkrétní technické řešení navrhne projektant RDS. Výsledné řešení je třeba přizpůsobit řešení navazujících konstrukcí (dle rozsahu výměny vozovky apod.).

Výše uvedené řešení pravděpodobně vyvolá potřebu dodatečného kácení dřevin v oblasti napojení nové a stávající dlažby. Dřeviny kolidující s novou konstrukcí, resp. dřeviny, jejichž kořenový systém významně zasahuje do nových konstrukcí a při stavebních pracích hrozí jeho poškození a následná ztráta stability dřeviny, budou odstraněny. Kácení bude projednáno s PVL a příslušným orgánem státní správy.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Přílohy:

- požadavek PVL z 6. 4. 2021

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. M
2. Objednatel, KSÚS, Ing. M
3. Objednatel, KSÚS, Ing. A
4. TDI, Pragoprojekt, a.s., I
5. Strabag, a.s., Karel Šimel
6. Strabag, a.s., Martin Lísá
7. Atelier PROMIKA, s.r.o.

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 1147/2022/DDv

Datum: 28. 2. 2022

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: 

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 46 - SO 102, frézování nebo bourání CB desky, úprava svahu

Byli jsme požádáni o vyjádření ke stanovisku projektanta RDS č. 4. Stanovisko projektanta je přílohou vyjádření.

Stanovisko řeší dva okruhy problémů. Jedná se o:

- Postup při volbě typu úpravy vozovky s ohledem na zbytkovou tl. CB desky.
- Požadavek PVL na úpravu svahů.

K prvnímu bodu sdělujeme následující:

- Potvrzujeme závěry projektanta RDS.
- Interpretace projektanta RDS odpovídá návrhu z přípravné dokumentace.

Ke druhému bodu sdělujeme následující:

- Za AD požadujeme postupovat dle požadavku PVL. Jedná se o trvalý požadavek PVL sdělený již po prvním nálezů do zahájení prací nánosy zakrytého stávajícího břehového opevnění.
- Bude postupováno dle vyjádření AD č. 23 ze dne 13. 4. 2021, kde byla problematika opevnění řešena.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli sděleno v předstihu před provedením prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Přílohy:

- Stanoviska projektanta RDS č. 4



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing.
2. Objednatel, KSÚS, Ing.
3. Objednatel, KSÚS, Ing.
4. TDI, Pragoprojekt, a.s.,
5. Strabag, a.s., Karel Šime
6. Strabag, a.s., Martin Lís
7. Atelier PROMIKA, s.r.o



STRABAG, a.s.
k rukám dis. Martina Lísy
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS_009/21 Ctibor

Praha, 31.05.2021

Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanovisko projektanta RDS č. 4

- 1) **Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“:**

Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.

Projektová dokumentace PDPS již vytypovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených prací s ohledem na použitou technologii.

- 2) **Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL-24823/2021/253, ze dne 6.6.2021):**

Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou z jiných typů („TYP A“ prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „**TYP B1 odláždění svahu do sklonu**“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísky, viz foto v příloze), což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhují postupovat v souladu s jeho doporučením a část zemního stavu z nevhodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.

Příloha: fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy



za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor








ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ
(sklon 1:1,25 a nižší)

Pozn.: ve staničení cca 10,465-10,540
dojde k tzv. zazubení svahu a odstranění CB
v souladu s původní PD

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

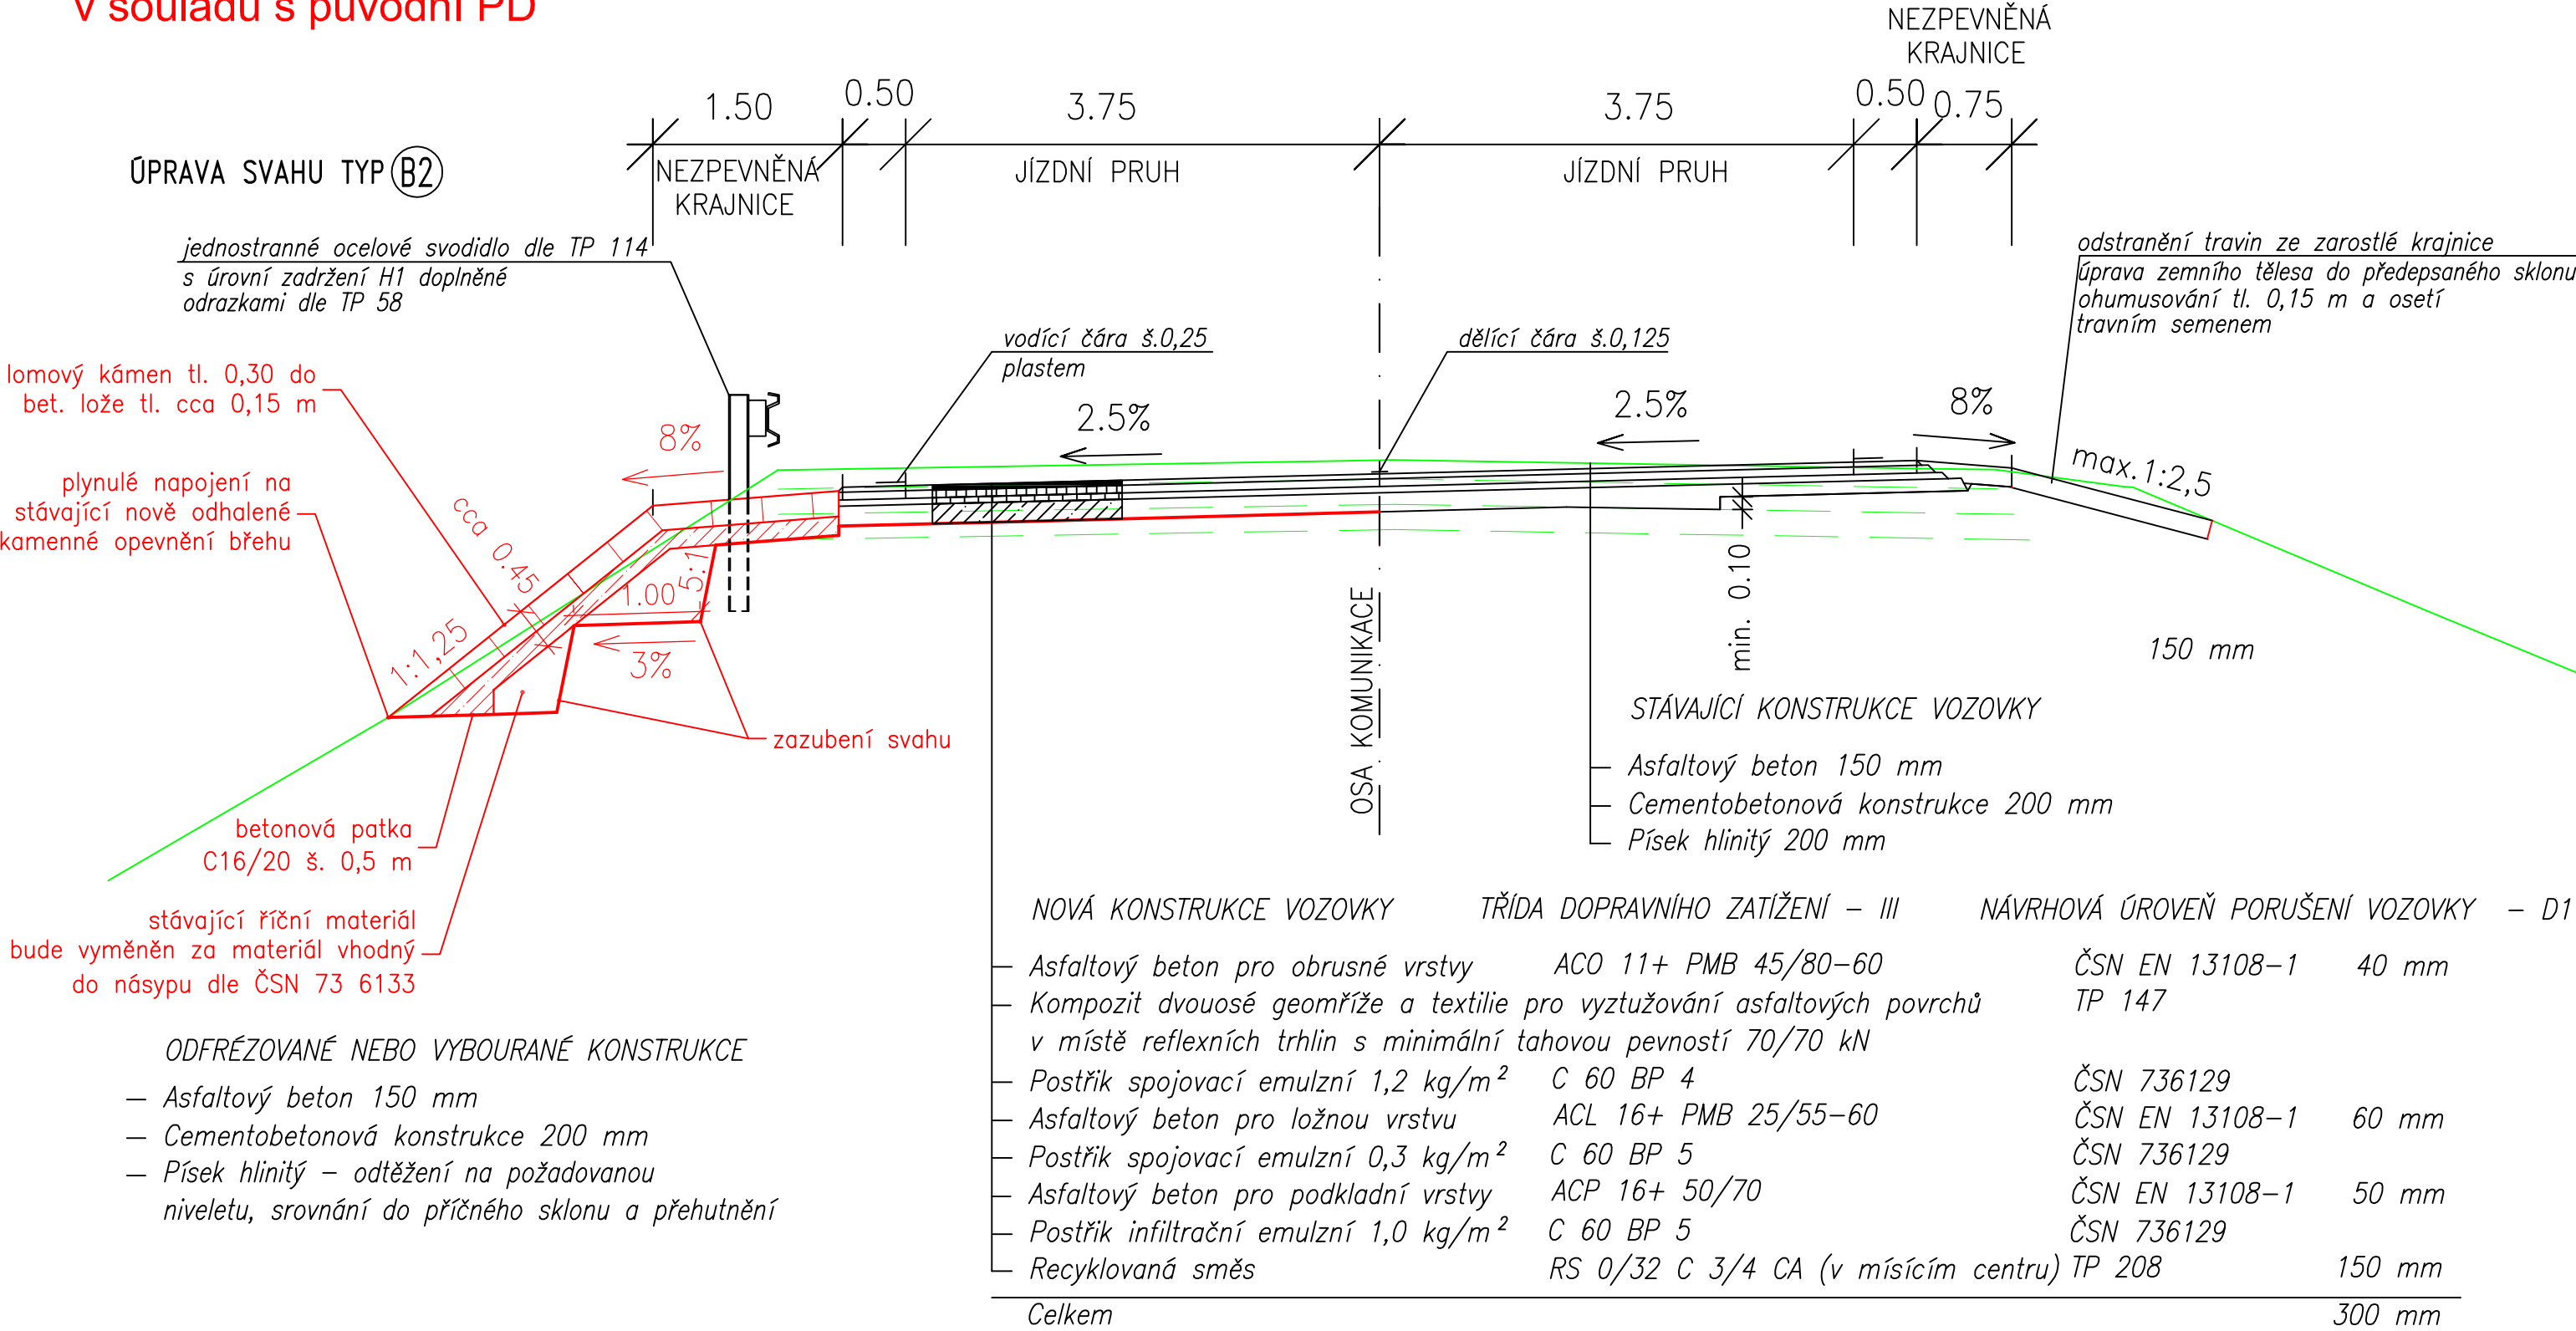

ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ

(sklon 1:1 a vyšší)

Pozn.: ve staničení cca 10,360-10,465


dojde k odstranění CB z důvodu homogenizace

podloží a tím tak k prodloužení životnosti vozovky

a také z důvodu případných kaveren pod vrstvou z CB, kde se vyskytuje říční

materiál, který je sypký a nezhutitelný

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

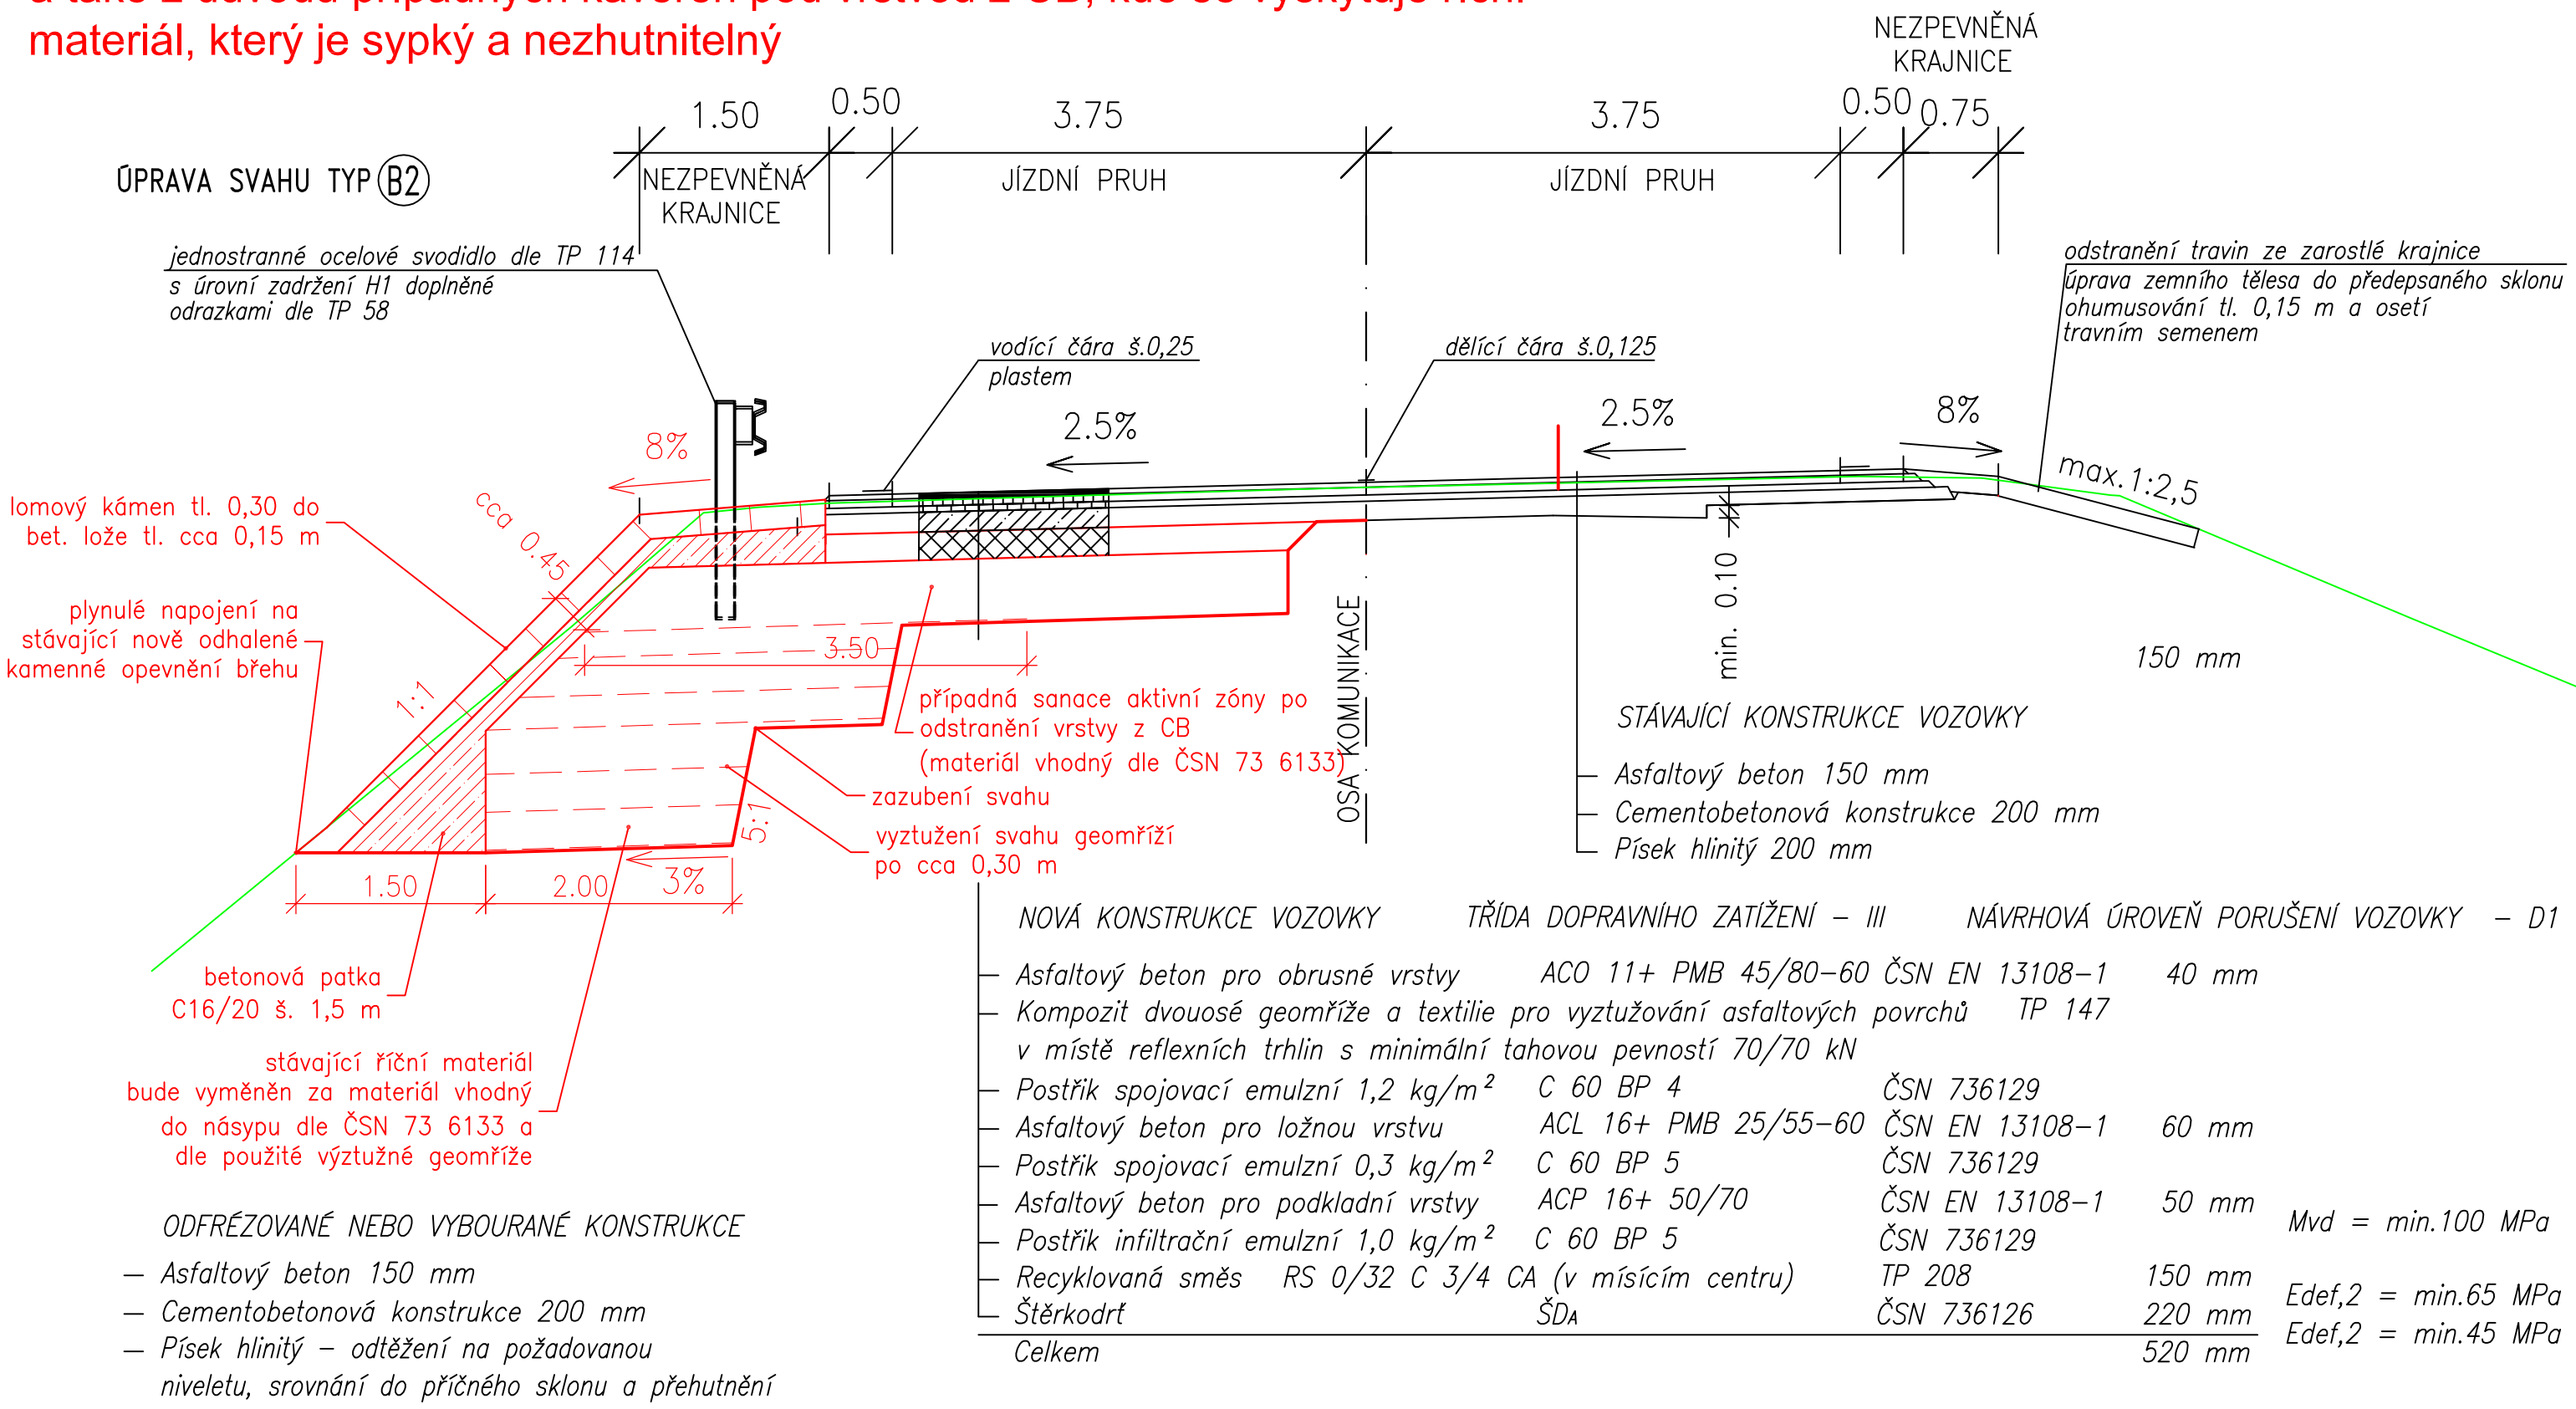

STRABAG, a.s.
k rukám dis. Martina Lísy
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS_009/21 Ctibor

Praha, 31.05.2021

Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanovisko projektanta RDS č. 4

- 1) **Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“:**

Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „...v místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů „...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.

Projektová dokumentace PDPS již vytipovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených prací s ohledem na použitou technologii.

- 2) **Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL-24823/2021/253, ze dne 6.6.2021):**

Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou z jiných typů („TYP A“ prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „**TYP B1 odláždění svahu do sklonu**“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísky, viz foto v příloze), což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhují postupovat v souladu s jeho doporučením a část zemního stavu z nevhodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.

Příloha: fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy



za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor








ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ
(sklon 1:1,25 a nižší)

Pozn.: ve staničení cca 10,465-10,540
dojde k tzv. zazubení svahu a odstranění CB
v souladu s původní PD

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

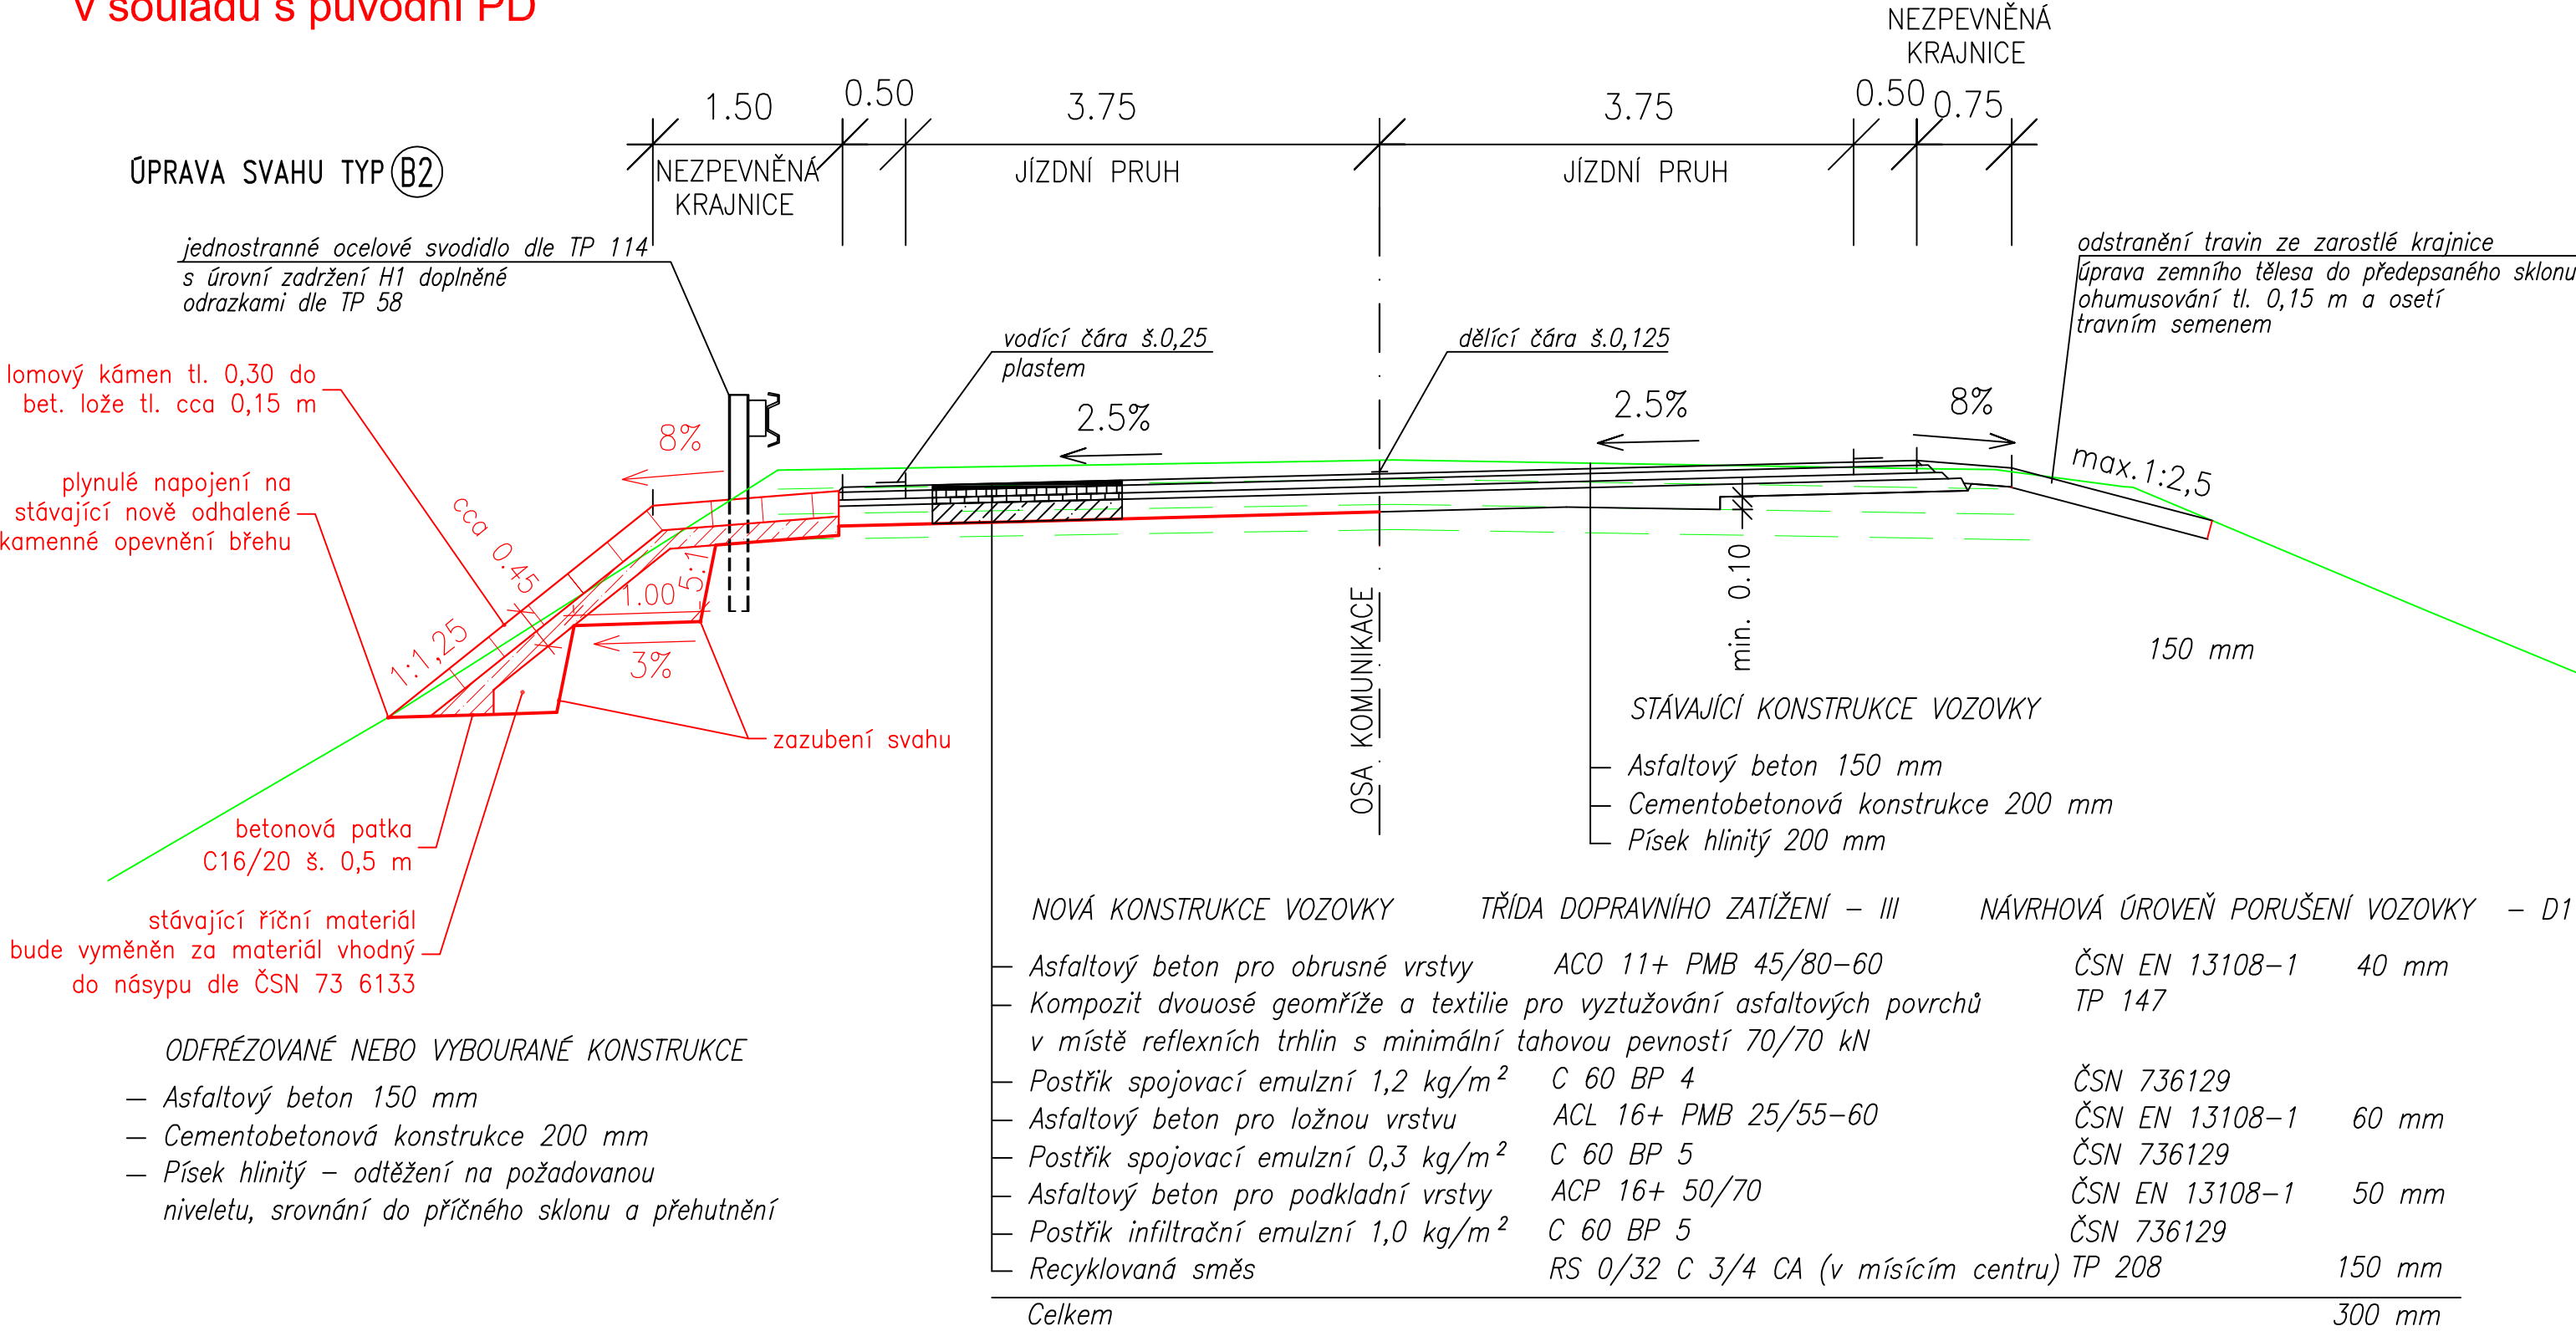

ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ

(sklon 1:1 a vyšší)

Pozn.: ve staničení cca 10,360-10,465


dojde k odstranění CB z důvodu homogenizace

podloží a tím tak k prodloužení životnosti vozovky

a také z důvodu případných kaveren pod vrstvou z CB, kde se vyskytuje říční

materiál, který je sypký a nezhutitelný

S9,5
SILNICE II/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

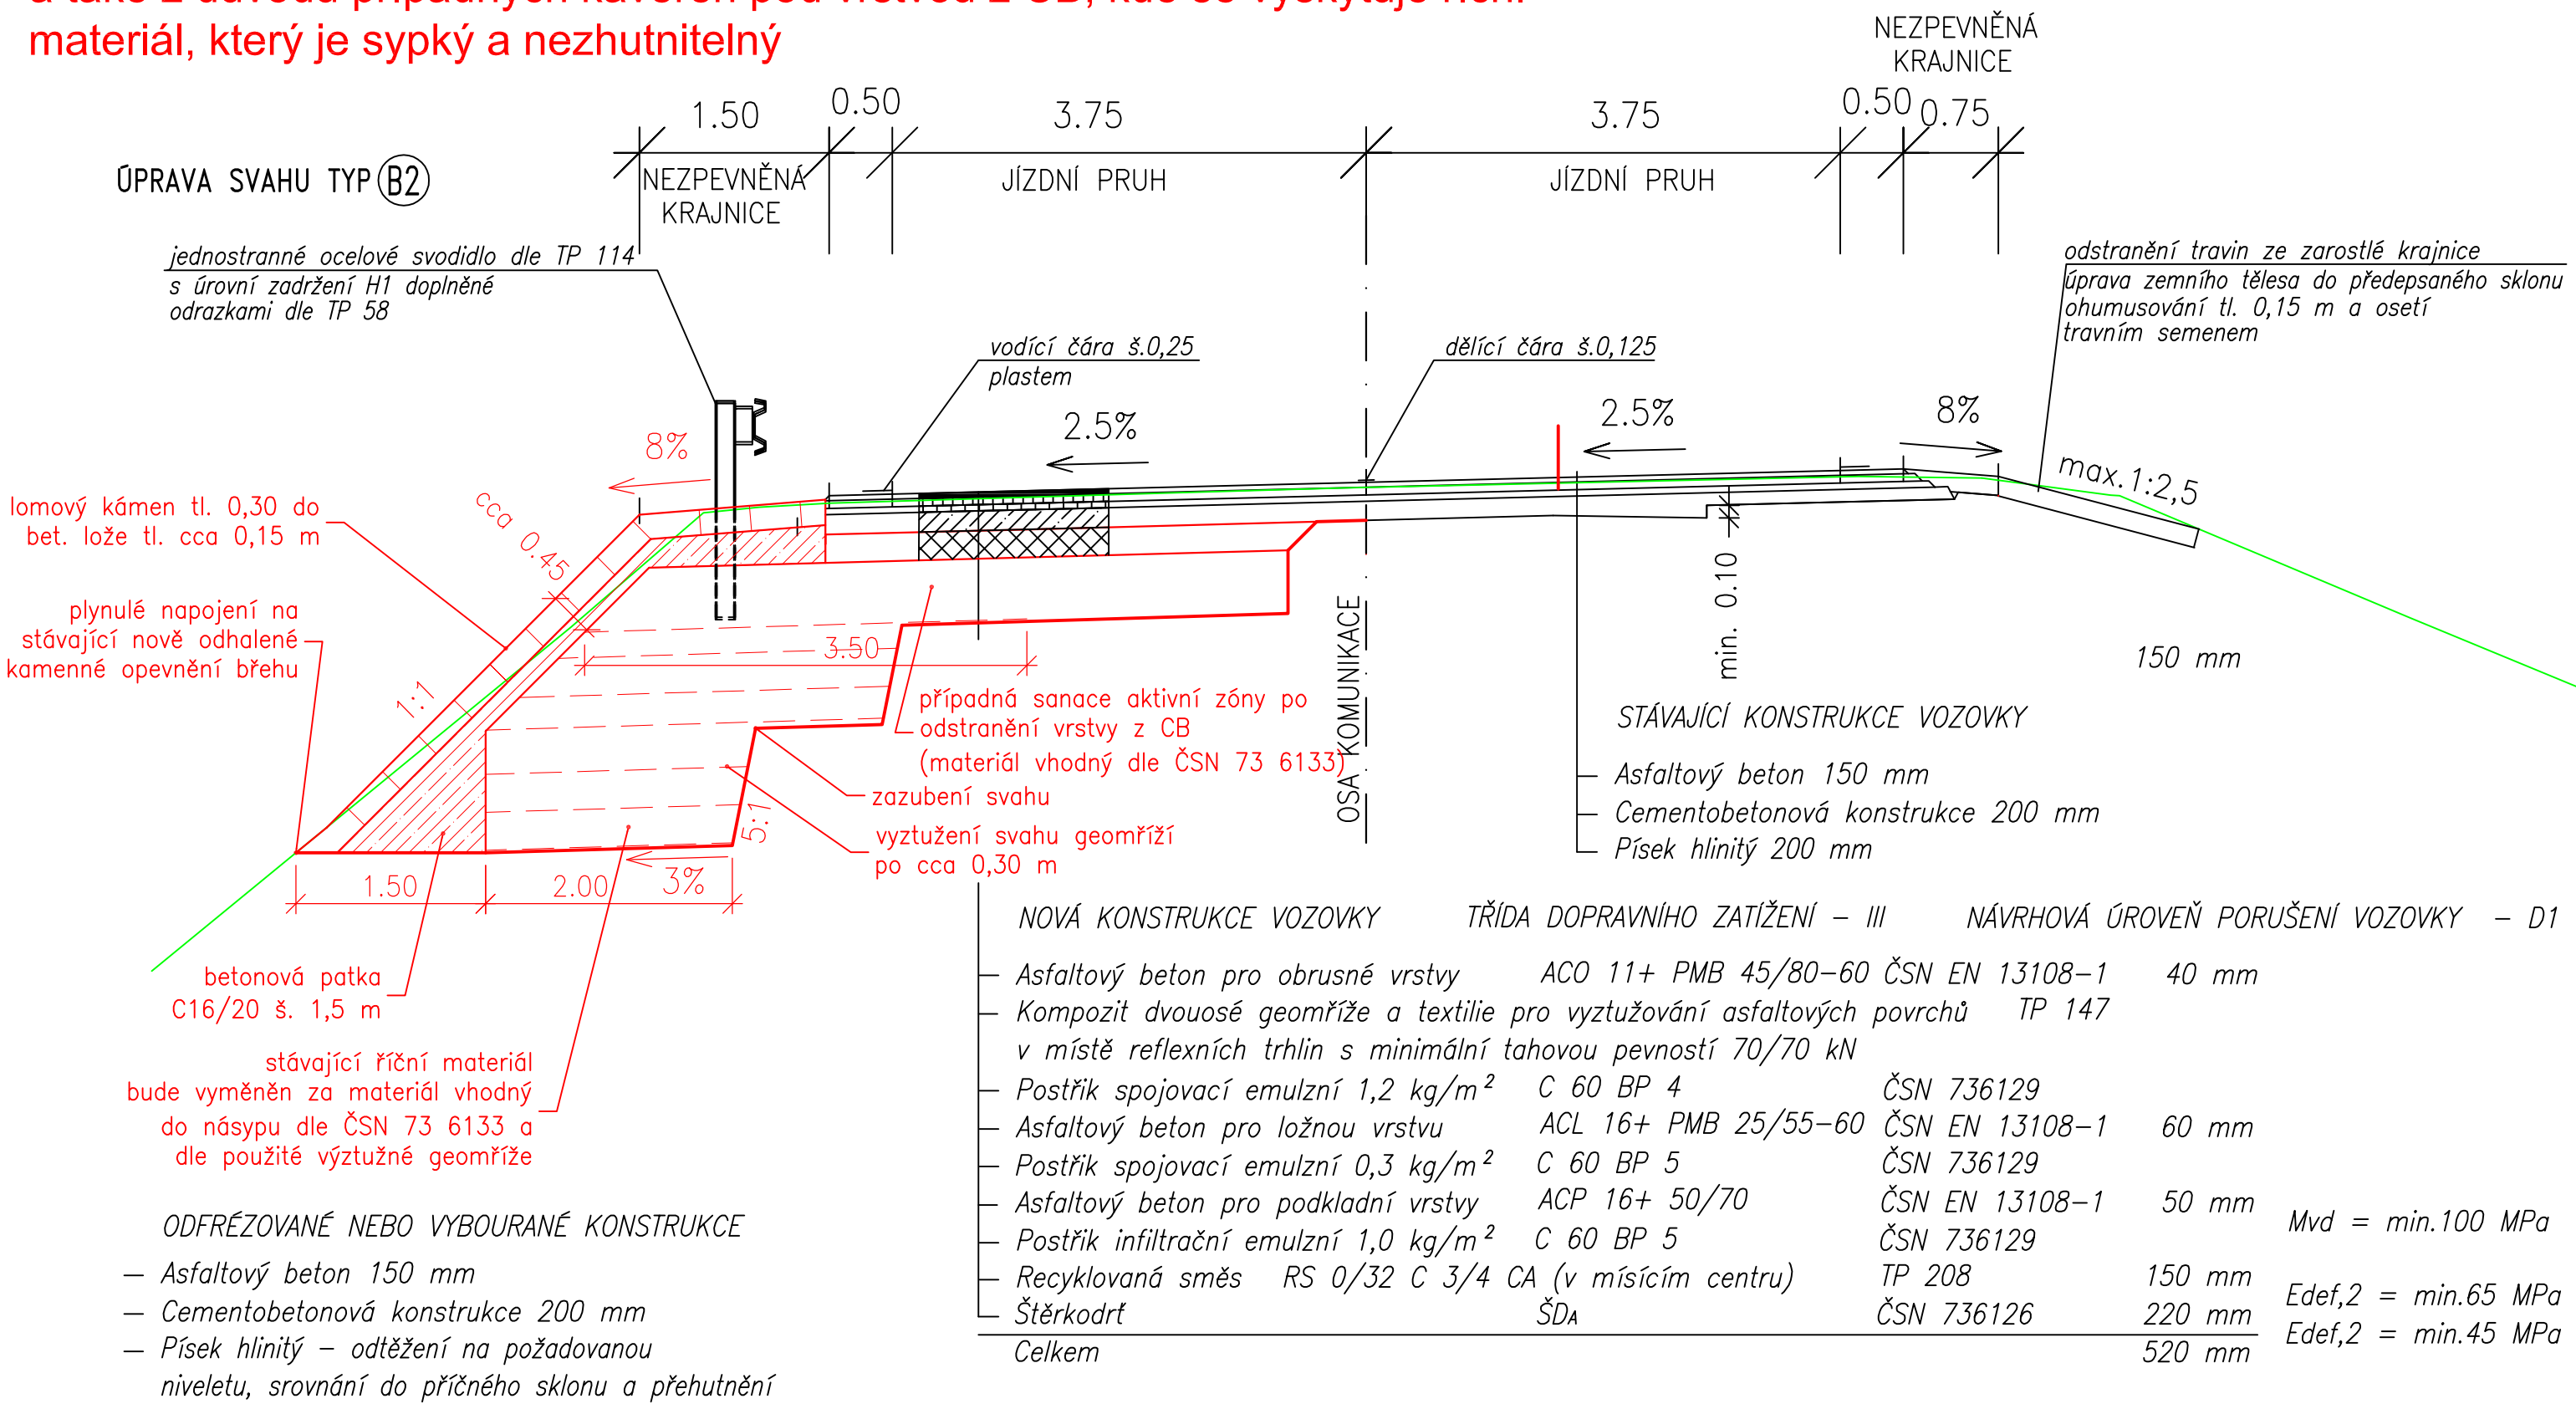

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek
Mobil +420 602 224 685
karel.simek@strabag.com

Naše značka:
KSÚS_/39

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Při dalších úpravách svahů (v návaznosti na stavební práce již nárokové v ZBV č. 13) se opět pod nánosem vegetace objevilo původní břehové opevnění lomovým kamenem. Na základě požadavku správce toku Povodí Vltavy s.p. a souhlasu objednatele na zhotovení opevnění jak bylo provedeno před vybouráním starého narušeného opevnění se veškerá zpevnění na levé straně silničního tělesa v návaznosti na ZBV č. 13 provede dle typu B1

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s provedením opevnění břehového svahu podle požadavku správce toku Povodí Vltavy s.p. Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL: 257 098 111
FAX: 257 313 622

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5

Č.Ú.: 31632051/0100

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVT.-59868/2022/253

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Markéta Bártová/243

DATUM
24.8.2022

věc Požadavek na konstrukční řešení úseků břehového opevnění v rámci opravy komunikace II/102 Praha - Štěchovice, II. etapa, svah tělesa komunikace v km 10,000 – 14,580

Obracíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace II/102 Praha – Štěchovice, II. etapa s požadavkem na zachování způsobu provedení konstrukce opevnění komunikace v úseku II. etapy, svah tělesa komunikace v km 10,000 – 14,580, tak jak byla provedena před vybouráním.

Svahy podél celé nádrže byly při výstavbě nádrže konstrukčně provedeny jako kamenná dlažba do betonu s vyspárováním.

Žádáme tedy o provedení stejného konstrukčního řešení, tedy vyspárované kamenné dlažby do betonu ve stejném rozsahu i materiálu, tedy v úseku Městys Davle – Štěchovice.

Svahy břehů nádrže mohou být při zvýšených průtocích zaplaveny vodou, odvádějí do nádrže dešťovou vodu a tak jejich konstrukční složení přispěje k zachování odolnosti proti klimatickým vlivům a k prodloužení životnosti konstrukce.

S pozdravem

Ing. Libor Peška
vedoucí střediska – Vltava kaskáda

Co vlastní

Od: Dvořáček David Ing.
Komu: "Valenta, Miroslav"
Kopie: Karel Šimek <
Datum: 05.09.2022 17:47
Věc: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - spárování dlažby
Přílohy: VyjAD23.pdf

Dobrý den,

k akci II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa...

U příležitosti podpisu ZBV jsem se dnes sešel s Ing. Šimkem. Informoval mě o diskuzi nad řešením opevnění. K diskuzi za AD rekapituluji/doplňuji následující:

- K problematice bylo vydáno vyjádření AD č. 23. To pro jednoduchost přikládám.
- Řešení opevnění bylo přizpůsobeno požadavku Povodí, konkrétně paní Bártové.
- Opevnění bude provedeno jako spárované. Odpovídá to požadavku Povodí. Řešení také zredukuje riziko zarůstání. Tím zjednoduší a zlevní následnému správci údržbu.
- Jelikož příslušná položka v PDPS v poznámce obsahuje informaci, že neobsahuje spárování, bude třeba tuto změnu řešit jako ZBV.

S pozdravem

--

Ing. David Dvořáček [ddv@pontex.cz]
Pontex s. r. o. [www.pontex.cz] [pontex@pontex.cz]
Bezová 1658
147 00 Praha 4

Tel.: +420 720 951 172
Tel.: +420 244 462 219



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL: 257 099 111

FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5

Č.Ú: 316302510103

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVL-10321/2023/253

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Markéta Bártová/243

DATUM
8.2.2023

věc Požadavek na konstrukční řešení úseků břehového opevnění v rámci opravy komunikace II/102 Praha - Štěchovice, II. etapa, svah tělesa komunikace v km 11,780 – 12,440

Obracejíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace II/102 Praha – Štěchovice, II. etapa s požadavkem na zachování způsobu provedení konstrukce opevnění komunikace v úseku II. etapy, svah tělesa komunikace v km 11,780 – 12,440, tak jak byla provedena před vybouráním.

Svahy podél celé nádrže byly při výstavbě nádrže konstrukčně provedeny jako kamenná dlažba do betonu s vyspárováním.

Žádáme tedy o provedení stejného konstrukčního řešení, tedy vyspárované kamenné dlažby do betonu ve stejném rozsahu i materiálu, tedy v úseku Městys Davle – Štěchovice, konkrétně 11,780 – 12,440, a to dle projektové dokumentace:

TYP A – prostý svah se zatravněním v Km 11,780 – 11,847 (bude nahrazen TYPEM B1 – odlážděný svah z regulačního kamene do betonového lože včetně spárování)

TYP B2 – svah obalovanými čely vyztuženými GEOKOMPOZITEM v km 11,847 – 11,970 (bude nahrazen TYPEM B1 – odlážděný svah z regulačního kamene do betonového lože včetně spárování)

TYP A – prostý svah se zatravněním v Km 11,988 – 12,025 (bude nahrazen TYPEM B1 – odlážděný svah z regulačního kamene do betonového lože včetně spárování)

TYP B2 – svah obalovanými čely vyztuženými GEOKOMPOZITEM v km 12,025 – 12,440 (bude nahrazen TYPEM B1 – odlážděný svah z regulačního kamene do betonového lože včetně spárování)

Svahy břehů nádrže mohou být při zvýšených průtocích zaplaveny vodou, odvádějí do nádrže dešťovou vodu a tak jejich konstrukční složení přispěje k zachování odolnosti proti klimatickým vlivům a k prodloužení životnosti konstrukce.

S pozdravem

Co :vlastní



KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 4350/2023/DDv
Datum: 14. 6. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: [redacted]

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 64 - požadavek PVL na opevnění svahu tělesa

Byli jsme požádáni o vyjádření k požadavku PVL na opevnění svahů zemního tělesa. PVL požaduje v úsecích komunikace se stávajícím opevněním opatřit nové části svahu dlažbou z regulačního kamene do betonového lože s vyspárováním.

V návaznosti na naše vyjádření AD č. 23 z 13. 4. 2021 sdělujeme, že obecně požadujeme postupovat v souladu s požadavkem PVL. V místě, kde bude dodatečně objeveno existující opevnění svahu zemního tělesa dlažbou bude nový svah zemního tělesa proveden typem B1, tj. s opevněním dlažbou do betonu.

Výše uvedené stanovisko bylo AD sděleno v průběhu prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
dírakce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 33/2021

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Úsek B – Obložení svahů kamenem km 13,150 – 13,190 - vlevo

km 13,150 – 13,190 **89,9 m²**

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil:	30.6.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	30.6.2021	Ing. S. Bílek
Ověřil:	30.6.2021	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




**II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

Úsek B

Plocha obložení svahu lomovým kamenem v km 13,150 – 13,190 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747993.55	1067453.16	207.24
2	747992.93	1067459.78	207.32
3	747992.54	1067467.07	207.34
4	747992.23	1067473.61	207.31
5	747991.85	1067481.11	207.35
6	747991.58	1067487.86	207.34
7	747991.39	1067493.42	207.34
8	747990.04	1067493.28	206.94
9	747990.04	1067488.08	206.74
10	747990.25	1067479.68	206.47
11	747990.47	1067475.71	206.40
12	747990.91	1067467.10	205.88
13	747991.15	1067462.83	205.70
14	747991.07	1067457.78	205.23
15	747991.25	1067453.06	205.05
16	747991.33	1067451.91	205.23
17	747991.82	1067451.48	205.37
18	747992.65	1067451.60	205.91
19	747993.72	1067451.40	205.98

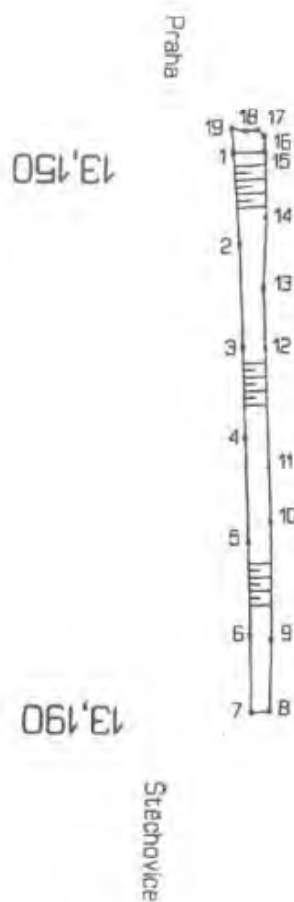

STRABAG a.s. Kacírkova 982/41, Praha 5			číslo zakázky			
			ověřil		Ing. S. Břek	
			datum		30.6.2021	
			číslo ověření		01/01/2021	
práce II/102 Hr. H. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 - B Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice- osek B Obložení svahu kamenem v km 13,150 - 13,190						vykres číslo
				měřítko	1:500	
zameřil	Ing. Stanislav Břek	datum	30.6.2021	sof. systém	S-JTSK	
kreslil	Ing. Stanislav Břek	datum	30.6.2021	vyřk. systém	Bpy	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 10/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek A – km 10,140 – 10,250 - vlevo

SO 102 - Plocha svahů zpevněných kamenem

191,1 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	2.3.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	4.3.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	4.3.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice

Úsek A – plocha svahů zpevněných kamenem

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747900.80	1064765.38	202.14
2	747899.20	1064766.26	201.97
3	747893.88	1064763.87	201.72
4	747889.11	1064762.10	201.18
5	747889.72	1064761.17	201.57
6	747887.35	1064759.98	201.55
7	747885.97	1064759.70	201.27
8	747883.86	1064758.11	201.62
9	747881.52	1064756.55	201.77
10	747875.90	1064753.95	201.57
11	747872.30	1064752.04	201.66
12	747867.35	1064749.37	201.74
13	747863.70	1064747.79	201.59
14	747859.53	1064745.87	201.50
15	747856.70	1064744.35	201.38
16	747856.97	1064743.51	201.94
17	747853.51	1064741.59	202.21
18	747853.10	1064742.03	201.49
19	747845.88	1064738.80	201.58
20	747839.99	1064735.63	201.75
21	747838.77	1064734.84	201.88
22	747837.03	1064734.14	201.84
23	747832.24	1064732.07	201.81
24	747828.35	1064730.55	201.73
25	747823.27	1064728.22	201.82
26	747819.07	1064726.85	201.69
27	747813.54	1064725.00	201.56
28	747807.12	1064722.65	201.70
29	747800.58	1064720.63	201.82
30	747801.07	1064719.07	202.51
31	747807.51	1064721.24	202.49
32	747814.07	1064723.48	202.49
33	747819.57	1064725.52	202.51
34	747823.62	1064727.11	202.50
35	747828.86	1064729.21	202.54
36	747832.79	1064730.91	202.56
37	747837.57	1064732.96	202.59
38	747839.36	1064733.80	202.58
39	747840.71	1064734.49	202.62
40	747846.57	1064737.51	202.63
41	747853.76	1064741.11	202.65
42	747857.39	1064742.89	202.64
43	747860.31	1064744.38	202.66
44	747864.36	1064746.53	202.64
45	747867.93	1064748.34	202.68
46	747872.91	1064750.88	202.67
47	747876.60	1064752.89	202.68
48	747882.01	1064755.67	202.67
49	747884.46	1064757.07	202.67
50	747886.68	1064758.18	202.68
51	747887.91	1064758.83	202.67
52	747890.36	1064760.18	202.67
53	747894.57	1064762.21	202.70
54	747899.90	1064764.86	202.72

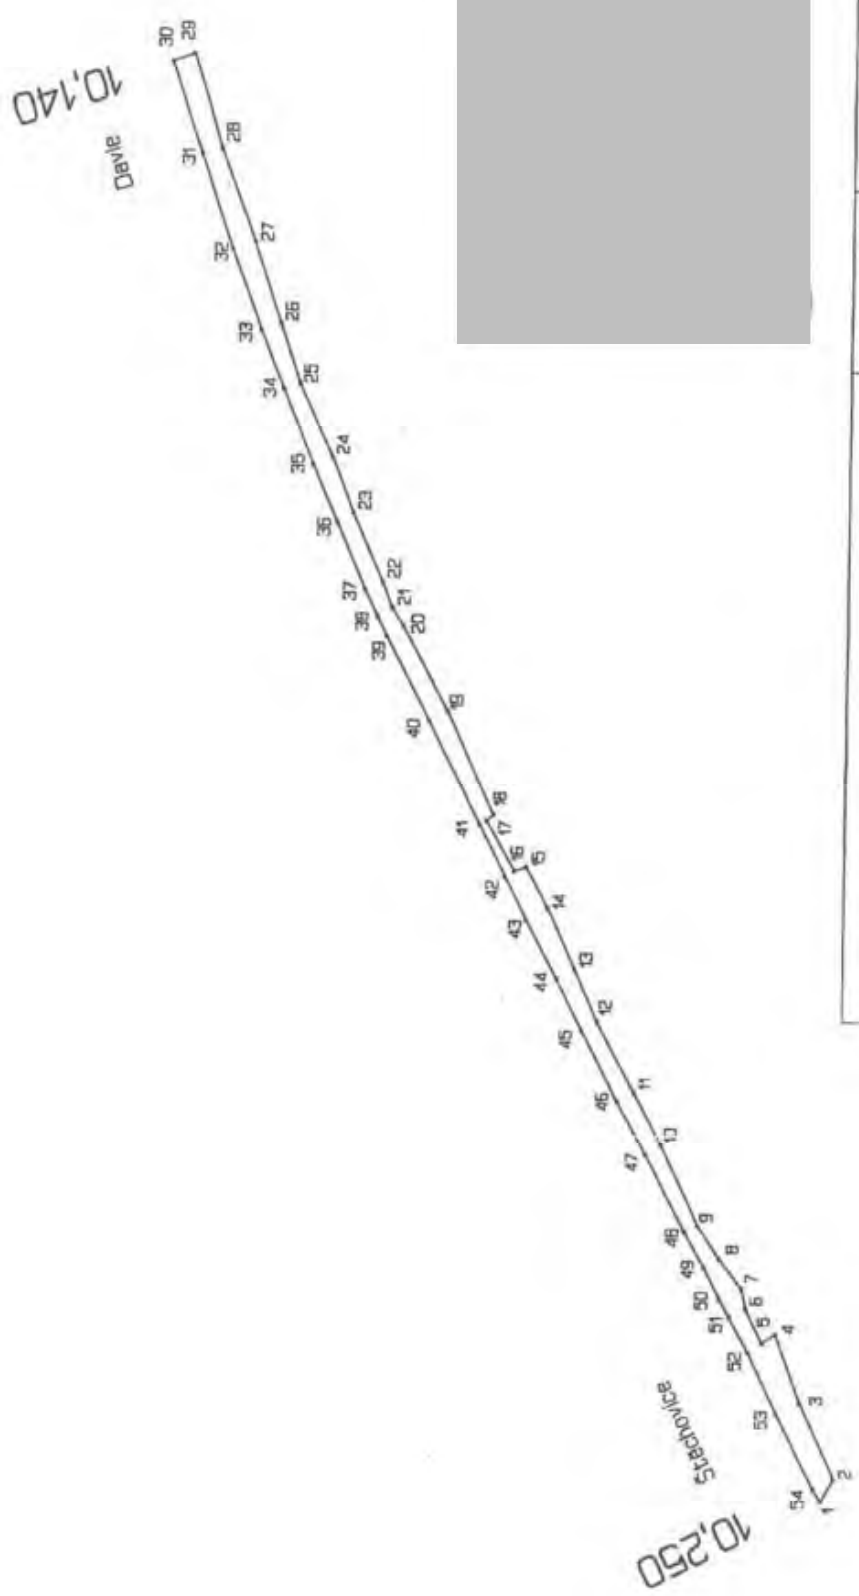

STRABAG a.s. Kadřická 982/41, Praha 5		číslo zakázky	Ing. S. Bliek	
		overil	4.3.2022	
		datum		
		číslo overení		
název	II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stechovice, rekonstrukce, etapa II SO 102- Rekonstrukce vozovky Davle - Stechovice - vlevo km 10,140 - 10,250 - zpevnění svahu kamenem			výkres číslo
		měřítko		1:500
zaměřil	Ing. Stanislav Bliek	datum	2.3.2022	soř. systém
kreslil	Ing. Stanislav Bliek	datum	4.3.2022	výšk. systém
				Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 12/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A – km 10,001 – 10,101 - vlevo

SO 102 - Plocha svahů zpevněných kamenem

112,9 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	15.3.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	15.3.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	15.3.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR., HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice

Úsek A – plocha svahů zpevněných kamenem

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
60	747664.791	1064696.914	202.488
61	747664.830	1064697.168	202.404
62	747671.069	1064697.829	202.516
63	747670.987	1064698.369	202.151
64	747672.520	1064698.080	202.509
65	747672.363	1064698.993	201.835
66	747678.057	1064699.787	201.757
67	747683.628	1064700.642	201.644
68	747692.344	1064701.805	201.648
69	747694.078	1064701.654	201.819
70	747695.152	1064701.791	201.887
71	747696.034	1064702.174	201.840
72	747701.169	1064702.719	201.763
73	747703.594	1064703.333	201.751
74	747707.505	1064703.708	201.897
75	747709.174	1064703.771	202.042
76	747711.186	1064703.986	202.079
77	747713.059	1064704.550	201.892
78	747715.408	1064705.136	201.787
79	747718.620	1064705.333	201.916
80	747719.508	1064705.333	201.972
81	747720.576	1064705.750	201.860
82	747723.799	1064706.112	201.872
83	747725.558	1064706.440	202.028
84	747726.817	1064706.872	202.101
85	747730.496	1064707.395	202.094
86	747733.328	1064707.774	201.877
87	747738.140	1064708.161	201.772
88	747739.965	1064708.130	201.808
89	747741.927	1064708.691	201.719
90	747744.909	1064708.830	201.959
91	747748.223	1064709.207	202.032
92	747749.954	1064709.931	201.620
93	747753.445	1064710.401	201.604
94	747755.825	1064710.840	201.521
95	747760.887	1064711.617	201.606
96	747763.784	1064711.886	201.751
97	747766.303	1064712.163	201.883
98	747766.438	1064711.452	202.527
99	747764.041	1064711.051	202.517
100	747761.083	1064710.552	202.473
101	747756.148	1064709.809	202.477
102	747753.558	1064709.416	202.442
103	747750.150	1064708.874	202.452
104	747746.281	1064708.596	202.469
105	747745.011	1064708.208	202.445
106	747742.083	1064707.834	202.381
107	747740.096	1064707.527	202.407
108	747738.379	1064707.306	202.399
109	747733.933	1064706.718	202.479
110	747730.632	1064706.208	202.419
111	747726.992	1064705.719	202.434
112	747725.657	1064705.516	202.425
113	747723.906	1064705.249	202.423
114	747720.746	1064704.797	202.404
115	747719.655	1064704.647	202.429
116	747718.666	1064704.497	202.414
117	747715.658	1064704.037	202.432
118	747713.197	1064703.709	202.377
119	747711.346	1064703.426	202.392
120	747709.238	1064703.103	202.394
121	747707.609	1064702.884	202.393
122	747703.746	1064702.343	202.404
123	747701.274	1064701.977	202.397
124	747696.298	1064701.243	202.403
125	747695.329	1064701.094	202.410
126	747694.258	1064700.926	202.428
127	747692.493	1064700.726	202.428
128	747683.822	1064699.592	202.463
129	747678.260	1064698.871	202.490

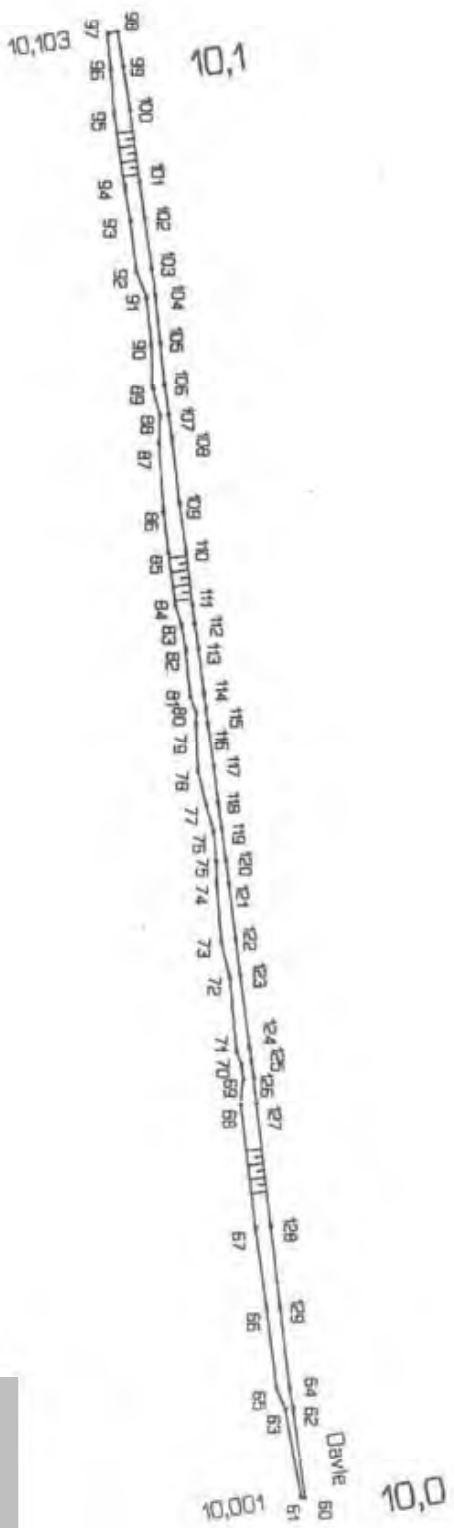

STRABAG a.s. Kadřická 982/41, Praha 5		číslo zakázky		Ing. S. Blásek	
		dávka		15.3.2022	
		datum		15.3.2022	
akce		číslo dleřev			
II/102 H. Města Prahy - Stechovice, rekonstrukce, etapa II					
SO 102- Rekonstrukce vozovky Dávkle - Stechovice - vlevo					
km 10,001 - 10,103 - zdevnět svahu kamenem					
		mřítko		1500	
záměr		Ing. Stanislav Blásek		souř. systém	
kresl		Ing. Stanislav Blásek		výsk. systém	
		datum		15.3.2022	
		výsk. systém		BpV	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 16/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A – km 10,103 – 10,140 - vlevo

SO 102 - Plocha svahů zpevněných kamenem

km 10,103 – SO 204	63,0 m ²
SO 204 – km 10,140	55,2 m ²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305,
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	19.4.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	20.4.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	20.4.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II

SO 102 – Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice

Úsek A – plocha svahů zpevněných kamenem

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
29	747800.58	1064720.63	201.82
30	747801.07	1064719.07	202.51
97	747766.30	1064712.16	201.88
98	747766.44	1064711.45	202.53
131	747770.10	1064713.47	201.53
132	747771.43	1064713.89	201.51
133	747772.62	1064716.42	200.19
134	747775.95	1064717.09	200.06
135	747778.15	1064717.66	200.03
136	747779.91	1064717.94	200.00
137	747780.89	1064717.62	200.08
138	747781.73	1064716.95	200.34
139	747781.30	1064714.64	201.50
140	747782.20	1064715.01	201.05
141	747781.63	1064716.17	200.92
143	747783.79	1064715.27	201.47
145	747776.76	1064712.91	202.71
146	747773.83	1064712.26	202.68
147	747773.07	1064712.58	202.64
148	747771.98	1064712.34	202.60
149	747770.30	1064712.08	202.54
150	747778.72	1064713.39	202.88
156	747792.45	1064716.56	202.77
157	747792.00	1064716.45	202.75
158	747791.83	1064717.13	202.75
159	747792.28	1064717.27	202.77
160	747790.54	1064716.08	201.61
161	747790.38	1064716.80	201.61
162	747789.61	1064715.88	201.61
163	747789.38	1064716.72	201.59
164	747790.07	1064717.69	201.60
165	747789.59	1064717.52	201.59
166	747789.77	1064716.83	201.60
167	747789.30	1064716.72	201.59
168	747789.12	1064717.41	201.58
169	747786.55	1064716.76	199.88
170	747786.68	1064716.07	199.90
171	747786.50	1064716.87	199.86
172	747788.20	1064720.37	199.96
173	747789.48	1064720.53	200.13
174	747791.80	1064717.25	202.71
175	747794.47	1064717.70	202.60
176	747795.72	1064717.90	202.58
177	747796.32	1064717.90	202.56
178	747796.96	1064718.03	202.55
179	747796.46	1064719.85	201.58
180	747795.79	1064719.81	201.50
181	747795.20	1064720.34	201.10
182	747794.88	1064721.05	200.69
183	747794.98	1064720.98	200.70
184	747793.92	1064721.31	200.35
185	747798.23	1064719.97	201.78
187	747797.03	1064717.86	202.57
188	747797.28	1064717.10	202.63
189	747792.29	1064717.28	202.76
190	747792.50	1064715.86	202.81

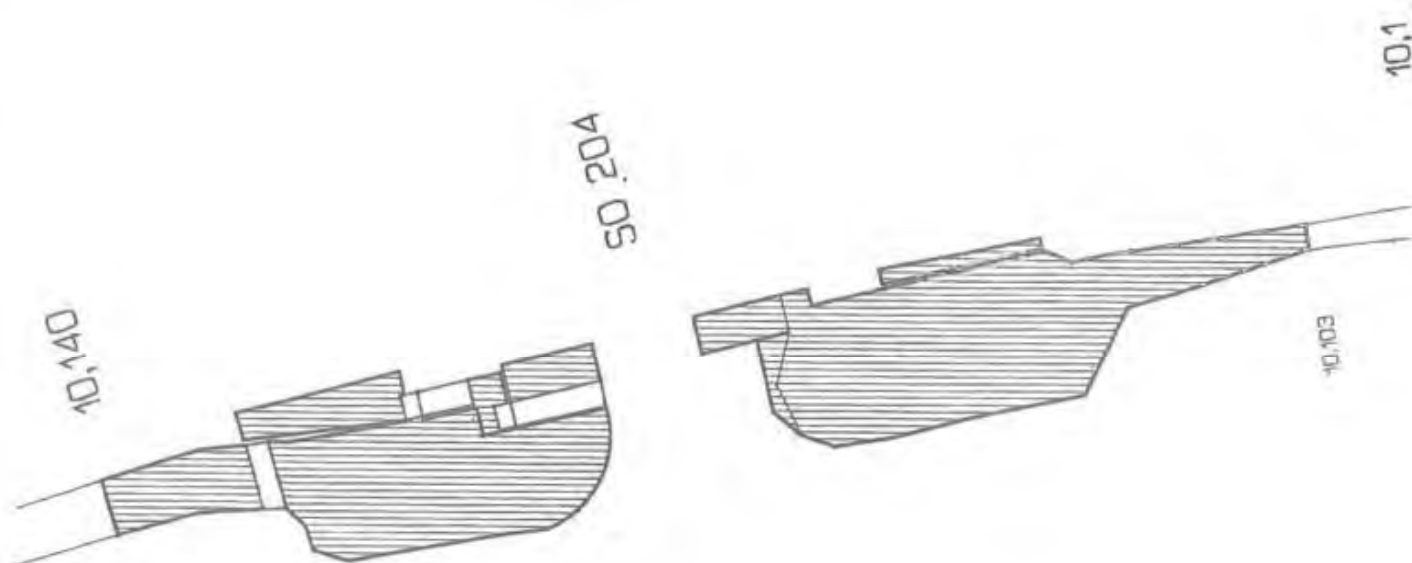

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				Dílo závažky				
				ověřil		Ing. S. Blásek		
				datum		20.4.2022		
				Dílo ověřeno				
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II							výkres číslo	
SD 102- Rekonstrukce vozovky Davle - Stěchovice - vlevo								
km 10,103 - 10,140 - zpevnění svahu kamenem								
						měřítko	1:200	
zameřil	Ing. Stanislav Blásek	datum		19.4.2022		soft. systém	S-JTSK	
kreslí	Ing. Stanislav Blásek	datum		20.4.2022		výsk. systém	Bpv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 27/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 11,430 – 11,520 – vlevo – obložení svahu kamenem
(stav ke dni 14.7.2022)

km 11,430 – 11,520 - 191,6 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	14.7.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	14.7.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	14.7.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 11,430 – 11,250 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748210.127	1065747.685	202.685
2	748208.987	1065756.240	202.843
3	748207.360	1065765.929	202.793
4	748206.302	1065774.175	202.891
5	748205.476	1065778.652	202.828
6	748205.060	1065779.478	202.676
7	748204.989	1065781.802	202.837
8	748203.963	1065788.733	202.931
9	748203.157	1065793.672	202.914
10	748202.829	1065794.962	202.867
11	748201.829	1065801.778	202.825
12	748200.311	1065811.886	202.857
13	748198.516	1065823.007	202.782
14	748197.489	1065828.562	202.682
15	748197.233	1065832.300	202.905
16	748196.644	1065836.361	202.952
17	748198.082	1065836.503	204.193
18	748198.697	1065832.540	204.219
19	748199.339	1065828.856	204.203
20	748200.196	1065823.281	204.182
21	748201.885	1065812.207	204.244
22	748203.471	1065802.049	204.248
23	748204.568	1065795.216	204.193
24	748204.758	1065793.868	204.219
25	748205.488	1065789.032	204.243
26	748206.516	1065782.145	204.278
27	748206.824	1065779.853	204.269
28	748206.976	1065779.006	204.278
29	748207.684	1065774.378	204.267
30	748208.945	1065766.199	204.224
31	748210.502	1065756.544	204.243
32	748211.865	1065747.855	204.213

11,430

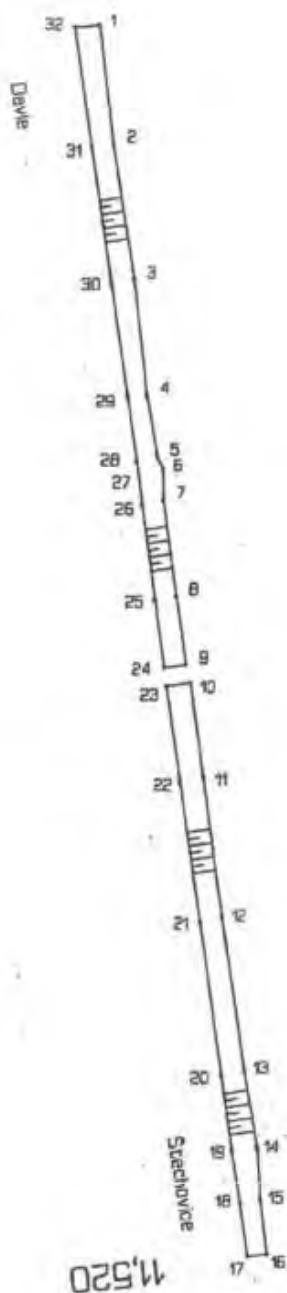

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky		
				ověřil	Ing. S. Bliek	
				datum	14.7.2022	
				číslo ověření		
akce	II/102 Hr. HL Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Dvyle – Štěchovice Úsek B, km 11,430 – 11,520 – kamenné obložení svahů – vlevo					výkres číslo
					měřítko	1 : 500
zameril	Ing. Stanislav Bliek	datum	14.7.2022	souř. systém	S-JTSK	
kreslil	Ing. Stanislav Bliek	datum	14.7.2022	výšk. systém	Bpv	

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 35/2022

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Úsek B – km 11,220 – 11,430 – vlevo – obložení svahu kamenem
(stav ke dni 11.8.2022)

km 11,220 – 11,340 - 268,3 m²
km 11,400 – 11,430 - 67,9 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305,
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	11.8.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	11.8.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	11.8.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 11,220 – 11,430 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748210.13	1065747.69	202.69
32	748211.86	1065747.85	204.21
100	748210.87	1065743.23	202.74
101	748211.79	1065736.85	202.69
102	748213.34	1065727.97	202.80
103	748214.30	1065722.83	202.86
104	748215.22	1065717.44	202.87
105	748216.88	1065717.49	204.11
106	748214.88	1065728.24	204.23
107	748213.55	1065737.13	204.23
108	748212.57	1065743.46	204.22
125	748223.48	1065657.59	202.08
126	748225.44	1065647.59	202.15
127	748227.08	1065637.60	202.03
128	748228.94	1065627.43	202.03
129	748231.29	1065617.98	202.45
130	748232.32	1065612.70	202.48
131	748232.56	1065609.44	202.24
132	748233.19	1065608.38	202.54
133	748233.62	1065606.02	202.42
134	748234.67	1065602.25	202.67
135	748235.63	1065598.03	202.75
136	748237.18	1065592.01	202.86
137	748238.34	1065586.20	202.78
138	748238.74	1065585.04	202.88
139	748240.05	1065579.33	202.88
140	748241.66	1065571.64	202.77
141	748243.00	1065564.35	202.63
142	748243.33	1065564.27	202.91
143	748244.56	1065559.01	202.85
144	748245.55	1065554.34	202.80
145	748246.85	1065549.36	202.91
146	748246.81	1065548.27	202.70
147	748248.47	1065539.87	202.59
148	748250.13	1065540.38	203.84
149	748248.28	1065548.59	203.84
150	748247.97	1065549.66	203.85
151	748246.84	1065554.79	203.90
152	748245.78	1065559.30	203.88
153	748244.57	1065564.56	203.90
154	748242.97	1065571.82	203.88
155	748241.19	1065579.56	203.96
156	748239.94	1065585.29	203.99
157	748239.72	1065586.38	203.94
158	748238.48	1065592.41	203.97
159	748237.20	1065598.37	203.95
160	748236.34	1065602.47	203.95
161	748235.55	1065606.22	203.96
162	748235.11	1065608.59	203.94
163	748234.89	1065609.65	203.95
164	748234.23	1065613.02	203.96
165	748233.09	1065618.43	203.93
166	748231.36	1065627.76	203.96
167	748229.47	1065638.19	204.00
168	748227.76	1065647.93	204.03
169	748225.95	1065657.87	204.02

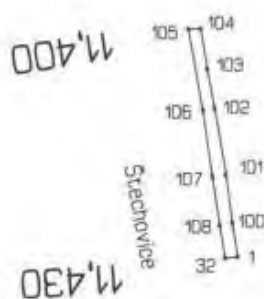

STRABAG a.s. Kačírkova 962/41, Praha 5				číslo zakázky							
				ověřil		Ing. S. Brlek					
				datum		11.8.2022					
				číslo ověření							
akce II/102 Hr. HL Města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle – Stěchovice Úsek A, km 11,220 – 11,430 – kamenné obložení svahů – vlevo								výkres číslo			
						měřítko		1 : 1000			
zameřil		Ing. Stanislav Brlek		datum		11.8.2022		souř. systém		S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Brlek		datum		11.8.2022		výšk. systém		Bpv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 43/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

**Úsek B – km 11,520 – 11,663 – vlevo – obložení svahu kamenem
(stav ke dni 5.9.2022)**

km 11,520 – 11,663 - 303,2 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	5.9.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	5.9.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	5.9.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výškových zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa I

SO 101 – Rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice

Úsek E,F – km 4,409 – 4,835 – základ pod betonové svodidlo - vpravo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška
1	748507.81	1061597.60	204.45
3	748501.21	1061616.46	204.44
6	748493.57	1061635.14	204.46
8	748485.27	1061653.31	204.45
10	748476.56	1061671.41	204.45
11	748467.84	1061689.27	204.44
15	748459.11	1061707.28	202.45
16	748450.31	1061725.28	202.47
20	748441.56	1061743.25	202.47
21	748432.77	1061761.24	202.49
23	748428.07	1061770.91	202.46
28	748513.71	1061578.00	202.47
30	748518.50	1061559.09	202.47
31	748522.67	1061538.76	202.46
34	748525.77	1061518.93	202.46
36	748528.17	1061499.17	202.38
38	748530.39	1061479.24	202.15
39	748531.65	1061469.90	202.01
40	748532.95	1061461.24	201.83
41	748534.57	1061453.16	201.74
42	748536.97	1061443.69	201.66
44	748543.95	1061427.01	201.33
45	748542.01	1061436.83	201.47
46	748539.32	1061446.22	201.60
47	748537.26	1061453.59	201.68
48	748535.43	1061460.11	201.75
49	748533.86	1061464.20	201.84
50	748532.92	1061469.96	201.97
51	748531.66	1061481.12	202.12
63	748547.50	1061415.61	201.07
64	748549.53	1061411.25	200.99
68	748559.13	1061391.79	200.83
82	748532.68	1061472.58	201.91
201	748566.44	1061378.19	201.01
202	748561.70	1061387.42	200.91
203	748559.35	1061391.99	200.91
204	748557.12	1061396.27	200.92
205	748553.70	1061402.96	200.97

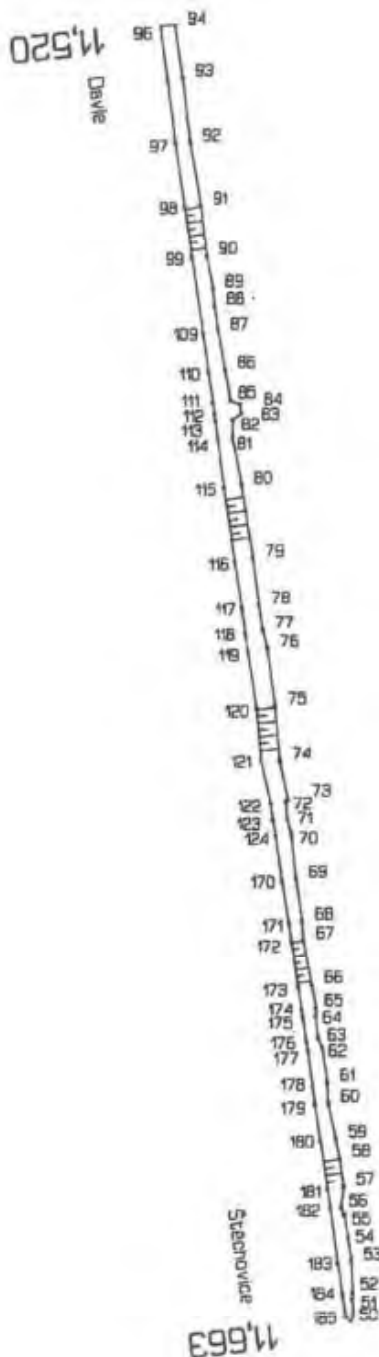

STRABAG a.s. Kacírkova 982/41, Praha 5				Dělo zarážky		
				ověř		Ing. S. Brlek
				datum		5.9.2022
				Dělo ověřeno		
název	II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Stechovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Dvle – Stechovice Úsek B, km 11,520 – 11,663 – kamenné obložení svahů – vlevo					výtisk číslo
					měřítka	bez
zavřel	Ing. Stanislav Brlek	datum	5.9.2022	soft. systém	S-JTSK	
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	5.9.2022	vysk. systém	Bpv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 45/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,520 – 11,663 – vlevo – obložení svahu kamenem
(stav ke dni 21.9.2022)

km 11,140 – 11,220 - 187,8 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	21.9.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	21.9.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	21.9.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 11,140 – 11,220 – vlevo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
236	748266.210	1065462.028	202.112
237	748264.518	1065469.865	202.247
238	748262.722	1065476.492	202.112
239	748261.672	1065482.064	202.276
240	748260.282	1065484.337	201.754
241	748260.899	1065485.767	202.379
242	748259.777	1065491.286	202.481
243	748258.064	1065497.969	202.396
244	748256.217	1065506.726	202.584
245	748255.773	1065507.819	202.482
246	748254.639	1065513.807	202.587
247	748253.646	1065517.573	202.489
248	748252.655	1065522.607	202.635
249	748251.471	1065526.608	202.542
250	748250.224	1065532.409	202.629
251	748251.990	1065532.755	203.925 HRANA
252	748253.338	1065526.870	203.935 HRANA
253	748254.248	1065523.022	203.943 HRANA
254	748255.420	1065517.962	203.917 HRANA
255	748256.334	1065514.277	203.899 HRANA
256	748257.733	1065508.113	203.860 SCHODY
257	748257.952	1065507.094	203.868 SCHODY
258	748260.026	1065498.278	203.845 HRANA
259	748261.583	1065491.385	203.814 HRANA
260	748262.823	1065485.997	203.793 HRANA
261	748263.078	1065484.778	203.782 HRANA
262	748263.708	1065482.335	203.770 HRANA
263	748264.901	1065477.214	203.743 HRANA
264	748266.444	1065470.353	203.712 HRANA
265	748268.228	1065462.342	203.696 HRANA

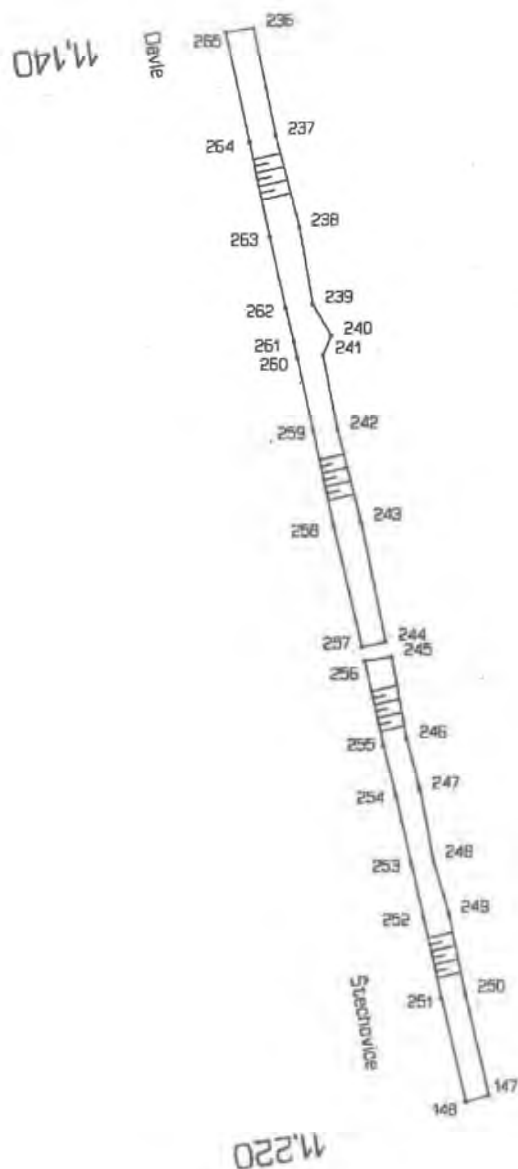

STRABAG a.s. Kadřkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	
				datum	
				číslo ověření	
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etape II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle – Stěchovice Úsek B, km 10,140 – 10,220 – vlevo – obložení svahu kamenem					výkres číslo
				měřítko	1 : 500
záměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	21.9.2022	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	21.9.2022	výřk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 47/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,671 – 11,780 – vlevo – obložení svahu kamenem
(stav ke dni 3.10.2022)

km 11,671 – 11,780 – 215,0 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	3.10.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	5.10.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	5.10.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 11,671 – 11,780 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
310	748159.267	1066092.562	202.560
311	748160.040	1066087.187	202.641
312	748161.073	1066078.703	202.629
313	748162.032	1066071.017	202.591
314	748162.823	1066065.465	202.667
315	748163.107	1066064.761	202.753
316	748164.051	1066059.421	202.964
317	748164.538	1066057.326	203.144
318	748164.399	1066054.734	202.860
319	748165.422	1066046.642	202.918
320	748165.415	1066044.962	202.744
321	748166.110	1066039.924	202.845
328	748167.010	1066034.773	202.955
330	748167.327	1066033.555	203.070
331	748167.438	1066031.150	202.922
332	748168.107	1066027.117	203.001
333	748168.169	1066024.336	202.825
334	748168.512	1066022.442	202.948
335	748168.457	1066020.490	202.690
336	748169.301	1066014.853	202.742
337	748169.946	1066007.963	202.727
338	748170.632	1066005.761	202.991
339	748171.033	1065999.852	203.030
340	748171.265	1065994.446	203.013
341	748171.484	1065990.512	203.081
342	748171.490	1065987.690	202.969
343	748171.464	1065985.466	202.994
344	748172.777	1065985.344	203.936
345	748172.996	1065987.514	203.928
346	748173.097	1065990.329	203.968
347	748173.018	1065994.375	204.011
348	748172.689	1066000.047	204.005
349	748172.310	1066005.806	203.998
350	748172.146	1066008.050	204.028
351	748171.237	1066014.990	203.955
352	748170.384	1066020.917	203.958
353	748170.250	1066022.321	203.949
354	748169.939	1066024.578	203.942
355	748169.910	1066024.587	203.942
356	748169.540	1066027.235	203.944
357	748169.014	1066031.336	203.930
358	748168.655	1066033.720	203.924
359	748167.813	1066040.102	203.893
360	748167.156	1066045.144	203.875
361	748166.962	1066046.915	203.871
362	748166.051	1066053.960	203.885
363	748165.875	1066055.011	203.884
364	748165.579	1066057.423	203.859
365	748165.298	1066059.607	203.877
366	748164.631	1066065.001	203.905
367	748164.496	1066065.740	203.893
368	748163.818	1066071.127	203.884
369	748162.848	1066078.782	203.882
370	748161.833	1066087.317	203.886
371	748161.070	1066092.766	203.876

11,671

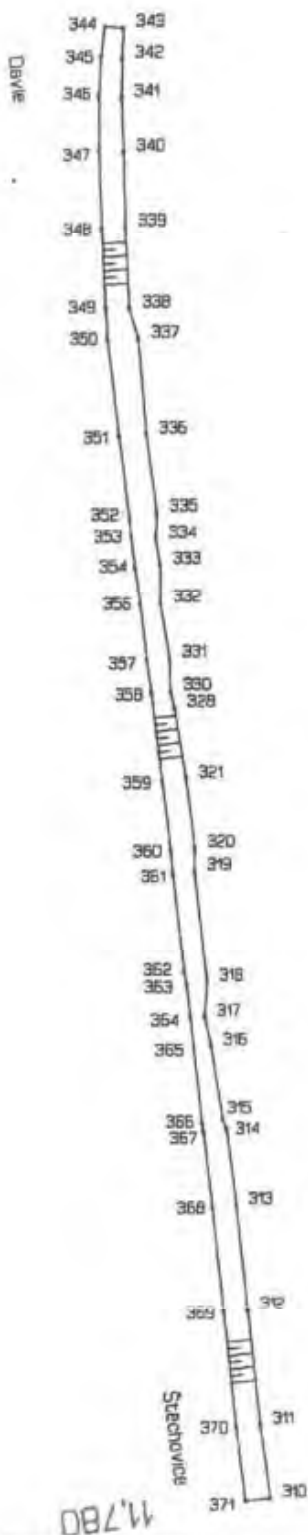

STRABAG a.s. Kabřkova 882/41, Praha 5				číslo zakázky			
				ověřil		Ing. S. Břek	
				datum		5.10.2022	
				místo ověření			
místo II/102 Hr. HL Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice Úsek B, km 11,671 - 11,780 - kamenné obložení svahů - vlevo							výkres číslo
					návrh	bez	
zaměřil	Ing. Stanislav Břek	datum	3.10.2022	souř. systém	5-JTSK		
kreslil	Ing. Stanislav Břek	datum	5.10.2022	výšk. systém	Bov		

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 53/2022

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Úsek C – km 14,462 – 14,580 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 14,462 – 14,580 - 249,3 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	24.10.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	24.10.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	24.10.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C

km 14,462 – 14,580 – vlevo – obložení svahu kamenem

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	747616.846	1068735.893	204.814
2	747619.295	1068733.872	204.600
3	747622.336	1068731.450	204.354
4	747625.363	1068729.029	204.050
5	747628.922	1068726.761	204.120
6	747631.467	1068725.569	204.494
7	747633.967	1068723.349	204.130
8	747639.678	1068719.443	204.144
9	747641.326	1068718.623	204.285
10	747643.908	1068716.997	204.353
11	747645.091	1068715.972	204.210
12	747647.911	1068714.210	204.250
13	747653.692	1068710.289	204.199
14	747655.518	1068708.977	204.208
15	747656.625	1068708.234	204.196
16	747659.277	1068706.310	204.207
17	747663.634	1068703.571	204.339
18	747668.166	1068700.478	204.329
19	747671.059	1068698.317	204.227
20	747674.917	1068695.889	204.339
21	747677.056	1068694.478	204.461
22	747678.828	1068692.839	204.273
23	747680.785	1068691.485	204.425
24	747683.244	1068689.876	204.431
25	747686.085	1068687.596	204.409
26	747690.366	1068684.323	204.471
27	747694.699	1068681.057	204.495
28	747698.779	1068678.160	204.691
29	747702.415	1068675.692	204.820
30	747704.770	1068673.769	204.821
31	747708.918	1068670.808	204.915
32	747712.777	1068667.467	204.753
33	747713.162	1068667.875	205.115
34	747709.783	1068671.429	205.818
35	747705.928	1068675.706	205.794
36	747703.693	1068677.309	205.793
37	747699.961	1068679.912	205.741
38	747695.802	1068682.812	205.716
39	747691.402	1068685.927	205.667
40	747687.073	1068689.019	205.631
41	747684.088	1068691.089	205.634
42	747681.714	1068692.792	205.664
43	747679.673	1068694.155	205.653
44	747677.807	1068695.486	205.652
45	747675.682	1068696.975	205.654
46	747671.902	1068699.674	205.671
47	747668.879	1068701.784	205.674
48	747664.413	1068704.942	205.681
49	747660.446	1068707.667	205.700
50	747657.551	1068709.670	205.690
51	747656.555	1068710.341	205.693
52	747654.768	1068711.596	205.693
53	747648.945	1068715.524	205.691
54	747646.062	1068717.458	205.663
55	747644.688	1068718.445	205.664
56	747642.257	1068720.081	205.652
57	747640.690	1068721.139	205.655
58	747634.870	1068725.047	205.639
59	747632.293	1068726.825	205.639
60	747629.946	1068728.335	205.647
61	747626.331	1068730.808	205.657
62	747623.265	1068732.844	205.642
63	747619.970	1068734.951	205.649
64	747617.299	1068736.641	205.639

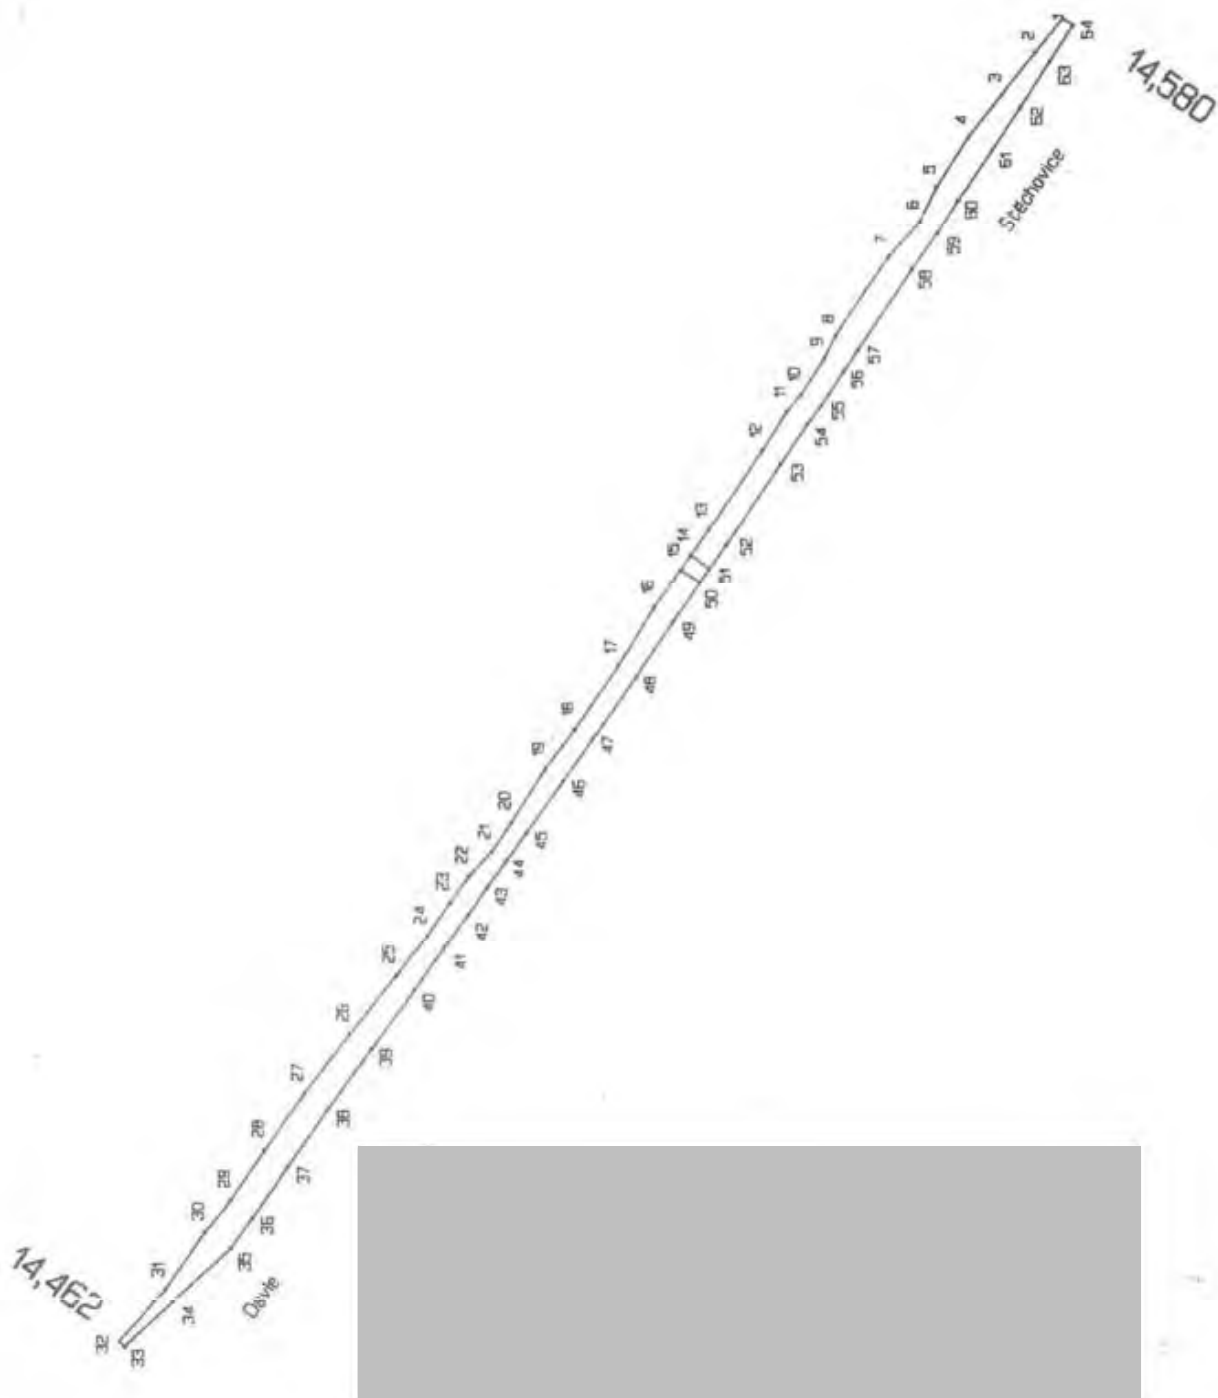

STRABAG a.s. Koblírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	
				datum	
				číslo ověření	
práce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etaps II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Dvře - Stěchovice Úsek C, km 14,452 - 14,580 - vlevo - obložení svahu kamenem					výkres číslo
				měřítko	1 : 500
zaměřil	Ing. Stanislav Blátek	datum	24.10.2022	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Blátek	datum	24.10.2022	výšl. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 62/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,056 – 11,140 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 11,056 – 11,140 - 214,2 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	1.12.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	2.12.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	2.12.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 220/2004 Sb.




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 11,056 – 11,140 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
600	748287.210	1065380.305	203.151
601	748284.324	1065386.791	202.238
602	748281.899	1065394.590	201.918
603	748279.630	1065402.794	201.662
604	748277.414	1065412.202	201.662
605	748274.913	1065423.231	201.698
606	748273.181	1065432.296	201.976
607	748271.993	1065437.861	202.107
608	748270.951	1065439.677	201.782
609	748269.459	1065446.807	201.841
610	748268.613	1065451.603	202.016
611	748267.071	1065458.249	202.026
612	748269.151	1065458.588	203.600
613	748270.666	1065452.021	203.596
614	748271.846	1065447.110	203.580
615	748273.469	1065440.229	203.512
616	748273.836	1065438.384	203.541
617	748275.071	1065433.086	203.543
618	748277.179	1065423.813	203.503
619	748279.758	1065412.605	203.497
620	748281.977	1065403.295	203.522
621	748283.843	1065395.371	203.485
622	748285.749	1065387.269	203.451
623	748287.363	1065380.435	203.422

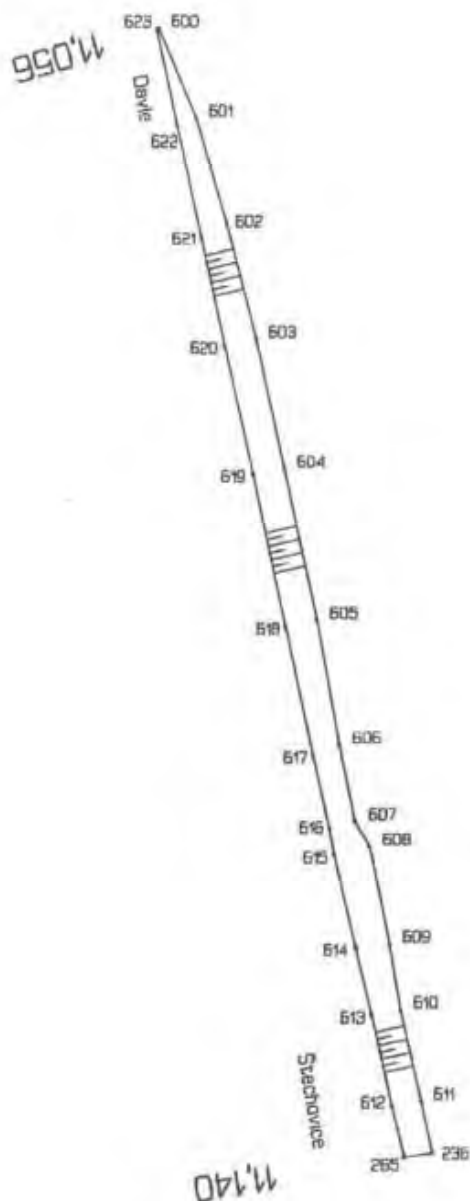

STRABAG a.s. Kadřkova 982/41, Praha 5				Dělo zakázky							
				ověřil		Ing. S. Břek					
				datum		1.12.2022					
				proje. ověřen							
akce				II/102 Hr. HL. Město Praha – Stechovice, rekonstrukce, etapa II				výkres číslo			
				SO 102 Rekonstrukce vozovky, Dávk – Stechovice							
				Úsek B, km 11,056 – 11,140 – kamenné obložení svahů – vlevo							
								měřítko		bez	
zpracoval		Ing. Stanislav Břek		datum		1.12.2022		sof. systém		S-JTSK	
ověřil		Ing. Stanislav Břek		datum		2.12.2022		vypl. systém		BoV	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 65/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,340 – 11,400 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 11,340 – 11,353 - 47,0 m²
km 11,353 – 11,400 - 160,3 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	19.12.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	19.12.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	19.12.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 11,340 – 11,400 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
104	748215.22	1065717.44	202.87
105	748216.88	1065717.49	204.11
222	748221.12	1065670.40	201.72
223	748222.12	1065664.73	201.82
226	748224.73	1065665.31	204.04
227	748223.83	1065670.86	204.07
704	748215.45	1065710.99	202.43
705	748216.00	1065705.57	202.25
706	748215.52	1065704.57	201.77
707	748215.59	1065697.76	201.42
708	748215.71	1065696.96	201.44
709	748216.15	1065695.42	201.55
710	748216.60	1065692.92	201.39
711	748217.12	1065690.86	201.50
712	748217.69	1065688.69	201.54
714	748218.53	1065685.67	201.74
715	748218.70	1065684.85	201.70
716	748218.15	1065684.59	201.35
717	748219.31	1065677.51	201.33
718	748219.66	1065676.63	201.36
722	748220.36	1065689.06	203.11
723	748220.97	1065685.97	203.15
740	748222.79	1065677.02	204.12
741	748222.64	1065678.12	204.12
742	748221.96	1065681.84	204.17
743	748222.35	1065682.07	204.40
744	748220.70	1065691.74	204.01
745	748219.69	1065695.66	204.15
746	748219.65	1065697.47	204.20
747	748219.47	1065698.42	204.22
748	748218.37	1065704.93	204.21
749	748218.22	1065705.95	204.18
750	748217.38	1065711.36	204.21

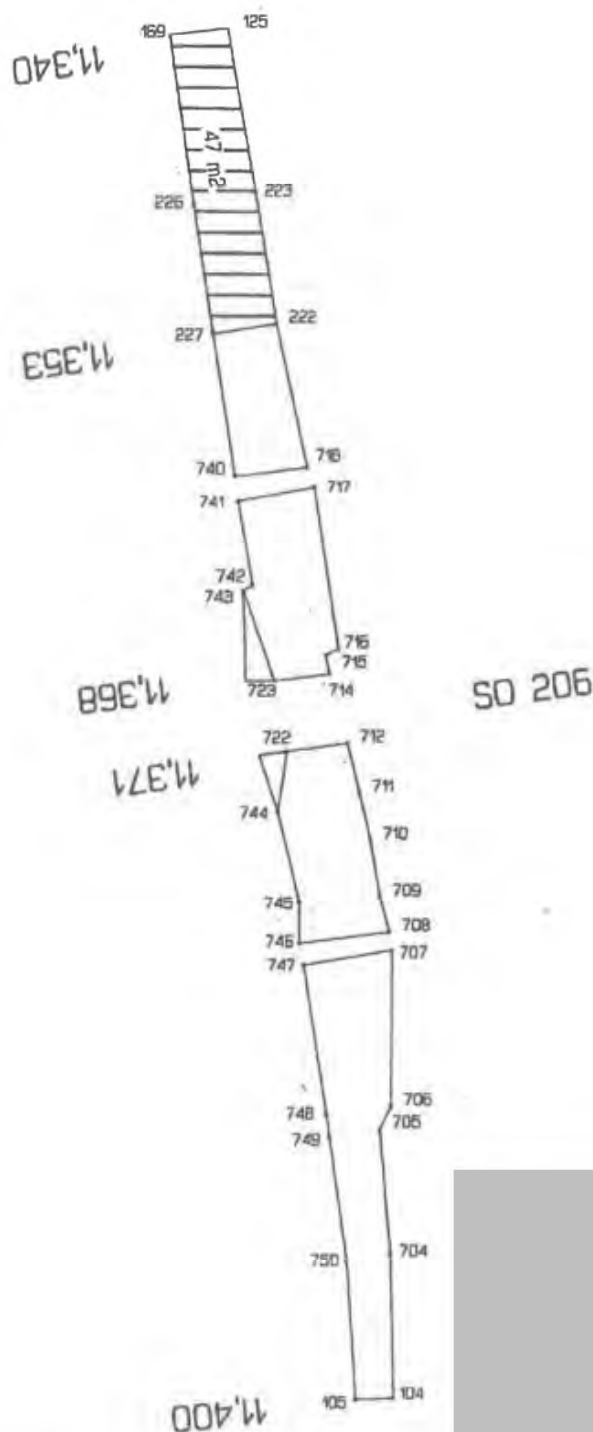

STRABAG a.s. Kabřkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky			
				ověřil		Ing. S. Bliek	
				datum		19.12.2022	
				číslo ověření			
akce II/102 Hr. HL Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Dvle - Stěchovice Úsek B, km 10,340 - 10,400 - vlevo - obložení svahu kamenem							vykres číslo
				měřítko		běž	
záměřil		Ing. Stanislav Bliek	datum	19.12.2022	souř. systém	S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Bliek	datum	19.12.2022	vysk. systém	Bpv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 4/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 10,947 – 11,031 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 10,947 – 11,031 - 165,6 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	7.2.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	7.2.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	7.2.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 10,947 – 11,031 – vlevo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
41	748302.92	1065274.53	201.81
42	748304.30	1065274.53	203.12
101	748303.01	1065276.53	201.93
102	748302.88	1065279.97	201.95
103	748302.38	1065284.29	201.76
104	748302.07	1065286.99	201.69
105	748302.09	1065289.56	201.77
106	748301.77	1065293.99	201.78
107	748301.32	1065298.52	201.85
108	748300.92	1065302.69	201.86
109	748300.13	1065306.89	201.72
110	748299.71	1065311.81	201.89
111	748299.04	1065316.50	201.93
112	748298.72	1065319.71	202.10
113	748298.26	1065323.05	202.21
114	748297.58	1065327.16	202.31
115	748296.64	1065332.15	202.34
116	748296.13	1065335.08	202.46
117	748295.09	1065340.02	202.50
118	748294.02	1065344.48	202.56
119	748292.70	1065349.06	202.50
120	748291.62	1065352.21	202.47
121	748290.84	1065355.00	202.47
122	748291.85	1065356.01	203.27
123	748292.10	1065355.33	203.31
124	748292.94	1065352.67	203.34
125	748294.01	1065349.45	203.37
126	748295.52	1065344.72	203.40
127	748296.61	1065340.31	203.38
128	748297.71	1065335.20	203.34
129	748298.31	1065332.32	203.32
130	748299.21	1065327.23	203.30
131	748299.91	1065323.35	203.28
132	748300.45	1065319.98	203.28
133	748300.93	1065316.75	203.28
134	748301.56	1065312.21	203.26
135	748302.24	1065307.00	203.24
136	748302.70	1065302.84	203.23
137	748303.16	1065298.62	203.21
138	748303.51	1065293.88	203.18
139	748303.72	1065289.56	203.16
140	748303.86	1065286.99	203.18
141	748303.95	1065284.24	203.15
142	748304.14	1065279.92	203.14
143	748304.22	1065276.59	203.14

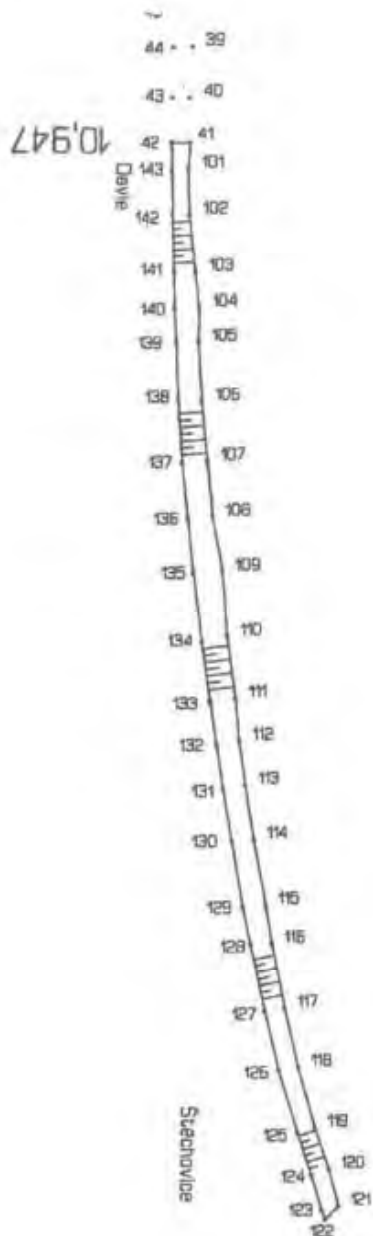

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5			ordo zakázky		
			ověřil		
			datum		
			Ordo ověřen		
číslo II/102 Hr. HL Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Děvle - Stěchovice Úsek B, km 10,947 - 11,031 - obložení svahu lomovým kamenem					výkres ordo
				měřítko	
zpracoval	ing. Stanislav Brlek	datum	7.2.2023	souř. systém	S-JTSK
kreslil	ing. Stanislav Brlek	datum	7.2.2023	výřk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 7/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,976 – 12,440 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 11,976 – 12,440 - 805,3 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic
	Náčrt

Zaměřil:	3.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	8.3.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	8.3.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B


Obložení svahu kamenem v km 11,976 – 12,440 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748080.93	1066729.07	203.15
2	748081.19	1066724.87	202.93
3	748081.66	1066719.41	202.86
4	748082.58	1066713.45	202.94
5	748083.41	1066708.80	203.00
6	748083.90	1066703.48	202.91
7	748084.37	1066699.11	202.89
8	748084.97	1066694.58	202.89
9	748085.75	1066690.60	203.18
10	748085.98	1066687.05	203.00
11	748086.72	1066682.49	203.08
12	748087.18	1066678.03	203.04
13	748087.26	1066675.63	202.75
14	748087.86	1066672.55	202.88
15	748088.63	1066666.74	203.01
16	748089.01	1066663.16	203.01
17	748089.66	1066657.77	202.92
18	748090.37	1066651.81	202.94
19	748091.08	1066645.69	202.88
20	748091.81	1066640.71	202.98
21	748092.41	1066634.43	202.85
22	748093.15	1066627.75	202.86
23	748093.21	1066624.10	202.56
24	748093.95	1066621.66	202.83
25	748094.49	1066616.24	202.78
26	748095.12	1066612.89	202.94
27	748095.23	1066609.16	202.73
28	748095.98	1066604.10	202.68
29	748096.18	1066599.51	202.54
30	748096.83	1066596.16	202.72
31	748097.73	1066590.40	202.82
32	748098.67	1066585.64	203.07
33	748099.00	1066580.53	202.84
34	748099.48	1066575.08	202.65
35	748100.37	1066569.10	202.77
36	748101.15	1066563.06	202.79
37	748101.80	1066556.89	202.69
38	748102.69	1066549.94	202.72
39	748103.70	1066542.04	202.72
40	748104.54	1066535.15	202.72
41	748105.31	1066527.94	202.68
42	748106.30	1066521.18	202.86
43	748107.02	1066514.70	202.78
44	748107.76	1066507.31	202.75
45	748109.06	1066498.22	202.82
46	748110.46	1066488.65	202.90
47	748111.35	1066480.18	202.90
48	748112.40	1066472.69	203.00
49	748113.04	1066466.82	202.99
50	748113.76	1066459.92	202.84
51	748115.21	1066460.06	204.07
52	748114.41	1066466.96	204.11
53	748113.60	1066472.98	204.08
54	748112.72	1066480.48	204.04
55	748111.69	1066488.89	204.09
56	748110.51	1066498.29	204.15
57	748109.32	1066507.43	204.16
58	748108.49	1066514.76	204.17
59	748107.67	1066521.38	204.13
60	748106.83	1066528.09	204.04
61	748105.92	1066535.26	204.01
62	748105.10	1066542.23	204.07
63	748104.10	1066550.14	204.11
64	748103.19	1066557.14	204.07
65	748102.44	1066563.30	204.03

66	748101.69	1066569.28	204.03
67	748100.96	1066575.38	204.08
68	748100.30	1066580.66	204.13
69	748099.64	1066585.83	204.09
70	748099.11	1066590.40	204.10
71	748098.35	1066596.36	204.09
72	748097.92	1066599.81	204.10
73	748097.34	1066604.40	204.08
74	748096.71	1066609.46	204.06
75	748096.26	1066613.06	204.07
76	748095.86	1066616.29	204.10
77	748095.19	1066621.73	204.14
78	748094.40	1066627.91	204.07
79	748093.54	1066634.58	204.07
80	748092.81	1066640.87	204.09
81	748092.18	1066645.91	204.12
82	748091.45	1066652.01	204.10
83	748090.69	1066658.00	204.12
84	748090.05	1066663.17	204.08
85	748089.57	1066666.83	204.06
86	748088.85	1066672.83	204.04
87	748088.49	1066675.76	204.08
88	748088.18	1066678.06	204.06
89	748087.66	1066682.61	204.10
90	748087.13	1066687.10	204.14
91	748086.64	1066690.68	204.13
92	748086.16	1066694.78	204.19
93	748085.61	1066699.16	204.18
94	748085.05	1066703.54	204.18
95	748084.44	1066708.90	204.13
96	748083.78	1066713.60	204.10
97	748083.02	1066719.71	204.11
98	748082.40	1066724.97	204.13
99	748081.89	1066729.14	204.15
100	748080.67	1066739.75	204.20
101	748080.52	1066743.22	204.28
102	748080.31	1066743.23	204.22
103	748080.08	1066745.05	204.22
104	748080.48	1066745.11	204.31
105	748079.88	1066746.75	204.26
106	748080.49	1066746.81	204.34
107	748079.68	1066747.97	204.25
108	748079.69	1066748.19	204.21
109	748080.49	1066748.23	204.38
110	748079.50	1066749.59	203.48
111	748078.51	1066749.07	203.16
112	748078.10	1066747.86	202.92
113	748078.35	1066747.06	202.98
114	748079.15	1066745.00	203.31
115	748079.06	1066743.17	203.09
116	748079.54	1066739.59	203.05
118	748079.89	1066734.13	202.87
119	748081.22	1066734.23	204.17
120	748114.72	1066452.93	202.93
121	748115.64	1066445.27	202.94
122	748116.82	1066437.88	202.97
123	748117.48	1066432.00	203.00
124	748118.21	1066424.51	202.77
125	748119.19	1066417.33	202.84
126	748119.96	1066410.40	202.70
127	748121.06	1066403.00	202.77
128	748122.24	1066394.36	202.85
129	748122.45	1066390.56	202.70
130	748123.57	1066382.53	202.79
131	748123.97	1066377.95	202.72
132	748125.08	1066370.94	202.82
133	748125.95	1066365.75	203.03
134	748126.26	1066360.81	202.81
135	748127.30	1066352.75	202.83
136	748128.04	1066345.24	202.72
137	748128.83	1066338.09	202.65
138	748129.39	1066335.82	202.83
139	748130.15	1066329.37	202.75
140	748131.16	1066321.58	202.76

141	748131.67	1066318.19	202.82
142	748132.04	1066313.70	202.59
143	748132.51	1066308.95	202.57
144	748133.02	1066306.34	202.69
145	748133.44	1066302.34	202.82
146	748133.30	1066298.13	202.69
147	748133.39	1066294.73	202.82
148	748133.38	1066292.08	202.85
149	748133.36	1066289.84	202.93
150	748134.07	1066287.63	203.39
151	748135.00	1066287.68	203.73
152	748135.07	1066289.66	203.83
153	748135.06	1066292.00	203.86
154	748134.94	1066294.92	203.87
155	748134.91	1066298.00	203.89
156	748134.78	1066302.28	203.91
157	748134.19	1066306.49	203.88
158	748133.90	1066309.06	203.87
159	748133.33	1066313.77	203.86
160	748132.78	1066318.47	203.91
161	748132.41	1066321.68	203.92
162	748131.40	1066329.54	203.89
163	748130.62	1066335.99	203.88
164	748130.29	1066338.23	203.88
165	748129.38	1066345.53	203.91
166	748128.48	1066353.00	203.92
167	748127.52	1066360.89	203.96
168	748126.94	1066365.83	203.97
169	748126.28	1066371.14	203.99
170	748125.40	1066378.15	204.00
171	748124.85	1066382.61	204.03
172	748123.82	1066390.75	204.03
173	748123.40	1066394.52	204.06
174	748122.28	1066403.11	204.04
175	748121.36	1066410.46	204.01
176	748120.43	1066417.41	204.07
177	748119.60	1066424.58	204.08
178	748118.66	1066432.25	204.09
179	748117.94	1066437.98	204.08
180	748116.98	1066445.56	204.11
181	748116.03	1066453.15	204.11



12,440

Davie

11,976

STRABAG a.s. Kádřkova 582/41, Praha 5	účetní číslo		účetní číslo	
	výše		výše	
	datum		datum	
	datum		datum	
úloha	I/102 Hr. H. Město Praha - Stachovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davie - Stachovice Úsek B, km 11,976 - 12,440 - obložení závěsu kamínkem			
číslo	11,976	12,440	12,440	12,440
	číslo		číslo	
	výše		výše	
	datum		datum	
	datum		datum	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 8/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 11,780 – 11,971 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 11,780 – 11,971 - 231,1 m²
1x schody - 1,7 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 3.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 14.3.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 14.3.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**

Úsek B


Obložení svahu kamenem v km 11,780 – 11,971 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
185	748137.24	1066281.53	203.55	
186	748137.28	1066281.49	204.00	
187	748137.30	1066278.53	203.29	
188	748137.38	1066274.19	202.92	
189	748137.45	1066268.82	202.58	
190	748138.09	1066263.85	202.62	
191	748139.19	1066257.56	202.84	
192	748139.56	1066254.19	202.80	
193	748140.25	1066252.33	203.09	
194	748140.69	1066248.40	203.10	
195	748141.02	1066244.26	202.94	
196	748141.29	1066243.24	203.08	
197	748141.34	1066240.38	202.85	
198	748142.18	1066236.11	202.86	
199	748142.95	1066236.22	203.85	
200	748142.41	1066240.58	203.89	
201	748142.07	1066243.28	203.91	SCHODY
202	748141.98	1066244.33	203.92	SCHODY
203	748141.43	1066248.64	203.93	
204	748140.71	1066254.16	204.00	
205	748140.30	1066257.68	203.99	
206	748139.51	1066264.03	203.97	
207	748138.89	1066268.96	203.96	
208	748138.24	1066274.29	203.95	
209	748137.68	1066278.51	203.97	
210	748144.07	1066218.39	202.95	
211	748144.76	1066212.15	202.92	
212	748145.78	1066206.51	203.07	
213	748146.33	1066200.12	202.84	
214	748147.19	1066193.75	202.88	
215	748147.57	1066192.47	203.02	
216	748147.86	1066187.75	202.97	
217	748148.79	1066181.79	203.02	
218	748149.66	1066176.68	203.07	
219	748150.29	1066172.23	203.19	
220	748150.72	1066167.57	203.02	
221	748151.27	1066163.42	203.19	
222	748151.75	1066158.96	203.08	
223	748152.18	1066157.74	203.28	
224	748152.46	1066155.23	203.24	
225	748152.85	1066150.66	203.11	
226	748153.56	1066145.24	203.14	
227	748154.24	1066139.53	203.11	
228	748154.84	1066133.43	202.95	
229	748155.63	1066126.82	202.96	
230	748156.65	1066120.42	203.03	
231	748157.39	1066113.56	203.00	
232	748158.26	1066107.43	203.03	
233	748158.83	1066101.01	203.03	
234	748160.15	1066092.67	203.13	
235	748161.22	1066092.82	203.91	
236	748159.97	1066101.08	203.83	
237	748159.11	1066107.58	203.86	
238	748158.40	1066113.74	203.85	
239	748157.57	1066120.48	203.84	
240	748156.74	1066126.99	203.85	
241	748155.87	1066133.58	203.86	
242	748155.15	1066139.58	203.85	
243	748154.42	1066145.31	203.86	
244	748153.73	1066150.80	203.84	
245	748153.12	1066155.31	203.86	
246	748152.86	1066157.86	203.88	
247	748152.62	1066159.10	203.88	
248	748152.09	1066163.43	203.89	

249	748151.55	1066167.80	203.89
250	748150.99	1066172.42	203.89
251	748150.43	1066176.69	203.91
252	748149.77	1066181.89	203.95
253	748149.00	1066187.62	203.97
254	748148.34	1066192.60	203.96
255	748148.19	1066193.83	203.96
256	748147.44	1066200.21	203.97
257	748146.67	1066206.49	203.98
258	748145.94	1066212.40	203.96
259	748145.13	1066218.50	203.95
500	748143.58	1066218.14	202.61
501	748142.91	1066219.85	202.34
502	748142.45	1066221.61	202.11
503	748142.85	1066222.58	202.29
504	748143.41	1066222.98	202.43
505	748144.05	1066222.27	203.39
506	748144.52	1066222.32	203.92
507	748144.89	1066220.06	203.97



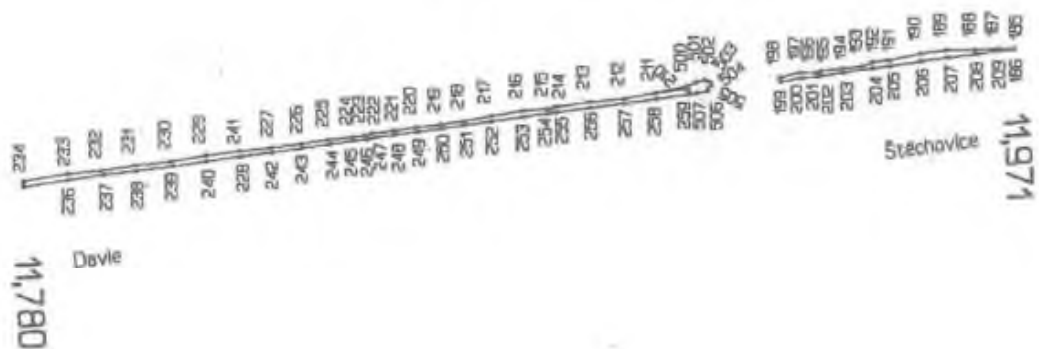

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil Ing. S. Brlek	
				datum 14.3.2023	
				číslo ověření	
akce II/102 Hr. Hl. Město Praha - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SD 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice Úsek B, km 11,780 - 11,971 - obložení svahu kamenem					vykres číslo
				mříčka	bez
záměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	3.2023	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	14.3.2023	vyřk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 11/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 14,410 – 14,460 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 14,410 - 75,4 m²
km 14,460 - 21,5 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 3.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 21.3.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 21.3.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C

km 14,410 a 14,460 – vlevo – obložení svahu kamenem

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
33	747713.16	1068667.88	205.12
34	747709.78	1068671.43	205.82
100	747716.80	1068666.45	204.69
101	747716.33	1068666.11	204.66
102	747713.43	1068668.09	205.11
105	747708.48	1068672.87	205.78
106	747709.71	1068674.32	205.88
107	747710.96	1068672.99	205.88
108	747711.98	1068672.06	205.70
109	747712.16	1068671.77	205.65
110	747714.48	1068669.47	205.16
111	747714.89	1068669.90	206.05
120	747739.82	1068640.28	203.43
121	747741.14	1068642.34	203.71
122	747742.78	1068643.67	205.08
123	747743.22	1068644.28	205.13
124	747748.61	1068637.60	205.02
125	747748.81	1068638.10	205.07
126	747749.14	1068638.43	205.15
127	747747.28	1068635.44	204.76
128	747750.73	1068636.25	205.38
129	747751.05	1068636.48	205.81
130	747751.24	1068636.75	206.14
131	747751.47	1068636.95	206.12
132	747753.86	1068634.44	205.96
133	747753.63	1068634.24	205.86
134	747751.73	1068632.66	205.48
135	747757.35	1068629.03	205.83
136	747759.44	1068627.66	205.91
137	747760.65	1068626.91	205.94
138	747761.68	1068626.07	205.98
139	747757.43	1068630.57	205.94

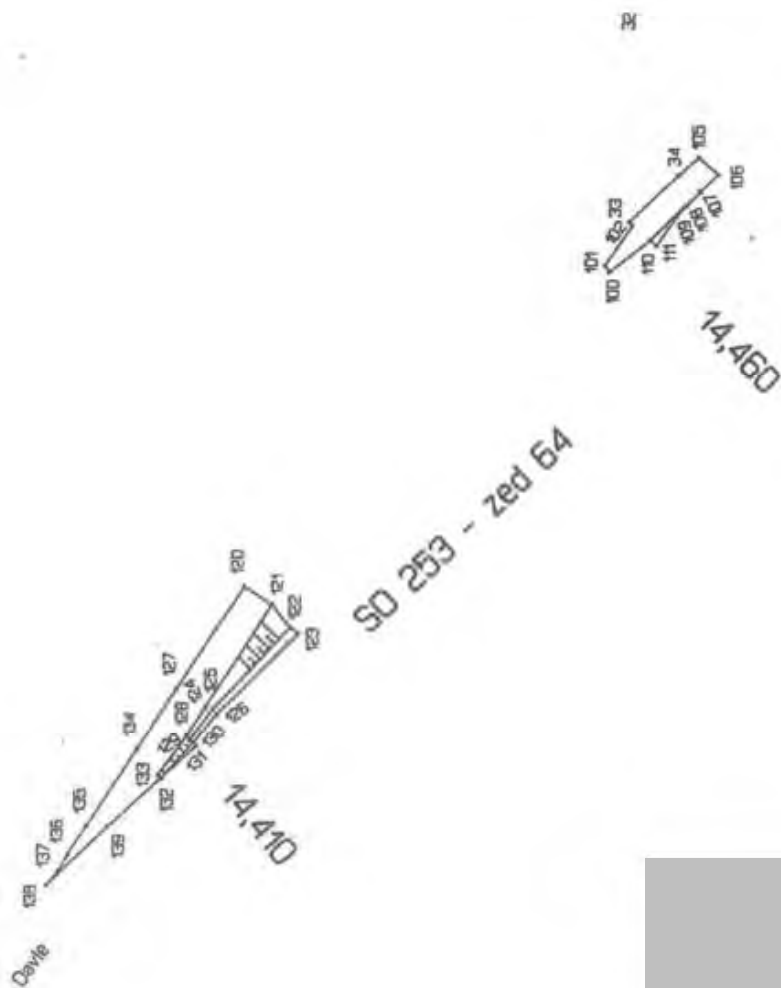

STRABAG a.s. Kacírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				overil	
				datum	
				číslo ověření	
etce II/102 Hr. HL. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice Úsek C, km 14,410 - 14,460 - vlevo - obložení svahu kamenem					výtisk číslo
				měřítko	1 : 500
zpracoval	Ing. Stanislav Břík	datum	3.2023	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Břík	datum	21.3.2023	výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 13/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 14,425 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 14,425 - 22,4 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	12.4.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	12.4.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	12.4.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C

km 14,425 – vlevo – obložení svahu kamenem

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
120	747739.82	1068640.28	203.43
121	747741.14	1068642.34	203.71
212	747739.46	1068643.58	203.14
213	747737.67	1068644.39	202.69
214	747736.93	1068644.45	202.51
215	747735.70	1068643.24	202.47
216	747735.27	1068642.79	202.28
217	747735.76	1068641.95	202.18
218	747736.98	1068641.02	202.34
219	747738.58	1068639.13	202.17
220	747738.65	1068638.79	202.16
221	747739.54	1068637.93	202.07
222	747740.01	1068638.70	202.62
223	747740.24	1068639.13	202.67
224	747739.25	1068639.71	202.94





STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	Ing. S. Brlek
				datum	12.4.2023
				číslo ověření	
akce II/102 Hr. HL Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce. etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice Úsek C, km 14,425 - vlevo - obložení svahu kamenem					výkres číslo
				měřítko	1 : 500
zámětl	Ing. Stanislav Brlek	datum	12.4.2023	spř. systém	S-JTSK
kresl	Ing. Stanislav Brlek	datum	12.4.2023	výšk. systém	Bpv

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 16/2023

Předmět měření: **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
Úsek B – km 11,928 – 12,060 – vpravo – zpevnění svahu kamenem

Zpevnění svahu kamenem
km 11,928 – 12,060 279,5 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	17.4.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	17.4.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	17.4.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků změřených činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Zpevnění svahu kamenem v km 11,928 – 12,060 - vpravo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška
1	748153.296	1066241.066	203.989
2	748151.833	1066253.143	203.927
3	748152.379	1066253.137	203.843
4	748149.350	1066273.044	203.915
5	748149.794	1066273.010	203.826
6	748146.854	1066293.223	203.905
7	748147.446	1066293.248	203.810
8	748144.823	1066312.980	203.868
9	748142.445	1066332.943	203.918
10	748139.775	1066352.641	204.075
11	748138.669	1066362.248	203.959
12	748137.438	1066372.152	203.993
13	748138.791	1066372.323	203.198
14	748139.783	1066369.762	202.745
15	748141.414	1066352.832	202.960
16	748143.737	1066333.121	203.246
17	748146.431	1066313.771	203.046
18	748149.438	1066292.533	202.742
19	748152.191	1066273.416	202.201
20	748154.281	1066253.856	202.497
21	748155.290	1066241.118	202.758

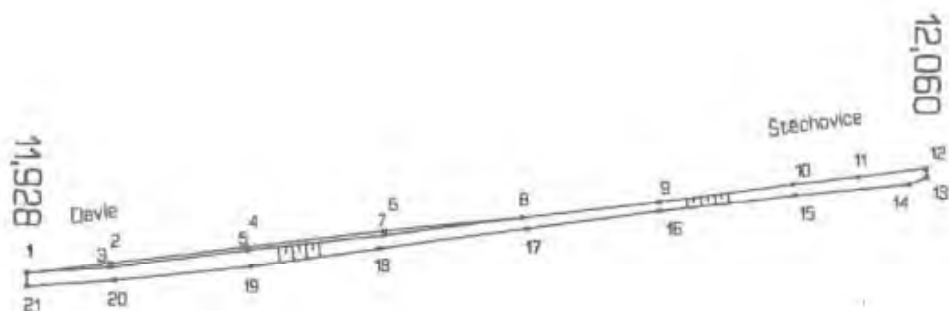

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky							
				ověřil		ing. S. Brlek					
				datum		17.4.2023					
				číslo overení							
akce II/102 Hr. HL Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II								výkres číslo			
SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice											
Úsek B, km 11,928 - 12,060 - vpravo - zpevnění svahu kamenem											
						měřítko		1 : 1000			
zpracoval		ing. Stanislav Brlek		datum		17.4.2023		souř. systém		S-JTSK	
kreslil		ing. Stanislav Brlek		datum		17.4.2023		výš. systém		Bpv	

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 27/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B – km 11,733 – 11,832 – vpravo – obložení svahu kamenem

km 11,733 – 11,832 = 332,7 m²


Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	6.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	5.6.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	5.6.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.



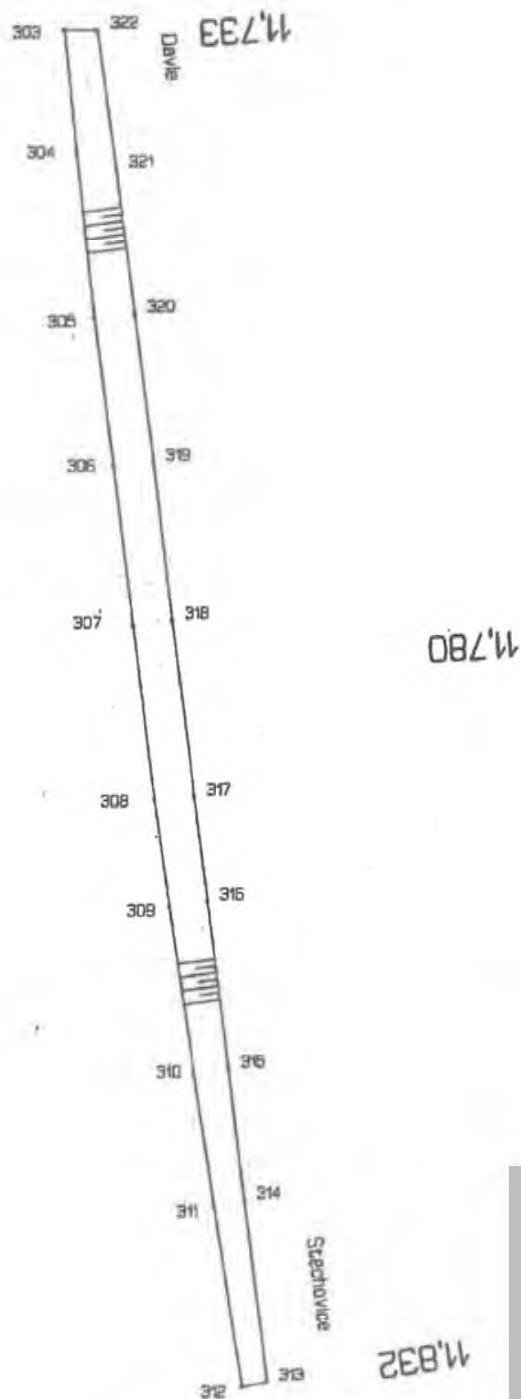

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	
				datum	
				číslo ověření	
objekt II/102 Hr. HL Města Prahy - Stechovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stechovice Úsek B, km 11,733 - 11,832 - vpravo - obložení svahu kamenem					výtisk číslo
				měřítko	1 : 500
zpracoval	Ing. Stanislav Brlek	datum	6.2023	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	5.6.2023	výtisk. systém	Bpv

II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek B

Obložení svahu kamenem v km 11,733 – 11,832 - vpravo

Seznam souřadnic

Bod	X	Y	Výška
301	748179.706	1066038.785	203.992
302	748178.985	1066040.901	203.904
303	748180.707	1066047.527	202.302
304	748179.712	1066056.431	201.932
305	748178.421	1066068.465	201.759
306	748177.071	1066079.196	201.701
307	748175.640	1066090.907	201.752
308	748174.115	1066103.536	201.843
309	748173.004	1066111.402	201.923
310	748171.267	1066123.596	202.064
311	748169.803	1066133.320	202.323
312	748167.718	1066146.705	202.724
313	748165.882	1066146.397	203.922
314	748167.561	1066132.971	203.871
315	748168.719	1066123.347	203.909
316	748170.251	1066111.050	203.892
317	748171.195	1066103.405	203.931
318	748172.796	1066090.531	203.913
319	748174.163	1066078.951	203.854
320	748175.530	1066068.191	203.919
321	748176.915	1066057.629	203.963
322	748178.324	1066047.557	203.993



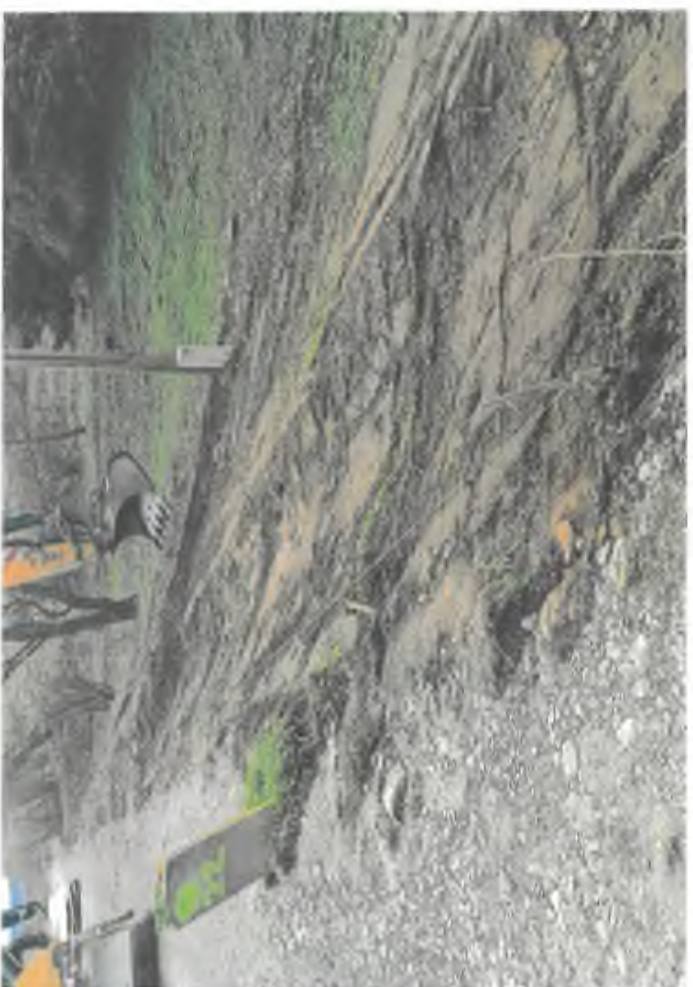





Bo me

Datum: 8.12.2022 Den tyding: 51

[illegible]

Stredisko: *Púchov* Název akcie: *MNO HE. HZ. P. ...*
Pracovní prestávka: *7:00 - 8:00*

[illegible]

nismy: LUBHERI 9H + HODOLICE^T ELADINO; 3x NOVLADNI AUG, KANTER
ČEJN, NALNOOQ, YEDONI DESER OR!

val: $\Delta \psi_{\text{Schottky}} = \Delta \psi_{\text{barrier}} + \psi_0 \approx 0.32 \text{ eV}$, PC 5/6

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- provedení vrtání, osazení, betonování
- čistič, stávkování OS desek v km 11,300 - 11,500
- práce na výhledu stávkování
- provedení osazení, betonování konstrukčních prvků
- v místech výhledu do úprave včetně v km 11,300 - 11,500
- práce na výhledu stávkování + betonování včetně malování
- práce na výhledu stávkování
- práce na výhledu stávkování
- provedení konstrukční práce a po vy. 012 mm v 22. 200 mm
- práce na výhledu stávkování OS desek
- provedení stávkování, betonování, osazení do betonového kódu
- provedení stávkování, betonování, osazení do betonového kódu
- práce na výhledu stávkování a betonování na výhledu stávkování
- práce na výhledu stávkování a betonování na výhledu stávkování

[illegible]

ZAPIS ODI: DOVOLUJI TRAVKORANT LOZOLNITHI OBRAC
2 IC. OBRACI EUDOM GEODESIKH ZATEBRN

provoz / kontrolní větr. s 80 1/6 v 12. 10 mm
v prázdné místnosti, os. 12. 10 mm 12. 10 mm
Podpis stavbyvedce

Podpis zastupce investora (TID):

Podpis stavbyvedy

So 102

Datum: 6. 12. 2022 Den týden: 47

isko: 11/2000 Název akce:

Název akce: 11/10/17 FRODOVITIS, PISTONSTRUCKE, II. EKOLOGIE

isko: 511000 Nazwa ekwi: 111000
111000 + 111000 + 111000 + 111000

Pracovní přestávka: 11:35 - 12:30

Pracovní přestávka: 10 min

na a příjmení: JOSEF BARTAL, VIO. ŽIVĚJŠÍ, ZDRAVÝ
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546

ROSEMARY GARDEN, 1101 W. 12th St, Vancouver
MICHAEL WARENDY, 1112401 Ave, British Columbia

LIBRARY 914, 34 MAR 22 1960, BOSTON, MASS. 02111

30 FE. 0.32 mm, 0.50 mm, 0.70 mm, 1.00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 7.00 mm, 8.00 mm, 9.00 mm, 10.00 mm, 12.00 mm, 15.00 mm, 20.00 mm, 25.00 mm, 30.00 mm, 40.00 mm, 50.00 mm, 60.00 mm, 70.00 mm, 80.00 mm, 90.00 mm, 100.00 mm, 120.00 mm, 150.00 mm, 200.00 mm, 250.00 mm, 300.00 mm, 400.00 mm, 500.00 mm, 600.00 mm, 700.00 mm, 800.00 mm, 900.00 mm, 1000.00 mm, 1200.00 mm, 1500.00 mm, 2000.00 mm, 2500.00 mm, 3000.00 mm, 4000.00 mm, 5000.00 mm, 6000.00 mm, 7000.00 mm, 8000.00 mm, 9000.00 mm, 10000.00 mm, 12000.00 mm, 15000.00 mm, 20000.00 mm, 25000.00 mm, 30000.00 mm, 40000.00 mm, 50000.00 mm, 60000.00 mm, 70000.00 mm, 80000.00 mm, 90000.00 mm, 100000.00 mm, 120000.00 mm, 150000.00 mm, 200000.00 mm, 250000.00 mm, 300000.00 mm, 400000.00 mm, 500000.00 mm, 600000.00 mm, 700000.00 mm, 800000.00 mm, 900000.00 mm, 1000000.00 mm, 1200000.00 mm, 1500000.00 mm, 2000000.00 mm, 2500000.00 mm, 3000000.00 mm, 4000000.00 mm, 5000000.00 mm, 6000000.00 mm, 7000000.00 mm, 8000000.00 mm, 9000000.00 mm, 10000000.00 mm, 12000000.00 mm, 15000000.00 mm, 20000000.00 mm, 25000000.00 mm, 30000000.00 mm, 40000000.00 mm, 50000000.00 mm, 60000000.00 mm, 70000000.00 mm, 80000000.00 mm, 90000000.00 mm, 100000000.00 mm, 120000000.00 mm, 150000000.00 mm, 200000000.00 mm, 250000000.00 mm, 300000000.00 mm, 400000000.00 mm, 500000000.00 mm, 600000000.00 mm, 700000000.00 mm, 800000000.00 mm, 900000000.00 mm, 1000000000.00 mm, 1200000000.00 mm, 1500000000.00 mm, 2000000000.00 mm, 2500000000.00 mm, 3000000000.00 mm, 4000000000.00 mm, 5000000000.00 mm, 6000000000.00 mm, 7000000000.00 mm, 8000000000.00 mm, 9000000000.00 mm, 10000000000.00 mm, 12000000000.00 mm, 15000000000.00 mm, 20000000000.00 mm, 25000000000.00 mm, 30000000000.00 mm, 40000000000.00 mm, 50000000000.00 mm, 60000000000.00 mm, 70000000000.00 mm, 80000000000.00 mm, 90000000000.00 mm, 100000000000.00 mm, 120000000000.00 mm, 150000000000.00 mm, 200000000000.00 mm, 250000000000.00 mm, 300000000000.00 mm, 400000000000.00 mm, 500000000000.00 mm, 600000000000.00 mm, 700000000000.00 mm, 800000000000.00 mm, 900000000000.00 mm, 1000000000000.00 mm, 1200000000000.00 mm, 1500000000000.00 mm, 2000000000000.00 mm, 2500000000000.00 mm, 3000000000000.00 mm, 4000000000000.00 mm, 5000000000000.00 mm, 6000000000000.00 mm, 7000000000000.00 mm, 8000000000000.00 mm, 9000000000000.00 mm, 10000000000000.00 mm, 12000000000000.00 mm, 15000000000000.00 mm, 20000000000000.00 mm, 25000000000000.00 mm, 30000000000000.00 mm, 40000000000000.00 mm, 50000000000000.00 mm, 60000000000000.00 mm, 70000000000000.00 mm, 80000000000000.00 mm, 90000000000000.00 mm, 100000000000000.00 mm, 120000000000000.00 mm, 150000000000000.00 mm, 200000000000000.00 mm, 250000000000000.00 mm, 300000000000000.00 mm, 400000000000000.00 mm, 500000000000000.00 mm, 600000000000000.00 mm, 700000000000000.00 mm, 800000000000000.00 mm, 900000000000000.00 mm, 1000000000000000.00 mm, 1200000000000000.00 mm, 1500000000000000.00 mm, 2000000000000000.00 mm, 2500000000000000.00 mm, 3000000000000000.00 mm, 4000000000000000.00 mm, 5000000000000000.00 mm, 6000000000000000.00 mm, 7000000000000000.00 mm, 8000000000000000.00 mm, 9000000000000000.00 mm, 10000000000000000.00 mm, 12000000000000000.00 mm, 15000000000000000.00 mm, 20000000000000000.00 mm, 25000000000000000.00 mm, 30000000000000000.00 mm, 40000000000000000.00 mm, 50000000000000000.00 mm, 60000000000000000.00 mm, 70000000000000000.00 mm, 80000000000000000.00 mm, 90000000000000000.00 mm, 100000000000000000.00 mm, 120000000000000000.00 mm, 150000000000000000.00 mm, 200000000000000000.00 mm, 250000000000000000.00 mm, 300000000000000000.00 mm, 400000000000000000.00 mm, 500000000000000000.00 mm, 600000000000000000.00 mm, 700000000000000000.00 mm, 800000000000000000.00 mm, 900000000000000000.00 mm, 1000000000000000000.00 mm, 1200000000000000000.00 mm, 1500000000000000000.00 mm, 2000000000000000000.00 mm, 2500000000000000000.00 mm, 3000000000000000000.00 mm, 4000000000000000000.00 mm, 5000000000000000000.00 mm, 6000000000000000000.00 mm, 7000000000000000000.00 mm, 8000000000000000000.00 mm, 9000000000000000000.00 mm, 10000000000000000000.00 mm, 12000000000000000000.00 mm, 15000000000000000000.00 mm, 20000000000000000000.00 mm, 25000000000000000000.00 mm, 30000000000000000000.00 mm, 40000000000000000000.00 mm, 50000000000000000000.00 mm, 60000000000000000000.00 mm, 70000000000000000000.00 mm, 80000000000000000000.00 mm, 90000000000000000000.00 mm, 100000000000000000000.00 mm, 120000000000000000000.00 mm, 150000000000000000000.00 mm, 200000000000000000000.00 mm, 25000000000000

je práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - periodická dotazníka setravních děl
- periodická dotazníka setravních děl v km
- periodická dotazníka setravních děl v km
- periodická dotazníka setravních děl v km

(včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PRONÍKÁNÍ ADRESAMI UŽIVATELŮ U MÍSTECH NOVÉ RUDOVNÉHO (STŘEDNÍHO ŠOLU) V KM PRONÍKÁNÍ + 02

(včetně dodavatelů a jejich členů):
V MÍSTECH NOVÉ RUDOLFOVÉHO (STŘEDNÍHO ŠKOLY) + DRŽE
11. 6. 7. - 11. 8. 2008 PRÁVA (JAZA NA VE PRÁVA) PRÁVNÍKŮ + DRŽE
NA MÍSTĚ PRÁVA

11, 627 - 11, 800 years B.P.
 5500-6000 years B.P. in the
 10,000 years B.P. to the present

11. 6. 27 - 11. 6. 20. Práva
ekonomického práva na individuální
ekonomický potřeby, práva, která jsou ekonomického práva
v místě nového ekonomického práva (ekonom. práva práva)
v místě nového ekonomického práva (ekonom. práva práva)

V NISTE NOVÉHO PRÁVNÍKA

V NISTA NOVEHO VYKAZU
+ ODPOVEDI NA OTAZY O VYKAZU

+ adol. (1900-1970) - "MARTIN LUTHER KING JR." + BEATRICE
PARKER (1900-1970) & ED. 1932 m.m. + BEATRICE
(1900-1970) & ED. 1932 m.m. + BEATRICE

(அனுபவம். காலம் 1000 மணி)
 காலம் 9 மணி 0 நிமிஷம் 453
 காலம் 1000 மணி 1000 மணி 1000

ADVE, NEUMONITNO VZROČNEHO PROJEKCIJE
PRAVILNOSTI, VZROČNEHO PROJEKCIJE

[illegible][illegible]

2085 SCHWABEN / WOLFENBUTTEL
- PANGOLIN VIRENSEN / FROGNA IS STREIL VERFÜRGEN
1. Hm 17,300 - 17,600

✓ km 17,300 - 17,500 peaky forest

Podpis stavby:

odpis zástupce investora (TDI)

So 102 ✓

Datum: 5. 12. 2022 Den týdene: 10

Den t dne: 10

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

ve středisku: $341/2000$ Název akce: 11100
 ústřední: $2000 + 300$, 052 , 700 , 1000 , 1000
 doba: 30 - 100 1000 1000

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 14⁰⁰

Pracovní přestávka: 11

LIBRARY 912, LIBRARY 913, 3x MICHIGAN AUTO, 2x FORD TRUCK, 1700 BONE BEARING, TROOP 102, BROWN 55M MICHIGAN.

Material: 256 urogenital system, section, potassium ce. 4/8 mm

Troubleshooting:

Předané práce

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PŘEDÁNÍ PRÁCE
PŘEDÁNÍ PRÁCE
PRÁCE V MĚSÍCI 11, 1980 - 11, 1980 PRÁCE PRÁCE V MĚSÍCI
PRÁCE V MĚSÍCI 11, 1980 - 11, 1980 PRÁCE PRÁCE V MĚSÍCI

POWERS &
PROVISION

PARTIJE V LETU 1948
 STANISLAV, BRADAN, STANISLAV, OR DEJNO, OR DEJNO
 - DEJNO, DEJNO, STANISLAV, OR DEJNO, OR DEJNO
 KOTIČA, STANISLAV, STANISLAV, OR DEJNO, OR DEJNO
 NE STANISLAV, STANISLAV, STANISLAV, OR DEJNO, OR DEJNO

[illegible]

NE PRÁVY STANOVENÍ + SOUHRN
LITERAR. 974 + NEDOKLADKOVÉ PŘÍLOHY
"PROVIZORNI" ODŠKODENÍ PRÁVNÍ JEDNOTKA VYPLVÁČKA S RYCHLOU
KAPKOVÁNÍ DO RYCHLOUHO LOKU V 10m 7,300 - 7,400 2616
KAPKOVÁNÍ PRÁVNÍ JEDNOTKA

QUESTIONS DO NOT WRITE IN THESE SPACES

- ВСТУПАЮЩИЙ ДО СТОЛОВОГО
 ПОДЪЕЗДА НА ПЯТОМ ПОВТОРЕНИИ
 - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИНИМАЮЩИЙ ДОСЬЕ (КАКОВЫЕ-ТО ДОКУМЕНТЫ) ПОСЛЕ ЧЕГО
 (ЗАНИМАЕТ ПРАВОЕ ПОДКОЛО) ПОСЛЕ (ОДНО) ПОСЛЕ
 ПЯТОМ ПОВТОРЕНИИ

[illegible]

ADVICE: RECOMMENDING THAT THE
US GOVERNMENT NOT REACT
TO THE "UNLAWFUL" INFORMATION FROM STATION OF DECEY

- rozměry "výplně" tvořících stěn
v km 12,300 - 12,800 přesně podle výš. stávků

People stayb

Podpis zástupce investora (

Datum: 29. 11. 2022 Den tyde: VI

středisko: 841206 Datum: 01. 11. 2000
Název akce: 11/101 HD. AL. 07. PENTAT - ŠKOLNÍK, PRÁZDNÉ, KURČE, H. KŘÍŽ

Pracovní přestávka: 7⁰⁰... 8⁰⁰

Pracovní přestávka: " 10
Pracovní doba: 300
Pracovní jména a příjmení: JAKUBŠAN JIŘEK, OLGA BUDÁKOVÁ, ZDENĚK KOUTNÝ, MICHAEL
BRENDERT, VASIL KAD, ROZÁRKA VEDVÍKOVÁ, MILAN BRATIS, MICHAEL VITVÝ
LADKA FANGL, VILK VILK

poslední: LIEBHARD OR LIEBHARD 914 8XWAGON AUTO, 2nd FORD TRANSIT,
MOSKOV BAIKA PANEL

At Rixtons Road Sale DN 100, BELLAUGH MOTTEN, BELTON, N56 FB. OR. mts

Trosky.

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVÁDĚNÍ PROPOJENÍ DESKOVÉ KANALIZACE (PRÁVE A LÉVÉ POKLADNÍ DOSTU) S MÍSTNÍM DO STŘEDNÍM VODOTĚM POD PROTĚTÍ (POKLADNÍ PRÁVNÍCH ROVR)
- PROVÁDĚNÍ PRŮPLVŮ PŘI ROVR (PRÁVE A LÉVÉ POKLADNÍ DOSTU) PŘÍKROU VE 0,12/111
- PROVÁDĚNÍ ZAKLADNÍ PRÁVNÍ ASFALTOBETONU + ZABUDOVÁNÍ V KM 11,500 - 11,450 PRÁVNÍ STRANA VE PRÁVNÍ STANOVISNÍ + OBRU, ASFALTOBETON OBU NA STANOVISNÍ
- PROVÁDĚNÍ ZABUDOVÁNÍ PRÁVNÍ TĚLŮ KANALIZACE S DESKOVÝM VODOTĚM DO BETONOVÉHO LÁZE V KM 11,300 - 11,400 LÉVÁ STRANA VE PRÁVNÍ STANOVISNÍ

Zápis z výstaviště: 8. 5. 1946, 10. 5. 1946
 (K. Práček a. p.) JARIN L. 10. 5. 1946, 10. 5. 1946
 10. 5. 1946 a 10. 5. 1946, 10. 5. 1946, 10. 5. 1946
 K. 10. 5. 1946 - 10. 5. 1946, 10. 5. 1946, 10. 5. 1946
 a 10. 5. 1946, 10. 5. 1946, 10. 5. 1946, 10. 5. 1946
 10. 5. 1946 a 10. 5. 1946, 10. 5. 1946, 10. 5. 1946
 10. 5. 1946, 10. 5. 1946, 10. 5. 1946, 10. 5. 1946

ZÁPIS VDI: PO PŘEHLEDNÉ KONSOLÉ A 24 DODATKOVÝCH VÝKONTROLER
KONSOL. ZKONTROL. DOKUMENT. POKROČIL. POKROČIL. FIAV
V ÚSTŘEDNÍM ÚSTŘEDNÍ

Podpis stavbyve

Podpis zástupce investora (TDI)

do 102

Den tøndre: Pe

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

chemistry: LIVERPOOL GR., LIVERPOOL GR., + BOURBON, MENDOZA, MENDOZA DE ROSA,
ST. ANDREW'S, RTO, ST. FOOD TOWN, VALLEY HART

Material: 30 AB. 0/32mm A, GELURAN BIRU, BIRU

trouček:

[illegible]

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího

So 102

Datum: 4. 11. 2022 Den týdne: P.

[illegible]Pracovní přestávka: $H^{*0} \sim Q^{*0}$

Phismy: DISPER 912, 2158 HSC 914, 31 NARCISSUS 910, 21 FORD TERRIT II, NARCI
14307

10 ft. ORIENTAL, ~~ORIENTAL~~ ROOTS, BROWN

mušky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVEDENÍ ODRŽENÍ + JINÉ ÚPRÁVY
PROVEDENÍ PR. ODRŽENÍ V KM 11,500 - 11,440 PRÁVA STRANA
KE SPŘEDÍ STANOVENÍ + ODVOZ MATERIÁLŮ NA PŘÍPOJEK KATY
"PROVEDENÍ ODRŽENÍ + NEKONFORMNOSTI SPRÁVNOSTI
V KM 11,500 - 11,440 PRÁVA STRANA KE SPŘEDÍ STANOVENÍ + ODVOZ
MATERIÁLŮ NA PŘÍPOJEK
- PROVEDENÍ ODRŽENÍ PRÁV. KONTROLACE DO ÚROVNĚ PLOŠE +
PROVEDENÍ PLOŠE KATY KATY V KM 11,500 - 11,440 PRÁV. STRANA KE SPŘEDÍ
- PROVEDENÍ ODRŽENÍ PLOŠE 8 (3) PR. 0132mm Ø V R. 5cm
V KM 11,500 - 11,440 PRÁVA STRANA KE SPŘEDÍ STANOVENÍ +
KONTROLA KATY
- PROVEDENÍ ODRŽENÍ JINÉ ÚPRÁVY KONTROLACE 8. KONTROLNÍHO
KONTROLA DO 8. KONTROLNÍHO 105.8 V KM 11,300 - 11,053 PRÁVA
KE SPŘEDÍ STANOVENÍ

Podpis zástupce investora _____

Podpis slavnob

TRABAG

SO 102

Datum: 6. 11. 2022

Den týdne: Pá

Inzaloško: 84110000

Název akce:

11/K2) RD. H2. J. PRAT, STŘEDNÍ, PRACOVNÍ KČE, J. EPPA

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Podpis stá

Podpis zástupce investora

50 702

Datum: 3.11.2022

Den tydne: 5.

[illegible]Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

2^o - 16^o
(jména a příjmení): MICHAEL BERN, FRANKÉD JOKLICKA, MICHAEL DINE,
ROBERT FENEL, JÁN JUREK, JAROSLAV STIPEK, OLIV LUKAS,
OLIV ENČURA, MATJEF PARDOUL, MICHAEL CHENOST, VÁCLAV HLAD,
JOSÉF LOUTENARD

LIBRARY 921, LIBRARY 904, SYMBIONESE AUTO, BEAKS 6804
HOLLYWOOD, 21700 TRANSIT

PERALAN, BATAN, SAMPALAN, SAMPALAN, SAMPALAN

plně práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ PRACÍ PRŮVODNÍHO OBKLADNÍHO KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE V LHM 14,570 - 14,520 LEMO STĚNA 15
PROJEKT STROMOJEVI
- PROVEDENÍ PRACÍ PRŮVODNÍHO KOTVENÍ PRŮVODNÍHO OBKLADNÍHO KOTVENÍ 0.63, 0.64
15 LHM 14,430 - 14,000 LEMO STĚNA 15 PROJEKT STROMOJEVI
- PROVEDENÍ PRACÍ PRŮVODNÍHO KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE
OBKLADNÍHO KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE
- PROVEDENÍ PRACÍ PRŮVODNÍHO KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE
OBKLADNÍHO KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE

Podpis stavby

 Odpis zástupce inv.

So now

Datum: 26.10.2022 Den tydne: 85.

Uisko: 8/11/2021 Nazov akcie: 11/10/11 HR. HL. 11. PRATO, JINHOVITE, RECONSTRUCTIVE, I. STARA

SNO, R₂NO + 3%, POH + 74%, 20PO₂ + 7%

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

na a prijmeni): FRANKLIN, NICHOLAS, WILLIAM BATES, JIM LUCKE, ALAN HANCOCK,
MICHAEL DIXIE, ERNEST FENNEL, JOHN WOLF, GEORGE BOUTENKIN, PAUL
LEED, MICHAEL SHANNON, JOSEPH ESTEE, OLIVER BUCHER, ROBERT
HOLDS

LIBRARY 912, LIBRARY 914, 34 NICHOLSON AVENUE, BRIDGE, WOLFE HATH,
BRIDGE 0500/10120000, LA BORD TRAVEL

SE 5/6, BSALEIGH, KATHEN, BRYON

plně práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - poskytnutí zdravotních karet z PC 1/6

✓ km 3,200 - 3,500 2519' pinnas 18' pinnas pinnas

poskytnutí ústřední právní služby související se poskytnutím
pomocí s poskytnutím ústřední služby do ustanoveného období v den

7/300 - 7/203 15768 7/203 15768 7/203 15768

POVRCHOVÁ GRADINA, PRAMEN KOTÉHO ODVODNĚNÍ S BEZPEČNÍM
VÝSTUPEM DO BEZPEČNOSTI 1685 V KM 19,300 - MÍSTO KOTÉ
JE PRAMEN GRADINA

Родился в семье 49 марта 1957 года

Podpis stavbyvedce

So far

Datum: 25.10.2022 Den tids: 15

ni dabe: 17-1-70

Pracovní přestávka: 1100-1200

onyms: 660000, 1010000, 1100000, 1200000, 1300000, 1400000, 1500000, 1600000, 1700000, 1800000, 1900000, 2000000, 2100000, 2200000, 2300000, 2400000, 2500000, 2600000, 2700000, 2800000, 2900000, 3000000, 3100000, 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 3600000, 3700000, 3800000, 3900000, 4000000, 4100000, 4200000, 4300000, 4400000, 4500000, 4600000, 4700000, 4800000, 4900000, 5000000, 5100000, 5200000, 5300000, 5400000, 5500000, 5600000, 5700000, 5800000, 5900000, 6000000, 6100000, 6200000, 6300000, 6400000, 6500000, 6600000, 6700000, 6800000, 6900000, 7000000, 7100000, 7200000, 7300000, 7400000, 7500000, 7600000, 7700000, 7800000, 7900000, 8000000, 8100000, 8200000, 8300000, 8400000, 8500000, 8600000, 8700000, 8800000, 8900000, 9000000, 9100000, 9200000, 9300000, 9400000, 9500000, 9600000, 9700000, 9800000, 9900000, 10000000, 10100000, 10200000, 10300000, 10400000, 10500000, 10600000, 10700000, 10800000, 10900000, 11000000, 11100000, 11200000, 11300000, 11400000, 11500000, 11600000, 11700000, 11800000, 11900000, 12000000, 12100000, 12200000, 12300000, 12400000, 12500000, 12600000, 12700000, 12800000, 12900000, 13000000, 13100000, 13200000, 13300000, 13400000, 13500000, 13600000, 13700000, 13800000, 13900000, 14000000, 14100000, 14200000, 14300000, 14400000, 14500000, 14600000, 14700000, 14800000, 14900000, 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15700000, 15800000, 15900000, 16000000, 16100000, 16200000, 16300000, 16400000, 16500000, 16600000, 16700000, 16800000, 16900000, 17000000, 17100000, 17200000, 17300000, 17400000, 17500000, 17600000, 17700000, 17800000, 17900000, 18000000, 18100000, 18200000, 18300000, 18400000, 18500000, 18600000, 18700000, 18800000, 18900000, 19000000, 19100000, 19200000, 19300000, 19400000, 19500000, 19600000, 19700000, 19800000, 19900000, 20000000, 20100000, 20200000, 20300000, 20400000, 20500000, 20600000, 20700000, 20800000, 20900000, 21000000, 21100000, 21200000, 21300000, 21400000, 21500000, 21600000, 21700000, 21800000, 21900000, 22000000, 22100000, 22200000, 22300000, 22400000, 22500000, 22600000, 22700000, 22800000, 22900000, 23000000, 23100000, 23200000, 23300000, 23400000, 23500000, 23600000, 23700000, 23800000, 23900000, 24000000, 24100000, 24200000, 24300000, 24400000, 24500000, 24600000, 24700000, 24800000, 24900000, 25000000, 25100000, 25200000, 25300000, 25400000, 25500000, 25600000, 25700000, 25800000, 25900000, 26000000, 26100000, 26200000, 26300000, 26400000, 26500000, 26600000, 26700000, 26800000, 26900000, 27000000, 27100000, 27200000, 27300000, 27400000, 27500000, 27600000, 27700000, 27800000, 27900000, 28000000, 28100000, 28200000, 28300000, 28400000, 28500000, 28600000, 28700000, 28800000, 28900000, 29000000, 29100000, 29200000, 29300000, 29400000, 29500000, 29600000, 29700000, 29800000, 29900000, 30000000, 30100000, 30200000, 30300000, 30400000, 30500000, 30600000, 30700000</

19: SC 5/6, OBUKON, MESTEN, BETON

sky:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): "rozšíření kontaktního centra z 2016
na 1. patro ke společné práci"

V AM 13.00 - 13.15 (Přestávka na občerstvení)

У дн 13,200 - 13,180 2575 (позако 15 јануари 1990. године)
- додатоци укупно 2575 јануари 1990. године
укупно 2575 до 2575 до 2575 у дн 13,200 - 13,180

10/10/2020

- POUŽITÍ PRÁCEJ
- POUŽITÍ PRÁCEJ
- POUŽITÍ PRÁCEJ
- POUŽITÍ PRÁCEJ
- POUŽITÍ PRÁCEJ

John J. McCarty

Podpis

Podpis zástupce

So 102

Datum: 17.10.2021 Den tid: 10.55

Den tid der: PO

Název akce: 11/10/19. 12. 17. 2019

Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 8⁰⁰

Rediško: ~~8/10~~ Nazev države: ~~SRB~~
 Datum: ~~20.10.2017~~ Pol: ~~10.10.2017~~ ODP: ~~10.10.2017~~
 Vrsta: ~~10.10.2017~~ Naziv: ~~SRB~~

[illegible]

PORTERSHIP, OLEF
LIEBERER JR., LIESBORN, 975, 10250 HAWK, PORTER GREEN, NARRAGANSETT
VIR. RESIDE DOU. SPANGLAND AND LATOON TRACT

WEEK END, 20th, 21st

[illegible]

Pod

Podpis zástupce investora (TDI):

So 102 ✓

Datum: 6.10.2022 Den lydne: 01

Název akce: H1021 MG HL ST 20271 Středisko: ...

Místo středisko: Pilsen Název akce: H1021 MG HL ST 20271 Středisko: ...

[illegible]

Priloha (jména a příjmení): FRANCO, AN. NERIO, QUEM. BIONDA, MATUR. PASCOLO, JO.
FRANCO, AN. NERIO, QUEM. BIONDA, MATUR. PASCOLO, JO.
FRANCO, AN. NERIO, QUEM. BIONDA, MATUR. PASCOLO, JO.

[illegible]

Material: Blackwood, BERN, 10th. 1/30mm

žoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POUKÁZÁNÍ ODBĚRNÍKŮ PRAMENŮ TĚŽBY
PŘÍRODNÍHO A KRAJINNÉHO DĚDÍSTVÍ DO SATELNÍHO
KARTY A KARTY TĚŽBY - 14,500 1974
PŘÍRODNÍ DĚDÍSTVÍ A DO PR. 0131 + KRAJINNÉ DĚDÍSTVÍ
PŘÍRODNÍ DĚDÍSTVÍ A DO PR. 0131 + KRAJINNÉ DĚDÍSTVÍ
PŘÍRODNÍ DĚDÍSTVÍ A DO PR. 0131 + KRAJINNÉ DĚDÍSTVÍ
PŘÍRODNÍ DĚDÍSTVÍ A DO PR. 0131 + KRAJINNÉ DĚDÍSTVÍ
PŘÍRODNÍ DĚDÍSTVÍ A DO PR. 0131 + KRAJINNÉ DĚDÍSTVÍ

Prudis

Podpis zastupce investora (TD1):

So we

Den tydnr: 12

Datum: 5.10.2022 Den tittel: PROSODI 15, PROSODI 16, 1.8.180

Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 12⁰⁰

(jména a příjmení): KROŠEN ŠESTÁK, MICHAEL; MUDRÝ JAROSLAV
DUBAČEK OBRADNÝ, VĚRA; FENCLO, JINĀ HOL DIVER,

IN/1012

~~FINANCIAL RECORDS~~, MATTHEW B. BURR + HENRY J.

Ref. S. 2001, vol. 16 + 17B at 10-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842

ANTHROPOLOGICAL UNIT

sky

vedené práce (výstavní dodavatelé) a jejich činnosti:

ПОДПИСАНИЕ: ПРОДОВОЖАЮЩИЙ ПО ПОСЛАНИЮ

$\text{POTENTIAL} = \frac{\rho Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

7500 - 7800, Lower Pangea 12

from 11,500 - 11,800 to 11,500 - 11,800

COLLEGGIATI VOSTRO PASTOR
PASTOR DOTT. 1025 V. Lm.

14 SEP 1945 10:45 1002 PLASTETT V. KM 2 12440
1002 PLASTETT V. KM 2 12440

$\frac{1}{2} \times 1000 = \frac{1}{2} \times 500 \text{ (under)}$
(continued) $\frac{250}{250} \times 63) + \text{HUMAN} \text{ SO VICTIMS}$

Podpis st. [redacted]

Debitul de investiții (DI):

So 102

Datum: 4.10.2022 Den tyder: 17

Den tydne: 17

středisko: Prácheň Název akce: 11/02 AR. M. P. 0001, PASOPOVCE, KAMENICE
0000 + 002, 002 + 100, 0002 + 100 Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

jméno a příjmení: PAVLA KEMBOVA, JAROSLAV ŠPÍRE, FRANK RUD. ELIŠ,
PAVLA ŽITKA, OLGA RUDOLFA, JOSEF VILK DOBŠÍ, MILA MUD

any: disturbance, good spirit

~~napisati~~ srednji postar 1,4 kg / m², površinski sloj, 80 cm

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- POSOUZENÍ JAKOSTI PRÁCE V LOMU 11,300 - 11,400 JEDN. PŘEDNÍ
- POSOUZENÍ JAKOSTI PRÁCE V LOMU 11,500 - 11,600 JEDN. PŘEDNÍ
- POSOUZENÍ JAKOSTI PRÁCE V LOMU 11,700 - 11,800 JEDN. PŘEDNÍ
- POSOUZENÍ JAKOSTI PRÁCE V LOMU 11,900 - 12,000 JEDN. PŘEDNÍ

Podpis stawa

Podpis zástupcu investora (TbI):

PO 102

Datum: 26.9.2002 Den tydner: CT

Datum: 29. 9. 2012 Den týdne: Út
Název akce: H/102 NR. 12. N. PRATY, PISO PORICE, DEZARTEJACE, T. STORA
Pracovní přestávka: 11⁰⁰-13⁰⁰
PRACOVNÍ DÍVĚ KAREL FENCE;

[illegible]

MICHAEL GREENBERG
HERI 94, JAVIC, NR (JAVIC), FORD V/301, BARKI NR,
OTHER CURENA, ZANALSON AUTO, LIEBER 1911

RESOURCES, REGION, RATION, POLITICAL PROGRESS AND PDS

(včetně dodavatelů a jejich činnosti): PRONÍŠOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ (PRONÍŠOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ) 10815 Y 11, 680 -

[illegible][illegible]

- "POTRUBIŠENI" V KM 11,300 - 11,400
 - "POTRUBIŠENI" V KM 11,300 - 11,400
 - "POTRUBIŠENI" V KM 11,300 - 11,400
 - "POTRUBIŠENI" V KM 11,300 - 11,400

- "PRAVIDELNÍ" VÝCHOVY KOMUNISTY
VÝCHOVY "PRAVIDELNÍ" ŽIVOTNÍ OBDOBÍ V R. 1950-1960
PRAVIDELNÍ ŽIVOTNÍ OBDOBÍ (NEPRAVIDELNÍ ŽIVOTNÍ OBDOBÍ)
PRAVIDELNÍ ŽIVOTNÍ OBDOBÍ

1. První část (1. až 10. kapitola) - První část (1. až 10. kapitola) - První část (1. až 10. kapitola)

2005-07
Základní údaje: 701 pracovních míst
Příjemci: v km 17,300-17,620 (základní mzda) a 17,620-17,800 (základní mzda + příspěvek)
17,800-18,000 (základní mzda + příspěvek + bonus) a 18,000-18,200 (základní mzda + příspěvek + bonus + bonus)
18,200-18,400 (základní mzda + příspěvek + bonus + bonus + bonus) a 18,400-18,600 (základní mzda + příspěvek + bonus + bonus + bonus + bonus)

[illegible]

15. POKRYTÍ V LOM 11,300 - 11,400 LETO VROSTO
 ZONEJTELA A POKRYTÍ V LOM POKRYTOSTATY, AD JAVET A ZONEJTELA
 ZONEJTELA A POKRYTÍ V LOM POKRYTOSTATY, AD JAVET A ZONEJTELA
 ZONEJTELA A POKRYTÍ V LOM POKRYTOSTATY, AD JAVET A ZONEJTELA

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis stavbyvedoucího:

80 102

Datum: 20.9.2022 Den týdne: 67

Den tidsnø: 67

Středisko: St. Blat / Název akce: 11/100) 12. 12. 7. PRAT - ŠKOLNÍK, DEBONKALNO - 12.
Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 21⁰⁰

Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 12⁰⁰

(Klasifikace, číslo + se, pr. + roc, adresa...)

Pracovní přestávka: 77

doba: 900-1000

*Místo (jména a příjmení): Václav Štěpán, Jiří Lurie, Marie Jiráková, Michal
Jirák, Jaroslav Fendl, Jan Konec, Petr Lemař, Jaroslav
Šindel, Ondřej Mareš, Aleš Růžek, Petr Kozel, Michal
Měnkof*

SX ADVISAL

WERNER 9R, LIEBOWITZ 9R, BOHMER 9R, 4000000, 5X 1000000
RFD,

Begegnung mit dem, was ist

4154

[illegible]

Podpis stavby

Podpis zástupce inv.

80 102

Datum: 13.4.2023

Den tidsnære: 3

skola: Šk. P. 1
 Datum: 1990

Název práce: 11402 12. 07. 2007 12. 07. 2007 12. 07. 2007

Reacción, $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{H}_2\text{O}$, $\text{PO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

9-11-1970

Imena i prijimi:

ANTONIA TEVER, JOŠ LUKAČ, VASILAV VIŠE, OLGA KOSTIĆ, A-ŠE
MIR, MIROSLAV OREBARI, ANĐELI KONČIK

Учебно-методический кабинет, 44

உதயகிரி கிராமம், கரையார்

2008

[illegible]

Podpis zástupce investora (TDI):

Podol

So 102

Datum: 8.9.2022

Den tydne: 05

Název akce: Práci na střeše - střešní práce, rekonstrukce, i. střešní práce
Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 9⁰⁰

[illegible]

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 7 - 10
pracovní doba: 900 - 1100
pracovní směna a příjmení: PÁTRAL BERNAN, FORTIŠEK JAROSLAV, DUBÍ LUDMIL, JIMOLAZ
DIME JAN MIKUL, JAKOBEK ŠTEPÁN, EDELMER EDUARD, KOTZ VLAD,
JACINER CARMONA

mechanismy: LIEBNER 912, LIEBNER 914, 23 NÁZOVNÁ AUTO, DEBETEK ÚSTNÍ
OBROBACE

RESULZADINI' BOSTON, BOSTON

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

Jeune génération : Villes et les parties
centralisées (parties de la région)
autres personnes

Podpis:

Podpis zástupce investora (TDI):

So 102 ✓

Datum: 3.9.2022 Den týdne: 57

Den týdne: 27

Název akce: 11401/10. 12. 17. PRÁVNÍ - TECHNICKÉ, ORGANIZAČNÍ, I. ETAPA

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

na a (prijmeni): IGORAV BUREN, FERNANDEZ, VEDRICH, MI WINK,
MAURICE WOLFE, RICHARD, MICHAEL O'BRIEN, OLGA BUDNO,
BARBARA BOWEN

~~LIBRARI 912, LIBRARI 914, DONICIA PISON 1280, ZA NOTAR. 1280,~~
~~LIBRARI 912, LIBRARI 914, DONICIA PISON 1280, ZA NOTAR. 1280,~~

158029001 Boston, Boston

[illegible]

Podpis s

odpis zas

Datum: 6.9.2022 Den trykkes: 15

Název akce: 11/102 190. 12. 7. 2021 - BRANOVSKÉ, PEROMYŠLICKÉ, J. K. 190

Pracovní přestávka: 2⁰⁰ - 2⁰⁰

Pracovní přestávka: 11 15
 (ani): JOSEF LUKAŠ, KAMILA BARTOŠ, MARIEČKA JEDLIČKA, JAR. VRIK,
 JAR. FENC, MICHAL DVOŘ, ALBA RUDOLFA, JAROSLAV ŠÍP,
 JAR. VRIK, MICHAL ŠENKEL, KAMILA VÁCLAV

100000 910, 215000 919, 315000 920, 420000 921, 520000 922, 620000 923, 720000 924, 820000 925, 920000 926, 1000000 927, 1100000 928, 1200000 929, 1300000 930, 1400000 931, 1500000 932, 1600000 933, 1700000 934, 1800000 935, 1900000 936, 2000000 937, 2100000 938, 2200000 939, 2300000 940, 2400000 941, 2500000 942, 2600000 943, 2700000 944, 2800000 945, 2900000 946, 3000000 947, 3100000 948, 3200000 949, 3300000 950, 3400000 951, 3500000 952, 3600000 953, 3700000 954, 3800000 955, 3900000 956, 4000000 957, 4100000 958, 4200000 959, 4300000 960, 4400000 961, 4500000 962, 4600000 963, 4700000 964, 4800000 965, 4900000 966, 5000000 967, 5100000 968, 5200000 969, 5300000 970, 5400000 971, 5500000 972, 5600000 973, 5700000 974, 5800000 975, 5900000 976, 6000000 977, 6100000 978, 6200000 979, 6300000 980, 6400000 981, 6500000 982, 6600000 983, 6700000 984, 6800000 985, 6900000 986, 7000000 987, 7100000 988, 7200000 989, 7300000 990, 7400000 991, 7500000 992, 7600000 993, 7700000 994, 7800000 995, 7900000 996, 8000000 997, 8100000 998, 8200000 999, 8300000 1000, 8400000 1001, 8500000 1002, 8600000 1003, 8700000 1004, 8800000 1005, 8900000 1006, 9000000 1007, 9100000 1008, 9200000 1009, 9300000 1010, 9400000 1011, 9500000 1012, 9600000 1013, 9700000 1014, 9800000 1015, 9900000 1016, 10000000 1017, 10100000 1018, 10200000 1019, 10300000 1020, 10400000 1021, 10500000 1022, 10600000 1023, 10700000 1024, 10800000 1025, 10900000 1026, 11000000 1027, 11100000 1028, 11200000 1029, 11300000 1030, 11400000 1031, 11500000 1032, 11600000 1033, 11700000 1034, 11800000 1035, 11900000 1036, 12000000 1037, 12100000 1038, 12200000 1039, 12300000 1040, 12400000 1041, 12500000 1042, 12600000 1043, 12700000 1044, 12800000 1045, 12900000 1046, 13000000 1047, 13100000 1048, 13200000 1049, 13300000 1050, 13400000 1051, 13500000 1052, 13600000 1053, 13700000 1054, 13800000 1055, 13900000 1056, 14000000 1057, 14100000 1058, 14200000 1059, 14300000 1060, 14400000 1061, 14500000 1062, 14600000 1063, 14700000 1064, 14800000 1065, 14900000 1066, 15000000 1067, 15100000 1068, 15200000 1069, 15300000 1070, 15400000 1071, 15500000 1072, 15600000 1073, 15700000 1074, 15800000 1075, 15900000 1076, 16000000 1077, 16100000 1078, 16200000 1079, 16300000 1080, 16400000 1081, 16500000 1082, 16600000 1083, 16700000 1084, 16800000 1085, 16900000 1086, 17000000 1087, 17100000 1088, 17200000 1089, 17300000 1090, 17400000 1091, 17500000 1092, 17600000 1093, 17700000 1094, 17800000 1095, 17900000 1096, 18000000 1097, 18100000 1098, 18200000 1099, 18300000 1100, 18400000 1101, 18500000 1102, 18600000 1103, 18700000 1104, 18800000 1105, 18900000 1106, 19000000 1107, 19100000 1108, 19200000 1109, 19300000 1110, 19400000 1111, 19500000 1112, 19600000 1113, 19700000 1114, 19800000 1115, 19900000 1116, 20000000 1117, 20100000 1118, 20200000 1119, 20300000 1120, 20400000 1121, 20500000 1122, 20600000 1123, 20700000 1124, 20800000 1125, 20900000 1126, 21000000 1127, 21100000 1128, 21200000 1129, 21300000 1130, 21400000 1131, 21500000 1132, 21600000 1133, 21700000 1134, 21800000 1135, 21900000 1136, 22000000 1137, 22100000 1138, 22200000 1139, 22300000 1140, 22400000 1141, 22500000 1142, 22600000 1143, 22700000 1144, 22800000 1145, 22900000 1146, 23000000 1147, 23100000 1148, 23200000 1149, 23300000 1150, 23400000 1151, 23500000 1152, 23600000 1153, 23700000 1154, 23800000 1155, 23900000 1156, 24000000 1157, 24100000 1158, 24200000 1159, 24300000 1160, 24400000 1161, 24500000 1162, 24600000 1163, 24700000 1164, 24800000 1165, 24900000 1166, 25000000 1167, 25100000 1168, 25200000 1169, 25300000 1170, 25400000 1171, 25500000 1172, 25600000 1173, 25700000 1174, 25800000 1175, 25900000 1176, 26000000 1177, 26100000 1178, 26200000 1179, 26300000 1180, 26400000 1181, 26500000 1182, 26600000 1183, 26700000 1184, 26800000 1185, 26900000 1186, 27000000 1187, 27100000 1188, 27200000 1189, 27300000 1190, 27400000 1191, 27500000 1192, 27600000 1193, 27700000 1194, 27800000 1195, 27900000 1196, 28000000 1197, 28100000 1198, 28200000 1199, 28300000 1200, 28400000 1201, 28500000 1202, 28600000

material: beton, stielholz, moose hirs

Nově dané práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - provedení přepracování střešní konstrukce (odstranění střešní konstrukce a betonového laje)

všechny dodavatele a jejich činnosti): - porovnání pracovních podmínek
všechny práce (ekonomická řešení od ekonomického ústavu)
všechny práce (ekonomická řešení od ekonomického ústavu)

[illegible]

1 km 11,520 - 11,650 Logo PIRACEMA -
"PACIFICADO" MATOS, DISCURSÃO DO PATENTE & COM/MS

1. "Přírodní" prostředí dle 2. přílohy k zákonu

[illegible]

1920 / 1921 / 1922 (1923-1924)

Pravomocnost + odgovornost, težnja do samovoljnega dela

[illegible]

2. INTEGRALNO PASTREVALIŠE NA PREJIDKOVU

1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 26

CONTRIBUTO DI FONDI

Средства, полученные от продажи продукции, направляются на развитие производства и на социальные нужды.

TRAFAS DO BEM-QUERIDO LÓBIS V. ANO 1930-1960 2005

PRINCIPALI PRINCIPALI

FOR ASSISTANCE IN PREPARING THE REPORT

Podpis:

Podpis zástupce investora

So far

Datum: 31.8.2022

Den tydne:

Název akce: 11101 AB. AL. II. PRAM - Šišovice, odpočívárka, II. etapa
Pracovní předávka: 7³⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 7³⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 7. 12. 1964
 pracovní doba 9^h 15^m
 pracovní (práva a příjmy): BERNARD BERNER, FERNANDÉZ JERÓNIMA, JAROSLAV JIŠPER, JOSEF
JOSEF, JOSEF JERONÍM, JAROSLAV, MICHAEL DVOŘ, MICHAEL FENCL

SEARCHED 912, INDEXED 914, EXAMINED 910, & ENTIRE VOLS (CONTAINED),
SERIALS, BOOKS, DPL, KOLEL, MATH

NEW YORK, EASTON, BRIDGEVIEW, HOTTEN (PICK), @ PG. 0/30 min A

Spencer

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - POKROČILÉ ODBĚRY (VAK) JEDNA KOMUNITA
- POKROČILÉ ODBĚRY JEDNA KOMUNITA

3. odkazování dotazů na dotazník 1085 v km 1020
1150 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600 6900 7200 7500 7800 8100 8400 8700 9000 9300 9600 9900 10200 10500 10800 11100 11400 11700 12000 12300 12600 12900 13200 13500 13800 14100 14400 14700 15000 15300 15600 15900 16200 16500 16800 17100 17400 17700 18000 18300 18600 18900 19200 19500 19800 20100 20400 20700 21000 21300 21600 21900 22200 22500 22800 23100 23400 23700 24000 24300 24600 24900 25200 25500 25800 26100 26400 26700 27000 27300 27600 27900 28200 28500 28800 29100 29400 29700 30000 30300 30600 30900 31200 31500 31800 32100 32400 32700 33000 33300 33600 33900 34200 34500 34800 35100 35400 35700 36000 36300 36600 36900 37200 37500 37800 38100 38400 38700 39000 39300 39600 39900 40200 40500 40800 41100 41400 41700 42000 42300 42600 42900 43200 43500 43800 44100 44400 44700 45000 45300 45600 45900 46200 46500 46800 47100 47400 47700 48000 48300 48600 48900 49200 49500 49800 50100 50400 50700 51000 51300 51600 51900 52200 52500 52800 53100 53400 53700 54000 54300 54600 54900 55200 55500 55800 56100 56400 56700 57000 57300 57600 57900 58200 58500 58800 59100 59400 59700 60000 60300 60600 60900 61200 61500 61800 62100 62400 62700 63000 63300 63600 63900 64200 64500 64800 65100 65400 65700 66000 66300 66600 66900 67200 67500 67800 68100 68400 68700 69000 69300 69600 69900 70200 70500 70800 71100 71400 71700 72000 72300 72600 72900 73200 73500 73800 74100 74400 74700 75000 75300 75600 75900 76200 76500 76800 77100 77400 77700 78000 78300 78600 78900 79200 79500 79800 80100 80400 80700 81000 81300 81600 81900 82200 82500 82800 83100 83400 83700 84000 84300 84600 84900 85200 85500 85800 86100 86400 86700 87000 87300 87600 87900 88200 88500 88800 89100 89400 89700 90000 90300 90600 90900 91200 91500 91800 92100 92400 92700 93000 93300 93600 93900 94200 94500 94800 95100 95400 95700 96000 96300 96600 96900 97200 97500 97800 98100 98400 98700 99000 99300 99600 99900 100200 100500 100800 101100 101400 101700 102000 102300 102600 102900 103200 103500 103800 104100 104400 104700 105000 105300 105600 105900 106200 106500 106800 107100 107400 107700 108000 108300 108600 108900 109200 109500 109800 110100 110400 1

11.000 LITROS, VINDOS DE DIVERSAS FONTES
- CONDIÇÃO: PRECISO DE OBSERVAÇÃO DO MARINHO DO BETONAGEM
- CONDIÇÃO: PRECISO DE OBSERVAÇÃO DO MARINHO DO BETONAGEM

[illegible]

- 2008: 1.000.000,00 на население
 - 2009: 1.000.000,00 и население на население
 - 2010: 1.000.000,00

has been
- and then the two remaining distinct roles (between the remaining
two, possibly)

100. (Klasifikace)
- Průměrná / konstantní rychlost z 60th p. 0/30 mm H₂O
v čase 17,520 - 17,630 1800th strana je prázdná stránka

10-11-68 17,633 LEWIS & CLARK TO MISSOURI

Podpis zástupce Investora

Podg

50 102

Datum: 30. 8. 2022 Den tyding: 11

Назва екипе: 11/10.1) № 12. 17. 1924-1, СЕДНАНОВ, ДЕКОНТРЕЛ, Л. БРАД

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

FRANZ GÖTTKE, FRANZISKUS JEDLIČKA, ERNEST FENCL, JAN
HEIMAT DINE, ADOLF VITEL, OUDSEK HANZEL, BOLESLAV
WEL LUBES

LIEBKEI 9K, LIEBKEI 9M, LIEBKEI 9N, 5x NORDBOON

1944-1945 ASIAN, SEASON

[illegible]

2015 BAKOVITALE: ŽASUPONĚ BAKOVITALE
 (K. PROBALE A.S.) ŽASUPONĚ BAKOVITALE
 INVESTICE P. PROBALE BAKOVITALE O ŽASUPONĚ BAKOVITALE
 (KONCEPCE) V KM 7,540 - 7,630 ŽASUPONĚ BAKOVITALE
 ŽASUPONĚ BAKOVITALE A O ŽASUPONĚ BAKOVITALE
 ŽASUPONĚ BAKOVITALE O ŽASUPONĚ BAKOVITALE

Задача 1. По плану контроля и на
подписку выходящих контро. Водитель
покажи заветы зетинские
осматривая кетову 2 по 9/10
в выведении воды.

Podpis stavby

Podpis zástupce Inv

pg 102

Den lydne: 22

1. *Adiantum* *sp.*
 2. *Adiantum* *sp.*
 3. *Adiantum* *sp.*
 4. *Adiantum* *sp.*
 5. *Adiantum* *sp.*
 6. *Adiantum* *sp.*
 7. *Adiantum* *sp.*
 8. *Adiantum* *sp.*
 9. *Adiantum* *sp.*
 10. *Adiantum* *sp.*
 11. *Adiantum* *sp.*
 12. *Adiantum* *sp.*
 13. *Adiantum* *sp.*
 14. *Adiantum* *sp.*
 15. *Adiantum* *sp.*
 16. *Adiantum* *sp.*
 17. *Adiantum* *sp.*
 18. *Adiantum* *sp.*
 19. *Adiantum* *sp.*
 20. *Adiantum* *sp.*
 21. *Adiantum* *sp.*
 22. *Adiantum* *sp.*
 23. *Adiantum* *sp.*
 24. *Adiantum* *sp.*
 25. *Adiantum* *sp.*
 26. *Adiantum* *sp.*
 27. *Adiantum* *sp.*
 28. *Adiantum* *sp.*
 29. *Adiantum* *sp.*
 30. *Adiantum* *sp.*
 31. *Adiantum* *sp.*
 32. *Adiantum* *sp.*
 33. *Adiantum* *sp.*
 34. *Adiantum* *sp.*
 35. *Adiantum* *sp.*
 36. *Adiantum* *sp.*
 37. *Adiantum* *sp.*
 38. *Adiantum* *sp.*
 39. *Adiantum* *sp.*
 40. *Adiantum* *sp.*
 41. *Adiantum* *sp.*
 42. *Adiantum* *sp.*
 43. *Adiantum* *sp.*
 44. *Adiantum* *sp.*
 45. *Adiantum* *sp.*
 46. *Adiantum* *sp.*
 47. *Adiantum* *sp.*
 48. *Adiantum* *sp.*
 49. *Adiantum* *sp.*
 50. *Adiantum* *sp.*
 51. *Adiantum* *sp.*
 52. *Adiantum* *sp.*
 53. *Adiantum* *sp.*
 54. *Adiantum* *sp.*
 55. *Adiantum* *sp.*
 56. *Adiantum* *sp.*
 57. *Adiantum* *sp.*
 58. *Adiantum* *sp.*
 59. *Adiantum* *sp.*
 60. *Adiantum* *sp.*
 61. *Adiantum* *sp.*
 62. *Adiantum* *sp.*
 63. *Adiantum* *sp.*
 64. *Adiantum* *sp.*
 65. *Adiantum* *sp.*
 66. *Adiantum* *sp.*
 67. *Adiantum* *sp.*
 68. *Adiantum* *sp.*
 69. *Adiantum* *sp.*
 70. *Adiantum* *sp.*
 71. *Adiantum* *sp.*
 72. *Adiantum* *sp.*
 73. *Adiantum* *sp.*
 74. *Adiantum* *sp.*
 75. *Adiantum* *sp.*
 76. *Adiantum* *sp.*
 77. *Adiantum* *sp.*
 78. *Adiantum* *sp.*
 79. *Adiantum* *sp.*
 80. *Adiantum* *sp.*
 81. *Adiantum* *sp.*
 82. *Adiantum* *sp.*
 83. *Adiantum* *sp.*
 84. *Adiantum* *sp.*
 85. *Adiantum* *sp.*
 86. *Adiantum* *sp.*
 87. *Adiantum* *sp.*
 88. *Adiantum* *sp.*
 89. *Adiantum* *sp.*
 90. *Adiantum* *sp.*
 91. *Adiantum* *sp.*
 92. *Adiantum* *sp.*
 93. *Adiantum* *sp.*
 94. *Adiantum* *sp.*
 95. *Adiantum* *sp.*
 96. *Adiantum* *sp.*
 97. *Adiantum* *sp.*
 98. *Adiantum* *sp.*
 99. *Adiantum* *sp.*
 100. *Adiantum* *sp.*

Pracovní přestávka: 7³⁰ - 12⁰⁰

scovola (mėna a plimoni)

100

scully.

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

Podpis

Podpis zástupce investora

STRABAG

10 (10L)

Datum: 23.8.2022

Den týdne: úterý

Zadavatel: Strabag

Název akce: Místní pro. H. H. Pavla -

Stavba nového, představení, B. Střep

Délka: 13,30

Pracovní přestávka: 1⁰⁰ - 13⁰⁰

Délka (včetně a přímky):

10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep

Charakter:

10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep

Běžná:

10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep, 10,000 Střep

Důhy:

Nové práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- Práce na stavbě nového, představení, B. Střep

- Práce na stavbě nového, představení, B. Střep

- Práce na stavbě nového, představení, B. Střep

- Práce na stavbě nového, představení, B. Střep

- Práce na stavbě nového, představení, B. Střep

Běžná činnost: Práce na stavbě nového, představení, B. Střep

Práce na stavbě nového, představení, B. Střep

Podpis zástupce

Podpis stavbyvedce

20/202

Datum: 22.8.2012

Den lydne: POWDER

7000 45 LATAGNO

11:00 11:00 11:00 11:00

Pracovní přestávka: 17⁰⁰ - 18⁰⁰

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

WIKET, PAUL ALMA, FRANK, EDWARD, ...

MEZ HANZLIK, OLECH LUCHRA, VAN JONCK, VAN GELDEREN,

EFNCL MICHAEL BIVLE + 1 THP, 2 MAGNETIC - 5000. MARCHON

DATE 10/1/2007 _____

604451

AUTO SCANIA, MARCA. AÑO 1980 a 1980 marca /

1957 - КОСОВ НАКЛАДНО

1992

Conclusion

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

11,520 - 11,620 USED SCALBERT VIRADO VINTAGE

ORIGIN 1: 1.7 LEGU, RATHERED DO DETOR. LOCE A DERIVED

1. HODINAR HODINAR TEKMA V R. V. z KOVIKA. MATEL 6

NAME: ROBERTO ANTONIO PEREZ ADDRESS: PARTE 144 MELB-

АВТОМОБИЛЬНО РЕОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

09/11/11 TRACY (11/10L).

12 $U_{PD} = 14580$ OASTRAHOLMI NEUTTEL. KONST. VÄRDE

[illegible]

POPS INC. VANDERBILT VEGAN /

UDACY

Podpis zástupce Investora (TD)

So 722

Datum: 23.9.2027

Den tidsnø: 67

ové středisko:

Název akce:

ni doba:

nici (jména a příjmení):

Pracovní přestávka: 11³⁰ - 12⁰⁰

anistany.

အိမ်:

ušký

— — — — —
 zpodobné práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti).

vydane práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- poskytování dopravního výkonu železničnímu v km ~~100~~ 100 a bezplatného
- kategorie do 300000 Kč (provoz, materiál, správa, údržba)
- 300000 Kč (provoz, materiál, správa, údržba) + 100000 Kč (provoz, materiál, správa, údržba)
- 100000 Kč (provoz, materiál, správa, údržba) + 100000 Kč (provoz, materiál, správa, údržba)
- 100000 Kč (provoz, materiál, správa, údržba) + 100000 Kč (provoz, materiál, správa, údržba)

ABAG

SO 102

Datum: 24.9.2021 Den týdne: Pá

Místo: Středočeský územní úřad, Středočeský územní úřad, Středočeský územní úřad
 Název akce: Středočeský územní úřad, Středočeský územní úřad, Středočeský územní úřad
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00
 Pracovní přestávka: 11:00-12:00

50 102

Datum: 29. 10. 2021 Den týdne: P

Výkonné středisko: H/Star Název akce: H/102 H2. H2. H. PRÁH, PŘEMOVČE, PŘELOŽKA JELČE, P. ŠKOLY

Podání: JASNO, ROKO +6°C, 902. +11°C, ODPOL. +15°C

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): ZDENEK DUTENEC, PAVEL BLAHO, MICHAL OHENDEJ, VÁCLAV HLAD, JIŘÍ KLEČKA, PAVEL ŠIMKA, ZDENEK KOLÁŘ, OLGA DUCHOVÁ, ANDRŠ HANUŠEK, KÁMEL V. ŠTĚPÁN, KRISTOF JEDLIČKA, MICHAL DÍK, KÁMEL FEJČEK, ANTONÍN TROCHA, JIŘÍ LUKÁČ

Mechanismy: LIEBHERR 910, LIEBHERR 914, KOMETI, ŽELVÍ NEMILADOV, LATORO TROVAT, 3x KOLÁŘOVÍ AUTO, 2x BOVACI, POTHOVÉ KLADIVO

Materiál: REKULTIVNÍ BATTEN, BETON

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ OVLÁDÁNÍ SOUDNÝM SVETLÍM, A DVA PROVEDENÍ A REKULTIVNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOKU V KAM 10, 905 PRÁH, PRÁH VE SVĚTLÉ PRÁHCE
- OPRÁVA NEVYHOVNÉHO VÝKONNÉHO MATERIÁLU A JEDNODROVÉ NA SVĚTLÉ PRÁHCE
- PROVEDENÍ PRÁHCE, NOVÝCH SVĚTLÝCH PRÁHCE + PŘEDKLENÍ PRÁHCE V KAM 10, 313 - 10, 314 A 10, 413 - 10, 419 PRÁH PRÁH VE SVĚTLÉ PRÁHCE (BUDOVNÍ PRÁHCE)

Podpis zástupce investora (T)

SO 402 ✓

Datum: 20.6.2023 Den tydne: *UT*

Abstract

Nazov akce: 7/100% - 100% + 1%

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Personal notes:

scoperta (materia e di meno)

Pracovní přestávka:

MILAN PAVLÍČEK, JOSEF VONÁČEK, MICHAL DIVNÝ, MAŘKA FENOL,
PRAVĚK MARIŠKA, OLGA HRUČÁKOVÁ, JAROSLAV ŠTÍP, SOTRIL LEMBORE,
JUDITA KOSTERNÍČ, MILA VLAD, MICHAL CHENDRY,

Isotachism

LIEBNER, 914, 121 NAWLADNI AUTO, BRONIER OBLNI
 AMALONE, 31 MOTOROVA, LADIVO, 41 FORD TOANRI, FINAKER VOUELE,
 31 NIKER HINT, 11 GISTICI WSE, 31 KROPICI WSE, DISTRIBUTOR

Eaton-Hall

ALU + PIR, DEKONTAMINACIJA, POSREDOVANJE, AČI 16 + PIR, DEKONTAMINACIJA, POSREDOVANJE

youky.

Expenditure price

- POKRYTÍ VÝROBU V TĚŽBĚNÝCH ČÁSTI ASFALTOBETONU AC 16+P18 V KM 11,300 - 11,800 PRÁVA STĚNA VE SMĚRU STAVBY (OPRAVA PO POŠKOZENÍCH KODOVANÝCH PŘÍPOJKÁCH)
- POKRYTÍ POKRYTÍ ASFALTOBETONU AC 11+P18 V KM 11,300 - 11,800 PRÁVA STĚNA VE SMĚRU STAVBY + VNITŘNÍ ASFALTOBETON AC 11+P18 KŘÍŽI HATIT
- POKRYTÍ ROZŠÍŘENÍ ŽELEZNÝCH HRAN AC 11+P18 V KŘÍŽI HATIT SO 102 V KM 13,300 - 13,425 + ODPOVĚDNÝCH KONTAKTŮ
- POKRYTÍ OVLIVNĚNÍ PRÁV TĚLESA KONTAKTŮ SO 102 A ROZŠÍŘENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 13,300 - 13,410
- POKRYTÍ PRÁVA VE SMĚRU STAVBY
- POKRYTÍ VÝROBU KONTAKTŮ SO 102 KŘÍŽI KŘÍŽI + KŘÍŽI KŘÍŽI A SO 103

ZÁPIS ZAHNIVITELK: ZÁKONNÉ ZAHNIVITELK (F. 18096 a.s.)
 MARTIN LÍBA ŠOLJA, PRAVĚNÍ DOŠLOJ INKUBACE P. MUDROSLAVA
 KLENTU O POROZENÍ PRÁVA DĚNÍ INFILTRAČNÍHO PROJEKČNÍHO
 ZÁSTAVKY V LÍN 13,700 - 14,46 LÉVA STRANA KE SMĚRU PRÁVĚNÍ
 ZÁKONNÉ A O POROZENÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ
 V ZÁKONNÉ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ
 ZÁKONNÉ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ
 PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ PRÁVĚNÍ

Podpis stavebyvedoucího: _____

Podpis stavbyvedoucího:

Podpis zástupce investora (TDI):

80 702

Datum: 19.6.2023 Den tøjde: Po

Adově sfedulo.

Název akce:

11/10/21 MR. AL. W. POHAT, STACHONICE, BISKONTOURSE, I. FLOP.

Pracovní přestávka:

ovné doba
ovné (příjmení):

exactly

1998-1999

KEY

overdone price.

13, 310 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY PRO
PODMĚNÍ POMOCÍ ODSOUPAČNÍHO LAMENE DO BETONOVÉHO
LOŽISKA (ODKLOPENÍ STAVU TĚL KOMUNIKACE)
PODMĚNÍ SPOJOVACÍHO INFILTRAČNÍHO POSTEJEK
V KM 13,300 - 13,400 PRÁVÍ STRANA VE SMĚRU STAVBY
DLE ODS

Podpis zástupce investora (TDI):

80_24

Datum: 19.6.2023 Den tyde: 10

Den tydne: 30

Autore: **STEFANO**

υἱὸν ἀκροῦ:

Naziv škole: 11/111 AB HL II. PRVAZ, STROMONICE, REKONSTRUKCIJE, II. BINA
 Datum: 11.6.2023

Pracovní přestávka: $11^{53} - 12^{10}$

1999

economic (infra-structure)

FRANCOIS PROSELYT
JANUAR BSTER, KAROL KENOL, ZDENĚK MOUVĚNSKY, MŠL
JANU, MICHAL ŠABNOET, VITALD HOTÝR, PAVEL NEHEČKA
JANUARIAN ŠPILER, JOIOVÉ PRASOUL

Mechanism

944, 11 MONTHS ON AUTO, 41 FORD TRANSIT, 24 MOTORBIKES
24 MOTORBIKES, 21 FORD BUTTER, 20 FORDS

Latent

STAN/D29, INFILTRACIJA, POUKAZ, PUSTOK 1/2 kg/m²

Yousky

Procedere pratico

PROVEDENÍ ASUTIFIKACE KODOVANÝCH A KANALIZAČNÍCH
KANÁLŮ V MĚSTSKÉ ZONĚ SO 102 V KM 11,300-11,800
POVRŠ. STRANA KE SVĚTLU STANIČENÍ
PROVEDENÍ ÚKLIDU KANALIZACE SO 102 V KM 11,300-11,800
POVRŠ. STRANA KE SVĚTLU STANIČENÍ
PROVEDENÍ AUTIZACE ČÁSTI MĚSTSKÉ ZONĚ U AUTOMATY
BASTOVIT V KM 11,800 POVRŠ. STRANA KE SVĚTLU STANIČENÍ
PROVEDENÍ POKLÁDKY ASFALTOBETONU (POŠKODENÉ
KOSTKY DLAŽBY)

[illegible]

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛАДѢ ВЪНОВУЮЩЕГО РАБОД. ЗАКЛАДА
ПОДЪЕМ ПОДЪЕМ. АСО ИЛИ УЛН 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,

- PRŮVODNÍ POUŽITO ANŽICH BRONZOVÝCH PŘÍVODNÍK V KM B, 700 -
 14,00 PRAVO STRANA KE STŘEDÍ STŘEDNÍ
 PRŮVODNÍ, ODBĚRNÍ, ZATĚŽOVÉ PRÁNI V OCE MODULOVACÍ
 SO OD V KM B, 700 - 14,925
 - PRŮVODNÍ ODBĚRNÍ SYSTÉM TĚLISKA KONTAKTOVÉ SO 102 V KM B, 700 -
 Druhý slabyvedoucího: 1 - - - - - 1

Podpis slabyvednucih):

Podpis zástupce investora (TDI)

80 122

Datum: 7.6.2023

Den tydner: 57

Uisko: 901/5000 Název akce: 11/100 AB. 12. 11. 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 26

1800: 5/11/2000, Natchez area, MS.
 5, 6000+100, 600, +1900, 6000, +2500
 500-1000

Pracovní přestávka: 1⁰⁰ - 1⁰⁰

na z příjmení): LODOLAV GARMAN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, JOSEF SLAVÍČEK,
JOSEF ŠIMŠ, KAREL ŠENCL, ANTONÍN HENCL, PAVEL LEHÁČKA,
OLEK EVOŘKA, JAROSLAV POSEJIL, VITALÍ HOTTET, KAREL HLAD, RUDOLF
ČERNÝ

LIEBHART GR., LIEBHART GR., DEUTSCHES FORSTWIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WÜRZBURG,
MINISTER PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE VERGLEICHENDE KULTURLEHRE, 30. SEPTEMBER 1987,
AN DER UNIVERSITÄT WÜRZBURG.

7.40, rok 76+, proukazatel postřik 0,8 kg/m², ~~saz~~ saz efektiv, rok 16/9/10,
postřikem, ci 20/25, proukazatel postřik 0,2 kg/m²

název: - pozice: prvního důstojníka baterie do prvního
1935 pozice: prvního pluku v km 11,30-11,30 km
první 15 km prvního

- podzemní úroveň (podzemní proud) 12,300
 - podzemní úroveň (podzemní proud) 12,300

- posušni posušni (lozeni) - inaktivni postelj, 1 kg/m²

- Pasičnik, Pasariški (Loren) - imitacijski postoj, 1980
- 65000/21 V km 14,100 - 14,125 pearls strands vs phase stranding

- 65008121 V km 14,100 - 14,125 Peaks (1961) to 14,125
- "MOUNTAIN" PUEBLO (1961) PUEBLO (1961) to 14,125
- "MOUNTAIN" PUEBLO (1961) PUEBLO (1961) to 14,125

- $\rho_{\text{пробирки}} = 1,2 \text{ г/см}^3$

- PROVA "PROVA" PROVA PROVA PROVA
 - PROVA "PROVA" PROVA PROVA PROVA
 - PROVA "PROVA" PROVA PROVA PROVA
 - PROVA "PROVA" PROVA PROVA PROVA
 - PROVA "PROVA" PROVA PROVA PROVA

$\rho_{\text{пр}} = \frac{\gamma}{g} = \frac{9800 \text{ Н/м}^3}{9.81 \text{ м/с}^2} = 1000 \text{ кг/м}^3$

"L'azione" secondo il principio di
 "non fare il male"

[illegible]

"PRAVO" PRAVO NE PRAČU STRANČANI + "PRAVO" PRAVO NE PRAČU STRANČANI
 "PRAVO" PRAVO NE PRAČU STRANČANI + "PRAVO" PRAVO NE PRAČU STRANČANI

РЕЗУЛТАТЪТ Е ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН
РЕЗУЛТАТЪТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО

reprezentativni predstavnik na području države
reprezentativni predstavnik države na području države

Republika Slovenija
Ljubljana, 11. 11. 2015

Datum: 8.5.2023

Den t dne: 27.

Pracovní přestávka: 17⁰⁰ - 18⁰⁰

ona a p[ri]men[ti]:

[illegible]

LIBANECI 912, LIBANECI 914, KONTAKI ŽIRNI NEPOSREDOČI, SE NÁVŠŤAVNÍ
AUTO, DISTRIKTOR)

plaz, zmenen' cerv, bery, kysle' kysle', oxidie, infiltraci
porizke, priradaci 1/2 kg/m²

ZAPIS TONI DO VERNILNEJ KONTROLE A ZA PODNUTENIM VARNOSTNIM
VNEŠNIM KONTROLAM. ZADNICE POVOLANI POŠTODOK,
HUV I VSELE 14,100 - 14,430 P.V. /

Cherry

práce: - provedení zářivkové osvětlovacího systému do betonového
lože zářivkové motory jsou v km 11,330 - 11,330 první strana
ke střešní střešní
- provedení zářivkové + osvětlovací osvětlovacího systému pro
podlahu střešního okruhu na výšku 8. podlaží střešní
100 + podlahu střešního okruhu do betonového děla
- osvětlovací střešního okruhu 8. podlaží střešní do střešní
(zářivkové zářivky 200 - 1000 zářivky střešní 100)
- zářivkové + osvětlovací osvětlovacího systému podlahy střešní
v km 11,100 - 11,480 první strana ke střešní střešní
podlahy střešní osvětlovacího systému střešní do 100
v km 11,100 - 11,480 první strana ke střešní střešní
okruhu střešního střešního střešního 8. podlaží střešní
střešního střešního
- provedení osvětlovacího systému střešního střešního v km 11,330 - 11,415
2 km 11,330 - 11,330 první strana ke střešní střešní
- provedení osvětlovacího systému střešního střešního v km 11,100 -
11,480 první strana ke střešní střešní
- zářivkové osvětlovací: zářivkové osvětlovací (f. střešní 8. podlaží)
podlahy střešní střešního střešního střešního p. střešního
podlahy 8. podlaží střešního střešního osvětlovacího střešního
střešního střešního v km 11,100 - 11,480 první strana ke
střešní střešního střešního střešního osvětlovacího střešního
podlahy střešního střešního střešního střešního střešního
střešního střešního střešního střešního střešního střešního
střešního střešního střešního střešního střešního střešního

- ↳ gruppo investitori (TDI):

PO 102

Datum: 26.5.2023

Den lydne: $\mathcal{P}_{\mathcal{G}}$

středisko: 11/102 Název akce: 11/102 11. 12. 1997

DATE: 8-1-2023
NAME: DEEPAK K. S. S.

středisko: 971000 Načarov
28.10.1940 + 10°C + 10°C + 10°C

Pracovní přestávka: $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$

total: 100 - 100

(jména a příjmení): JOSEF RUTANOV, KAREL HOD, MICHAL CHENDEJ, MILAN
HEŘTIK, MIROSLAV JUREŠIL, OLGA DUCHOVÁ, JAROMÍR LIŠEČKA,
MIROSLAV DÍK, KAREL FANCL, ANTONÍN HENCL, FANTÍREK
NEDELČEK, MICHAL ŠTEJN

my:

my: LIVERMORE 914, LIVERMORE 910, HUNTER COUNCIL HALL; ST. JOHNS
AUTO, FINEARTS COFFERS, EXTRAORDINARY, ST. JOHN'S

[illegible]

jeune grâce;

dené práce:

ROZPOČET PRÁCE NA STAVBU PŘEHRADY V km 10,890 - 10,960
VÝŠKA PŘEHRADY 1,80 M
PRÁCE NA STRANĚ KE SVĚTLU ZEMNÍHO KAMENNÉHO + MOŘENÍ
PŘI 10,960 - 11,180 PRAKTIČTĚ STRANA KE SVĚTLU ZEMNÍHO KAMENNÉHO + MOŘENÍ
PŘI 11,180 - 11,200 PRAKTIČTĚ STRANA KE SVĚTLU ZEMNÍHO KAMENNÉHO + MOŘENÍ

815225085704N W201 H2917

EXTRACTORU KALCI HASTIT - - - - -
KALCI HASTIT EXTRACTORU HASTIT DE SUKROMU OBLASTI - - - - -

FOOT 1 "GIENI" TIRAZIN 324 P WOLF. Y Em 1980-17060-A
FOOT 1 "GIENI" TIRAZIN 324 P WOLF. Y Em 1980-17060-A

FOOT - GREEN - TERNAN - 834 & WOLF - FEM - 7-1

FROM - 11,150 - 11,300 PPM. DEPTH OF WATER - 11,300 - 11,350
 11,150 - 11,300 PPM. DEPTH OF WATER - 11,300 - 11,350

- POVODNOSTI POSREDI POSREDI POSREDI

[illegible][illegible][illegible]

1991-1992
1993-1994

[illegible]

1. WATER 2. WATER 3. WATER 4. WATER 5. WATER 6. WATER 7. WATER 8. WATER 9. WATER 10. WATER 11. WATER 12. WATER 13. WATER 14. WATER 15. WATER 16. WATER 17. WATER 18. WATER 19. WATER 20. WATER 21. WATER 22. WATER 23. WATER 24. WATER 25. WATER 26. WATER 27. WATER 28. WATER 29. WATER 30. WATER 31. WATER 32. WATER 33. WATER 34. WATER 35. WATER 36. WATER 37. WATER 38. WATER 39. WATER 40. WATER 41. WATER 42. WATER 43. WATER 44. WATER 45. WATER 46. WATER 47. WATER 48. WATER 49. WATER 50. WATER 51. WATER 52. WATER 53. WATER 54. WATER 55. WATER 56. WATER 57. WATER 58. WATER 59. WATER 60. WATER 61. WATER 62. WATER 63. WATER 64. WATER 65. WATER 66. WATER 67. WATER 68. WATER 69. WATER 70. WATER 71. WATER 72. WATER 73. WATER 74. WATER 75. WATER 76. WATER 77. WATER 78. WATER 79. WATER 80. WATER 81. WATER 82. WATER 83. WATER 84. WATER 85. WATER 86. WATER 87. WATER 88. WATER 89. WATER 90. WATER 91. WATER 92. WATER 93. WATER 94. WATER 95. WATER 96. WATER 97. WATER 98. WATER 99. WATER 100. WATER

POSLANÍK: STANISLAV VEJNAR, STANISLAV VEJNAR, DO BŘANOVCEHO
POŠLO: STANISLAV VEJNAR, STANISLAV VEJNAR, DO BŘANOVCEHO

POKROV - POKROV NA JUTRO
POKROV - POKROV NA JUTRO DO 17.30 - 17.30

POKRODANI
LOSE POŠTOLJENI PRILIVCI MITODU SIKO V RMA TJEV

LOSE SCHWELLEN (KONTAKT) H.

1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 26

0000 NEWBORNS, PROBABLE IN THE

MS - 02200001 ADD VRCM V 0m 11,000 - 11,300 28100

PODOLSKÝ, Václav, PRÁVNÍK V OBLASTI
1. OBLASTI PRÁVNÍK (PODOLSKÝ PRÁVNÍK)

PODROBNĚJŠÍ ZPRÁVA -
PODROBNĚJŠÍ ZPRÁVA (PODROBNĚJŠÍ ZPRÁVA)

odpis zástupce investora (TDI):

SO 101

Datum: 22. 8. 2023 Den týdne: PO

Středisko: Město Název akce: H/101 RD H/11. PRAT, STĚHOVÁNÍ, REKONSTRUKCE, II. ETAPA
Pracovní doba: 8:00 - 13:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

Pracovní (jména a příjmení): FANTINEK, JEDLIČKA, MICHAL DÍK, MARIE FENC, ANTONÍN MENCL,
KROŠKA FILIP, ZDENEK KOTVICKÝ, VILK MOTRIL, KOSTL
KROŠKA, MICHAL CIMENT

Pracovní místa: LUBENEC 90, HILACH (PASEK BORO), ST. NĚMČOVSÁK, PRATKEL ČELNÍ
KROŠKA, KROŠKA, KROŠKA, KROŠKA

Pracovní místa: PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

Pracovní místa: PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

Pracovní práce: PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6, PRATKEL ČELNÍ, ST. NĚMČOVSÁK, SO 5/6

So 102

Datum: 18.5.2023

Den tydne: $\overline{OT}$

Středisko: Střelice

Název akce: 17/402/AB.HL.M. fest

Datum: 18.1.2005
 GOSHOVICH, PAVLOVICH KUE, I. Elena

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

dobu: 5.02.1990

Pracovní přestávky: 11 10

KOANTISEK, JEDNÁKA, KÁBLAV, ČISTEN, ZADOSLAV, ČITICE, KAPAL, DÍVĚ,
ČADEL, FANGL, ANTOVÍN, MRAJOL, OLEK, BUDHAR, MAREK, FOSBOL,
VIRAL, MERRIK, JASA, WAD, KROMEL, CHENDRY, ČENKEL,
KONTENEDU

priority:

LIEBER 9R, LIEBER 9H, J. FORD FROST, KOLEC, HATTI, VIBRAM DRESS,
J. A. MACKAY, AIO, MOTOHARA, EISENBAUM, VIBRAM DRESS

—

NEEDLE, KNIFE, SAW, EUROPE MAP, 20 PG. O/SUMMARY

Sky.

4. ജനകീ മുഖർജി മുഖർജി മുഖർജി മുഖർജി

redené práce:

PROBATIONER ADVISOR: SPANISH KILLER BOWMAN PARK RD 101/

[illegible]

PROBA PRAMA KE JAMBU SAMUDRA
 "PENGALAMAN" BERKAS "KEMERIAHAN" (KEMERIAHAN) BERKAS "KEMERIAHAN"
 PROBA PRAMA KE JAMBU SAMUDRA

Peggy (Mama) R. Jones

[illegible][illegible][illegible]

Parasitism 'no reward' (parasitoid does not lay eggs)

Funk "FUNKER DE (HARD) SCHNITTEN"

PO KZ V BM 17060 - 17070 PRIMA PHOTONICA

TRANSGENIC + MODIFIED: PHASE 1: POLYESTER MONITOR

15. 11. 1981 - 13.940 paginas - 750 palabras por pagina - 10.500 palabras

(CRISTOBAL) INSULATION: DILUTION BASED + TENSILE STRENGTH + PLASTICITY

ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC VÀ CHẤM DỨT ĐÓNG (PHIÊN) VÀ

показатели: процентное соотношение = 100%
в кв. метрах 9 кв. мет. - 11 кв. мет. - 12 кв. мет. - 13 кв. мет. - 14 кв. мет. - 15 кв. мет. - 16 кв. мет. - 17 кв. мет. - 18 кв. мет. - 19 кв. мет. - 20 кв. мет. - 21 кв. мет. - 22 кв. мет. - 23 кв. мет. - 24 кв. мет. - 25 кв. мет. - 26 кв. мет. - 27 кв. мет. - 28 кв. мет. - 29 кв. мет. - 30 кв. мет. - 31 кв. мет. - 32 кв. мет. - 33 кв. мет. - 34 кв. мет. - 35 кв. мет. - 36 кв. мет. - 37 кв. мет. - 38 кв. мет. - 39 кв. мет. - 40 кв. мет. - 41 кв. мет. - 42 кв. мет. - 43 кв. мет. - 44 кв. мет. - 45 кв. мет. - 46 кв. мет. - 47 кв. мет. - 48 кв. мет. - 49 кв. мет. - 50 кв. мет. - 51 кв. мет. - 52 кв. мет. - 53 кв. мет. - 54 кв. мет. - 55 кв. мет. - 56 кв. мет. - 57 кв. мет. - 58 кв. мет. - 59 кв. мет. - 60 кв. мет. - 61 кв. мет. - 62 кв. мет. - 63 кв. мет. - 64 кв. мет. - 65 кв. мет. - 66 кв. мет. - 67 кв. мет. - 68 кв. мет. - 69 кв. мет. - 70 кв. мет. - 71 кв. мет. - 72 кв. мет. - 73 кв. мет. - 74 кв. мет. - 75 кв. мет. - 76 кв. мет. - 77 кв. мет. - 78 кв. мет. - 79 кв. мет. - 80 кв. мет. - 81 кв. мет. - 82 кв. мет. - 83 кв. мет. - 84 кв. мет. - 85 кв. мет. - 86 кв. мет. - 87 кв. мет. - 88 кв. мет. - 89 кв. мет. - 90 кв. мет. - 91 кв. мет. - 92 кв. мет. - 93 кв. мет. - 94 кв. мет. - 95 кв. мет. - 96 кв. мет. - 97 кв. мет. - 98 кв. мет. - 99 кв. мет. - 100 кв. мет.

[Handwritten signature]

Podpis zastupce investora (TDI):

So 10/1

Datum: 15. 2023

Den tydnet:

skladisko: P1/266c Název akce: VÝVOJ MR. M. D. PRAHA, ČESKÝ KRAJ, OBLASTI PRAHA, II. STUPNĚ

BLOČNO, RINO + 8°C, PAR. + 10°C, ODPR. 14°C

Pracovní přestávka: 12:00 - 13:00

400-4000

jména a příjmení): KARLÍČEK, VEDVÍLEK, VEDVÍLEK BARTEN, JAROSLAV ŠPÍSEK, MICHAL
ŠIVS, KAROL FENCAL, ANTONÍN BENCAL, OLGA BUCHNER, MATEJ
STROUČIL, VÍTĚZLAV HARTÍK, KATEŘINA, MICHAL OBERHART

...safety.

LIVERMERE 9/12, LIVERMERE 9/12, FARMER W-110, BEARCO W-12, BARNES
(BEARCO W-12), 5+ BARNES W-110, W-110 W-117

Regulační křivky, BOD, Euklové křivky

une grâce:

- rozšíření zastřešení vlnok zvlášť důležitá součást
a zastřešení na potrubí do rozvaděčného kódu 1 kto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,

- ODRU NEPŘÍMÉHO VÝROBKU (PŘÍRODŮ) 2 MĚKČENÍ NE
PŘÍRODŮ (PŘÍRODŮ) 2 MĚKČENÍ NE

- UČENO OPOSREDOVANJE POSREDOVANJE V LEM 1970-11,800 5X5/0.7
 MARIJO (JANOSIČ)

NOVÝ (KARLOVÝ)
- PROJEKOVANÝ DEKONTAMINOVANÝ PLOCH NA DŮLEŽITÝ NOVÝ
PŮVOD NOVÝHO ŽIVOČ. V KM 11,30218 - 11,35116 PRAHA - PRAHA
KE PŘEDNÍ PRAHA

NE PŘEDÍ PŘÍRODU
- VYKONÁVÁNÍ PRÁCE V PRÁVNÍM OBSEKTU V LÍN 10, 120 - 10, 120
A 11, 040 - 11, 120 PRÁCE VYKONÁVÁNÍ V PRÁVNÍ PŘÍRODU
A 11, 040 - 11, 120 PRÁCE VYKONÁVÁNÍ V PRÁVNÍ PŘÍRODU

7 11,040 - 11 RO 10000 10000 10000 10000
 100 10000 2 3.5. 10000 + 10000, 1000000 1000000
 100 10000 10000

[illegible]

19. MARCHOVNÍK + MARCHOVNÍK PLÁNOVÁNÍ
- MARCHOVNÍK (MARCHOVNÍK) MARCHOVNÍK 2. MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK
K, 800 - 15 800 MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK (MARCHOVNÍK)
MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK
MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK
MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK
MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK MARCHOVNÍK

[illegible]

Podnikateľstvo:

Iple zástupce investora (TDI):

80 102

Datum: 7.6.2023

Den tjdne: 1/2

Číslo: 8472442 Název akce: 11/1021 PR. AL. 17. PRON, ŽICHOVSKÉ

redisko: 57/1202 Nazev arhiv: 17/102

Pracovní přestávka: 17⁰⁰ - 18⁰⁰

ota: 900-7800

(jména a příjmení): FRANTIŠEK JISOLICKÝ, VÍTAL BÍSEK, JANOSLAV ŠTĚPÁNEK, JAROMÍR
LEHOCER, PAVEL DOUBAČ, ANNA RUCHNÁ, MICHAL CHADIL, KAMIL VLAD,
VITOLD HEDVIK

LUBRICI GRU, LUBRICI GU, GRASCI BELO, MALJANO, FARBA W/20,
OPROCI NOS, PX NOVIŠ, 3x MALJANA AUTO, VIBRACIJ SVETA DR.

ORIGINAL BATHEN, BATUN, DO. RE. 0132mm.9

identné práce:

[illegible][illegible]

Podpis zástupce investora (TDI):

PC 102

Datum: 15.5.2023

Den lydne: $\mathcal{PQ}$

Datum: 10. 9. 1968

Sifedisko: 046102) Nazev akce: 1102] No. 12. II. FLOM, (SOMONICE, PLEBANCI, POSE, I. STARS)

[illegible]Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

dobu: 270 - 172 se

dobu: 20 - 12 00
(jména a příjmení): ROBERT BATHEN, ROBERT BATHEN, JEDLIČKA, EDVARD POLJENSKI,
DAVIDOVIC, GILBERT, OLGA POLJKA, MARIE PASCHUL, PAULIE
LEHNER, ITHALIE KONSTO, URSULA MAE, MICHAEL PASCHUL

Disney;

UNCLASSIFIED 994 UNCLASSIFIED 994, 3/15/2000 CUTO, 2/1/2000 10:00:00

will

bestehen können, wenn

sky:

troušené práce:

- PROVÁZENÍ DÍLO V ROKU 1924 - 1930 PRÁVO PŘEDNÁŠKY
NA PŘÍKL. STANOVENÍ
- PROVÁZENÍ ODPOVĚDNÍ SHODNĚ TĚLESA KOMUNIKACE SO 10A
A DEKLAROVÁNÍ UPOVĚDNĚ DO STANOVENÍ LOSE
V ROKU 1923 - 1923 PRÁVO PŘEDNÁŠKY NA PŘÍKL. STANOVENÍ
- PROVÁZENÍ UPOVĚDNĚ STANOVENÍ
- PROVÁZENÍ UPOVĚDNĚ STANOVENÍ NA STANOVENÍ
- PROVÁZENÍ UPOVĚDNĚ STANOVENÍ NA STANOVENÍ

80 10W

Datum: 11.5.2023

Den tidsne: 24

oddelisko: PH/BB/00 Nazev akcie: 1/102/100, AL. 17. 100000

Pracovní přestávka: 14⁰⁰ - 12⁰⁰

dobro: \$ 00-1/00

(jména a příjmení):

(Filmení): MICHAEL GERTEN, FRANTISEK NEJEDLIK, MICHAL DAVÍČEK, KAREL PEČEK,
ANTONÍN TENCHEL, PAVEL LEHOCER, ALEXANDR ŠPILKA, JIŘÍ RUDOLPH,
MARTIN POCECH, MICHAL OTTOMAR, JOSEF HAD, VIKTOR MORTZKE

Army:

NEŠMERI 974, LISCHNERI 975, KROŠAR, ČELNI MOKROVAC, 976
 ENJO, KRAJČAR, VÖGELE, SIVOLAC, MOJTI, 977, TR. GEOPICI, 978

1057

REKURSI KIRAN, BETON, ADO M+PUB

dané práce:

- ODPOV. NEVYHODNÉHO PŘEDPOVĚDNÉHO MATERIÁLU S PŘEDPOVĚDNÍKEM
AŽ PŘEDPOVĚDNÍKEM VYKAZUJÍCÍM

- DOPOSLEDNOSTI
ALE VYKONÁVAJÚ NAŠU PRÁCU
- ZAPOVEDNÍ OCHRANENÍ PRÁTU TĚLESA KONTROLACE (O M)
P. POKROČILÝM DOKUMENTEM DO KONTOVÉHO LOSTE V BR. 17, 180-
"HODNOU SE PRÁCE PRÁVOBĚH"

E. RESURBIRINGO HABITAT
 1/250 PEOPLE STAYING IN (MAY STAYING)
 - "JONKIDEN" PASSING RECREATIONIST MOON AND 11+ JMB
 2 km 2,500 - 1/100 PEOPLE STAYING IN (MAY STAYING) +
 1/100 PEOPLE STAYING IN (MAY STAYING)

- PROJEKČNÍ PRÁCE PRŮTOČNÉHO MĚŘENÍ PLOŠNÍ
V PŘÍM. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 694

Podpis zástupce investora (TDI)

Datum: 5.5.2023

Den t dne: PCV

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

WINTER, Q14 + HAZARD, BLADWIN, LEECHES GR., WINTER BURN' MOUNTAIN,
MORRIS, BARNETT, G. MONTGOMERY RD., D. FORD KANSAS, E. CENTRAL,
KALOS, EXETER, MERRILL, DEER GR., MATHIAS GR. + TAYLOR ROAD
R. BRITAIN.

20. Fr. 0.08 mm, KATENIVO FB. 4-8 mm, PABULON KOTEN, SATIN

POKUS PRIMA 15 STUPEŇ FUNKČNÍ
- CÍL: UVEDENÍ NOVOU VÝROBNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIČNÍHO
ROZVOHU NOVÝM

[illegible]

~ PROVIDENȚĂ = PROVIDENȚĂ + PROVIDENȚĂ (PROVIDENȚĂ + PROVIDENȚĂ = PROVIDENȚĂ)

Kc. 4-8mm (Přístrojová a do přístrojové komory)
 - POUKÁZÁNÍ KONFIGURACÍ KONTAKTŮ 3. DO Kc. 0,13mm A A KONTAKTŮ
 4-8mm (KONTAKTŮ ODEBÍRANÉHO POUKÁZÁNÍ Kc. 0,13mm - 0,25mm)
 13-18mm (KONTAKTŮ ODEBÍRANÉHO POUKÁZÁNÍ + KONTAKTŮ DO Kc. 0,13mm A
 13-18mm KONTAKTŮ DO Kc. 0,13mm A
 KONTAKTŮ DO Kc. 0,13mm A

[illegible]

Podpis zástupce investora (TD1):

Podpis stavbyvedoucího:

80 102

Date: 4.5.2023

Den tydne: 87.

Datum: 7. 8. 2002
 Místo dleko: (Příloha) Název akce: P/102/HR. AL. 17. PRAHA, STŘEDHOVCE, BŘKOVSKÝCE, II. STÁPA
 PRÁVO, BŘKOV + 5%, PUL. + 10%, 0002. + 19%
 Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 14⁰⁰
 Období: 1. 8. - 13. 8.

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přesvědčení: ...
Obč: 260 - 1300
(jména a příjmení): JOSEF KOTENKA, PAVEL LEŠKA, JAROSLAV ŠÍP, NEH
RUBRA, OTOMAR POSLOMIL, MICHAEL GRABERT, KOSTI VLAD, VITALIT
MOTILKA, MICHAEL DÍVĚ, MARIE FENC, RUDOLPH NECH

LIEBHERR 914, LIEBHERR 910, DEERE, FIELD MARKER, MOTOROLA
BELLINI, LA FORD TRUCK, SAKURA DIRT, BOSTON, VT. (MOTOROLA)
MOORE, JESSA DRU

REGULATION NUMBER, SEVEN, NEW, 20 FEB. 1951, 11 AM

[illegible]

25000 INMOTIVATED

Stavba smyšená:
 Stavba smyšená (F. Hrabal a.s.) stavba 1. a 2. poschodí
 Stavba smyšená (F. Hrabal a.s.) stavba 1. a 2. poschodí *
 Stavba smyšená (F. Hrabal a.s.) stavba 1. a 2. poschodí *

Podpis stavbyvedoucího: 1

Podpis stavbyvedoucího:

odpis zástupce investora (TDI):

SO 102/

Datum: 3.5.2023

Den týdne: 8.

Místo: (Místo)

Název akce:

MTRU HR. 10. D. PRAHA, (ČE. NOVKA, DISPOZICIONALNÍ, II. KLASA)

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Jména a příjmení: ZDENĚK KUBIŠKA, ALEŠ PAVELKA, JAROSLAV ŠTÍPÁK, JIŘÍ
 RUDOLFA, JAROSLAV ŠTÍPÁK, MICHAEL ŠTÍPÁK, MICHAEL ŠTÍPÁK, MICHAEL ŠTÍPÁK,
 MICHAEL ŠTÍPÁK, MICHAEL ŠTÍPÁK, MICHAEL ŠTÍPÁK, MICHAEL ŠTÍPÁK,
 ANTONÍN ŠTÍPÁK

LIDSKÝ 911, LIDSKÝ 911, LIDSKÝ 911, LIDSKÝ 911, LIDSKÝ 911,
 SYSTÉMOVÝ 1000, SYSTÉMOVÝ 1000, SYSTÉMOVÝ 1000, SYSTÉMOVÝ 1000,
 SYSTÉMOVÝ 1000, SYSTÉMOVÝ 1000, SYSTÉMOVÝ 1000, SYSTÉMOVÝ 1000

PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰,
 PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰,
 PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰,
 PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰,
 PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰,
 PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰,
 PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰, PRACOVNÍ PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

pis zástupce investora (TPI):

Podpis stavbyvedoucího:

80 102 ✓

Datum: 2.5.2013

Den tydne: 07

Učedisko: ČH/2001 / Název akce: 11/1001 NR. 12. 17. 19017, ŠKOLNÍK, REKONSTRUKCE, 1. STUP
UČESNÍ, POZADENÍ, RÁNO + 2K, 17. + 13K, 19017. + 17°C
 Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 10⁰⁰

300 - 1400

Pracovní přestávka: 7⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11 10

čas: 300 - 1500

(jména a příjmení): ROBERTA WAGNER, KARL BUCHEN, JAROMÍR BÍLÝ, MILOŠ
LEHÁČEK, JOSEF POKROČIL, OLEŠ RICHNER, MICHAEL OHRNÁČEK,
KARL KLAD, MILAN MATOUŠEK, MICHAEL BÍLÝ, KAREL FIALA, RICHARD
DANČKA, ALBÍN PAVLÍK

hobby: LIESMERE 94, LIESMERE 92, BREWER, KRISTEN ÖZGÜN NÖRDLÖF,
3x NÖRDLÖF AUTO, KÖLEY, ANIT, 2x FORD TRANSIT,

001: 0560220001 RIGIMAN, BISTRA, PIVANOVÍ ORBURI, ED. NO. 01/2000

જા. સરકારી જોગવાઈનાં કારણે/ગત - પહેલે ત્રી

[illegible][illegible]

Zároveň TDI: po vizuálnej kontrole a na základe
vymedzení kontrolných zón podľa
police, SP v gule prítomnosti úteku.

50 102 ✓

Datum: 28. 7. 2013

Den tøndne: *Pa*

Název akce: 11/100 HE. AL. 17. POKY, ŠKOLNÍ, EKONOMICKÉ, I. STUP

soluções, $\text{O}_2 + 4\text{e}^-$, $\text{Pb} + 2\text{e}^-$, $\text{Cu} + 2\text{e}^-$

Přecovní přestávka: 17³⁰ - 18⁰⁰

jména a příjmení: BUDENKOV MONTENEGRO, VASIL KAD, DICHAL CHENDEZ, VITALY HOFER,
JAENSAV ZIPER, OLGA KUDER, MATOJE POSVOJIL, VIOLOV ZEMEN,
FRANKIEK JEDNIEKO, ANTONIA STENOV, MURAL DITE, KROER KENCL

LIBETTER) 914, LIEBARD 915, NEARBY 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608

20 FC. 01320, 1956 URBAN WOMEN, RETON

[illegible]

spis zástupce investora (TDI):

PO 102

Datum: 25.4.2013

Den týdne: ÚT

Místo: Město Náměstí Název akce: Úprava H. 11. 12. 1947, 1. 1. 1948, 2. 1. 1948

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

SO 102

Datum: 24. 4. 2023 Den týdne: PO

Místo: Sídliště: Strabag Název akce: 11/102 11. R. II. P. 11. H7, ŠKOLNÍKOVSKÉ, OŠKOLNÍKOVSKÉ, II. R. R.

Pracovní doba: 9:00 - 18:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Místo (jména a příjmení): JAROSLAV BARTON, MICHAL DITK, KAREL FRANZ, MICHAEL OTENOV, MARIE KLOD, VITOLIV PETREK, OLGA RUDOLFA, VITOLIV PETREK, BOLESLAV KOTRANSKY, JAROSLAV BARTON, MICHAL DITK, KAREL FRANZ, MICHAEL OTENOV, MARIE KLOD, VITOLIV PETREK, OLGA RUDOLFA, VITOLIV PETREK

Materiál: LITOMĚŘ 914, LA MONTAGNI' APO, LA FORD TENDR, MICHAEL OTENOV, MICHAEL OTENOV, LITOMĚŘ 914

Materiál: OŠKOLNÍKOVSKÉ, BARTON, BARTON

Materiál:

- provedené práce:
- PROVÁZENÍ OŠKOLNÍKOVSKÉ DO V KM 11,800 - 11,870 PŘEDVÍ
PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ
 - PROVÁZENÍ DO V KM 10,800 - 11,300 PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ
PŘEDVÍ
 - PROVÁZENÍ DO V KM 10,300 - 11,300 PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ
PŘEDVÍ
 - PROVÁZENÍ OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ
PŘEDVÍ V KM 10,800 - 11,300 PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ +
OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ
 - PROVÁZENÍ OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ
PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ + OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ
 - PROVÁZENÍ OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ
PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ + OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ
 - PROVÁZENÍ OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ
PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ + OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ
 - PROVÁZENÍ OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ
PŘEDVÍ VE SVĚTLÉ PŘEDVÍ + OŠKOLNÍKOVSKÉ PŘEDVÍ

Středisko: Strabag Datum: 11.3.2013 Den týdne: Pá
 Název akce: 11/101 NO. 12. 17. PRÁVNÍ, STŘECHOVÝCH, REKONSTRUKCE, P. ENER

PRO RÁDO
50-11,00

Pracovní přestávka: 11.00-12.00

(jméno a příjmení): RODOLF BARTEN, MICHAL DUBČEK, ALOIS KAVKA, BOLESLAV KOUTERKA,
PATRICK KLAD, MICHAL OHEZDIL, VILÉM HODRKA

LIBERKA 914, STŘECHOVÝCH, LITROD KONČA, EL. CENTRÁLA, LITROD
REKONSTRUKCE

PRÁVNÍ PRÁVNÍ, BERTON

- (včetně dodavatelů a jejich činností):
- PRÁVNÍ REKONSTRUKCE VÝROBNĚHO ZAŘÍZENÍ
 - REKONSTRUKCE NA STŘECHOVÝCH PRÁVNÍ
 - REKONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ PRÁVNÍ PRÁVNÍ (LIBERKA PRÁVNÍ, 50 401)
 - REKONSTRUKCE PRÁVNÍ DO REKONSTRUKCE PRÁVNÍ + PRÁVNÍ PRÁVNÍ
 - EL. CENTRÁLA + 21 PRÁVNÍ PRÁVNÍ (21 914)
 - REKONSTRUKCE PRÁVNÍ PRÁVNÍ PRÁVNÍ

Datum: 22.9.2003

Den tædne: 07

číslo: 11/101 AB. AL. 17. PO. KY, JEDNOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA
 (PO. 25.0 + 17°C, PO. 1. + 18°C, PO. 2. + 19°C)

at 25.0 + 17°C, 20.0 + 13°C, 15.0 + 9°C

300-2500

Prägnant blühende 27.12. - 28.12.

slučajno: MAISON LEPEN, BOUTIQUE JEWELER, PIERRE DITE, KROCH
FEVO BASTONIN MARCH

1. УЛИЦА 910, УЛИЦА 914, ДОМЫ СЕВ. НАДВОРА, ЗАПАД. РАЙОН,
ПРАВОСЛАВ. ЦЕРК., Б. СЕВЕР. Д. РАЙОН СЕВЕРНО, ПОСРЕД.
РАЙОН, Д. РАЙОН СЕВЕР. РАЙОН.

Reinhold Köhn, Sohn

získ (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - odvětví zpracování dřeva
odvětví zpracování dřeva

* POKROČILÝ DRABOVÁNÍ PRÁCTO POTOM (LEŽEĆ POTOM DO ŽOL)
8 DEKALOGU NO MOMENTS DO PRÁCTOVÉHO + 550 MĚŘÍČKOU
SE ČÍSLOVÝMA + 24 MĚŘÍČKOU PRÁCTOVÉHO (24 MĚŘÍČKOU)

[illegible]

Решением Саратовского областного Совета (Составлен
в количестве 15 человек) при постановлении
исполнительного комитета (Исполкома) - 1926 года № 100/1

POVRATAK: DOBRIM, SPRAVNO, KOTIKOJE DAKLE U MASTU
U TOJ LOKALITETU JE VREME SPRAVNO

[illegible]

POŠTAČNÍ, PROVAZINÍ, PRÁVNÍČNÍHO OBŠLUŽNÍHO MÍSTNOSTI A Z. B. OBŠLUŽNÍHO
MÍSTNOSTI A MÍSTNOSTI PŘED LÉSNÍ PŘED 107 (85V - DLE VÝKRESU)
DO 70. 5. 1952

Материал: Б.К. - про багновую систему 12.12.2018 + 0.02
до 10.01.2019 + 0.02. В периодичности по 10.01.2019
(до 10.01.2019 - 10.01.2019)

and taxpayers' investments (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Date: 31.1.2023

Den tid: *20*

d. Ewidencja: 31/10/19 Nazwa skłosa: 11/10/19 NO. AL. H. PLOTT, 100 HAWKES, RICHMOND LANE, IL. 60622

Đàn, trống

1000 3-10-1944

Pracovní přestávky: 12.00 - 12.05

(Imena i prezimena): RODOV ŽUREN, KRSTIĆEK VROČIĆIĆ, MATEJ ŽIVČ, RABEL
FEJER, BOŠNER DAVENSKI, MILO MOO, MILOŠ ŽIVČIĆ,
BRILJ, MOŠTAR,

4. LIBRERO 912, LIBRERO 914, MONTES DEL VALLE, LIBRERO, LA ROSA ROBERTO,
R. SANTANA, EL MANTO JESUS, LIBRERO, LIBRERO, LIBRERO, LIBRERO,
LIBRERO, LIBRERO

[illegible][illegible]

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Poděště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/257/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. +

e-mai

Datum: 3. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 39 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice.

Zhotovitel stavby předložil dne 15. 8. 2023 a 23. 8. 2023 doplnil návrh ZBV č. 39 SO 102 (102/14) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Úprava svahu z lomového kamene).

Návrh změny řeší požadavek správce toku Povodí Vltavy, s.p. na provedení břehového opevnění typu B1 (odlážděný svah ve sklonu 1:1,25) namísto úpravy svahu typu A, B2 viz stanovisko AD č. 23 z 13. 4. 2021 a navazující stanoviska č. 46 z 28. 2. 2022 a 14. 6. 2023.

Změna ovlivnila výměry položek č. 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 31, 33, 49, 124, 125 a nové položky č. 130, 132, 133, 137.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 39 SO 102 (102/14) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Úprava svahu z lomového kamene)

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/14) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.



M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

253/3

Číslo ZBV:

40

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 40 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.3	0,00	272 560,35	272 560,35

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
40	0,00	272 560,35	272 560,35

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

253/3

Číslo ZBV:

40

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Strabag a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů	A4
2. Změnový list	1	počet listů	A4
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	A4
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	A4
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů	A4
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	A4
Další doklady dle přehledu dokladů	38	počet listů	A4

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71

Změna během výstavby řeší dvě skutečnosti, které PDPS nemohla postihnout.

1) Změna vznikla z důvodu směrové odchylky, která nastala při napojení nového zádržného systému ocelového zábradelního svodidla vybudované opěrné zdi OZ 63 na stávající zádržný systém již dříve postavené OZ č.71. Úprava proběhne na délku jednoho dilatačního úseku římsy stávající zdi 7,5m. V tomto případě je nutné tento směrový nesoulad doladit odbouráním 7,5 m původní ŽB římsy zdi č. 71, provést její novou část ve správné poloze tak, aby došlo k hladkému napojení obruby a nad ní umístěného svodidla. Na nové římsce bude použito stávající zábradlí a svodidlo (stávající svodidlo a zábradlí se demontuje, odveze na mezi depinií, z které se po dokončení prací zpětně doveze a osadí). Druhá skutečnost řeší doplnění sanace stávající obruby římsy opěrné zdi č. 71 před provedením samotných ochranných nátěrů typu S1 a S4 a to sanační hmotou tak, aby byla kompatibilní s nátěrem S4 popřípadě S1. Tato obruba vykazuje povrchově značnou degradaci po očištění tlakovou vodou. Změna se týká pol. č. 30, 38, 44-47 a 50-59 a 62-68, v ceně 252 937,29 Kč.

2) V km 14,100 bylo nutné přeložit při budování opěrné zdi č. 63 stávající betonový propustek DN 300 na levé polovině vozovky, který byl ve výškové kolizi s nově budovanou opěrnou zdí. Jedna polovina propustku byla demontována a přes převlečnou spojkou byla jedna polovina propustku položena níže mimo kolizi s opěrnou zdí v provedení PVC potrubí stejného profilu s obetonováním. Změna se týká pol. č. 48, 49, 61, 62 a 69 v ceně 19 623,06 Kč.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož i přes provedení inženýrskoekologických průzkumů provedení při přípravě stavby nebyla tato lokální odchylka základových zemin zjištěna. Hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35

Technická pomoc Obiednatele

iméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

nodnis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Karel Šimek

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s r.o.

iméno

Ing. David Dvořáček

datum

podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.

jméno

Miroslav Valenta

datum

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 40**

Název Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 253/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
141 279 018,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-11 482 675,35	4 342 630,72	134 138 973,82	-7 140 044,63

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	272 560,35	4 615 191,07	3,27%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-11 482 675,35	134 411 534,17	-6 867 484,28	-4,86%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 40													
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-014610, II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo Číslo a název rozpočtu: 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								253					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	625,425	627,649	2,224	684,61	428 172,21	0,00	1 522,57	429 694,78	1 522,57	0,36%
38	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO	M	508,000	520,700	12,700	128,96	65 511,68	0,00	1 637,79	67 149,47	1 637,79	2,50%
		Nové položky											
44	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	1 356,022	1 356,022	1,00	0,00	0,00	1 356,02	1 356,02	1 356,02	100,00%
45	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,000	2,808	2,808	257,00	0,00	0,00	721,66	721,66	721,66	100,00%
46	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	9,516	9,516	276,33	0,00	0,00	2 629,56	2 629,56	2 629,56	100,00%
47	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1,170	1,170	1 873,30	0,00	0,00	2 191,76	2 191,76	2 191,76	100,00%
48	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,000	1,250	1,250	1 088,06	0,00	0,00	1 360,08	1 360,08	1 360,08	100,00%
49	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	1,250	1,250	431,77	0,00	0,00	539,71	539,71	539,71	100,00%
50	28539R	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	0,000	49,000	49,000	453,00	0,00	0,00	22 197,00	22 197,00	22 197,00	100,00%
51	317326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	0,000	3,806	3,806	20 198,50	0,00	0,00	76 875,49	76 875,49	76 875,49	100,00%
52	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	0,432	0,432	31 608,44	0,00	0,00	13 654,85	13 654,85	13 654,85	100,00%
53	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO	M2	0,000	0,750	0,750	155,00	0,00	0,00	116,25	116,25	116,25	100,00%
54	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	5,850	5,850	28,60	0,00	0,00	167,31	167,31	167,31	100,00%
55	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	5,850	5,850	11,27	0,00	0,00	65,93	65,93	65,93	100,00%
56	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	5,850	5,850	761,20	0,00	0,00	4 453,02	4 453,02	4 453,02	100,00%
57	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	5,850	5,850	830,28	0,00	0,00	4 857,14	4 857,14	4 857,14	100,00%
58	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	5,850	5,850	677,98	0,00	0,00	3 966,18	3 966,18	3 966,18	100,00%
59	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,000	58,500	58,500	1 222,10	0,00	0,00	71 492,85	71 492,85	71 492,85	100,00%
61	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	6,190	6,190	1 203,20	0,00	0,00	7 447,81	7 447,81	7 447,81	100,00%
62	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	1,000	1,000	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	100,00%
63	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	8,000	8,000	196,00	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
64	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S	M	0,000	8,000	8,000	232,00	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
65	9115C2	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	16,000	16,000	395,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	100,00%
66	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	16,000	16,000	433,00	0,00	0,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	100,00%
67	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000	12,700	12,700	48,36	0,00	0,00	614,17	614,17	614,17	100,00%
68	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO	M3	0,000	3,806	3,806	7 290,00	0,00	0,00	27 745,74	27 745,74	27 745,74	100,00%
69	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	0,000	6,190	6,190	534,00	0,00	0,00	3 305,46	3 305,46	3 305,46	100,00%
		Celkem						493 683,89	0,00	272 560,35	766 244,24	272 560,35	55,21%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatel: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	377 812 002,59
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	394 057 663,61
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	476 809 772,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,30%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-6,87%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	17 007 928,37
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,50%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 343 600,78

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	15,75%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,24%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 164 365,31
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	188 906 001,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	56 671 800,39
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	399839261,00%
14=137366000-37		133 367 607,39

		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-6,87%																	
								- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
								Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000,- Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		III/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II	- 25 958 548,45	42 204 209,47	16 245 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 515 664,79	35 972 069,16	12 456 404,37	59 487 733,95	- 62 553,68	3 656 232,12	4 551 524,00	4 676 631,36	3 998 392,61	0,01		
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%		
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%		
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%		
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%		
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skálního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%		
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%		
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%		
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zeď č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zasetení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,15-13,202 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
102/8	21	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tloušťek AB vrstev	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 685 017,85	2 326 749,68	1 641 731,83	3 011 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
334/3	22	Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbínové žlaby, vpusti, žlaby	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 848 332,68	893 335,27	45 002,59	1 741 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102/9	23	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 315 045,75	4 872 115,58	1 557 069,83	8 187 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103/7	24	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku	0,00	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 957,63	386 957,63	386 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253/2	25	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 675,35	4 065 440,24	- 7 417 235,11	15 548 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102/10	26	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	0,00	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 825,06	893 825,06	893 825,06	0,00	0,00		
102/11	27	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek	0,00	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 876,30	439 876,30	439 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103/8	28	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 14,950 a 15,070	0,00	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 421,30	337 421,30	337 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000/1	29	Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 064,84	1 879 064,84	1 879 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
331/1	30	Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

332/1	31	Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.2/1	36	Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu	0,00	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,50	64 020,50	64 020,50	0,00	0,00
102/12	37	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek SAL, zábradlí propustek	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 929,80	1 684 180,84	1 597 251,04	1 771 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/13	38	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 172,61	1 530 172,61	1 530 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102/14	39	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového	- 6 111 253,89	5 276 219,41	- 835 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 111 253,89	5 276 219,41	-835 034,48	11 387 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
253/3	40	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / úprava římsy u OZ č. 71	0,00	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 560,35	272 560,35	272 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	40
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	253/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 253 po změně 3 pro ZBV 40	7	
08 Vyjádření AD č. 60	3	
09 Oznámení zhotovitele o změně	1	
10 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
11 Vyjádření AD č. 56	1	
12 Listy SD - římsa	6	
13 Fotodokumentace - římsa	6	
14 Faktura hlídání	1	
15 Výkres - trouba	1	
16 Fotodokumentace - trouba	2	
17 Geodetický protokol - trouba	3	
18 Listy SD	3	
19 Zápis ing. Klofáče do obch. Rejstříku	2	
20 Stanovisko TDs k ZBV č. 40	1	
Počet listů celkem	38	

[illegible]

[illegible]

8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9 460,500	12 399,459	2 938,959	10,43	98 673,02	0,00	30 653,34	129 326,36	30 653,34	31,07%
		SOD 9460,5=9 460,500 [A] ZBV ZBV č. 25 pol. 131738 2995,2=2 995,200 [A] pol. 131838 69,49=69,49 [B] pol. 131938 310,80=310,8 [C] pol. 138438 -247,321=- 247,321 [D] pol 138938 -189,21=- 189,210 [E] celkem A+B+C+D+E=2938,959 [F]											
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ	M3	3 547,688	5 183,117	1 635,429	497,28	1 764 194,29	0,00	813 266,13	2 577 460,42	813 266,13	46,10%
		Výkop-výtlak (objem zdi, podkl. beton, dre. beton s drenáží, kanen. Rovnanina)											
		SOD 3,0*(0,5+1,0)*0,5*1576,75=3 547,688 [A] ZBV ZBV č. 25 výtlak zed' dle SoD 3728,215 =3 728,215 [A] dren. beton 0,25*0,25*1839,5=114,969 [B] dle pol. č. 451312 60,592+426,464+426,768+30,259=944,083 [C] rovnanina z lom. Kamene dle SoD 1576,5 =1 576,500 [D] výtlak celkem 3728,215+114,969+944,083+1576,5=6 363,767 [E] výkop 11546,894 m3=11 546,884 [F] výkop-výtlak 11546,884-6363,767=5 183,117 [G] odpočet ze SOD -3547,688=-3 547,688 [H] celkem G+H=1 635,429 [I]											
2 Zakládání													
10	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	1 839,500	1 839,500	0,000	875,05	1 609 654,48	0,00	0,00	1 609 654,48	0,00	0,00%
		Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zed' dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A] vyústění po 6 m 1,0*1576,5/6,0=262,750 [B] Celkem: A+B=1 839,500 [C]											
11	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 576,750	1 576,500	-0,250	103,62	163 382,84	-25,91	0,00	163 356,93	-25,91	-0,02%
		rub zdi k drenáži - odhad 1m na celou délku zdi 1,0*(109,8+710,27+707,42+49,26)=1 576,750 [A] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 1576,50 odpočet pův. množství -1576,75 celkem 1576,75-1576,50=-0,25											
12	22694	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVŮ DOČASNÉ	T	788,375	54,900	-733,475	3 859,31	3 042 583,52	-2 830 707,40	0,00	211 876,12	-2 830 707,40	-93,04%
		dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A] pažící stěna na celé délky zdi- odhad 0,75*1576,75/1,5=788,375 [B] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 54,90 odpočet pův. množství -788,375 celkem 54,90-788,375=-733,475											
13	22695A	VÝDRĚVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNA (PLOCHA)	M2	3 153,500	219,600	-2 933,900	326,48	1 029 554,68	-957 859,67	0,00	71 695,01	-957 859,67	-93,04%
		pažící stěna - odhad 2,0*1576,75=3 153,500 [A] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 219,60 odpočet pův. množství -3153,50 celkem 219,60-3153,50=-2933,9											
14	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	13 378,500	12 985,500	-393,000	2 399,03	32 095 422,86	-942 818,79	0,00	31 152 604,07	-942 818,79	-2,94%
		kompletní s roznášecí hlavou část 1 (6,5+7,0)*(70+445)=6 952,500 [A] část 2 (6,5+7,0)*444=5 994,000 [B] část 3 (6,5+7,0)*32=432,000 [C] Celkem: A+B+C=13 378,500 [D] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 12985,5 odpočet pův. množství -13378,5 celkem 12985,5-13378,5=-393,00											

15	26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM odhad 50% délky - ode dna výkopu část 1 (6,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A] část 2 (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B] část 3 (6,0+6,0)*32=384,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 5900,925 odpočet pův. množství -5946,00 celkem 5900,925-5946,00=-45,075	M	5 946,000	5 900,925	-45,075	1 303,82	7 752 513,72	-58 769,69	0,00	7 693 744,03	-58 769,69	-0,76%
16	26184	VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM odhad 50% délky - ode dna výkopu část 1 (6,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A] část 2 (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B] část 3 (6,0+6,0)*32=384,000 [C] Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D] BV ZBV č. 25 skutečnost 5900,925 odpočet pův. množství -5946,00 celkem 5900,925-5946,00=-45,075	M	5 946,000	5 900,925	-45,075	1 303,82	7 752 513,72	-58 769,69	0,00	7 693 744,03	-58 769,69	-0,76%
17	264727	VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 500MM pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% 5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 201,30 odpočet pův. množství -2890,25 celkem 201,30-2890,25=-2688,95	M	2 890,250	201,300	-2 688,950	338,99	979 765,85	-911 527,16	0,00	68 238,69	-911 527,16	-93,04%
18	264827	VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 500MM pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% 5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 201,30 odpočet pův. množství -2890,25 celkem 201,30-2890,25=-2688,95	M	2 890,250	201,300	-2 688,950	469,38	1 356 625,55	-1 262 139,35	0,00	94 486,20	-1 262 139,35	-93,04%
19	28999	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těníční fólie dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 3,0*1576,75=4 730,250 [A] ZBV ZBV č. 25 skutečnost 329,40 odpočet pův. množství -4730,25 celkem 329,40-4730,25=-4400,85	M2	4 730,250	329,400	-4 400,850	138,17	653 578,64	-608 065,44	0,00	45 513,20	-608 065,44	-93,04%

[illegible]

		6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
28	62745	SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu <i>zeď typ C3.2 - odhad 1,0*508,0=508,000 [A]</i> ZBV ZBV č. 25 skutečnost 0	M2	508,000	0,000	-508,000	759,92	386 039,36	-386 039,36	0,00	0,00	-386 039,36	-100,00%
		7 Přídružená stavební výroba											
29	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) <i>zeď typ C3.2 (0,4+1,45-0,15)*508,0=863,600 [A]</i> ZBV ZBV č. 25 skutečnost 838,20 odpočet pův. množství -863,60 celkem 838,20-863,60=-25,40	M2	863,600	838,200	-25,400	492,92	425 685,71	-12 520,17	0,00	413 165,54	-12 520,17	-2,94%
30	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) <i>zeď typ C3.2 (0,15+0,15)*508,0=152,400 [A] ostatní C1 a C2 (0,15+0,15)*1576,75=473,025 [B] Celkem: A+B=625,425 [C]</i> ZBV č. 40 7,414 [m]*(0,150 [m])+0,150 [m]=2,224 [A]	M2	625,425	627,649	2,224	684,61	428 172,21	0,00	1 522,57	429 694,78	1 522,57	0,36%
		8 Potrubí											
31	89914	SACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ vč.zemních prací <i>díl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 6 ks/50m (1550/50)*6+4=190,000 [A]</i> ZBV ZBV č. 25 skutečnost 0 odpočet pův. množství -190,0 celkem -190,00	KUS	190,000	0,000	-190,000	339,66	64 535,40	-64 535,40	0,00	0,00	-64 535,40	-100,00%
		9 Ostatní konstrukce a práce											
32	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVK A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO <i>díl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A]</i>	M	1 576,750	1 576,750	0,000	7 599,16	11 981 975,53	0,00	0,00	11 981 975,53	0,00	0,00%
33	912151	SVODNICE SAMOSTATN A - DODÁVK A MONTÁŽ kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu <i>zeď typ C3.2 + napojení 508,0/4,0+1+1=129,000 [A]</i>	KUS	129,000	129,000	0,000	3 339,02	430 733,58	0,00	0,00	430 733,58	0,00	0,00%
34	912153	SVODNICE SAMOSTATN Á - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč.odvozu <i>zeď typ C3.2 + napojení 508,0/4,0+1+1=129,000 [A]</i>	KUS	129,000	129,000	0,000	690,83	89 117,07	0,00	0,00	89 117,07	0,00	0,00%
35	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETN Ě ODRAZNĚHO PÁSKU <i>zeď typ C3.2 12=12,000 [A]</i>	KUS	12,000	12,000	0,000	322,39	3 868,68	0,00	0,00	3 868,68	0,00	0,00%
36	917223	SILNIČN Í A CHODNIKOV Ě OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM mimo vozovku <i>ukončení přímě 9,0*5=45,000 [A]</i>	M	45,000	45,000	0,000	609,88	27 444,60	0,00	0,00	27 444,60	0,00	0,00%
37	917224	SILNIČN Í A CHODNIKOV Ě OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky <i>ukončení přímě 5,0*5=25,000 [A] ukončení u sjezdu 5,0*2=10,000 [B] Celkem: A+B=35,000 [C]</i>	M	35,000	35,000	0,000	654,25	22 898,75	0,00	0,00	22 898,75	0,00	0,00%</

40	936502	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ POZINK chříče 940x920/5 - 34 kg/kus po 6 m 1572,0/6,0=262 ks 262*34=8 908,000 [A]	KG	8 908,000	8 908,000	0,000	172,71	1 538 500,68	0,00	0,00	1 538 500,68	0,00	0,00%
41	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ zed' typ C3.2 (0,4+1,45+0,15)*508,0=1 016,000 [A]	M2	1 016,000	1 016,000	0,000	161,19	163 769,04	0,00	0,00	163 769,04	0,00	0,00%
42	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku typ C2 - km 13,81 - 14,01 = 200 m 1,0*1,0*200,0=200,000 [A]	M3	200,000	200,000	0,000	1 365,70	273 140,00	0,00	0,00	273 140,00	0,00	0,00%
43	27152	NOVÉ POLOŽKY POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO - z recyklátu Cena převzata z OTSKP 2020, pol. 27152 SOD ZBV ZBV č. 14 161=161,000 [A]	M3	0,000	161,000	161,000	867,00	0,00	0,00	139 587,00	139 587,00	139 587,00	100,00%
44	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací ZBV č. 40 1 356,022=1 356,022	KČ	0,000	1 356,022	1 356,022	1,00	0,00	0,00	1 356,02	1 356,02	1 356,02	100,00%
45	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Cena položky dle OTSKP 2023 ZBV č. 40 0,50 [m]*0,20 [m]*(7,5 [m]+4,2 [m])*2,40 [t/m3]=2,808 [A] materiál z vybourané vozovky	T	0,000	2,808	2,808	257,00	0,00	0,00	721,66	721,66	721,66	100,00%
46	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Cena položky dle SoD SO 437 ZBV č. 40 1,450 [m]*0,350 [m]*7,500 [m]*2,500 [t/m3]=9,516 [A]	T	0,000	9,516	9,516	276,33	0,00	0,00	2 629,56	2 629,56	2 629,56	100,00%
47	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODVOZ DO 20KM Cena položky dle SoD SO 334 ZBV č. 40 0,50 [m]*0,20 [m]*(7,5 [m]+4,2 [m])=1,170 [A]	M3	0,000	1,170	1,170	1 873,30	0,00	0,00	2 191,76	2 191,76	2 191,76	100,00%
48	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Cena položky dle SoD SO 437 ZBV č. 40 1,50 [m]*1,0 [m]*0,50 [m]=0,750 [A] trouba 0,5*1,0*1,0=0,500 [B] A+B=1,250 [C]	M3	0,000	1,250	1,250	1 088,06	0,00	0,00	1 360,08	1 360,08	1 360,08	100,00%
49	17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Cena položky dle SoD SO 437 ZBV č. 40 1,50 [m]*1,0 [m]*0,50 [m]=0,750 [A] trouba 0,5*1,0*1,0=0,500 [B] A+B=1,250 [C]	M3	0,000	1,250	1,250	431,77	0,00	0,00	539,71	539,71	539,71	100,00%
50	28539R	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Cena položky dle OTSKP 2023 ZBV č. 40 49 [ks]=49,000 [A]	KUS	0,000	49,000	49,000	453,00	0,00	0,00	22 197,00	22 197,00	22 197,00	100,00%
51	317326	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 Cena položky dle SoD SO 205 pol.č. 33 ZBV č. 40 1,450 [m]*0,350 [m]*7,50 [m]=3,806 [A]	M3	0,000	3,806	3,806	20 198,50	0,00	0,00	76 875,49	76 875,49	76 875,49	100,00%
52	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Cena položky dle SoD SO 207 ZBV č. 40 viz výkres římsy, tabulka výztuže 0,432 [t]=0,432[A]	T	0,000	0,432	0,432	31 608,44	0,00	0,00	13 654,85	13 654,85	13 654,85	100,00%
53	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Cena položky dle OTSKP 2023 ZBV č. 40 1,50*0,50=0,750 [A]	M2	0,000	0,750	0,750	155,00	0,00	0,00	116,25	116,25	116,25	100,00%

54	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	5,850	5,850	28,60	0,00	0,00	167,31	167,31	167,31	100,00%
		Cena položky dle SoD SO SO 205											
		ZBV č. 40											
		0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]											
55	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	5,850	5,850	11,27	0,00	0,00	65,93	65,93	65,93	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 205											
		ZBV č. 40											
		0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]											
56	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	5,850	5,850	761,20	0,00	0,00	4 453,02	4 453,02	4 453,02	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 205											
		ZBV č. 40											
		0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]											
57	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	5,850	5,850	830,28	0,00	0,00	4 857,14	4 857,14	4 857,14	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 205											
		ZBV č. 40											
		0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]											
58	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	5,850	5,850	677,98	0,00	0,00	3 966,18	3 966,18	3 966,18	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 205											
		ZBV č. 40											
		0,50 [m]*(7,50 [m]+4,20 [m])=5,850 [A]											
59	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,000	58,500	58,500	1 222,10	0,00	0,00	71 492,85	71 492,85	71 492,85	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 40											
		58,5 m2											
61	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	6,190	6,190	1 203,20	0,00	0,00	7 447,81	7 447,81	7 447,81	100,00%
		dle SO 334											
		ZBV č. 40											
		dle geodetického protokolu Š II 29/2022											
		6,19=6,190 [A]											
62	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	1,000	1,000	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	100,00%
		Cena dle OTSKP 2022											
		ZBV č. 40											
		1=1											
63	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	8,000	8,000	196,00	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 40											
		8,0 [m]=8,000 [A]											
64	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	8,000	8,000	232,00	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 40											
		8,0 [m]=8,000 [A]											
65	9115C2	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000	16,000	16,000	395,00	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 40											
		8,0 [m]+8,0 [m]=16,000 [A]											
66	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	16,000	16,000	433,00	0,00	0,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 40											
		8,0 [m]+8,0 [m]=16,000 [A]											
67	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000	12,700	12,700	48,36	0,00	0,00	614,17	614,17	614,17	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 205											
		ZBV č. 40											
		(7,5+4,2+2*0,5)=12,700 [A]											
68	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	3,806	3,806	7 290,00	0,00	0,00	27 745,74	27 745,74	27 745,74	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2023											
		ZBV č. 40											
		1,450 [m]*0,350 [m]*7,500 [m]=3,806 [A]											
69	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC	M	0,000	6,190	6,190	534,00	0,00	0,00	3 305,46	3 305,46	3 305,46	100,00%
		Cena položky dle OTSKP 2022											
		ZBV č. 40											
		dle geodetického protokolu 6,19=6,190 [A]											
		Celkem						141 279 018,45	- 11 482 675,35	4 615 191,07	134 411 534,17	- 6 867 484,28	-4,86%

2400 (82)



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 2537/2023/DDv
Datum: 4. 5. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: -

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 60 - SO 253, nátěr římsy zdi 71

Na základě místního šetření provedeného v roce 2017 v rámci průzkumných prací pro zpracování přípravné dokumentace byla na stávající opěrné zdi v lokálním stanícení cca km 13.2 až 13.7 navržena obnova ochranných nátěrů na římse. Bylo uvažováno s provedením nátěru S4 na obrubě a S1 na zbytku povrchu římsy. Toto řešení bylo převzato do RDS. Je předmětem SO 253, opěrná zeď 71. RDS byla AD schválena.

Zhotovitelem jsme byli informováni, že před realizací nátěrů bylo zjištěno následující:

- Stav betonu obruby se zhoršil. Beton je povrchově degradovaný. Degradace znemožňuje obnovu nátěru S4. Hrozí riziko rychlé separace a znehodnocení nově provedeného nátěru bez úpravy stávajícího povrchu.
- Náletová vegetace u opěrné zdi zasahuje lokálně až k římse opěrné zdi a znemožňuje bezpečné a kvalitní provedení nátěrů především na ozubu římsy.

Za AD jsme výše uvedené skutečnosti prověřili a potvrzujeme je.

Za AD požadujeme následující:

- Před provedením nátěru bude provedena sanace obruby. Sanace bude provedena tak, aby byla kompatibilní s nátěrem S4, případně i S1, pokud by sanovaná plocha zasahovala i do oblasti nátěru S1. Plošná sanace celé římsy, tj. i v oblasti nátěru S1, se však nepředpokládá.
- Náletová vegetace bude prořezána tak, aby bylo umožněno bezpečné a kvalitní provedení nátěrů římsy. Předpokládá se především provedení prořezu větví. Tam, kde by byl prořez větví nedostačtečný, bude odstraněna celá dřevina.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/40

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

- 1) Změna během výstavby řeší dvě skutečnosti, které PDPS nemohla postihnout. První je směrová odchylka, která nastala při napojení nového zádržného systému ocelového zábradelního svodidla vybudované opěrné zdi OZ 63 na stávající zádržný systém již dříve postavené OZ č. 71. V tomto případě je nutné tento směrový nesoulad doladit odbouráním 7,6 m původní ŽB římsy zdi č. 71, provést její novou část ve správné poloze, která umožní napojení obou zádržných systémů. Druhá skutečnost řeší doplnění sanace stávající obruby římsy opěrné zdi č. 71 před provedením samotných ochranných nátěrů typu S1 a S4 a to sanační hmotou tak, aby byla kompatibilní s nátěrem S4 popřípadě S1. Tato obruba vykazuje povrchově značnou degradaci po očištění tlakovou vodou.
- 2) V km 14,100 bylo nutné přeložit při budování opěrné zdi č. 63 stávající betonový propustek DN 300 na levé polovině vozovky, který byl ve výškové kolizi s nově budovanou opěrnou zdí. Jedna polovina propustku byla demontována a přes převlečnou spojku byla jedna polovina propustku položena níže mimo kolizi s opěrnou zdí v provedení PVC potrubí stejného profilu s obetonováním.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

strana 1 z 1

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s nápravou směrové odchytky při napojení nového zádržného systému vybudované opěrné zdi OZ63 na stávající zádržný systém a s přeložením betonového propustku DN300 na levé polovině vozovky z důvodu kolize s nově budovanou opěrnou zdí.

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č.j.: Px0561/2023/DDv
Datum: 26.1.2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: 

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 56 - SO 253, napojení zdi úseku 71 a 63

Při osazování svodidla na opěrnou zeď SO 253 úsek 63 v místě napojení na stávající zeď v km cca 13.7 byla zjištěna půdorysná výchylka polohy svodidla na stávající opěrné zdi. Opěrná zeď půdorysně v místě svého ukončení vybíhá směrem k ose vozovky. Dochází tak k lokálnímu zúžení vozovky o cca 0.3 m. Ukončení stávající zdi není rovnoběžné s osou komunikace.

Provedli jsme místní šetření a vyhodnotili podrobné zaměření zajištěné zhotovitelem.

Za AD požadujeme následující:

- Půdorysné vychýlení konce stávající zdi bude upraveno.
- Úprava proběhne na délku jednoho dilatačního úseku římsy stávající zdi, tj. cca 7.5 m. Římsa bude odbourána a nově provedena v odsunuté poloze. Změna polohy bude plynulá tak, aby došlo k hladkému napojení obruby a nad ní umístěného svodidla. Šířka římsy a služebního chodníku zůstane zachována. Na nové římsě bude použito stávající zábradlí a svodidlo.
- Mezi římsou stávající zdi a obrubou nové zdi úseku 63 bude proveden betonový obrubník a dlažba z lomového kamene.
- Do realizované zdi úseku 63 nebude zasahováno.

Konkrétní technické řešení bude zpracováno v RDS.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

SO 253 - I

OBJEDNATEL STAVBY



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 00066001

SCHVÁLIL-RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

TECHNICKÝ DOZOR



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
IČ 45272387

SCHVÁLIL-RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

AUTORSKÝ DOZOR



Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4 - Braník
IČ 40763439

SCHVÁLIL-RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

ZHOTOVITEL STAVBY



STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744

SCHVÁLIL-RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

ZPRACOVATEL RDS



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223
160 00 Praha 6
IČ 26080273

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

SCHVÁLIL-RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

VYPRACOVAL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Kamil Pej

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Tomáš Roztočil

AKCE

TECHNICKÁ KONTROLA

Ing. Petr Macek

II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

STAVEBNÍ OBJEKT

SO 253 - OPĚRNÉ ZDI - DAVLE-ŠTĚCHOVICE - VLEVO

PŘÍLOHA

**OPĚRNÁ ZEĎ Č. 71 -
km 13.202-13.706**

Č. PŘÍLOHY

Č. PARÉ

71.

STUPEŇ

RDS

DATUM


MĚŘÍTKO

FORMÁT







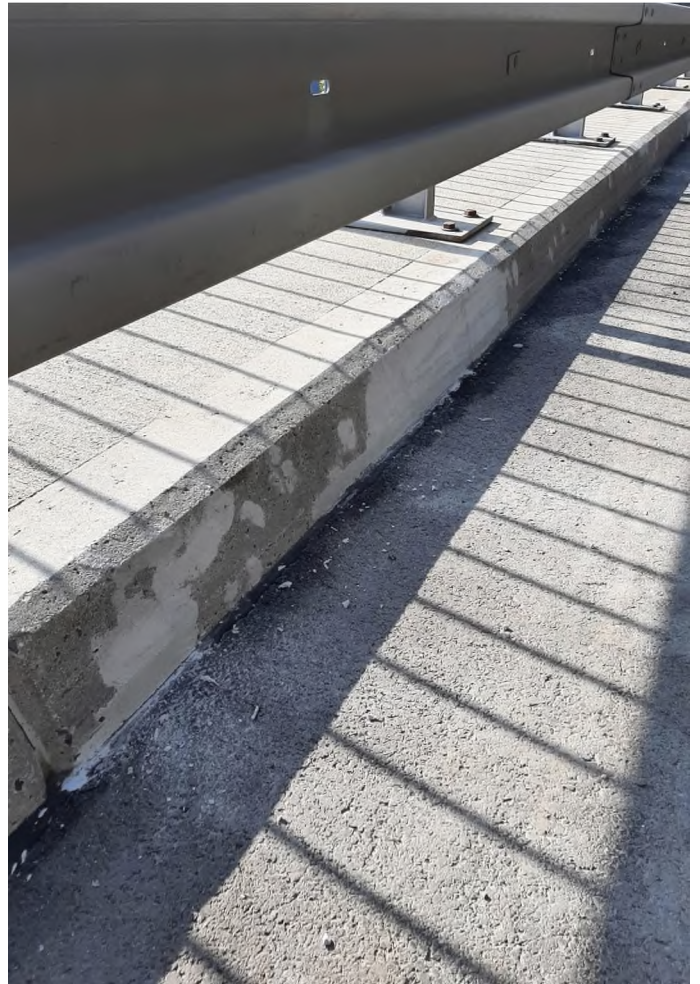





S0253

Datum: 6.6.2023

Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: 841/26K Název akce: 11/102 HR. HL. II. PRAHY - STŘECHOVICE, ÚZELONOSTRUKCE, STATA 4

Počasí: ZATAŽENO 10°C, 15°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): PAVEL KOLONIAK, MICHAL MARIEK, VÁCLAV KRUPKA, JAN VEJŠKA

Mechanismy: DROBNÁ MECHANIZACE, R. CENTRÁLA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- MONTÁŽ SERVOJE POD DMSU S0253-71
- MONTÁŽ BEDNĚNÍ PODLAHY DMSU S0253-71

SO253

Datum: 7. 6. 2023 Den týdne: ST

Nákladové středisko: 891/28AC Název akce: 1/102 HE HL. H. PRAHY - STŘEHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA 4.

Počasí: JASNO MC: 19°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): PAVEL IKONIAK, VÁCLAV KRUPA, JAN VELKÝ, MICHAL HAREK

Mechanismy: DROBNÁ MECHANIZACE, KOMPRESOR, R. CENTRÁLA

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- DOKONČENÍ BEDNĚNÍ PODLAHY PTHSY SO253-41
- VYVĚTÁNÍ A VLEPENÍ VÝTULŽE PRO KOTVENÍ PTHSY

Podpis zástupce investora (TDI)

SO253

Datum: 9.6.2023 Den týdne: PA

Nákladové středisko: 841/207K Název akce: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - STŘEŠPOUKĚ, REKONSTRUKCE, ETAPA I.

Počasí: JASNO 12°C - 18°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): PAVEL KONIÁK, MICHAL MAREK, VÁCLAV ERUPEL, JAN VELKÝ,
4x DEZNÍK (F. HOLENDÁ), 5x DEZNÍK (F. REJČO)

Mechanismy: EL. CENTRÁLA, DEOBNA' MECHANIZACE, VYSOKOTRATKA' MYČKA, KALUŽE' ČERPADLO

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PROVA'DENÍ' UVEDENÍ' ARMATURY RTHSY SO253-71
- PROVA'DENÍ' HYTI' NAŠLAPU RTHSY POMOCI' TRAKOVÉ' MYČKY NA SO253 - 2DI Č. 63 A Č. 64
- PROVA'DENÍ' SANACÍ' NAŠLAPU RTHSY NA SO264 - OPĚRNA' ZED'
- ÚKLID POD MOSTY SO209, SO205, SO206, SO201

Podpis zástupce investora (TDI):

Datum: 10. 6. 2023 Den týdne: SO

dové středisko: 841/26AC Název akce: 1/102 HR. HL. M. PRAMY - STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA 4.

st: JASNO 9°C, 16°C

vní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

vníci (jména a příjmení): 5x DĚLNÍK (REGIO), MICHAL HAREK, VÁCLAV KRUPKA, PETR MOTEJL, JAN VEKLY,

anizmy: DROBNÁ MECHANIZACE

riál: OCHRANÝ MATERIÁL S9

šky:

edené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- APLIKACE 1. VRSTVY OCHRANÝCH MATERIÁLŮ TYPU S9 NA SO253 - ZEDČ. 63
- MONTÁŽ BEDNĚNÍ ŘEŠSÝ SO253 - 71

pis zástupce investora (TI

30253

Datum: 11.6.2023

Den týdne: NE

Nákladové středisko: 841/2BAC Název akce: 4/162 HR.HL. M. PRAHY - STŘEDVÍCE, REKONSTRUKCE, ETAPA V.

Počasí: JASNO

Pracovní doba: 4⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): GADÉLNÍK (F. REGIO), PAVEL IKONIÁK, VÁCLAV KRUPEA,
JAN VELKÝ, PETR HOTEČ, MICHAL MAREK

Mechanismy: DROBNÁ MECHANIZACE

Materiál: OCHRANÝ NÁTER TYP S9

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- APLIKACE 1. VESTVY OCHRANĚHO NÁTERU TYPU S9 NA NÁŘAD
- S0253 - ZED ů. G3 A G4
- MONTÁŽ BEDNĚNÍ DÍMSY S0253-47

Podpis zástupce investora (

SO 253

Datum: 12.6.2023 Den týdne: PO

Nové středisko: 841/26AK Název akce: 1/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Podmínky: JASNO 10°C; 14°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): 5x DĚLNÍK (REGIO)

Pracovní systémy: DROBNÁ MECHANIZACE

Pracovní materiál: OCHRANÝ NÁTER TYP S4

Ukázky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- APLIKACE 2. VESTVY OCHRANĚHO NÁTERU TYPU S4 NA NÁBĚH
SO 253 - ZED Č. 63

- ZÁPIS ZHOTOVITELÉ: STAUBYVEDOUČÍ (DIS. MARTIN LISA) ŽÁDA
TDI (P. MIROSLAVA VALENTA) O PŘEVZETÍ VÝZVUŽE A POUKLENI
BETONÁŽE RTHS SO 253 - ZED 41

ZÁPIS TDI PROVEDENÁ KONTROLA KVALITY,
NA ZÁKLADĚ TĚTO KONTROLY
POVOLYNI BETONÁŽE RTHS

Podpis zástupce investora (TDI):

S0253

Datum: 13.6.2023 Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: 411/26AC Název akce: 11/102 HE. HL. M. PRAMY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUČE, ETAPA II.

Počasí: JASNO 15°C, 22°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰Pracovníci (jména a příjmení): PAVEL KONIÁK, VÁCLAV KROUPA, MICHAL HÁREK, JARU VELKÝ,
5X ŽENKLE (F. REC-10)

Mechanismy: EL. CENTRÁLA, PONORNÝ VIBRÁTOR, 1x AUTODOMČNÁVAČ, ŽROBNÁ MECHANIZACE

Materiál: BETON C 30/37 XF4, OCHRANÝ NÁTĚR TYPU 34

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- APLIKACE 2. VESTVY OCHRANĚHO NÁTĚRU TYPU 34 NA NÁŠTAD
S0253 - ŽED Č. 63 A Č. 64
- BETONOVÁ Ž. B/MSY S0253-41
- PROVEDENÍ STRAŽE NA POCHOZÍ ČÁSTI B/MSY
- OŠETŘOVÁNÍ BETONU

Podpis zástupce investora (TDI):

50253

Datum: 16.6.2023 Den týdne: PA

Nákladové středisko: 341/20AC Název akce: III/ 102 HE. HL. P. PRAHY - STRODOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Počasí: JASNO 14°C 23°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): PAVEL KECMATEK, VÁCLAV KRUPKA, MICHAL HAREZ, JAN VELKÝ

Mechanismy: P2. CENTRÁLA, DEOBVA' MECHANIZACE, KOMPRESOR, AUTO S POUKOU

Materiál: OCHRANU' MATERI' TYPU S1 A S9

Zkoušky:


Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

50253 - ZED' 41:

- DEMONTAŽ ZEDNENÍ PTHS1
- DEMONTAŽ SERUZE POD PTHSOU
- APLIKACE OCHRANĚHO MATERI' TYPU S1
- UKLID' STAVENIŠTĚ
- ODUVZ' ZEDNENÍ A SERUZE
- APLIKACE OCHRANĚHO MATERI' TYPU S9 NA VAŠLAP PTHS1 (1. VESTVA)

Podpis zástupce investora (TDI):

TYP ZDI "B" - PŘÍČNÝ ŘEZ U-U 1:75 ČÍSLA PODROBNÝCH BODŮ (EE)

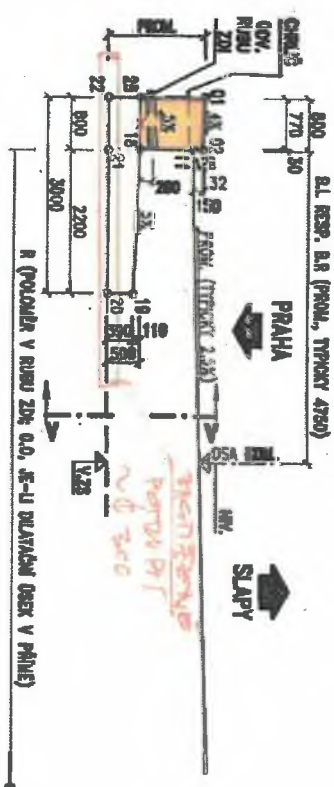

TYP ZDI "B" - POHLED V-V 1:75



POZNÁMKY:

- 1) VODNÍKOVÉ DELTY SE MĚNÍ V ŘÍMĚ ZDI.
- 2) VÝŠKA ZDI NENÍ PROVEDENA LINEÁRNĚ, PROŠEDNÍ VÝŠKY ZDI - VIZ JEDNOTLIVÉ ŘEZY POKRÝTÍ.
- 3) ŘEZY JSOU KOLMĚ NA OSU KOMUNIKACE.
- 4) BLAŽENÁ OSEY V OBLASTI - VIZ NEROUČNÁ HOODNOST VZPĚTÍ "P" UPRASŤED DELTY DL. OSEKUI
- 5) VŠECHY NÁSTY ZIGOST 20/20, NENÍ UVEDENO JINAK.
- 6) ROZKLETY ČERKLE, PROSTŘÍP ODVOZENÉ, TVAR DL. SVATÝ AFOD. - VIZ "OPĚVNĚ ZDI - DETAIL".
- 7) POLONA JEDNOTLIVÝCH DL. OSEKUI - VIZ "PŘEMĚNĚNÍ A VYTVOŘENÍ VÝKRES".
- 8) SOUDAVNOST BODŮ POKRÝTÍ - VIZ "TVAR OPĚVNĚ ZDI - SOUDAVNOST BODŮ TVARU".


PARAMETRY ZDI

TYP ZDI	B
CELKOVÁ VÝŠKA NA ZÁKLADNÍ ZDI	H.tot.L = 1.736 m
VÝŠKA DÍLKU NA ZÁKLADNÍ ZDI	H.L = 1.286 m
CELKOVÁ VÝŠKA NA KONCI ZDI	H.tot.R = 1.740 m
VÝŠKA DÍLKU NA KONCI ZDI	H.R = 1.240 m
NADPODLEKÁ VÝŠKA V LÍCI DÍLKU NA ZÁKLADNÍ ZDI	V.L = 206.020 m. n. n.
NADPODLEKÁ VÝŠKA V LÍCI DÍLKU NA KONCI ZDI	V.R = 206.024 m. n. n.
NADPODLEKÁ VÝŠKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY	V.ZS = 304.284 m. n. n.
ČÍSLO ŘEZY NA ZÁKLADNÍ ZDI	DDO.L = 435
ČÍSLO ŘEZY NA KONCI ZDI	DDO.R = 448
POLONA V ŘÍMĚ ZDI	R = -419.760 m
VZPĚTÍ UPŘ. DÍL. OSEKUI V DÍL. ZÁKLADOVÉ (R) ZDI	d = 48 mm
VZDÁLENOST OD OSY KOMUNIKACE NA ZÁKLADNÍ ZDI	B.L = 4.762 m
VZDÁLENOST OD OSY KOMUNIKACE NA KONCI ZDI	B.R = 4.762 m

MATERIÁLY

- PODKLADNÍ BETON: C 12/16 X0
- ZÁKLADOVÁ DESKA: C 30/37 XF2/XD1/XC2
- DÍK: C 30/37 XF4/XD3/XC4

MĚNĚNÍ VZPĚTÍ



PROSTŘÍP (PŘÍKLAD) PŘÍDE DEPCOVANÉ UŠ

POLONA POKRÝTÍ (ODNÁ DÍLKA)

BLAŽENÁ POKRÝTÍ (LÍCI) POKRÝTÍ (LÍCI)

PROSTŘÍP

VLIVNĚ BUDĚ POKRÝTÍ (LÍCI) POKRÝTÍ (LÍCI)

NENÍ POKRÝTÍ (LÍCI)





STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 29/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C – km 14,100 – oprava původního propustu

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:	4.2022	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	14.7.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	14.7.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb



II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE


Úsek C

Oprava původního propustu v km 14,100

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	Popis
500	747933.77	1068390.46	204.55	VYTOK
501	747939.55	1068392.66	204.72	NAPOJENÍ



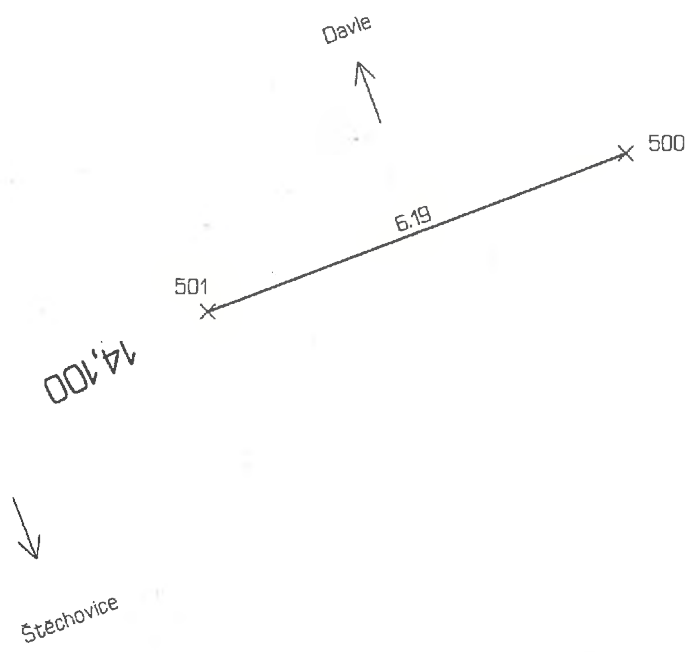

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky	
				ověřil	Ing. S. Brlek
				datum	14.7.2022
				číslo ověření	
akce	II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice Úsek C, km 14,100 - oprava původního propustu				výkres číslo
				měřítko	1 : 100
zaměřil	Ing. Stanislav Brlek	datum	4.2022	souř. systém	S-JTSK
kreslil	Ing. Stanislav Brlek	datum	14.7.2022	výšk. systém	Bpv

80 102

Datum: 1. 3. 2012 / Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: 84/1262 / Název akce: 11/102 / PR. K2. 17. PRAM - JIČHOVCE, REKONSTRUKCE, B. ET.

Počasí: POLOJASNO, PR. 20-6°C, POL. +8°C, ADOTL. +2°C

Pracovní doba: 5:00 - 16:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): PAVLÍNEK VILÉM, VASIL VLAD, MICHAL CHLÁDEK, JIŘÍ KOLAR, BOLENEK KAREL

Mechanismy: LIEBHERR 912, HITACHI, JAPLECI NEURON 50 83, 2x NISSAN DESER, 2x KOTÁČKOVÝ KAMIO, 2x FORD TRANSIT, 1x NÁKL. AUTO, KOTÁČKOVÝ BŘEŠŤ, KAPALNÁ

Materiál: ABSOLUTNÍ PĚNEN, BETONOVÝ POKRYTÍ, BETON

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- PROVEDENÍ OÚTĚŽENÍ TĚLESA KOMUNIKACE
- V K2. 17.00 - 17.20 (LEVO STRANA KE PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ)
- OČISTĚNÍ PLOŠY PŘED TĚLESEM NA PLOŠKU PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ
- PŘÍPRAVA PLOŠY PŘED TĚLESEM PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ
- PŘÍPRAVA PLOŠY PŘED TĚLESEM PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ
- V K2. 17.20 - 17.40 (LEVO STRANA KE PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ)
- BETONOVÝ POKRYTÍ PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ
- PO PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ
- PŘÍPRAVA PLOŠY PŘED TĚLESEM PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ
- KOTÁČKOVÝ KAMIO (PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ)
- V K2. 17.40 - 17.50 (LEVO STRANA KE PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ)
- PŘÍPRAVA PLOŠY PŘED TĚLESEM PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ
- BETONOVÝ POKRYTÍ PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ PŘÍČNÉ PŘEMĚNĚ

Podpis zástupce investora (T)

Podpis stavby

SO 253

Datum: 18.5.2022 Den týdne: ST.

Místní středisko:

Název akce: II/102 H.N.H.L.M. PRAHY, STŘECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II

Město:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení): KOHOUT MAREK, VITALIJ IVANOV, VITALIJ MIKUL, VASIL IVANOV, GILJUK TOLJA, BELVA VIKTOR, KASIMIR JIN, MICHAL BLECHA, BOBAL VASIL, DANKO IVAN, IKOMAK PAVEL, MICHAL MAREK, DAVID HOKR, KAREL DAVID, VÁCLAV TRUBKA, BOŽEK ROMAN

Mechanismy: DROBNÁ MECH, EL. CENTRÁLA, KOMPRESOR,

Materiál:

Zkoušky: ZÁPIS ZHOTOVITELE: ŽADÁNÍ TDI O POUŽITÍ BETONÁŽE ZÁKLADU OP. 2DI
DILATAČNÍ VSEKY 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

MT. BEDNĚNÍ ZÁKLADU
OSAŽENÍ TRUBKY Ø300 SKRZE ZÁKLAD
IZOLACE MŘEZOVÝCH TRUBICEK DRENÁŽÍ
MT. BEDNĚNÍ DRENÁŽE
NÁTĚR LICE OP. 2DI ALP+ZYALNZÁPIS ZHOTOVITELE: JMÉNEM DNE BYLA
ODPRÁVNĚNÁ PRO DUBA DN 300 PN R/ DO ZÁKLADU
OP. 2DI Č. 63 DÍL 6332 V KM 14,100
LEŽE PŘEDNÍ JE MŘEZU PLOMČENÍ A PŘEPOJENÁ
V BETONOVÝM ODPRÁVNĚNÍ DN 300 DLE POKYSLIVNÉHO
POKRYTÍ OD 90 STAVBY A DLE POKYSLIVNÉHO
PŘEPOJENÍ FOTODOKUMENTACE PŘEPOJENÍ + POKRYTÍ

ŽADÁNÍ TDI: ŽEKL NA VÝSTAVĚ, IT

Výpis zástupce investora (TDI):

DIATAČNÍ ÚSEK 6332


$$\sqrt[3]{1000} = 10$$

- ÉKNE ZDI - SOUBAŇNICE BOBŮ TVANŮ.

B.R. 4.752

三

1



11-254

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/261/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. 

e-ma 

Datum: 7. 11. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 40 (253/3) SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 40 SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo (Úprava římsy u OZ č. 71).

Návrh změn řeší:

1. Napojení nové opěrné zdi č. 63 na stávající opěrnou zeď č. 71 včetně zábradelního svodidla, ocel. svodidla, vybourání stávající OZ, doplnění konstr. vrstev (viz stanovisko AD č. 56 z 26.1. 2023).

Změna měla vliv na položky č. 30, 38 a nové položky č. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

2. Sanaci římsy stávající opěrné zdi č. 71 (viz stanovisko AD č. 60 z 4. 5. 2023).

Změna měla vliv na novou položku č. 59.

3. V km 14,100 výškovou úpravu stávajícího bet. propustku DN 300.

Změna měla vliv na nové položky č. 61, 62, 69.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 40 (253/3) SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo (Úprava římsy u OZ č. 71).

Položky oceněného soupisu prací SO 253 (253/3) budou fakturovány na základě skutečné provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.



M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek
