

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021, změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZVZ, odst. (6)

Stavební akce:	Odkanalizování Lhoty II
Změnový list 04	
Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změna stavby

Dotčená část stavby:			
Název / označení změny:	ZL 4 - čerpání spodní vody		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	List č. 019687 ze dne 19. 1. 2022, list č. 019688 ze dne 19.1.2022		
Návrh pro změnu podal: zhotovitel - Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	██████████	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	Po zahájení zemních prací v lokalitě Za Lesem, Ke křížku, Polivkov a Na Blatech byl zjištěn výskyt silného přítoku spodní vody. Projekt ustálenou hladinu spodní vody nepředpokládá.		
Identifikace plnění	<p>Náklady na plnění dle přiložených rozpočtů víceprací a méněprací jednotlivých objektů jsou rozděleny na část:</p> <p>A) spolufinancováno z prostředků OPŽP vícepráce ██████████ Kč Méněpráce ██████████ Kč Změnový list ██████████ Kč</p> <p>B) financováno mimo prostředky OPŽP - vícepráce ██████████ Kč Méněpráce ██████████ Kč Změnový list ██████████ Kč Celkem změnový list ZL ██████████ Kč</p>		
Popis příčin vzniku změny díla	Po zahájení zemních prací v lokalitě Za Lesem, Ke křížku, Polivkov a Na Blatech byl zjištěn výskyt silného přítoku spodní vody. Projekt ustálenou hladinu spodní vody nepředpokládá. Tato skutečnost byla konzultována s projektantem a se zástupcem provozovatele. Jelikož spodní vodu nelze oddrenážovat (není dešťová kanalizace a do spáškové nelze čerpat spodní vodu) bylo dohodnuto, že se provede čerpací šachta, ze které se bude spodní voda odčerpávat po dobu po dobu montáže do silničního příkopu. Lože pod potrubím se provede ze šterku frakce 16-32 nebo 32-63 v tl.20cm na které bude provedeno sedlo z betonu..		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		51 dní
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem (bezDPH):			██████████
přípočty celkem (bezDPH):			██████████
odpočty celkem (bezDPH):			██████████
Přílohy:			
	- č.1 - Ocenění změny díla		Rozpočet přípočty a odpočty
	- č.2 - Projektová dokumentace		Celá lokalita
	- č.3		
	- č.4 - Fotodokumentace		
	- č.5 - Zápis ze stavebního deníku		l.č.019687 z 19.1.2022, l.č. 019688 z 21.1.2022
	- č.6 - Vyjádření TDS, AD, objednatele		
Za útvár / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným J -	██████████	24.6.2024	
projektant /EGYPROJEKT spol s r.o./ -	██████████	24.6.2024	
techn. dozor stavebníka /RAVAL projekt v.o.s./ -	██████████	24.6.2024	
objednatel /Vodárna Pízeň, a.s./ -	██████████	24.6.2024	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o

Stavební akce:

Odkalanaizování Lhoty II Změnový list 04

Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Odpočty uznatelné

Název / označení změny:

ZL 4 - čerpání spodní vody

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
			Náklady soupisu celkem				■	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 04

Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Odpočty neuznatelné

Název / označení změny:

ZL 4 - čerpání spodní vody

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
			Náklady soupisu celkem				■	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 ,

Stavební akce:

Odkalanalizování Lhoty II Změnový list 04

Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Přípočty neuznatelné

Název / označení změny:

ZL 4 - čerpání spodní vody

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000			
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV							
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000			

středa
19.1.2022

Zápis na základě zjištění výskytu
silného přítoku spodní vody ve
výkopu v cedrové ulici.

Na základě zjištění spodní vody ve výkopu,
která vystoupá do úrovně cca 20-30cm nad
horní hranu potrubí bylo na dohodě
s projektantem [REDACTED] a zástupcem
provozovatele panem [REDACTED] následující
řešení:

- 1) Jelikož spodní voda nelze oddrenážovat,
bude provedena čerpací šachta, ze které
se bude voda čerpat do zatrubněného přítoku.
- 2) Ložc pod potrubí se provede ze šterky
frakce 16-32 nebo 32-63 v tl. 20cm.
- 3) Po dobu montáže ~~na~~ betonového vedla
a obsypu potrubí se musí spodní voda
odčerpávat.
- 4) V místě výskytu a vystoupení spodní vody
se obsyp potrubí provádět graným pítkem.
- 5) Do stavebního deníku se budou zapisovat
úroveň podloží ze šterky a hodiny čerpání.

čtvrtek

Počasí: ráno - 2°C oblačno, odpoledne + 2°C oblačno 20. 1. 2022

Pracovní doba: 7.⁰⁰ - 16.⁰⁰

Pracovníci: [REDACTED]

Pracovní doba: Stroje: 2x bagr JCB, náhl. auto MB

Plnění: Na základě pozitivního testu na covid-19 na pracovišti v Cedrové ulici jsou na tomto pracovišti práce přerušeny do 24. 1. 2022.

Pracoviště: Za lesem: vykládky kamionů s kameninovými trubkami, vykládky kamionů s betonovými výrobky, tj. šachtová dna a skruže, obnovení trasovací sítě, montáž pažicích boxů.

pátek

Počasí: ráno - 6°C mch. přehánky, odpoledne - 2°C 21. 1. 2022

Pracovní doba: 7.⁰⁰ - 16.⁰⁰

Pracovníci: [REDACTED]

Stroje: bagr JCB, náhl. auto MB


Plnění: Výkop ryhy v místě napojení v ulici Za lesem s odvozem výkopky na mezi depozit, pažení stěn ryhy, ohrazení výkopu.

Zápis z pracoviště Za lesem:

Při výkopu ryhy byl zjištěn silný přítok spodní vody.

Postup bude obdobný jako v Cedrové ulici viz. zápis ze 14. 1. 2022 L. z. 019685.



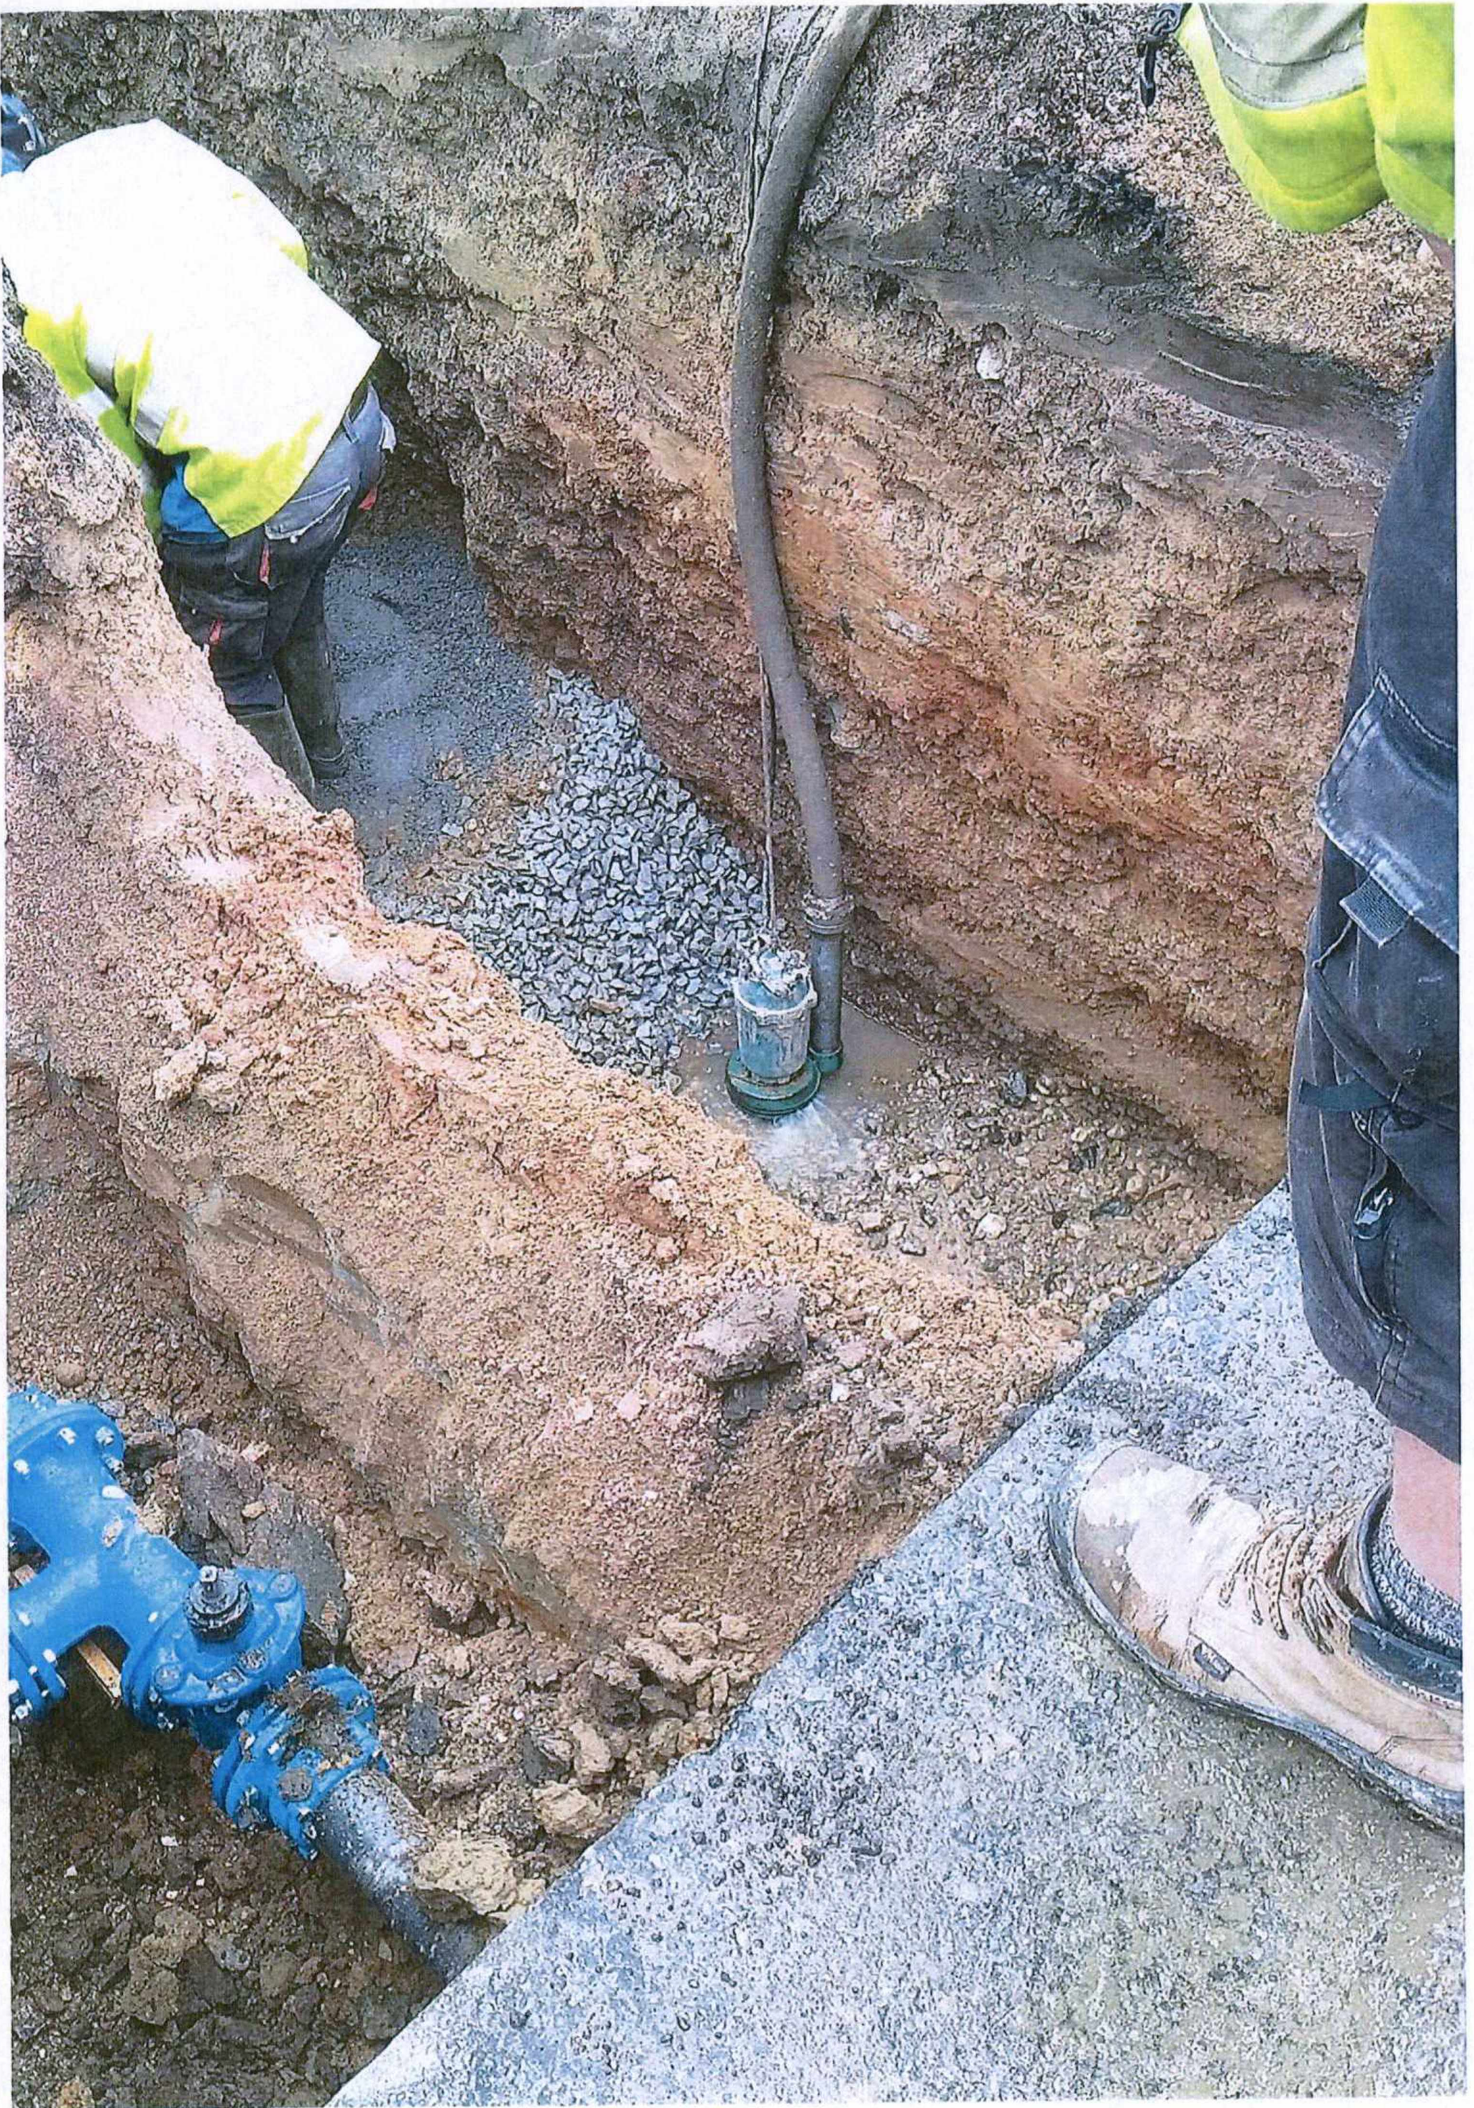



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 4:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření TDS ke Změnovému listu č.4

Předmětem změnového listu č.4 je čerpání spodní vody z výkopu. Po zahájení zemních prací v lokalitě Za Lesem, Ke křížku, Polívkov a Na Blatech byl zjištěn výskyt silného přítoku spodní vody. Projekt ustálenou hladinu spodní vody nepředpokládal. Tato skutečnost byla konzultována s projektantem a se zástupcem provozovatele. Jelikož spodní vodu nelze oddrenážovat (není dešťová kanalizace a do splaškové nelze čerpat spodní vodu) bylo dohodnuto, že se provede čerpací šachta, ze které se bude spodní voda odčerpávat po dobu montáže do silničního příkopu. Lože pod potrubím se provede ze šterku frakce 16-32 nebo 32-63 v tl.20cm na které bude provedeno sedlo z betonu.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 51 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 4 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 4:


Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření AD ke Změnovému listu č.4

Předmětem změnového listu č.4 je čerpání spodní vody z výkopu. Po zahájení zemních prací v lokalitě Za Lesem, Ke křížku, Polívkov a Na Blatech byl zjištěn výskyt silného přítoku spodní vody, z tohoto důvodu bylo lože pod potrubím provedeno ze štěrku frakce 16--63 v tl.20cm na které bylo provedeno sedlo z betonu.

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s vysokou hladinou spodní vody. AD souhlasí se změnovým listem.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 4:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření Objednatele ke Změnovému listu č. 4

Předmětem změnového listu č. 4 je čerpání spodní vody z výkopů.

Po zahájení zemních prací v lokalitě Za Lesem, Ke křížku, Polívkov a Na Blatech byl zjištěn výskyt silného přítoku spodní vody, přičemž projektová dokumentace s ustálenou hladinou spodní vody neuvažovala. Po konzultaci s autorským dozorem a zástupci provozního úseku bylo dohodnuto, že se provede čerpací šachta, ze které se bude po dobu stavebních prací spodní voda odčerpávat do silničního příkopu. Pod potrubí bude provedeno štěrkové lože o dané frakci a mocnosti včetně betonového sedla

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 51 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 4 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

Objednatel po doporučení ADP a TDS považuje Změnový list č. 4 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 17.12.2022

