





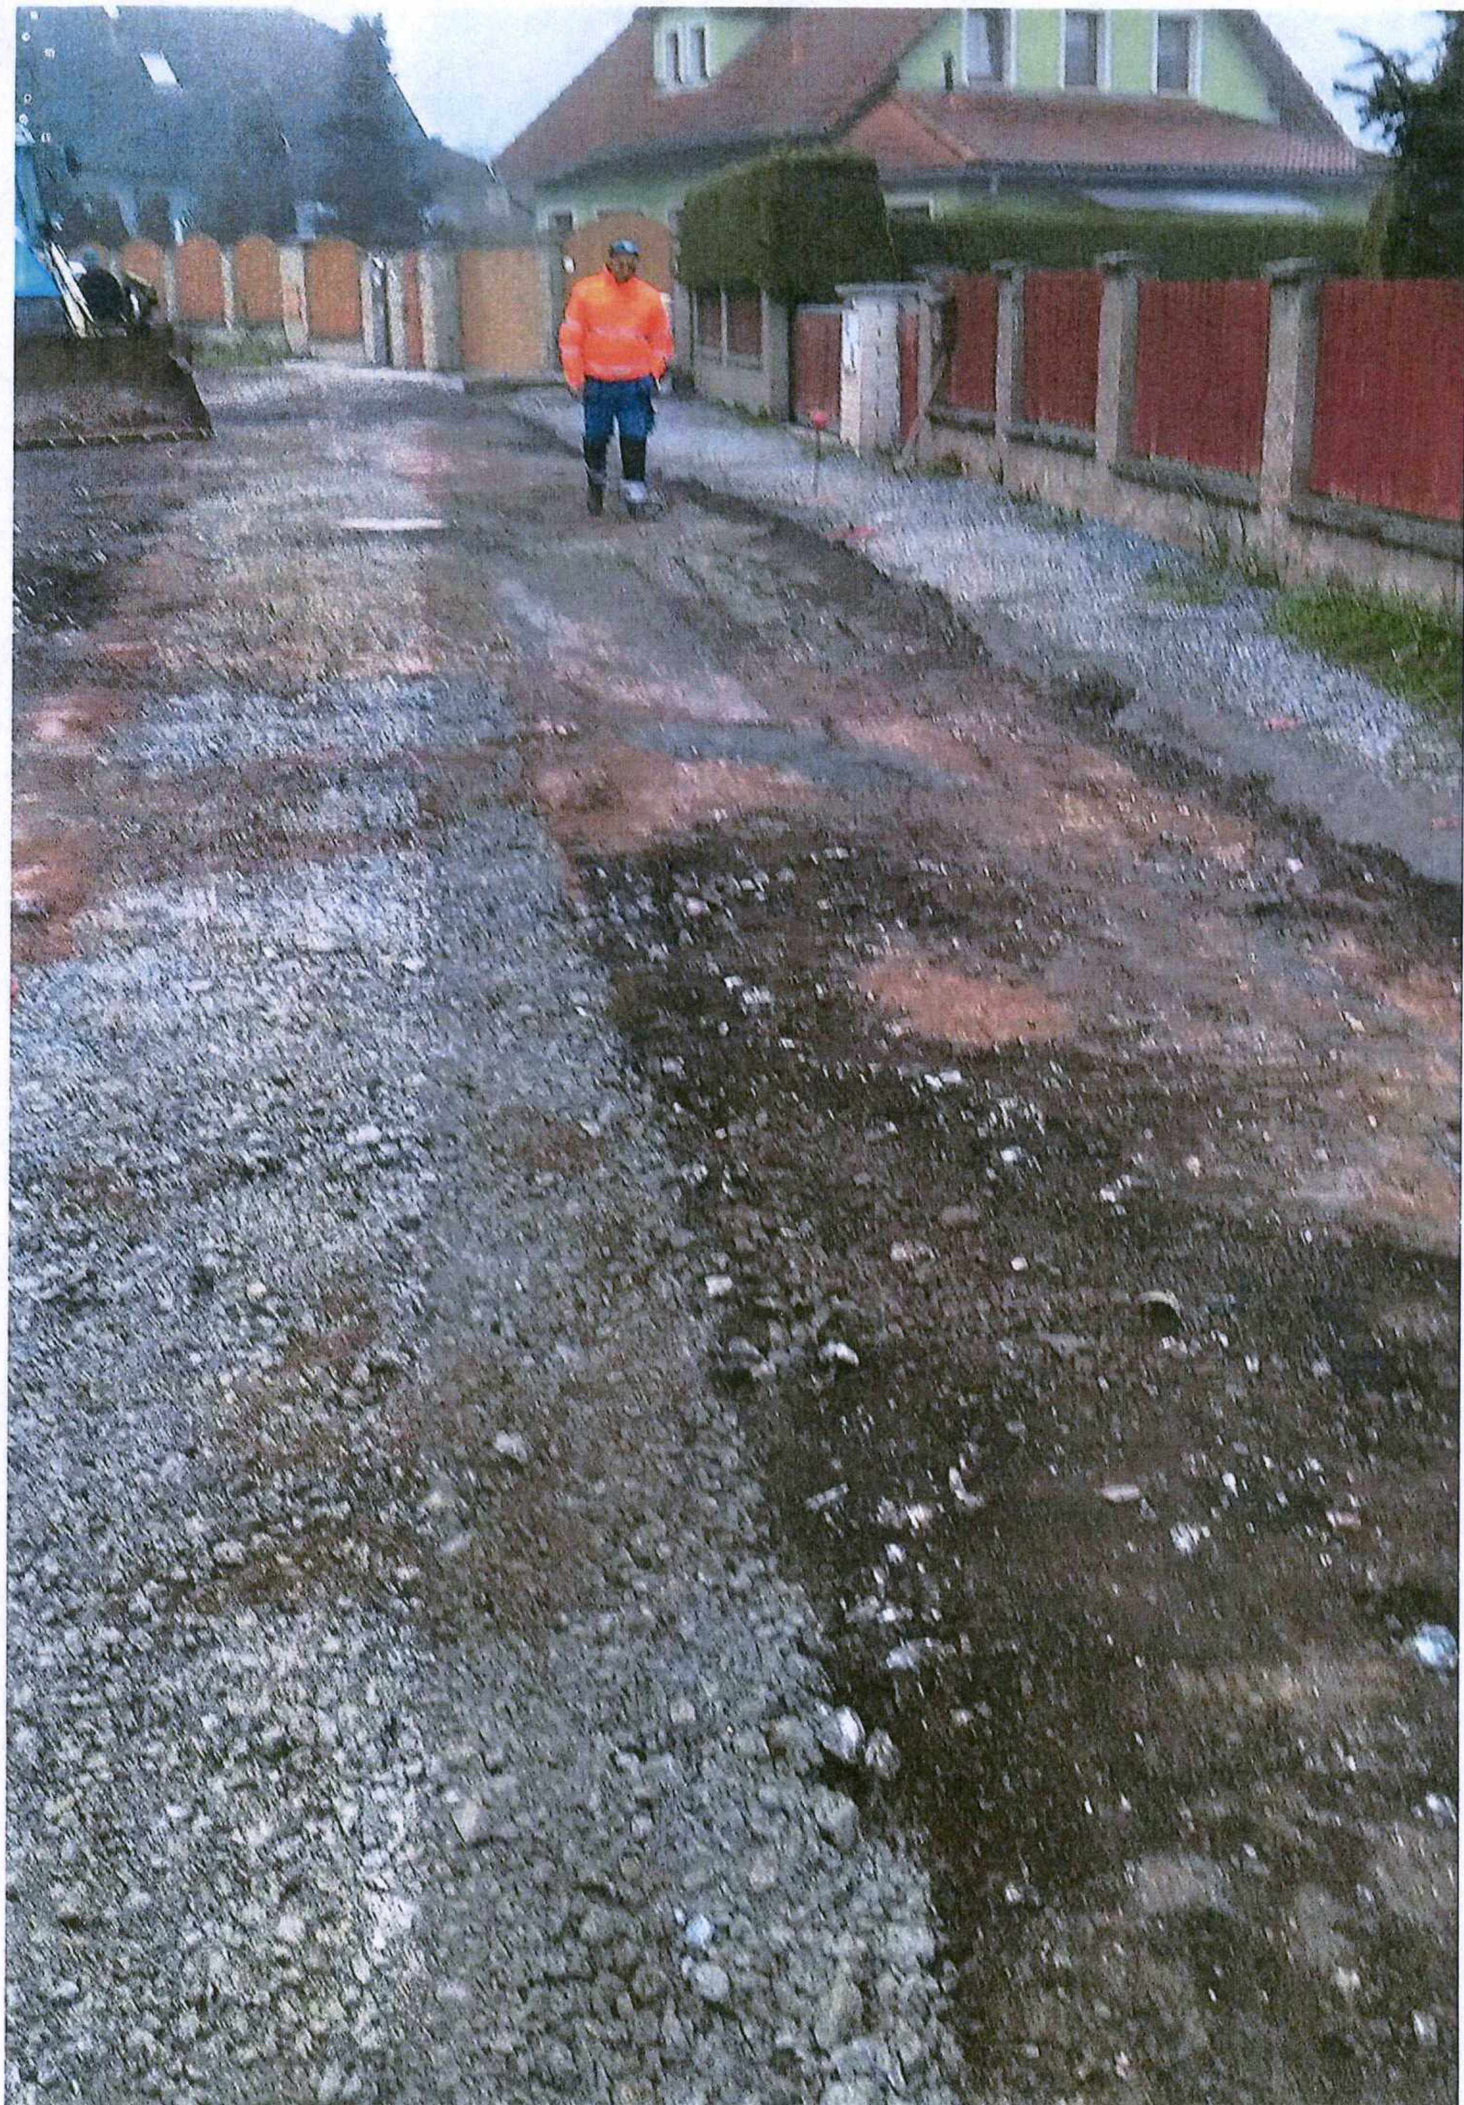

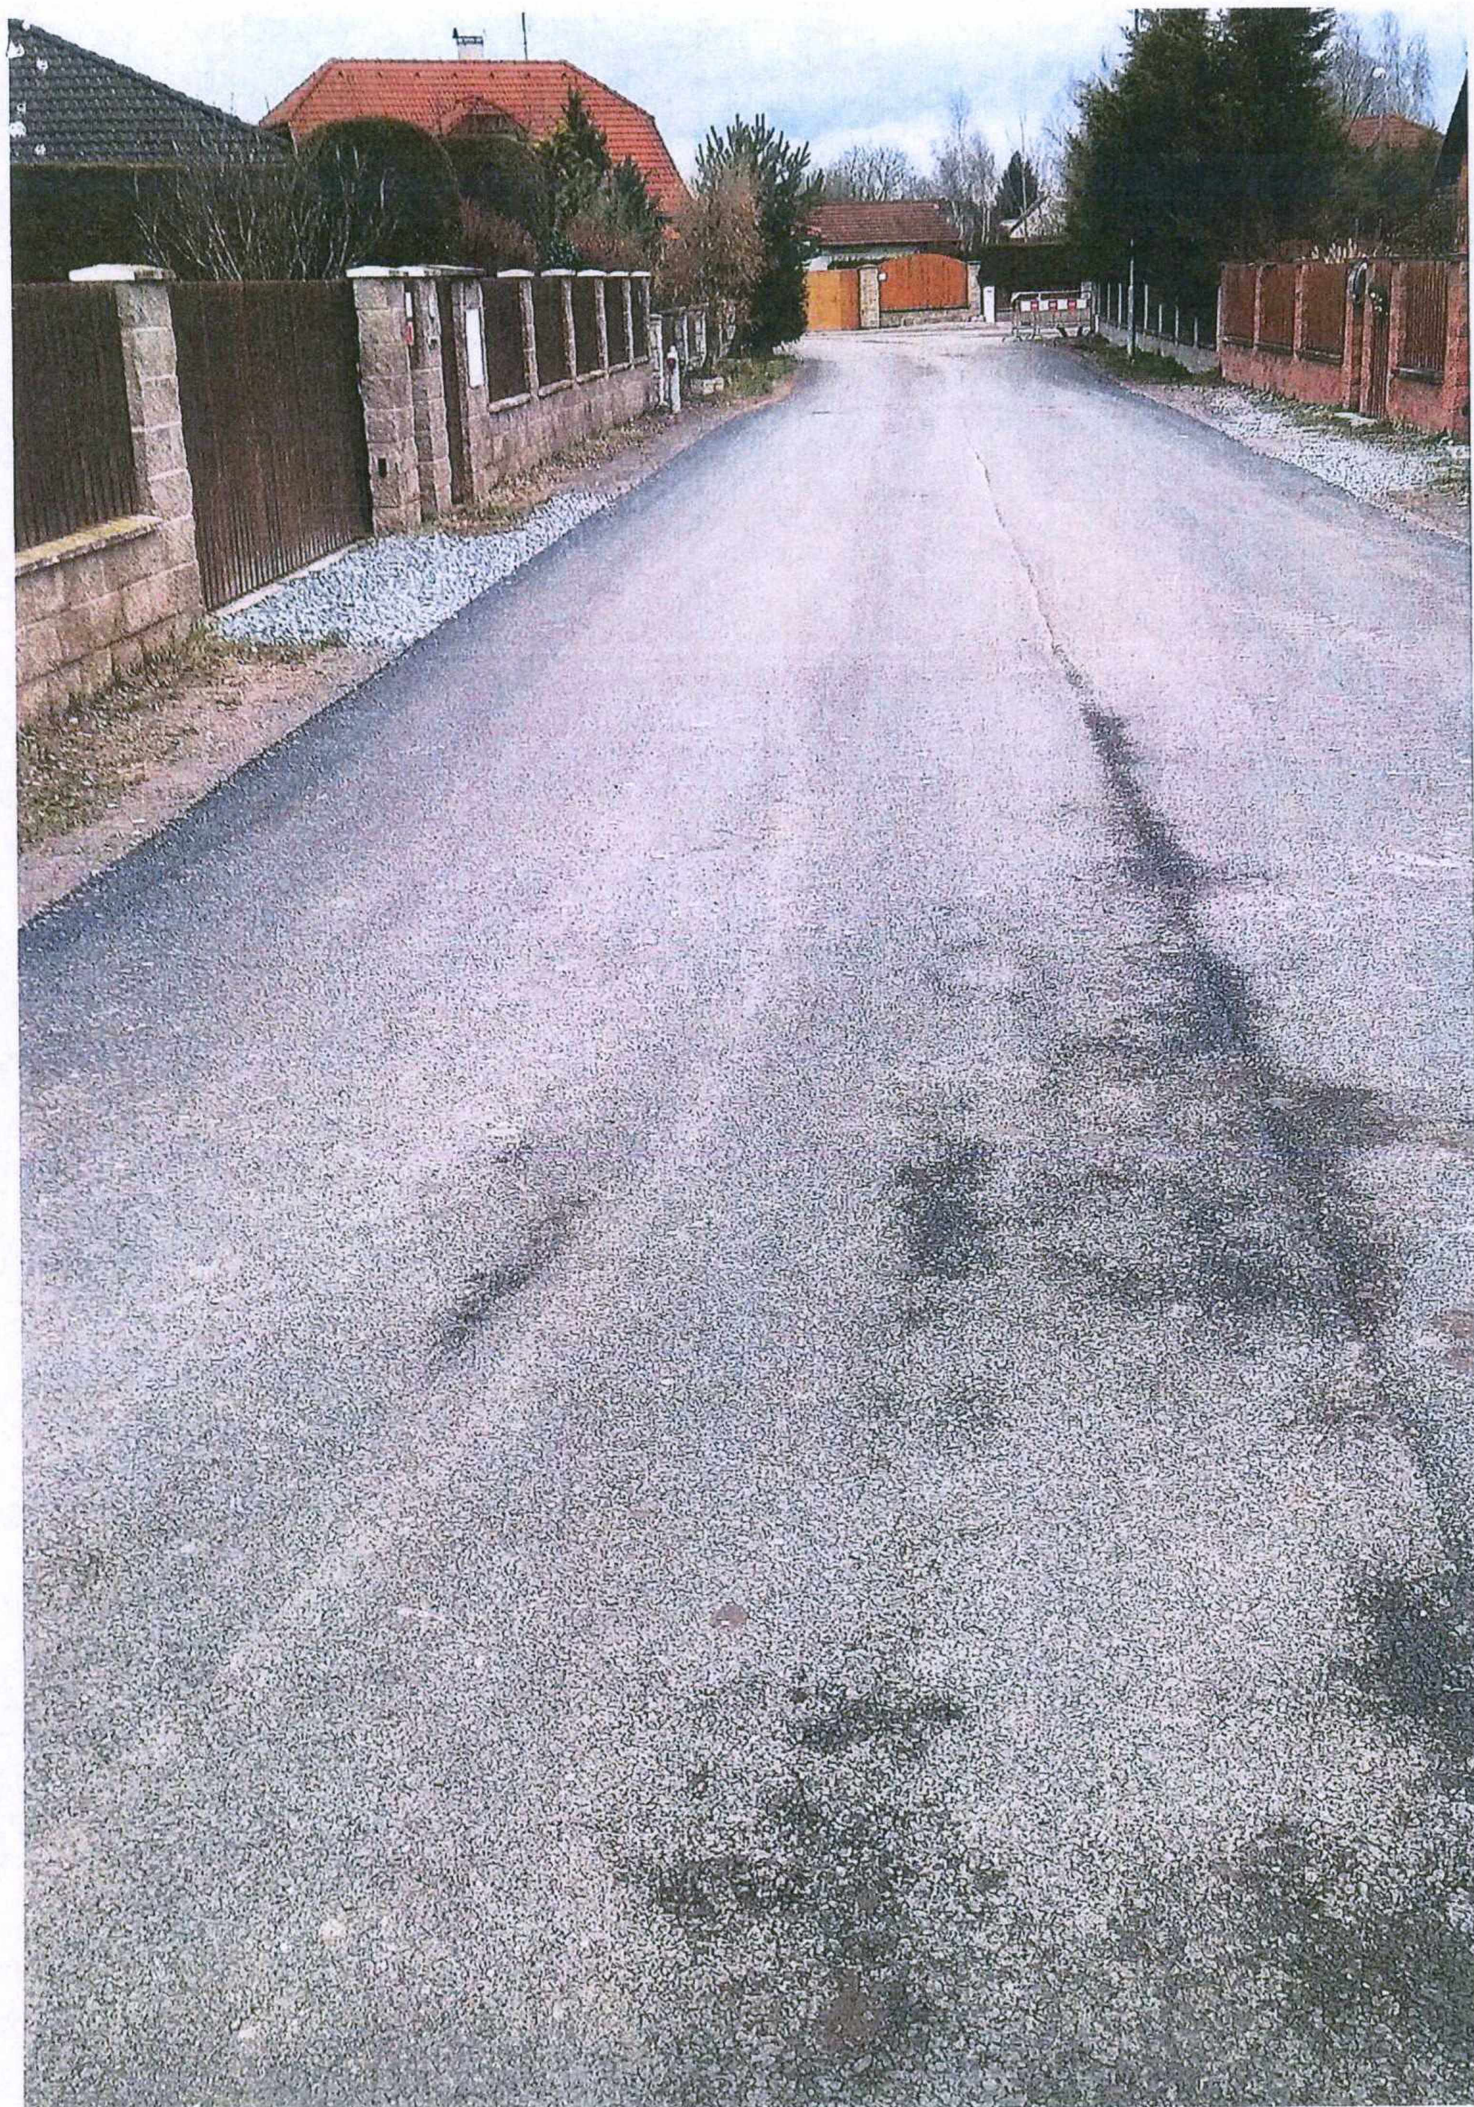

Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 13:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření TDS ke Změnovému listu č.13

Předmětem změnového listu č.13 - Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné pro realizaci kanalizace a přeložky vodovodu odfrézování živičného krytu tl. 40. Vzhledem k porušení více jak poloviny povrchu komunikace a dosti velkému dopravnímu zatížení v části ulice Cedrová po křižovatku s Meduňkovou ulicí a v Meduňkové ulici požaduje správce komunikace v daném úseku celoplošné doplnění živičného krytu ve skladbě podkladní vrstva z ACP 16+ v tl. 60 mm a vrchní ohrubná vrstva z ACO 11+ v tl. 40mm s výškovou úpravou poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů. Po geodetickém zaměření je plocha provedeného živičného krytu 903m² s tím, že napojení na stávající vjezdy a zelenou plochu bylo provedeno dosypáním a úpravou krajnice ze štěrkodrti v průměrné šířce 25cm a tl. 10cm.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.


Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 13 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 13:


Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření AD ke Změnovému listu č.13

Předmětem změnového listu č.13 - Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Změnový list řeší obnovu povrchu po stavbě do původního stavu.

AD souhlasí se změnovým listem.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 13:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření Objednatele ke Změnovému listu č. 13

Předmětem změnového listu č. 13 je doplnění živičného krytu komunikace v lokalitě Polívkov.

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že se v ulicích Cedrová, Meduňková a Máťová nachází živičný kryt komunikace, s čímž projektová dokumentace neuvažovala. Z toho důvodu muselo být provedeno odfrézování krytu a následně dle požadavku správce komunikace provedení zpětného doplnění konstrukce komunikace v určených mocnostech a tloušťkách jednotlivých vrstev skladby komunikace.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.


Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 13 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

Objednatel po doporučení ADP a TDS považuje Změnový list č. 13 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 17.12.2022



Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě §222 ZZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II

Změnový list 13

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Změna stavby

Dotčená část stavby:	Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov		
Název / označení změny:	ZL 13 - Doplnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulice Cedrová		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	I.č.019685 z 14.1.2022, I.č.05329 ze dne 15.11.2022, zápis z 13 KD ze dne 11.10.2022 bod 13.3		
Návrh pro změnu podal: objednatel		Dne:	
Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Máťová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné pro realizaci kanalizace a přeložky vodovodu odřezování živičného krytu tl. 40. Vzhledem k porušení více jak poloviny povrchu komunikace a dosti velkému dopravnímu zatížení v části ulice Cedrová po křižovatku s Meduňkovou ulicí a v Meduňkové ulici požaduje správce komunikace v daném úseku celoplošné doplnění živičného krytu ve skladbě podkladní vrstva z ACP 16+ v tl. 60 mm a vrchní ohrubná vrstva z ACO 11+ v tl. 40mm s výškovou úpravou poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů. Po geodetickém zaměření je plocha provedeného živičného krytu 903m2 s tím, že napojení na stávající vjezdy a zelenou plochu bylo provedeno dosyváním a úpravou krajnice ze šterkorditu v průměrné šířce 25cm a tl. 10cm.			
Identifikace plnění	Náklady na plnění dle příložených rozpočtů víceprací a méněprací jsou rozděleny na část: spolufinancováno z prostředků OPŽP vícepráce [redacted] Kč 0,00Kč mimo prostředky OPŽP vícepráce [redacted] Kč Celkem změnový list ZL 13 [redacted] Kč A) Méněpráce [redacted] Kč B) financováno [redacted] Kč Méněpráce [redacted] Kč		
Popis příčin vzniku změny díla	Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Máťová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné odřezování živičného krytu tl. 40 pro realizaci kanalizace a přeložky vodovodu. Dle požadavku správce komunikace zpětného doplnění živičného krytu ve skladbě podkladní vrstva z ACP 16+ v tl. 60 mm a vrchní ohrubná vrstva z ACO 11+ v tl. 40mm s výškovou úpravou poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů.		
Vliv změny na termín dodání díla:	Ano	10 dní	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem (bezDPH):			[redacted] Kč
přípočty celkem (bezDPH):			[redacted] Kč
odpočty celkem (bezDPH):			[redacted] Kč
Přílohy:			
	- Č. 1 - Ocenění změny díla	Rozpočet víceprací + méněprací	
	- Č. 2 - Projektová dokumentace		
	- Č. 3 - Geodetické zaměření		
	- Č. 4 - Fotodokumentace		
	- Č. 5 - Zápis ze stavebního deníku	I.č.019685 z 14.1.2022, I.č.05329 ze dne 15.11.2022, zápis z 13 KD ze dne 11.10.2022 bod 13.3	
	- Č. 6 - Vyjádření TDS, AD, objednatele	Vyjádření AD	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel / VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, společnost s ručením omezeným / -	[redacted]	24.6.2024	[redacted]
projektant / EGYPROJEKT spol s r.o. / -	[redacted]	24.6.2024	[redacted]
techn. dozor stavebníka / RAVAL projekt v.o.s. / -	[redacted]	24.6.2024	[redacted]
objednatel / Vodárna Plzeň, a.s. / -	[redacted]	24.6.2024	[redacted]

Stavební akce:

| Změna stavby / projektové

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

ZL 13 - Doplnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulice Cedrová

Odpočty - spolufinancované z prostředků OPŽP

[illegible]

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 ,

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 13

Změna stavby /

Dotčená část stavby:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov

Název / označení
změny:

ZL 13 - Doplnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulice Cedrová

Přípočty spolufinancované z prostředků OPŽP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
57	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm stroj $(3,0+25,0+18,5+39,5+30,5+3) * (0,5+1,3+0,5) = 119,5*2,3=274,85 \text{ m}^2$	m2	274,500			
63	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	274,500			
58	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	274,500			
	D	5	Komunikace					
24	K	564930512	Doplnění krajnic - podklad ze štěrkodrti plochy do 100 m2 tl 100 mm $262 * 0,25=65,5 \text{ m}^2$	m2	0,000			
25	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	274,500			
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	274,500			
59	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	0,000			
	D	8	Trubní vedení					

[illegible]

Stavební akce:

Změnový list 13

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

uplnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulic

[illegible]

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2021 , změna uváděná ve
změnovém listě se provádí na základě §222 ZZVZ, odst. (6)

Stavební akce:

Odkanalizování Lhoty II Změnový list 13

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Odkanalizování Lhoty II - Lokalita Polívkov splnění živičného krytu v lokalitě Polívkov v ulici Meduňková a část ulic Přípočty financované z prostředků mimo OPŽP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
57	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strc	m2	693,830			
			10,5 * (18,5+6/2) = 128,63m2 6,0 = 342 m2 79,0 * 6,3 = 497,7 m2 Odpočet uznatelné náklady 274,5 m2		57,0 *			
63	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	693,830			
58	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	663,830			
	D	5	Komunikace					
24	K	564930512	Doplnění krajnic - podklad ze štěrku drti plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	65,500			
			262 * 0,25=65,5m2					
25	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	628,500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Poznámky
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	628,500			
59	K	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	38,500			
	D	8	Trubní vedení					
61	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	0,000			
60	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	12,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
	D	997	Přesun sutě					
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	138,770			
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 248,900			
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	62,450			
54	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového	t	76,320			
	D	998	Přesun hmot					
62	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	167,796			

14. 11. 2022

Počasí: ráno +2°C dešť, odpoledne +5°C přehánky

- 18. 11. 2022

Pracovní doba: 7.00 - 16.00

Pondělí - pá

Pracovníci: [REDACTED]

Stroje: bagr otoč, traktorbagr, 2x nákladní auto
Plnění:K Jezírku - V pondělí 14. 11. 2022 proveden
opakovaný odběr vzorku vody v místech V0 a V21.Dne 15. 11. oznámil provozovatel vodovodu,
že v odebraném vzorku je vysoce pH a nutný
další opakovaný odběr vzorku vody po předchozím
proplachu, který provozovatel požadil až
na další pondělí 21. 11. 2022.Poliubov - objednatel požaduje jako úkryt
za úhrady nový živičný kryt komunikace
v úseku Meduňková ulice a část Cedrové
ulice v úseku Meduňková - K sídoru ve složení:
6cm ACP 16+ a 4cm ACO 11+.Komunikace v úseku Meduňková ulice
vzhledem k tomu, že nemá podélný spád
bude proveden jen příčný spád s tím, že
voda z komunikace bude odtékat do zelené
krajiny.Úsek Cedrové ulice bude odvodněn do
silničního příkopu. V místě napojení
na ulici K sídoru bude z důvodu
stávajících propustků výškově přizpůsoben.
Na stavbě prováděno odstraňování
vtáv. povrchu a úprava pláňe.VCP P... IL 13,
ZATDS [REDACTED]
