



DIAMO 100 12 R 40 4

Faktura (daňový doklad) číslo: **74610033**

strana 1 / 1

dodavatel:		odběratel:	
<b>GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.</b> 101263		IČ: 00002739      DIČ: CZ00002739	
adresa: Tieskačova 1329/16 32300 Plzeň		<b>DIAMO, státní podnik</b>	
IČ: 49196375	DIČ: CZ49196375	Máchova 201	
telefon: 602 444 297	fax:	471 27      Stráž pod Ralskem	
iban:			
swift:			
účet: <b>505930/8030</b>			
Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 4319			
datum splatnosti: <b>17.08.2024</b>		zakázka: 14000615 Zajišťování nebo likvidace SDD	
forma úhrady: Příkazem		konstantní symbol: 0008	
datum vystavení: 12.07.2024		druh dodávky:	
duzp: 12.07.2024			
vyřizuje:		objednávka: NRZ/KO/283/19	
předmět faktury:		konečný příjemce:	
<b>Zajišťování nebo likvidace SDD</b>			

název	množství	mj	%dph	cena/ mj	cena bez dph
Plnění na zakázce	1,000		21	379 051,00	379 051,00
Zabezpečení SDD "propad Pernink (p.č. 1332/1)" (č.o. 2927) v k.ú. Pernink					

Číslo smlouvy MZP-OG-14/24/SDD

Vydaná DPH 21%


daň 79 600,71      daňový základ 379 051,00

zaokrouhlení 0,00

**celkem k úhradě CZK 458 651,71**

slovy: čtyřistapadesátosmibicšestsetpadesátjednaKčsedmdesátjedenhal  
vystavil:   
e-mail:

duzp = datum uskutečnění zdanitelného plnění



**Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.**

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD-PKÚ+GIS-oblast 1“	Ing. Karel Bureš	Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Daniel Prečuch	GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD: Zabezpečení SDD „propad Pernink (p.č. 1332/1)“ (č.o. 2927) v k.ú. Pernink.

Místo: k.ú. Pernink, obec Pernink, okres Karlovy Vary | Kraj: Karlovarský

Projektant: Ing. Karel Bureš GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzeň	Zahájení: 5. 3. 2024	Dokončení: 30. 6. 2024
--	-------------------------	---------------------------

Smlouva – číslo ze dne: 2. 2. 2024      MZP-OG-14/24/SDD      CES: 190 070

Č. j. prováděcí smlouvy ENV/2024/870323



Závěrečné převzetí: 12. 7. 2024

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD (včetně DPH): 458 651,71 Kč

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy (vč. DPH): 458 651,71 Kč

Prohlídkou zabezpečení SDD bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zajištění. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zajištění nebo likvidace, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:  
Nebyly zjištěny

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: Nestanovují se		
Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel jako součást závěrečné zprávy: 30. 8. 2024		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 12. 7. 2024		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přijímá zabezpečené SDD dnem 12.7.2024 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 12. 7. 2027		
Za zhotovitele: Ing. Karel Bureš Na základě plné moci 	Za GDO: Ing. Daniel Prečtich 	Za odběratele: Ing. Petr Uldrych
Přejímací řízení zahájeno dne: 12.7. 2024		skončeno dne: 12.7. 2024
Přílohy:	Rozdělovník: Objednatel: 2x Zhotovitel: 2x GDO: 1x	

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci**

číslo:

Sledované období: březen - červen 2024

rok 2024

Počet příloh: 1

**I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE****ZHOTOVITEL:** Společnost „Likvidace SDD-PKÚ + GIS – Oblast 1“**OBJEDNATEL:** MŽP ČR

IČ: 00164801

DIČ:

**AKCE:** Realizace Zabezpečení SDD „propad Pernink (p.č. 1332/1)“ (č.o. 2927) v k.ú. PerninkZahájení:  
5. 3. 2024Dokončení:  
30. 6. 2024

Místo: Obec Pernink, k.ú. Pernink

Kraj: Karlovarský

Smlouva – číslo ze dne: 2. 2. 2024  
č.j. ENV/2024/87032

č.sml.objednatele: MZP-OG-14/24/SDD

**II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			458 651,71 Kč
2.	Cena za provedené práce v Kč.	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	0	379 051	379 051
	Cena včetně DPH	0	458 651,71	458 651,71
	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH).			0

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

**Za zhotovitele:** Jméno: Ing. Karel Bureš

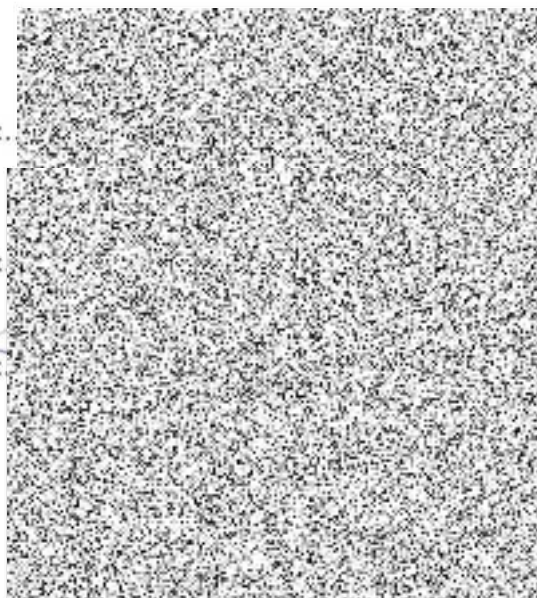
Podpis:

**Za objednatele:** Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

**Za GDO:** Jméno: Ing. Daniel Prečuch

Podpis:

**Přílohy:** č. 1 - Soupis provedených prací

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ			2024/I		Objednatel: MŽP ČR, odbor geologie		
Objekt: Zabezpečení propadu Pernink (p.č. 1332/1)			Zhotovitel: GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.				
P.Č.	Kód položky		MJ	Celkem MJ	Cena MJ	Cena celkem	Cena s použit. krit. 47-28
<b>VRN Příprava stavby</b>							
1	119003131	Výstražná páska - zřízení (150+150+60+60)	m	420,00	36,80	15 456 Kč	8 538 Kč
2	119003132	Výstražná páska - odstranění	m	420,00	15,20	6 384 Kč	2 700 Kč
<b>Příprava staveniště</b>							
3a	030001100	Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště	%	2,50	786 379,0 Kč	19 659 Kč	0 Kč
3b	030001100	Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště	%	2,50	334 128,0 Kč	0 Kč	8 353 Kč
4	031203000	Terénní úpravy pro zař. stav. a přístup na lok. - úprava cesty, zpevnění příjezdu (HZS pomocný dělník stavební 3x24 hod)	hod	72,00	360,0 Kč	25 920 Kč	10 964 Kč
5	M58343930	Drcené kamenivo 16/30 (350 x 2,5x0,15)x1,65	t	216,50	860,0 Kč	142 890 Kč	60 442 Kč
<b>HSV Technické práce</b>							
6	131251102	Hloubení jam a zářezů nezapažených strojně s urovnáním hor. tř. I/3 (6x3x1,5+5x2x2+15x2x2) = 27+20+60	m3	107,00	456,0 Kč	48 792 Kč	20 639 Kč
7	174251101	Zásyp jam strojně bez zhutnění (6x3x2,5+5x2x3+15x2x3) = 45+30+90	m3	165,00	77,8 Kč	12 837 Kč	5 430 Kč
8	M58343930	Drcené kamenivo 16/30 (6x3x1,5+5x2x1,5+15x2x1,5)x1,65t = (27+15+45)x1,65	t	143,50	660,0 Kč	94 710 Kč	40 062 Kč
9	162751117	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km se složením tř. I	m3	29,00	304,0 Kč	8 816 Kč	3 729 Kč
10	162751119	Příplatek k ceně za každý další km tř. I (40-10)x29	m3	870,00	23,1 Kč	20 097 Kč	8 501 Kč
11	112251103	Odstranění pařezů strojně s vykopáním 500 - 700 mm	kus	2,00	1 180,0 Kč	2 360 Kč	998 Kč
12	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci ovliv. horninností (kamenivo 143,5 t)	t	143,50	2 400,0 Kč	344 400 Kč	145 681 Kč
13a	Vzor 1	Ohrazení ocel. sloupky 2 linie břevem kolem propadu 14+14+4+4	m	36,00	2 129,0 Kč	76 644 Kč	
13b	Vzor 1	Ohrazení ocel. sloupky 2 linie břevem kolem propadu 14+14+4+4	m	36,00	934,0 Kč		33 624 Kč
<b>Ostatní náklady</b>							
14	HZS4222	Zaměření prací s vyhodnocením geodet odborný	hod	12,00	750,0 Kč	9 000 Kč	3 807 Kč
15	HZS4221	Zaměření prací geodet	hod	8,00	628,0 Kč	5 024 Kč	2 125 Kč
16	181111121	Závěrečná úprava terénu s urovnáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech do 200 mm (70+180)	m2	250,00	46,8 Kč	11 700 Kč	4 949 Kč
17	936942211	Tabulka informační na ohrazení	ks	1,00	500,0 Kč	500 Kč	500 Kč
18	M73534510	Tabulka bezpečnostní na ohrazení	ks	4,00	39,3 Kč	157 Kč	66 Kč
19	767995111	Montáž atyp. zámeč. výrobku - podklad pod tabulku včetně výroby	kg	4,00	159,0 Kč	636 Kč	269 Kč
20	065002000	Převoz mat. a zař. nad 25 km pro stavbu (40-25) x 6 - 3 cesty Údolí - lokalita	km	90,00	50,0 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč
21a	013254820	Dokumentace skutečného provedení stavby, ZZ	%	2,78	850 482,0 Kč	23 643 Kč	0
21b	013254820	Dokumentace skutečného provedení stavby, ZZ	%	4,17	363 877,0 Kč	0 Kč	15 174 Kč
<b>CELKEM STAVBA bez DPH</b>						<b>874 125 Kč</b>	<b>379 051 Kč</b>

Poznámka: Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS ÚRS Praha ců 2024/I, programu KROS a ceníku inženýrských prací UNIKA

Legenda:

- Položky neoznačené představují položky z ceníku stavebních prací ÚRS Praha bez modifikace jednotkové ceny (převzatá jednotková cena z ÚRS Praha)
- Položky označené olivově zelenou jsou položky obsažené v CS ÚRS Praha představující vedlejší rozpočtové náklady VRN dle ÚRS Praha neoceněné v CS ÚRS Praha, tyto položky byly naceněny ceníkem inženýrských prací UNIKA nebo platnými cenami v místě obvyklé
- Položky označené oranžově jsou položky mimo CS ÚRS Praha neobsažené v CS ÚRS Praha, nebo položky agregované, nebo tzv. R - položky



## Ekonomické zhodnocení akce

Zabezpečení SDD „propad Pernink (p.č. 1332/1)“ (č.o. 2927) v k.ú. Pernink

### Ekonomické zhodnocení prací:

Před zahájením prací byl vypracován plán zabezpečení, včetně rozpočtu prací.

Celková cena bez DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **379 051,- Kč.**

Celková cena včetně DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **458 651,71 Kč.**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem bez DPH **379 051,- Kč**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem včetně DPH **458 651,71 Kč**

Podíl subdodávek kromě speciálních odborných prací: 0

Všechny položky rozpočtu byly beze zbytku vyčerpány.

V Plzni dne 11. 7. 2024



Ing. Karel Bureš  
Projektant HČ

