

FERIST spol. s r.o.

Ocelářská 9, 190 00 Praha 9


IČO 46359508, DIČ CZ46359508

**TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY****Oprava potrubí mezi tunelovým vodovodem a objektem ATC 1**

| | | |
|-----|--|--------|
| 1) | Vypuštění vodovodu | 1 den |
| 2) | Demontáž stávajícího potrubí | 12 dnů |
| 3) | Odvoz demontovaného potrubí | 3 dny |
| 4) | Navezení nerezového potrubí a armatur | 2 dny |
| 5) | Montáž nosných konstrukcí | 2 dny |
| 6) | Montáž potrubí DN 150 pomocí spojek Victaulic..... | 14 dnů |
| 7) | Propojení s tunelovým vodovodem (noční výluka) | 5 dnů |
| 8) | Izolace potrubí DN 150 | 5 dnů |
| 9) | Napojení odboček | 2 dny |
| 10) | Napuštění vodovodu | 1 den |
| 11) | Proplach a dezinfekce potrubí | 1 den |
| 12) | Tlaková zkouška | 1 den |
| 13) | Montáž uzemnění | 2 dny |
| 14) | Elektropráce včetně výchozí. revize | 3 dny |
| 15) | Odvoz a likvidace odpadu | 2 dny |
| 16) | Úklid pracoviště | 1 den |
| 17) | Protokolární předání stavby | 1 den |

Celkem 58 dnů

Poznámka: Některé montážní práce lze provádět pouze v nočních výlukách v době od 01:20 – 03:45h

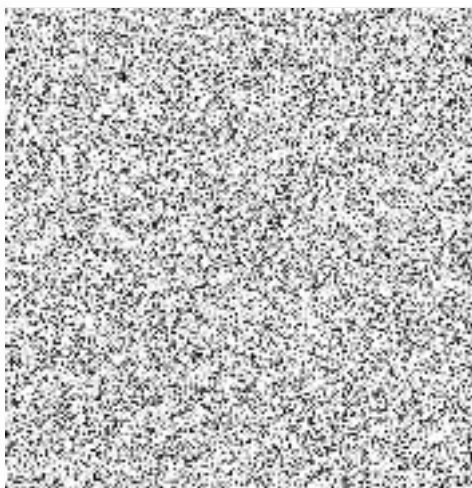

V Praze dne 28. 05. 2024
