



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření  
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

## ZMĚNOVÝ LIST

### ZL 36

D\_03 SO 07.01 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

- ZM 019 Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu



Kancelář  
architekta  
město Brno



Brněnské komunikace



BRNĚNSKÉ  
VODÁRNY  
A KANALIZACE, a.s.

## SEZNAM PŘÍLOH

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Důvodová zpráva              | 1          |
| Stanovisko Autorského dozoru | 2          |
| příloha č. 7                 | 3          |
| příloha č. 8                 | NEOBSAZENO |
| příloha č. 9                 | 5          |
| Rozpočet                     | 6          |
| Výkresová část               | 7          |
| Stavební deník               | NEOBSAZENO |
| Zápis z Kontrolního dne      | 9          |
| Fotodokumentace              | NEOBSAZENO |

**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –  
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 36  
ZM 019 \_ Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu**

Na základě zjištěné kolize pilotové stěny SO 07.01 se stávajícím STL plynovodem (zjištěna nová poloha plynu), tj. stěna je navržena v menší vzdálenosti než 1,0 m od plynovodu.

AD předložil opravenou DPS se zapracovanými připomínkami a dále byly předloženy vytyčovací výkresy pro jednotlivé piloty.

V Brně dne :




[REDACTED]

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pondělí 25. dubna 2022 9:16  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: PPO Svratka\_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu  
**Přílohy:** SVR-DPS-D.03-01\_VYTYCENI STEN\_ad.dwg; SVR\_DPS\_D03\_01\_601\_01\_VYTYČOVACÍ SCHÉMA\_SO 07.01.pdf

Dobrý den,  
V příloze zasílám v závislosti na zjištěnou polohu plynu úpravu vytyčovacího výkresu. Došlo ke zrušení body 1 a doplnění bodů B68 a B69. Výkres je jak v dwg tak i pdf. Tato úprava nemá vliv na výkaz výměr daného stavebního objektu SO 07.01. Došlo k přidání lomového bodu na ŽB stěně.

Jen pro info, níže obrázek zobrazuje polohu plynu dle poskytnutých podkladů (modrá barva) a zaměření na stavbě (červená barva).

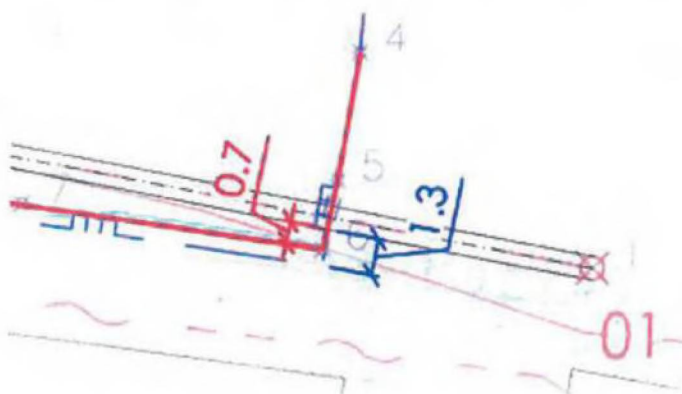

S pozdravem



[REDACTED]  
vedoucí projekce



A PLUS a.s.  
Česká 12, 602 00 Brno  
[www.aplus.cz](http://www.aplus.cz)

**From:** [REDACTED]

**Sent:** Monday, April 25, 2022 12:24 AM

**To:** [REDACTED]

**Cc:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Subject:** FW: PPO Svratka\_informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu

Dobrý den,

S pozdravem  
Bibiana Janebová

M ■ ■ ■



**Kancelář  
architekta  
města Brna**

**Náš projekt? Brno!**  
**Lidé, územní plán, veřejný prostor.**

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Friday, April 22, 2022 1:54 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** PPO Svatka informace o kolizi SO07.01 a stávající trasou plynu



Vážená paní inženýrko,

dovolují si Vás informovat o kolizi stávající trasy plynu STL s navrženou pilotovou stěnou, která je součástí SO 07.01. Kolize byla zjištěna 6.4.2022 a byla postoupena GP, TDI, stejně tak byla řešena v rámci minulých kontrolních dnů.

V příloze Vám zasílám emailovou korespondenci mezi námi jako zhotovitelem a GP.  
V posledním emailu jsme obdrželi informaci od p. Zelinky, že zřejmě dojde k posunu samotné stěny.

Bez změny PD není možno pilotovou stěnu provést.

S pozdravem

**Stavbyvedoucí**  
**HOCHTIEF CZ a. s.**  
Plzeňská 16/3217  
150 00 Praha 5  
Česká republika  
Mobil: [REDACTED]  
[REDACTED]  
**www.hochtief.cz**

Stavební firma HOCHTIEF CZ zaměstnává v České republice a na Slovensku 1 100 lidí a v dodavatelském řetězci zprostředkovává práci dalším zhruba 3 000 firmám. HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Zajímají vás naše stavby? Podívejte se na <http://www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz/> nebo <http://www.statniopravrekonstrukci.cz/>. Více na [www.hochtief.cz](http://www.hochtief.cz).





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA:</b> "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)<br><b>ÚSEK:</b> D 03 – Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | <b>Změnový list č.</b><br><b>36</b> |                  |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|----------------|------------------|---------|------------------|----------------|------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</div><div style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div> <p>SO 07.01 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce<br/>- ZM 019 Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                  |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</div><div>DATUM:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: _____</div><div>POŠTOU: _____</div><div>KURÝR: _____</div><div>FAX: _____</div><div>OSOBNĚ: _____</div></div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Mail <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                  |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| <p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Kolize pilotové stěny SO 07.01. se stávajícím STL plynovodem, pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti než požaduje GaSNet</p> <p><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO 07.01.</p> <p><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 019</p> <p><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> položkový rozpočet „ZL č.36 vícepráce, ZL č.36 méněpráce, ZL č.36 rozdílový“</p> <p><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |                  |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| <p><b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">329 796,15 Kč</td><td style="text-align: right;">69 257,19 Kč</td><td style="text-align: right;">399 053,34 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 816 186,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-381 399,15 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 197 585,59 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-1 486 390,29 Kč</td><td style="text-align: right;">-312 141,96 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 798 532,25 Kč</td></tr></tbody></table> |                  |                                     |                  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 329 796,15 Kč | 69 257,19 Kč | 399 053,34 Kč | Méněpráce: | -1 816 186,44 Kč | -381 399,15 Kč | -2 197 585,59 Kč | Rozdíl: | -1 486 390,29 Kč | -312 141,96 Kč | -1 798 532,25 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena bez DPH     | DPH                                 | Cena s DPH       |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 329 796,15 Kč    | 69 257,19 Kč                        | 399 053,34 Kč    |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1 816 186,44 Kč | -381 399,15 Kč                      | -2 197 585,59 Kč |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1 486 390,29 Kč | -312 141,96 Kč                      | -1 798 532,25 Kč |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| <p><b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p> <p><b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p> <p><b>OD:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                     |                  |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |                  |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:<br/>BKOM, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span><br/>BKOM, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 50%;">ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:<br/>Magistrát města Brna OI,<br/><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                     |                  |              |     |            |            |               |              |               |            |                  |                |                  |         |                  |                |                  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII



D\_03 (07.01) Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PPO Svratka

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | -1 486 390,29 |
|--------------|---------------|

|              |            |               |             |
|--------------|------------|---------------|-------------|
|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně   |
| DPH základní | 21,00%     | -1 486 390,29 | -312 141,96 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00          | 0,00        |

|            |   |     |               |
|------------|---|-----|---------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -1 798 532,25 |
|------------|---|-----|---------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**-1 486 390,29**

D\_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO  
(07.01) 07.01)

-1 486 390,29 -1 798 532,25

**-1 486 390,29 -1 798 532,25**

D\_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -  
(07.01)MP méněpráce

-1 816 186,44 -2 197 585,59

D\_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -  
(07.01)VP vícepráce

329 796,15 399 053,34

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_03 (07.01) - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

Místo: Nábřeží Svatky  
 Zadavatel: Statutární město Brno  
 Uchazeč: PPO Svatka

Datum: 6. 9. 2022  
 Projektant: A PLUS a.s.  
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

| PČ                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]    | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|----------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>-1 486 390,29</b> |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>-1 486 390,29</b> |                 |
| <b>D 1 Zemní práce</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>33 720,41</b>     |                 |
| 67                               | K   | 132251252   | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                           | m3 | 357,308    | 394,10       | 140 815,08           | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Zemní práce - výkop (dl * š * v)                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | SO 07.01 - převážka                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (11,42*33,16)*0,80*2,00                                                                                                                                                                                                                                          |    | 71,328     |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (31,00)*0,80*2,00                                                                                                                                                                                                                                                |    | 49,600     |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (17,85)*0,80*2,00                                                                                                                                                                                                                                                |    | 28,560     |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | rozšíření                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (207,82)                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 207,820    |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 357,308    |              |                      |                 |
| 14                               | K   | 162351103   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         | m3 | -117,744   | 60,10        | -7 076,41            | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Zemní práce - přesun po stavbě (obj)                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Převážka                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | SO 07.01 - nevyz pilota                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (pilota_620_1_dl)*(P*0,31*0,31)                                                                                                                                                                                                                                  |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  | vývrtek_obj | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -117,744   |              |                      |                 |
| 15                               | K   | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3 | -117,744   | 9,70         | -1 142,12            | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Zemní práce - skládka na stavbě (obj)                                                                                                                                                                                                                            |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (vývrtek_obj)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -117,744   |              |                      |                 |
| 16                               | K   | 167151111   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         | m3 | -117,744   | 72,10        | -8 489,34            | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Zemní práce - nakládání na stavbě (obj)                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (vývrtek_obj)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -117,744   |              |                      |                 |
| 17                               | K   | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | -117,744   | 252,10       | -29 683,26           | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Zemní práce - přesun na skládku (obj)                                                                                                                                                                                                                            |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (vývrtek_obj)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -117,744   |              |                      |                 |
| 18                               | K   | 162751119   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | -1 177,440 | 6,10         | -7 182,38            | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Zemní práce - přesun na skládku (obj)                                                                                                                                                                                                                            |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (vývrtek_obj)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | -117,744*10 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |    | -1 177,440 |              |                      |                 |
| 19                               | K   | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        | t  | -211,939   | 300,00       | -63 581,70           | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Zemní práce - skládkové (obj)                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | (vývrtek_obj)                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | -117,744   |              |                      |                 |
|                                  | VV  |             | -117,744*1,8 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |    | -211,939   |              |                      |                 |
| 68                               | K   | 174151101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                   | m3 | 149,488    | 67,30        | 10 060,54            | CS ÚRS 2020 02  |
|                                  | VV  |             | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                      |                 |

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|    |   |           |    |                                                                                                                                                |    |          |       |           |                |
|----|---|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|----------------|
|    |   |           | VV | -117,744*1,8*Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |    | -211,939 |       |           |                |
| 68 | K | 174151101 |    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | m3 | 149,488  | 67,30 | 10 060,54 | CS ÚRS 2020 02 |

|    |                                  |         |
|----|----------------------------------|---------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701           |         |
| VV | Zemní práce - zásyp (dl * š * v) |         |
| VV | SO 07.01 - převážka              |         |
| VV | (11,42+33,16)*0,80*2,00          | 71,328  |
| VV | (31,00)*0,80*2,00                | 49,600  |
| VV | (17,85)*0,80*2,00                | 28,560  |
| VV | Součet                           | 149,488 |

D 2 Zakládání -1 452 197,61

|    |   |           |  |                                                                                                                                          |   |          |          |             |                |
|----|---|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------------|----------------|
| 21 | K | 226212113 |  | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III | m | -390,000 | 2 196,30 | -856 557,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------------|----------------|

|    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701  |          |
| VV | Piloty - vývrt (dl * p) |          |
| VV | SO 07.01 - nevyz pilota |          |
| VV | -(3,00)*130             | -390,000 |
| VV | piloty_620_1_dl         | Součet   |
|    |                         | -390,000 |

|    |   |           |  |                                                                                                                                                |   |          |        |             |                |
|----|---|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-------------|----------------|
| 27 | K | 231211312 |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | -390,000 | 384,10 | -149 799,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-------------|----------------|

|    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701  |          |
| VV | Piloty (dl)             |          |
| VV | SO 07.01 - nevyz pilota |          |
| VV | (piloty_620_1_dl)       | -390,000 |
| VV | Součet                  | -390,000 |

|    |   |          |  |                                           |    |          |          |             |                |
|----|---|----------|--|-------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|----------------|
| 33 | M | 58932935 |  | beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 | m3 | -129,518 | 3 108,40 | -402 593,75 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|----------|--|-------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|----------------|

|    |                                               |          |
|----|-----------------------------------------------|----------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701                        |          |
| VV | Piloty - beton (dl * průměr)                  |          |
| VV | SO 07.01 - nevyz pilota                       |          |
| VV | (piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)              | -117,744 |
| VV | Součet                                        | -117,744 |
| VV | -117,744*1,1*Přepočtené koeficientem množství | -129,518 |

|    |   |           |  |                                                                                       |    |        |          |           |                |
|----|---|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 36 | K | 279323112 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | m3 | -2,204 | 4 020,50 | -8 861,18 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

|    |                                |          |
|----|--------------------------------|----------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701         |          |
| VV | Piloty - převážka (dl * š * v) |          |
| VV | SO 07.01 - převážka            |          |
| VV | -(93,44)*0,80*2,07             | -154,737 |
| VV | (11,42+33,16)*0,80*2,41        | 85,950   |
| VV | -(2,30)*0,80*0,50              | -0,920   |
| VV | (31,00)*0,80*1,91              | 47,368   |
| VV | (17,85)*0,80*1,41              | 20,135   |
| VV | Součet                         | -2,204   |

|    |   |           |  |                                                                    |    |          |        |             |                |
|----|---|-----------|--|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|----------------|
| 37 | K | 279351121 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | -179,307 | 672,10 | -120 512,23 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|----------------|

|    |                                         |          |
|----|-----------------------------------------|----------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701                  |          |
| VV | Piloty - převážka, bednění (dl * v * p) |          |
| VV | SO 07.01 - převážka                     |          |
| VV | -(93,44)*(3,00*2)                       | -560,640 |
| VV | (11,42+33,16)*2,41*2                    | 214,876  |
| VV | -(2,30)*0,50*2                          | -2,300   |
| VV | (31,00)*1,91*2                          | 118,420  |
| VV | (17,85)*1,41*2                          | 50,337   |
| VV | Součet                                  | -179,307 |

|    |   |           |  |                                                                       |    |          |        |            |                |
|----|---|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|----------------|
| 38 | K | 279351122 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | -179,307 | 132,10 | -23 686,45 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|----------------|

|    |   |           |  |                                                                          |    |        |          |            |                |
|----|---|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 69 | K | 274313511 |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 30,000 | 3 660,40 | 109 812,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|

|    |                                           |        |
|----|-------------------------------------------|--------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701                    |        |
| VV | Opěrné stěny - pata, podklad (dl * š * v) |        |
| VV | SO 07.01                                  |        |
| VV | (100,00)*3,00*0,10                        | 30,000 |
| VV | Součet                                    | 30,000 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 323,90

|    |   |           |  |                                                                                                                                                                  |     |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|
| 56 | K | 953241211 |  | Osazení smykových tmů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm | kus | 84,000 | 60,10 | 5 048,40 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|

|    |                        |        |
|----|------------------------|--------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701 |        |
| VV | Smykové tmy - SD01 (p) |        |
| VV | SO 07.01               |        |
| VV | 84                     | 84,000 |
| VV | Součet                 | 84,000 |

|    |   |          |  |                                                                                                                |     |        |        |           |                |
|----|---|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 57 | M | 54879272 |  | tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 20mm | kus | 84,000 | 424,00 | 35 616,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|

|    |   |           |  |                                                                                                                                 |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 59 | K | 953333324 |  | PVC těsnicí pás do betonových konstrukcí do dilatačních spár vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuží šířky 320 mm | m | -2,000 | 540,10 | -1 080,20 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

|    |                        |         |
|----|------------------------|---------|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701 |         |
| VV | Těsnicí pás - L02 (dl) |         |
| VV | SO 07.01               |         |
| VV | -(22,00)               | -22,000 |
| VV | 20,00                  | 20,000  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | vv  |           | Součet                                                                                               |    | -2,000   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 953334212 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm                 | m  | -3,000   | 420,10       | -1 260,30         | CS ÚRS 2020 02  |
|    | vv  |           | Viz PD D.03-01-001-701                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Bobtnavý pásek (dl)                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | vv  |           | SO 07.01                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | vv  |           | -(225,00)                                                                                            |    | -225,000 |              |                   |                 |
|    | vv  |           | 222,00                                                                                               |    | 222,000  |              |                   |                 |
|    | vv  |           | Součet                                                                                               |    | -3,000   |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                          |    |          |              | -106 236,99       |                 |
| 66 | K   | 998322011 | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m | t  | -252,885 | 420,10       | -106 236,99       | CS ÚRS 2020 02  |

|    |   |           |      |  |  |  |      |  |
|----|---|-----------|------|--|--|--|------|--|
| VP |   | Vícepráce | 0,00 |  |  |  |      |  |
|    | K |           |      |  |  |  | 0,00 |  |
|    | K |           |      |  |  |  | 0,00 |  |
|    | K |           |      |  |  |  | 0,00 |  |
|    | K |           |      |  |  |  | 0,00 |  |
|    | K |           |      |  |  |  | 0,00 |  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1  
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D\_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)  
ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -méněpráce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
PPO Svratka  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
STAGA stavební agentura s.r.o.  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 6. 9. 2022  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 253 33 046  
DIČ: CZ25333046

|                  |                   |                           |                       |
|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                           | -1 816 186,44         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně -1 816 186,44 | Výše daně -381 399,15 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                      | 0,00                  |
| Cena s DPH v CZK |                   |                           | -2 197 585,59         |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**-1 816 186,44**

D\_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO  
(07.01) 07.01)

-1 816 186,44 -2 197 585,59

D\_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -  
(07.01)M méněpráce

-1 816 186,44 -2 197 585,59

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D\_03 (07.01)M - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) - méněpráce**

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: PPO Svratka

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-1 816 186,44**

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**-1 816 186,44**

**D 1 Zemní práce -117 155,21**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|----------------|
| 14 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | -117,744 | 60,10 | -7 076,41 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|----------------|

|    |            |  |                                      |  |          |  |  |  |
|----|------------|--|--------------------------------------|--|----------|--|--|--|
| VV |            |  | Viz PD D.03-01-001-701               |  |          |  |  |  |
| VV |            |  | Zemní práce - přesun po stavbě (obj) |  |          |  |  |  |
| VV |            |  | Piloty                               |  |          |  |  |  |
| VV |            |  | SO 07.01 - nevyz pilota              |  |          |  |  |  |
| VV |            |  | (piloty_620_1_dl)*(Pi*0,31*0,31)     |  | -117,744 |  |  |  |
| VV | vývrtk_obj |  | Mezisoučet                           |  | -117,744 |  |  |  |
| VV |            |  | Součet                               |  | -117,744 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                             |    |          |      |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----------|----------------|
| 15 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | -117,744 | 9,70 | -1 142,12 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----------|----------------|

|    |  |  |                                       |  |          |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------|--|----------|--|--|--|
| VV |  |  | Viz PD D.03-01-001-701                |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | Zemní práce - skládka na stavbě (obj) |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | (vývrtk_obj)                          |  | -117,744 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                |  | -117,744 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                          |    |          |       |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|----------------|
| 16 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -117,744 | 72,10 | -8 489,34 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|----------------|

|    |  |  |                                         |  |          |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------------|--|----------|--|--|--|
| VV |  |  | Viz PD D.03-01-001-701                  |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | Zemní práce - nakládání na stavbě (obj) |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | (vývrtk_obj)                            |  | -117,744 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                  |  | -117,744 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|----------------|
| 17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -117,744 | 252,10 | -29 683,26 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|----------------|

|    |  |  |                                       |  |          |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------|--|----------|--|--|--|
| VV |  |  | Viz PD D.03-01-001-701                |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | Zemní práce - přesun na skládku (obj) |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | (vývrtk_obj)                          |  | -117,744 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                |  | -117,744 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |      |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|----------------|
| 18 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | -1 177,440 | 6,10 | -7 182,38 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----------|----------------|

|    |  |  |                                                |  |            |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|
| VV |  |  | Viz PD D.03-01-001-701                         |  |            |  |  |  |
| VV |  |  | Zemní práce - přesun na skládku (obj)          |  |            |  |  |  |
| VV |  |  | (vývrtk_obj)                                   |  | -117,744   |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                         |  | -117,744   |  |  |  |
| VV |  |  | -117,744*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | -1 177,440 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                            |   |          |        |            |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------|----------------|
| 19 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -211,939 | 300,00 | -63 581,70 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------|----------------|

|    |  |  |                                                |  |          |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------|--|----------|--|--|--|
| VV |  |  | Viz PD D.03-01-001-701                         |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | Zemní práce - skládkovné (obj)                 |  |          |  |  |  |
| VV |  |  | (vývrtk_obj)                                   |  | -117,744 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                         |  | -117,744 |  |  |  |
| VV |  |  | -117,744*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | -211,939 |  |  |  |

**D 2 Zakládání -1 562 009,61**

|    |   |           |                                                                                                                                          |   |          |          |             |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------------|----------------|
| 21 | K | 226212113 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III | m | -390,000 | 2 196,30 | -856 557,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------------|----------------|

|    |                 |  |                         |  |          |  |  |  |
|----|-----------------|--|-------------------------|--|----------|--|--|--|
| VV |                 |  | Viz PD D.03-01-001-701  |  |          |  |  |  |
| VV |                 |  | Piloty - vývrt (dl * p) |  |          |  |  |  |
| VV |                 |  | SO 07.01 - nevyz pilota |  |          |  |  |  |
| VV |                 |  | -(3,00)*130             |  | -390,000 |  |  |  |
| VV | piloty_620_1_dl |  | Součet                  |  | -390,000 |  |  |  |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27                                      | K   | 231211312 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m  | -390,000 | 384,10       | -149 799,00       | CS ÚRS 2020 02  |
|                                         | VV  |           | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Piloty (dl)                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | SO 07.01 - nevýz pilota                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (piloty_620_1_dl)                                                                                                                              |    | -390,000 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |    | -390,000 |              |                   |                 |
| 33                                      | M   | 58932935  | beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8                                                                                                      | m3 | -129,518 | 3 108,40     | -402 593,75       | CS ÚRS 2020 02  |
|                                         | VV  |           | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Piloty - beton (dl * průměr)                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | SO 07.01 - nevýz pilota                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (piloty_620_1_dl)*(P*0,31*0,31)                                                                                                                |    | -117,744 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |    | -117,744 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | -117,744*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |    | -129,518 |              |                   |                 |
| 36                                      | K   | 279323112 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tf. C 30/37                                                          | m3 | -2,204   | 4 020,50     | -8 861,18         | CS ÚRS 2020 02  |
|                                         | VV  |           | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Piloty - převázka (dl * š * v)                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | SO 07.01 - převázka                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | -(93,44)*0,80*2,07                                                                                                                             |    | -154,737 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (11,42+33,16)*0,80*2,41                                                                                                                        |    | 85,950   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | -(2,30)*0,80*0,50                                                                                                                              |    | -0,920   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (31,00)*0,80*1,91                                                                                                                              |    | 47,368   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (17,85)*0,80*1,41                                                                                                                              |    | 20,135   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |    | -2,204   |              |                   |                 |
| 37                                      | K   | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                                                             | m2 | -179,307 | 672,10       | -120 512,23       | CS ÚRS 2020 02  |
|                                         | VV  |           | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Piloty - převázka, bednění (dl * v * p)                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | SO 07.01 - převázka                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | -(93,44)*(3,00*2))                                                                                                                             |    | -560,640 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (11,42+33,16)*2,41*2                                                                                                                           |    | 214,876  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | -(2,30)*0,50*2                                                                                                                                 |    | -2,300   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (31,00)*1,91*2                                                                                                                                 |    | 118,420  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | (17,85)*1,41*2                                                                                                                                 |    | 50,337   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |    | -179,307 |              |                   |                 |
| 38                                      | K   | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                                                          | m2 | -179,307 | 132,10       | -23 686,45        | CS ÚRS 2020 02  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                                                |    |          |              | -2 340,50         |                 |
| 59                                      | K   | 953333324 | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm                 | m  | -2,000   | 540,10       | -1 080,20         | CS ÚRS 2020 02  |
|                                         | VV  |           | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Těsnící pás - L02 (dl)                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | SO 07.01                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | -(22,00)                                                                                                                                       |    | -22,000  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 20,00                                                                                                                                          |    | 20,000   |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |    | -2,000   |              |                   |                 |
| 60                                      | K   | 953334212 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí akrylový, rozměru 20 x 10 mm                                                           | m  | -3,000   | 420,10       | -1 260,30         | CS ÚRS 2020 02  |
|                                         | VV  |           | Viz PD D.03-01-001-701                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Bobtnavý pásek (dl)                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | SO 07.01                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | -(225,00)                                                                                                                                      |    | -225,000 |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | 222,00                                                                                                                                         |    | 222,000  |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |    | -3,000   |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                       |     |           |                                                                                                                                                |    |          |              | -134 681,12       |                 |
| 66                                      | K   | 998322011 | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m                                           | t  | -320,593 | 420,10       | -134 681,12       | CS ÚRS 2020 02  |

|    |   |           |  |  |  |  |  |      |
|----|---|-----------|--|--|--|--|--|------|
| VP |   | Vícepráce |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |           |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |           |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |           |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |           |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |           |  |  |  |  |  | 0,00 |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085e1  
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D\_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01)

ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -  
vicepráce

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| KSO:                           | CC-CZ:            |
| Místo:                         | Datum: 6. 9. 2022 |
| Zadavatel:                     | IČ:               |
|                                | DIČ:              |
| Uchazeč:                       | IČ:               |
| PPO Svratka                    | DIČ:              |
| Projektant:                    | IČ:               |
|                                | DIČ:              |
| Zpracovatel:                   | IČ: 253 33 046    |
| STAGA stavební agentura s.r.o. | DIČ: CZ25333046   |
| Poznámka:                      |                   |

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 329 796,15 |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní     | 21,00%     | 329 796,15  | 69 257,19  |
| snižená          | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 399 053,34 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085e1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PPO Svratka Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**329 796,15**

D\_03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO  
(07.01) 07.01)

**329 796,15**

**399 053,34**

D\_03 ZM 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu -  
(07.01)P vícepráce

329 796,15

399 053,34

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D\_03 (07.01)P - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce (SO 07.01) - vícepráce**

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: PPO Svratka

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**329 796,15**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**329 796,15**

#### D 1

#### Zemní práce

**150 875,62**

|    |   |           |                                                                                                                                                                        |    |         |        |            |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 67 | K | 132251252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 357,308 | 394,10 | 140 815,08 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

|    |                                  |  |  |  |         |  |  |  |
|----|----------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701           |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | Zemní práce - výkop (dl * š * v) |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | SO 07.01 - převážka              |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (11,42+33,16)*0,80*2,00          |  |  |  | 71,328  |  |  |  |
| VV | (31,00)*0,80*2,00                |  |  |  | 49,600  |  |  |  |
| VV | (17,85)*0,80*2,00                |  |  |  | 28,560  |  |  |  |
| VV | rozšíření                        |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (207,82)                         |  |  |  | 207,820 |  |  |  |
| VV | Součet                           |  |  |  | 357,308 |  |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                  |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 68 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 149,488 | 67,30 | 10 060,54 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|    |                                  |  |  |  |         |  |  |  |
|----|----------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701           |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | Zemní práce - zásyp (dl * š * v) |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | SO 07.01 - převážka              |  |  |  |         |  |  |  |
| VV | (11,42+33,16)*0,80*2,00          |  |  |  | 71,328  |  |  |  |
| VV | (31,00)*0,80*2,00                |  |  |  | 49,600  |  |  |  |
| VV | (17,85)*0,80*2,00                |  |  |  | 28,560  |  |  |  |
| VV | Součet                           |  |  |  | 149,488 |  |  |  |

#### D 2

#### Zakládání

**109 812,00**

|    |   |           |                                                                          |    |        |          |            |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 69 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 30,000 | 3 660,40 | 109 812,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|

|    |                                           |  |  |  |        |  |  |  |
|----|-------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701                    |  |  |  |        |  |  |  |
| VV | Opěrné stěny - pata, podklad (dl * š * v) |  |  |  |        |  |  |  |
| VV | SO 07.01                                  |  |  |  |        |  |  |  |
| VV | (100,00)*3,00*0,10                        |  |  |  | 30,000 |  |  |  |
| VV | Součet                                    |  |  |  | 30,000 |  |  |  |

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

**40 664,40**

|    |   |           |                                                                                                                                                                    |     |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|
| 56 | K | 953241211 | Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm | kus | 84,000 | 60,10 | 5 048,40 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|----------------|

|    |                         |  |  |  |        |  |  |  |
|----|-------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| VV | Viz PD D.03-01-001-701  |  |  |  |        |  |  |  |
| VV | Smykové trny - SD01 (p) |  |  |  |        |  |  |  |
| VV | SO 07.01                |  |  |  |        |  |  |  |
| VV | 84                      |  |  |  | 84,000 |  |  |  |
| VV | Součet                  |  |  |  | 84,000 |  |  |  |

|    |   |          |                                                                                                                 |     |        |        |           |                |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 57 | M | 54879272 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 20mm | kus | 84,000 | 424,00 | 35 616,00 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|

#### D 998 Přesun hmot

**28 444,13**

|    |   |           |                                                                                                      |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 66 | K | 998322011 | Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m | t | 67,708 | 420,10 | 28 444,13 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

### VP

### Vícepráce



**0,00**

|   |  |  |  |  |  |  |      |  |
|---|--|--|--|--|--|--|------|--|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

# PROTIPOVODŇOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA SO 07.01 - VÝKRES TVARU + SCHÉMA VÝZTUŽE

PŮDORYS STĚNY

M 1:250

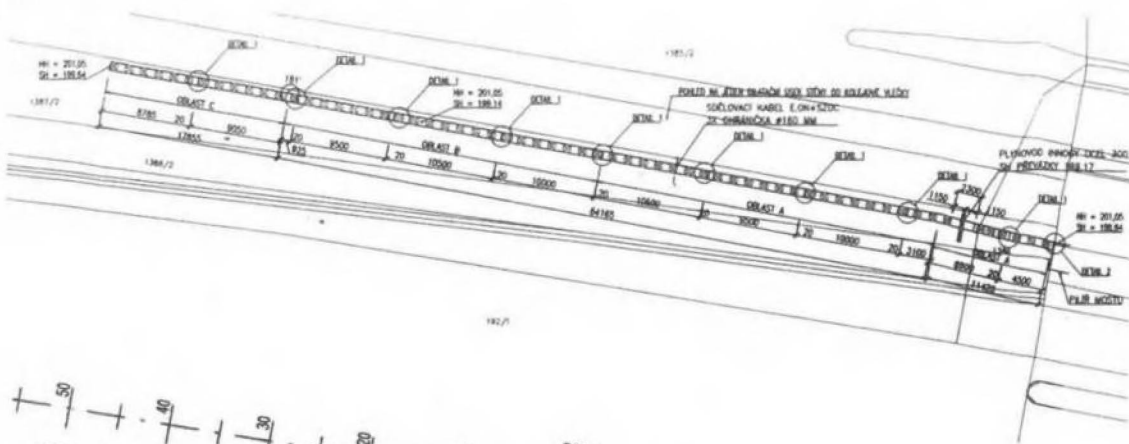


## PŮDORYS JEDNOHO DILATAČNÍHO ÚSEKU STĚNY

M 1:100

OBLAST A

VOZOVNÝ PŘELOH




## POHLED NA JEDEN DILATAČNÍ ÚSEK STĚNY OD KOLEJOVÉ VLEČKY

M 1:100

OBLAST A

VOZOVNÝ PŘELOH




## ŘEZY

M 1:50

OBLAST A

VOZOVNÝ ŘEZ




## ŘEZY

M 1:50

OBLAST B

VOZOVNÝ ŘEZ




## ŘEZY

M 1:50

OBLAST C



VOZOVNÝ ŘEZ



## DETAILY

M 1:50

DETAIL 1 - 9 ks



DETAIL 2 - 1 ks



## VÝPIS SPECIÁLNÍCH PRVKŮ

TĚSNÍCÍ PRVKY:

POZNÁMKY KE SPECIÁLNÍM PRVKŮM:

- PRVKY TĚSNÍCÍ STROPNÍ PRÁCE NEBO STŘEŠNÍ PRÁCE DLE PŘEDPISU VNITŘNÍ
- PRVKY STŘEŠNÍ PRÁCE TĚSNÍCÍ PRÁCE NEBO STŘEŠNÍ PRÁCE DLE PŘEDPISU VNITŘNÍ

LEZOKAPLAK B 320

1. = 20 mm

ROSTKOVÝ PÁSEK TĚSNÍCÍ P-250/1

1. = 3 mm

DILATAČNÍ TRNY:

ROSTKOVÝ PÁSEK TĚSNÍCÍ P-250/1

1. = 3 mm

ROSTKOVÝ PÁSEK TĚSNÍCÍ P-250/1

1. = 3 mm

JAKÝKOLIV ÚVODNÍ OBLASTI VÝKRESU JEN URČIL VLASTNOSTI PRVKU (JAKO MINIMUM POŽADOVANÝ STANDARD) PRO DÁNÍ PRVKU. MŮŽE BÝT POUŽITÝ VÝKRES JAKO DOKUMENTACE.

## POZNÁMKY

- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- PŘED VÝKRESNÍM PRŮMYSLU DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.
- VŠE DOKUMENTACE JE V SOULADU SE STÁVNÍMI ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.

POZN. 1 - DLE STÁVNÍ ČÁSTI PRŮMYSLU DOKUMENTACE, V PŘÍPADĚ NEJISTOTY JE KONTAKT S VÝKRESNÍM PRŮMYSLU.

PRŮMYSLU DLE ČSN EN ISO 9001 A ČSN EN ISO 9002

BETON C25/30 - XC2 XA1 (F.1.1) - Dmax 22 - CI 0,2

- PLOTY

BETON C30/37 - XC4 XF4 XA1 (F.1.1) - Dmax 22 - CI 0,2

- PLOTY

## OCEL B 500B

- BETONOVÁ VÝZTUŽ

KRYTÍ 50 MM

- MONITOROVACÍ KONSTRUKCE

KRYTÍ 70 MM

- PLOTY

## LEGENDA ZNAČENÍ

- DLE KONSTRUKCE V ŘEZU
- DLE KONSTRUKCE V PŮDORYSU
- UPOVĚŘENÍ KONSTRUKCE V PŮDORYSU
- UPOVĚŘENÍ KONSTRUKCE V ŘEZU



## TABULKA PILOT

| POPS                             | DELKA (M) | K1/10 | CELKOVÁ DELKA | CELKOVÁ DELKA |
|----------------------------------|-----------|-------|---------------|---------------|
| VÝKRESNÍ PLOTA 400               | 5         | 45    | 205           |               |
| VÝKRESNÍ PLOTA 400               |           |       |               |               |
| CELKOVÁ DELKA VÝKRESNÍ PLOTY 400 |           |       | 205           |               |
| CELKOVÁ DELKA VÝKRESNÍ PLOTY 400 |           |       |               |               |

## SCHEMATICKÉ ŘEZY VÝZTUŽI

M 1:50

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A


OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

OBLAST A

5/2

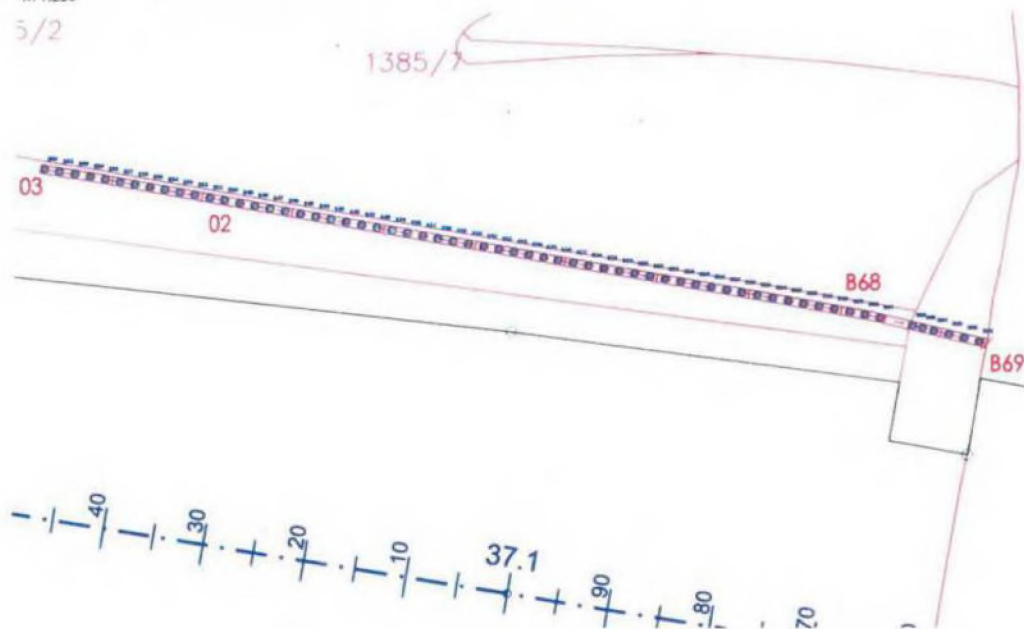

| WYŚCIEGOWY PRZEBIEG |           |                 |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Wzrost (cm)         | Waga (kg) | Prędkość (km/h) | Siła (kg) | Siła (kg) | Siła (kg) |
| 801                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 802                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 803                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 804                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 805                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 806                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 807                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 808                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 809                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 810                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 811                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 812                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 813                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 814                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 815                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 816                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 817                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 818                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 819                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 820                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 821                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 822                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 823                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 824                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 825                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 826                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 827                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 828                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 829                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 830                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 831                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 832                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 833                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 834                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 835                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 836                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 837                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 838                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 839                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 840                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 841                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 842                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 843                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 844                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 845                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 846                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 847                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 848                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 849                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 850                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 851                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 852                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 853                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 854                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 855                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 856                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 857                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 858                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 859                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 860                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 861                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 862                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 863                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 864                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |
| 865                 | 158.00    | 75.0            | 115.00    | 1.00      | 1.00      |

| VÝTVŮVACÍ<br>BOD | Paleta X    | Paleta Y    |           |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 01               | 0000 00 010 | 0000 00 000 | 000 - 000 |
| 01               | 0000 00 011 | 0000 00 001 | 000 - 000 |
| 000              | 0000 00 000 | 0000 00 000 | 000 - 000 |
| 000              | 0000 00 000 | 0000 00 000 | 000 - 000 |

[illegible]

VYTYČOVACÍ SCHEMA

MAKERS AND JOINERS

chybí vložit na úložiště revize statického výpočtu. AD doplní požadované a termín předání tištěné dokumentace je do 7.10.2022

Zástupce zhotovitele dále upozornil, že na viaduktu momentálně probíhají sanační práce – dojde k domluvě mezi zhotovitelem PPO a zhotovitelem sanačních prací ohledně prostoru staveniště.

Za předání dokumentace zodpovídá AD

18.10.2022 VTD byla doplněna a odsouhlasena zhotovitelem i TDI. Termín pro předání tištěné dokumentace je 25.10.2022. Včetně revize VV

Za předání dokumentace zodpovídá AD

1.11.2022 dokumentace v tištěné podobě včetně revize VV předá AD v den konání KD zástupci KAM. Předání tištěné dokumentace: 1.11.2022

Zodpovídá AD

15.11.2022 Nesplněno. Dokumentace byla předána neúplná, chybí VV.

Termín: 15.11.2022

Zodpovídá AD

29.11.2022 Výkaz výměr byl předán ke kontrole TDI a vložen na sdílené úložiště. Probíhá kontrola. Info na příštím KD

13.12.2022 Kontrola VV rozpočtářem BKom proběhne do 16.12.2022. Dořešení VV proběhne na schůzce na zařízení staveniště 19.12.2022

Za kontrolu ZL zodpovídá TDI

10.1.2023 Kontrola VV rozpočtářem proběhla. V den konání KD byly zhotoviteli zaslány připomínky k zapracování do VV. Info na příštím KD.

Za zapracování připomínek zodpovídá zhotovitel

24.1.2023 VV se zapracovanými připomínkami byl zaslán rozpočtáři ke kontrole. Info k tomuto VV je od rozpočtáře (Bkom) přislíbeno na 25.1.2023. TDI upozornil zástupce AD, že chybí rozdílový rozpočet, který je nutný.

Zodpovídá TDI (Bkom) Za kontrolu VV, Za vyhotovení rozdílového VV odpovídá AD

14.2.2023 20.2.2023 proběhne schůzka k dořešení VV, za účasti rozpočtáře BKom, TDI a zástupce zhotovitele.

7.3.2023 Zástupce TDI na KD informoval, že VV byl rozpočtářem Bkom schválen. Zástupci zhotovitele nebyli informováni – schůzka k potvrzení schválení VV proběhne 8.3.2023. Info na příštím KD

21.3.2023 Viz předchozí bod. VV bude dořešen na schůzce na zařízení staveniště 22.3.2023. AD doplní dokladovou část.

Zodpovídá TDI(Bkom) za dořešení VV a AD za dokladovou část

4.4.2023 VV byl rozpočtářem BKom schválen. Tištěnou verzi DPS AD předá do 18.4.2023. Zodpovídá AD

18.4.2023 Dokumentace nebyla předána. Chybí pouze dokladová část. Bude předána do 2.5.2023.

Zodpovídá AD

2.5.2023 Dokumentace nebyla předána, stále chybí dokladová část. Bude předána do 16.5.2023.

Zodpovídá AD

16.5.2023 Nesplněno. K předání dokumentace nedošlo, není kompletní dokladová část, přítomný zástupce AD na KD přislíbil předání změny DPS do 23.5.2023

Zodpovídá AD

30.5.2023 Přítomný zástupce AD na KD informoval, že tuto dokumentaci předá kompletní, včetně dokladové části nejpozději do 6.6.2023.

Zodpovídá AD

13.6.2023 Dokumentace nebyla předána. Dokumentaci předá přítomný zástupce KAM dnes po skončení KD. Za předání zodpovídá KAM

**27.6.2023 Nebylo předáno. Předání dokumentace proběhne dnes po skončení KD.**

**Za předání zodpovídá KAM**

#### 4. Kamerový systém na kolonádě – Napojení kamer na kolonádě na městský kamerový systém ZM 029

-Aktuálně je navrženo dle metodiky 23 stacionárních kamer, návrh umožňuje napojení na MKDS, současně může fungovat jako autonomní. Ve VV chybí licence a HW (dle požadavku budoucího správce).

-Dle informací MP nelze provedení dle PD napojit na MKDS. V případě požadavku investora (doposud nerozhodnuto), aby byl objekt kolonády napojen na MKDS, je doporučeno dle informací MP, BKOM a zhotovitele provést revizi PD.

Dne 10.5.2022 se uskutečnilo jednání na KAMu, byly vysvětleny skutečnosti, které brání napojení na MKDS. Bylo ujednáno, že KAM osloví svého projektanta CCTv, aby upravil svoji PD. Úprava PD pro CCTv by měla proběhnout co nejdříve z důvodů schvalování u MP a dlouhých dodacích lhůt komponentů CCTv.

Zodpovídá KAM

7.6.2022 Proběhlo vstupní jednání mezi BKOM a AD. Na základě jejich domluvy proběhne nacenění. Zatím není oficiálně stanoveno napojení kamer na MKDS. Info KAM: bude řešeno v červenci, ale je předpoklad napojení na MKDS.

AD čeká zadání od BKOM. Bude ugovat zástupce Bkom. Kontrola na příštím KD.

Zodpovídá AD

21.6.2022 - Do 1.7.2022 proběhne jednání za účasti AD a jeho subdodavatele, BKOM (p. [redacted]) a TDI na základě kterého bude napojení kamer na MKDS dále řešeno a proběhne úprava PD.

Za svolání

jednání odpovídá AD

### 3. Kolize pilotové zdi se stávajícím plynovodem u viaduktu (SO 07.01) ZM 019

Dále zhotovitel upozornil na kolizi pilotové stěny SO 07.01 se stávajícím STL plynovodem. Pilotová stěna je navržena v menší vzdálenosti 1m než požaduje správce zařízení GaSNet. Zástupce projektanta sdělil, že v místě křížení je možné část pilot vynechat a provést pouze konstrukci převážky. Souběh plynovodu a pilotové stěny projektant prověří.

Zodpovídá: projektant Termín: do 26.4.2022

26.4.2022 Projektant předal vytyčovací body nové polohy pilotové stěny, s ohledem na požadovaný odstup 1 m od pevných konstrukcí. Projektant toto řešení projedná se správcem plynovodu. Zhotovitel požaduje v tomto kontextu i o prověření, zda nedochází ke kolizi i při ulici Rybářská s SO 07.27 (produktovod) a s SO 07.21 (přeložka plynu-lávka).

Zodpovídá: projektant

10.5.2022 Byly poskytnuty nové vytyčovací body. Předání proběhne 10.5.2022 po KD. Mění se pouze poloha stěny, délka i ostatní tech. řešení včetně výkazu výměr se nemění.

AD prověřil možnou kolizi SO 07.27 a SO 07.21 s pilotovou stěnou a uvádí, že toto řešení bylo f. GASNet předloženo během zpracování projektové dokumentace a bylo f. GASNet odsouhlaseno.

24.5.2022 Zhotovitel žádá o prověření, zda u pilotové stěny S 07.01 je požadavek na převrtávané piloty. AD prověří a výsledek oznámí zhotoviteli.

Dále zhotovitel požaduje předložit vyjádření f. Gasnet ke křížení plynovodu s pilotovou stěnou. Nejedná se o nové křížení – dle AD není třeba řešit s f. Gasnet. AD předá vyjádření firmy EMH servis, které vyloučí nutnost úpravy křížení. Kontrola na příštím KD. Zhotovitel požaduje předložit detail křížení pilotové stěny (převážky) s plynovodním potrubím.

Zodpovídá AD

7.6.2022 Křížení bylo řešeno s projektantem plynovodu. Prověřuje se nutnost osazení dělené chráničky na plynovod s přesahem 1 m na každou stranu pilotové stěny. AD sdělí info do 14.6.2022

Převrtávané piloty – AD čeká na informace od firmy Šindlar dle AD pravděpodobně nebude nutnost převrtávaných pilot), info do 14.6.2022.

Zodpovídá AD

21.6.2022 Křížení a osazení dělené chráničky bylo řešeno s firmou Gasnet, písemné vyjádření bude do 27.6.2022 – AD zašle TDI a zhotoviteli.

AD sdělil, že převrtávané piloty nejsou nutné – je třeba zpracovat změnu DPS. Proběhne změna u převážek na základě, které zhotovitel objedná výstuže, v této souvislosti zástupce zhotovitele upozorňuje, že výstuže je potřeba objednat nejpozději 3 týdny před vlastním zahájením prací. Plán zahájení prací je 11.7.2022. AD potvrdil zpracování změny do 27.6.2022

Zodpovídá

AD

12.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do příštího KD, který proběhne 26.7.2022.

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika.

Zodpovídá AD

26.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Nový termín do 5.8.2022

Změna DPS – převrtávané piloty – nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika – nesplněno. Termín do 5.8.2022.

Zodpovídá AD

9.8.2022 Křížení a osazení dělené chráničky – písemné vyjádření od Gasnetu – nesplněno. Urgence AD.

Změna DPS – převrtávané piloty. Dokumentace nebyla předána a bude zaslána neprodleně po KD.

Zodpovídá AD

23.8.2022 Vyjádření od Gasnetu bylo zhotoviteli zasláno 19.8.2022.

Změna DPS-AD zapracovává připomínky od TDI (Bkom) a poté bude dokumentace vložena na sdílené úložiště.

Změna obsahuje i vynechání převrtávaných pilot. Na místě probíhá demontáž sloupů VO, z nichž jeden je ve správě CTP. Zhotovitel oznámí odstranění tohoto sloupu VO přímo správci (CTP).

Zodpovídá: zhotovitel za oznámení demontáže sloupu VO správci, AD za úpravu DPS a KAM za vložení na sdílené úložiště.

6.9.2022 AD provedl revizi DPS a nejpozději 7.9.2022 bude vložena na sdílené úložiště i se zpracovaným výkazem výměr. Zhotovitel zadá výstuž do výroby až poté co bude DPS schválena.

Za vložení na sdílené úložiště zodpovídá KAM

20.9.2022 Projekční řešení bylo zhotoviteli zasláno 19.9.2022. Zhotovitel zaslal k tomuto řešení připomínky, TDI vyzval zástupce AD k jejich zapracování a předložení dokumentace v tištěné podobě.

Zodpovídá AD

4.10.2022 Dle vyjádření AD byly připomínky k VTD zapracovány a dokumentace je již opravená. Zhotovitel upozorňuje, že byly zaslány vytyčovací výkresy na jednotlivé piloty, ale chyběl detail navázání na viadukt, dále
