

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 17.10.2024	
Název veř. zakázky: LC Spodní soukromá investiční					
Zhotovitel: Konopa Vladimír s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC Spodní soukromá investiční		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: a) Navýšení množství sanací b) Prodloužení drenáží c) Dodání podkladu pro osazení betonových konstrukcí d) Měněpráce (jedno čelo propustku a čištění jednoho propustku)					
Zdůvodnění změny: a) Na základě nevyhovujících zátěžových zkoušek ze dne 17.10.2024, příloha č. 1,2, byla určena další část sanace LC, 575,7m2 a z toho bude 72 m2 v části u HS překryto asf. recyklátem. b) Při výkopových pracích pro sanace došlo k odhalení dalších pramenů z tohoto důvodu je navýšena drenáž. c) Pro vyrovnání zamokřeného podkladu pro betonové konstrukce bude použita šterkodrt' v tl. 150 mm a šířce 1 m. d) Dle KD na místě stavby bylo dohodnuto neprovedení jednoho čela na provizorním propustku vč. vyčištění.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: -----				Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do:	31.10.2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 25 960,- N:	Bilance: 299 334,36 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 325 294,36 N:		
	Konečná celková cena akce po změně			2 870 905,36 Kč bez DPH	
				Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		[redacted]		Datum:	23.10.2024
Zástupce objednatele - jméno:		[redacted]		Datum:	23.10.2024
Přílohy: č.1 - 2 protokoly zátěžových zkoušek, č.3 položkový rozpočet, č.4 zápis ve stavebním deníku					

Počet listů: 1

List číslo: 1

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 1482/24

Objednatel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Název stavby:

LC SPODNÍ SOUKROMÁ INVESTIČNÍ

Objekt:

SO 101 komunikace

Místo zkoušení:

v km 0,820, levá strana komunikace

Konstrukční vrstva:


zemní pláň

Datum zkoušení:

17.10.2024

vzorek č.: 1882/24

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	0,36
0,12	1,02
0,18	1,88
0,25	3,26
0,33	5,08
0,41	7,48
0,50	10,86
0,25	10,34
0,12	8,82
0,00	6,48
0,06	6,84
0,12	7,26
0,18	7,72
0,25	8,32
0,35	9,04
0,45	9,94

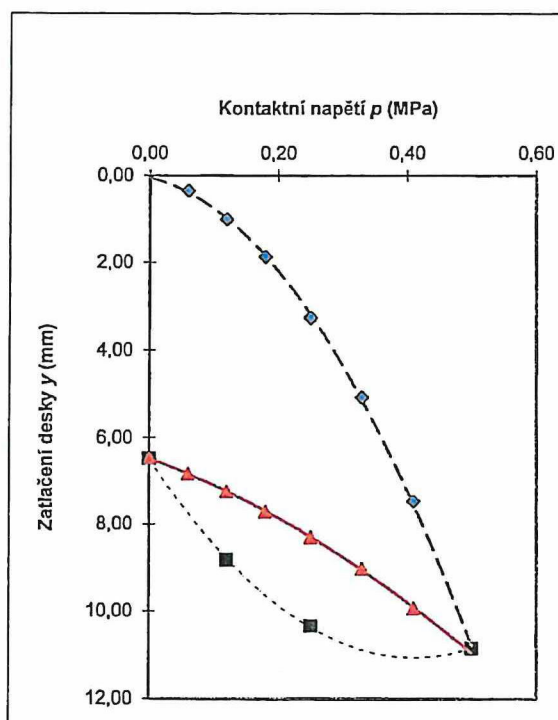

výsledky zkoušky		
$E_{def,1}$ (1.zatěžovací cyklus)	10,46	MPa
$E_{def,2}$ (2.zatěžovací cyklus)	28,65	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$ (poměr)	2,74	

Zkoušel:

Zpracoval:

Schválil:


Protokol vydán dne:

17.10.2024

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Technická zkušební laboratoř s.r.o., Chebská 53, Sokolov, 356 01, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198



Počet listů: 1

List číslo: 1

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 1481/24

Objednatel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Název stavby:

LC SPODNÍ SOUKROMÁ INVESTIČNÍ

Objekt:

SO 101 komunikace

Místo zkoušení:

v km 0,980, pravá strana komunikace

Konstrukční vrstva:


zemní pláň

Datum zkoušení:

17.10.2024

vzorek č.: 1881/24

Kont. napětí	Zatlač.desky
p (MPa)	y (mm)
0,06	1,14
0,12	2,46
0,18	3,76
0,25	5,16
0,33	6,86
0,41	8,58
0,50	10,48
0,25	10,06
0,12	8,84
0,00	7,02
0,06	7,46
0,12	7,82
0,18	8,26
0,25	8,78
0,35	9,36
0,45	9,96

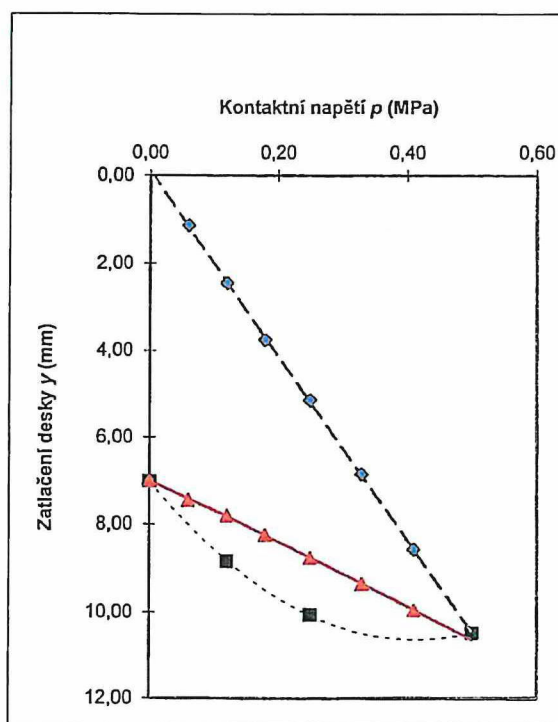

výsledky zkoušky		
$E_{def,1}$ (1.zatěžovací cyklus)	10,64	MPa
$E_{def,2}$ (2.zatěžovací cyklus)	34,72	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$ (poměr)	3,26	

Zkoušel:



Zpracoval:

J. [redacted] k

Schválil:




Protokol vydán dne:

17.10.2024

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Technická zkušební laboratoř s.r.o., Chebská 53, Sokolov, 356 01, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198



KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Stavba:

LC Spodní soukromá investiční

Objekt:

SO101 - LC Spodní soukromá investiční

KS0:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

GEOREAL spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2024

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

03565785

DIČ:

CZ03565785

IČ:

DIČ:

40527514

DIČ:

Materiál			80 475,21
Montáž			218 859,15
Cena bez DPH			299 334,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	299 334,36	21,00%	62 860,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		362 194,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Spodní soukromá investiční

Objekt:

SO101 - LC Spodní soukromá investiční

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Datum:

23.10.2024

Projektant:

Uchazeč:	KONOPA Vladimír s.r.o.	Zpracovatel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	80 475,21	218 859,15	299 334,36
HSV - Práce a dodávky HSV	80 475,21	218 859,15	299 334,36
1 - Zemní práce	0,00	22 804,05	22 804,05
2 - Zakládání	8 403,21	4 558,60	12 961,81
5 - Komunikace pozemní	72 072,00	217 456,50	289 528,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-25 960,00	-25 960,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:
LC Spodní soukromá investiční
Objekt:
SO101 - LC Spodní soukromá investiční
Místo:
Datum: 23.10.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:
Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.
Zpracovatel: GEOREAL spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								299 334,36
D HSV Práce a dodávky HSV								299 334,36
D 1 Zemní práce								22 804,05
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	58,050	0,00	134,00	7 778,70
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	P		Poznámka k položce					
	VV		Výkop pro sanaci					
	VV		Sanace					
	VV		LS km 0,606-0,653		21,150			
	VV		47*1,5*0,3					
	VV		LS km 0,780-0,820		27,000			
	VV		60*1,5*0,3					
	VV		LS km 0,915-1,042		57,150			
	VV		127*1,5*0,3					
	VV		PS km 0,945-1,042		43,650			
	VV		97*1,5*0,3					
	VV		CÚ km 1,042 - 1,080		51,300			
	VV		38*4,5*0,3					
	VV		Vjezd km 1,057 - 1,075		21,600			
	VV		18*4*0,3					
	VV		původní rozpočet		163,800			
	VV		47*1,5*0,3, 127*1,5*0,3, 38*4,5*0,5		59,050			
	VV		Součet vícepráce					
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,050	0,00	42,00	2 438,10
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		58,05		58,050			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	58,050	0,00	40,00	2 322,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		58,05		58,050			
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	58,050	0,00	55,00	3 192,75
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		58,05		58,050			
6	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	307,500	0,00	23,00	7 072,50
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním					

VV	307,5	307,500							
D 2	Zakládání							12 961,81	
8 K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	43,700	15,03	28,00	1 880,41		C
PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m							S
Online PSC		https://podminky.projektom.cz/2023/03/13/211971121							U
VV		"Obalení rýhy trativodu"		43,700					
VV		1,9*23		43,700					
VV		Součet		43,700					
9 M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	43,700	22,00		961,40		C
PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2							S
10 K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	23,000	295,00	145,00	10 120,00		C
PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150							S
Online PSC		https://podminky.projektom.cz/2023/03/13/212752102							U
VV		23		23,000					
D 5	Komunikace pozemní							289 528,50	
11 K	564851111	Podklad ze štěrkovité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	546,000	132,00	20,00	82 992,00		C
PP		Podklad ze štěrkovité ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm							S
Online PSC		https://podminky.projektom.cz/2023/03/13/564851111							U
VV		47*1+18*4		546,000					
12 K	564871016	Podklad ze štěrkovité ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	575,700	0,00	345,00	198 616,50		C
PP		Podklad ze štěrkovité ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm							S
P		Poznámka k položce: Frakce G/125 Sanace LS km 0,603-0,653 47*1,5 LS km 0,780-0,820 60*1,5 LS km 0,915-1,042 127*1,5 PS km 0,945-1,042 97*1,5 CÚ km 1,042 - 1,080 38*4,5 Vjezd km 1,057 - 1,075 18*4 původní rozpočet: 47*1,5*0,3, 127*1,5*0,3, 38*4,5*0,5 Součet vícepráce		70,500 90,000 190,500 145,500 171,000 72,000 163,800 575,700					
13 K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recykátem tl 150 mm	m2	72,000	0,00	110,00	7 920,00		C
PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění asfaltovým recykátem tl. 150 mm							S
VV		18*4		72,000					
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							-25 960,00	
19 K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-1,000	0,00	22 000,00	-22 000,00		C
PP		Čelo propustku včetně filmy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm		1					S
27 K	938902482	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	-6,000	0,00	660,00	-3 960,00		C
PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně štoupkou nánosu přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm							S
VV		1*6		6,000					

Počasí: oblačno 4°C - 12°C

16.10.2024

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 16⁰⁰ hod.

POČET PRAC: Vladimír Konopa, Zdeněk Zelinger,
Ivan Lakotš, Oskar Orst, Josef Konopa

MECHANIZACE: CAT 312, BOBCAT, UV HAM
IVECO SKLÁPÍČ 2x

POPIS PRACÍ: - DOPRAVA ŠTĚRKODRŽE
- POKLÁDKA SANACE
- ROZRYTÍ KŘÍTU LC
- PŘESUN VÝKOPU

KD - NA PÍSTĚSTAVBY ZA ÚKASTI ZHODNUTÉ 17.10.2024
A OBJEDNATELE.

① BYLY PROVEDENY ZÁŤEŽOVÉ ZKOUŠKY NA
DVOU MÍSTECH LC. Č. - stančení v km 0,980
NA LEVÉ STRANĚ LC A P.2. V KM 0,920
NA PRAVÉ STRANĚ LC.

OBE ZKOUŠKY VYŠLY POD LIMITEM DANÝM
PD. NA MÍSTĚ BYLA STANOVENA PLOCHA
DOPLNŮJÍCÍ SANACE.

② NA KONCI ÚSEKU DOŠLO PŘI ODEOPÁVĚKÁCH
PRO SANACE LC K ODHÁLENÍ PRAMENŮ V
TELESE LC, NA TOMTO ZÁKLADĚ BĚŽ
DOHODNUTO PŘEDLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍ DŘEPAŽE
O 23 mb.

③ PO UČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ BYL ZJIŠTĚN ROZMOŘENÝ
PODKLAD, KTERÝ JE NEVYHOVUJÍCÍ PRO OSAZENÍ
BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.
BYLO DOHODNUTO PROVEDENÍ PODKLADU V
HROBNOSTI 150 mm ŠTĚRKODRŽE

(4) NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOVÍK ZJIŠTĚNÍ BYLA
DOHODNUTO NEPROVEDENÍ JEDNOHO ŽEKA
PROPUSTKU. A JEHO ČISTĚNÍ
PROPUSTE MÁ PROZATÍMNÍ CHARAKTER

NA TYTO ZMĚNY BUDE ZHOTOVITELEM
UYHOTOVEN POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VÍCE A MĚNĚ
PRÁCE)

ZA OBJEDNATELE:

[REDACTED]

[REDACTED]

ZA ZHOTOVITELE:

[REDACTED]

[REDACTED]
