



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 63

D_21 - Úpravy konstrukcí,

D_05 - Komunikace

- ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU



Kancelář
architekta
města Brna



Brněnské komunikace



BRNĚNSKÉ
VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

**Důvodová zpráva – změnový list č. 63
ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U
VIADUKTU**

Zástupci KAM Brno dne 21.03.2023 oznámili, že v rámci PPO – etapy IX. a X. probíhá zpracování polohy cyklostezky na levém břehu u viaduktu. Tato nová cyklostezka bude navazovat na cyklostezku budovanou v rámci etap VII. a VIII. a bude nutná změna DPS.


Na základě výše uvedeného dochází ke změnám řešení komunikační sítě a v návaznosti na zrušení železniční vlečky procházející mostním obloukem pod železničním viaduktem na ul. Uhelná, která bude následně odstraněna. Uvolněný prostor v tomto oblouku viaduktu bude nově využit pro umístění smíšené komunikace pro pěší a cyklisty dále od koryta řeky tak, aby původní trasa obloukem blíže ke korytu mohla být ponechána jako pěšina pouze pro pěší a stezka bude napojena na cestní síť etapy VII, VIII v prostoru lávky CTP.

Stavební objekty komunikací povolené v rámci etapy VII, VIII budou směrově a výškově ukončeny ve vzdálenosti min. 10 m od viaduktu Uhelná tak, aby byly plynule navázány na stávající terén a konstrukce stávajících komunikací.

Spodní pěšina na levém břehu bude napojena na stávající schody na levém břehu. Opevnění koryta včetně patek a oprav stávajícího opevnění bude ukončeno ve vzdálenosti 10 m od viaduktu. Opevnění dna a opravy opevnění navazující budou dle dohody řešeny v rámci etapy IX, X.

V rámci ZM 062 byla zpracovaná výkresová část ukončení cest a situace změn v místě viaduktu.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Brno
06.10.2023

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: Nábřeží Svratky Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII

Stanovisko projektanta ke změně 062 - Zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu


Vážení,

Na základě stavu zpracování projekčních prací PPO Města Brna etapy IX, X, XI, která po proudu navazuje na PPO etapy VII, VII, dochází ke změnám řešení komunikační sítě a návaznosti těchto etap PPO. Během návrhu PPO etapy IX, X a XI došlo ke zrušení železniční vlečky procházející mostním obloukem pod železničním viaduktem na ul. Uhelná, která bude následně odstraněna. Uvolněný prostor v tomto oblouku viaduktu bude nově využit pro umístění smíšené komunikace pro pěší a cyklisty dále od koryta řeky tak, aby původní trasa obloukem blíže ke korytu mohla být ponechána jako pěšina pouze pro pěší a stezka bude napojena na cestní síť etapy VII, VIII v prostoru lávky CTP. Stavební objekty komunikací povolené v rámci etapy VII, VIII budou směrově a výškově ukončeny ve vzdálenosti min. 10 m od viaduktu Uhelná tak, aby byly plynule navázány na stávající terén a konstrukce stávajících komunikací.

Spodní pěšina na levém břehu bude napojena na stávající shody ne levém břehu. Opevnění koryta včetně patek a oprav stávajícího opevnění etapy VII, VIII bude ukončeno ve vzdálenosti 10 m od viaduktu. Opevnění dna a opravy opevnění navazující na etapy VII, VIII budou dle dohody řešeny v rámci etapy IX, X, XI.

Řešení bude projednáno a odsouhlaseno se zástupci SŽ, ČE a objednatele a zohledněny připomínky TDI.

V rámci ZM062 byla zpracovaná výkresová část ukončení cest a situace změn v místě viaduktu. Výkaz výměr upravující rozdíl v objemu prací bude součástí výkazu výměr ZM046, který bude obsahovat kompletní změny v úpravě břehů koryta řeky.



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_21 - Úpravy konstrukcí, D_05 - Komunikace		Změnový list č. 63
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: D 05.1 - SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 -MK D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 38,830 – cesta D 21.01 - Bourané konstrukce ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU		
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny řešení komunikační sítě DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.1, SO 07.14.2, D 21.01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 062 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.63-méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Stavební objekty komunikací povolené v rámci etapy VII, VIII budou směrově a výškově ukončeny ve vzdálenosti min. 10 m od viaduktu Uhelná tak, aby byly plynule navázány na stávající terén a konstrukce stávajících komunikací. Spodní pěšina na levém břehu bude napojena na stávající schody na levém břehu. Opevnění koryta včetně patek a oprav stávajícího opevnění bude ukončeno ve vzdálenosti 10 m od viaduktu.		
NAVRHL: PŘÍKAZ VYDAL: DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_21 - Úpravy konstrukcí, D_05 - Komunikace	63																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D 05.1 - SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055-38,830 -MK D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 38,830 – cesta D 21.01 - Bourané konstrukce ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: PPO nábřeží Svatky - Brno POŠTOU: _____ KURÝR: _____ Mail DATUM: _____ OSOBNĚ: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny řešení komunikační sítě DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.13.1, SO 07.14.2, D 21.01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 062 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.63 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: center;">0 Kč</td> <td style="text-align: center;">0 Kč</td> <td style="text-align: center;">0 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: center;">- 437 295,63 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 91 832,08 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 529 127,71 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: center;">- 437 295,63 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 91 832,08 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 529 127,71 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Méněpráce:	- 437 295,63 Kč	- 91 832,08 Kč	- 529 127,71 Kč	Rozdíl:	- 437 295,63 Kč	- 91 832,08 Kč	- 529 127,71 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Méněpráce:	- 437 295,63 Kč	- 91 832,08 Kč	- 529 127,71 Kč														
Rozdíl:	- 437 295,63 Kč	- 91 832,08 Kč	- 529 127,71 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____																	
VYJÁDRĚNÍ: _____																	
OD: _____ 29.05.24																	
SCHVÁLIL: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____ BKOM, _____ BKOM, _____ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_21 - Úpravy konstrukc, D_05 - Komunikace

Soupis:

**ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU -
MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum: 29.05.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2018 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

-437,295,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-437 295,63	21,00%	-91 832,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-529 127,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis:

**ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU -
MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

29.05.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-437 295,63

KOMPLET ZMĚNA ZM 062

-437 295,63

D 05.1

-332 274,98

D 05.2

-6 794,06

D 21.01

-98 226,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D 05.1 - SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 -

38,830 - místní komunikace

ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY

CYKLOSTEZKY U VIADUKTU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.05.2024

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

DIČ:

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Cena bez DPH

-332 274,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-332 274,98	21,00%	-69 777,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-402 052,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: 0

Datum: 29.05.2024
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: A PLUS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-332 274,98

HSV - Práce a dodávky HSV

-332 274,98

1 - Zemní práce

-327 955,90

998 - Přesun hmot

-4 319,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D 05.1 - SO 07.13.1 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 -
38,830 - místní komunikace
ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU


29/5/2024

Místo:

Datum: 29.05.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

A PLUS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-332 274,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

-332 274,98

D 1

Zemní práce

-327 955,90

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-68,250	248,40	-16 953,30	SO 07.13.1
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	VV		"odkopávky po zemní pláň"					
	VV		"osa 1 - stezka" 163*0,37m		-60,000			
	VV		"osa 1 - zemní krajnice" 0,3*55+0,15*55m		-8,250			
	VV		Součet		-68,250			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-16,500	60,60	-999,90	SO 07.13.1
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"přesun zeminy na deponii a zpět do místa zpracování"					
	VV		"materiál pro dosypávky krajnic" -8,250*2		-16,500			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-60,000	254,40	-15 264,00	SO 07.13.1
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km"					
	VV		"odkopávky"		-60,000			
	VV		Součet		-60,000			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-8,250	48,50	-400,13	SO 07.13.1
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		-8,25		-8,250			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-108,000	200,00	-21 600,00	SO 07.13.1
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(-60,00)*1,8		-108,000			
8	K	171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	-60,000	9,70	-582,00	SO 07.13.1
	PP		Uložení sypání na skládku nebo meziskládky bez hutnění a upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
16	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-163,000	16,90	-2 754,70	SO 07.13.1
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		"hutnění zemní pláň na předepsanou únosnost"		-163,000			
24	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	-163,000	78,30	-12 762,90	SO 07.13.1
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) a rozptýlením, promísením, vtlačím, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm					
	VV		"POLOŽKA ČERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"					
	VV		"stabilizace podloží vápnem, tl. 50cm, předpoklad 3% vápna"					
	VV				-163,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	-4,328	3 524,70	-15 254,90	SO 07.13.1
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní					
	VV		*POLOŽKA ČERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA*					
	VV		*hmotnost vápna pro 3% vápnění 53,1 kg/m ³ (-163)*0,50*0,0531		-4,328			
26	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	-163,000	125,60	-20 505,40	SO 07.13.1
	PP		Podklad ze štěrku ŠD a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 100 mm					
	VV		*vrstva ŠDa Ø32 v tl. 100mm*					
	VV		*živičný kryt*					
	VV		*osa 1*		-163,000			
	VV		Součet		-163,000			
27	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	-163,000	184,10	-30 008,30	SO 07.13.1
	PP		Podklad ze štěrku ŠD a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl 150 mm					
	VV		*vrstva ŠDa Ø63 v tl. 150mm*					
	VV		*živičný kryt*					
	VV		*osa 1*		-163,000			
	VV		Součet		-163,000			
28	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-163,000	537,20	-87 563,60	SO 07.13.1
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) a rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm					
	VV		*podkladní vrstva z ACP 16+ (50/70) tl. 80mm					
	VV		*osa 1*		-163,000			
	VV		Součet		-163,000			
30	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	-8,250	240,90	-1 987,43	SO 07.13.1
	PP		Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhuštěním					
	VV		*dosypávký krajnic materiálem z výkopu*					
	VV		*osa 1 - zemní krajnice 0,3*55+0,15*55m		-8,250			
	VV		Součet		-8,250			
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-163,000	16,90	-2 754,70	SO 07.13.1
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		*postřik infiltrační v množství 0,7 kg/m2*					
	VV		*osa 1*		-163,000			
	VV		Součet		-163,000			
32	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-163,000	5,50	-896,50	SO 07.13.1
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		*osa 1*		-163,000			
	VV		Součet		-163,000			
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-163,000	301,50	-49 144,50	SO 07.13.1
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) a rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l, po zhuštění tl. 40 mm					
	VV		*obrusná vrstva z ACO 11 (50/70) tl. 40mm*					
	VV		*osa 1*		-163,000			
	VV		Součet		-163,000			
71	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-110,000	265,20	-29 172,00	SO 07.13.1
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		*obruha do bet. lože C16/20*					
	VV		*chodníková 10/25*					
	VV		*osa 1		-110,000			
	VV		Součet		-110,000			
72	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-113,300	170,80	-19 351,64	SO 07.13.1
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		(-110)*1,03		-113,3			
	D	998	Přesun hmot				-4 319,08	
93	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-118,656	36,40	-4 319,08	SO 07.13.1
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakákoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 38,830 - cesta
**ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY
CYKLOSTEZKY U VIADUKTU**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.05.2024

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

IČ:

DIČ:

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Cena bez DPH

-6 794,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 794,06	21,00%	-1 426,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 220,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

Uchazeč:

Zpracovatel:

S I A G A s t a v e b n í
a n e n t u r a s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 794,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 794,06

1 - Zemní práce

-1 128,80

5 - Komunikace pozemní

-5 659,04

998 - Přesun hmot

-6,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D 05.2 - SO 07.14.2 - Pěšina v km 37,055 - 38,830 - cesta

ZM 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU

Místo:

Datum:

29.05.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

S I A G A s t a v e b n í
a n e n t u r a s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 794,06	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 794,06	
D	1		Zemní práce				-1 128,80	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1,470	248,40	-365,15	SO 07.14.2
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	W		"odkopávky po zemní pláři"					
	W		"osa 12B"					
	W		stezka 3m*0,34m = 1,02m3		-1,020			
	W		zemní krajnice 0,2*-1,5+0,1*-1,5		-0,450			
	W		Součet		-1,470			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,900	60,60	-54,54	SO 07.14.2
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	W		"přesun zeminy na deponii a zpět do místa zpracování"					
	W		"materiál pro dosypávky krajnic" -0,45*2		-0,900			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,020	254,40	-259,49	SO 07.14.2
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	W		"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 10 km"					
	W		"odkopávky"		-1,020			
	W		Součet		-1,020			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-0,450	48,50	-21,83	SO 07.14.2
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhnětého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	W		"naložení zeminy na deponii pro dosypávky krajnic" -0,45		-0,450			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1,636	200,00	-367,20	SO 07.14.2
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	W		(-1,02)*1,6		-1,836			
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	-1,020	9,70	-9,89	SO 07.14.2
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
7	K	181951112	Úprava pláň v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-3,000	16,90	-50,70	SO 07.14.2
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	W		"hutnění zemní pláň na předepsanou únosnost"					
	W		"osa 12B"		-3,000			
	W		Součet		-3,000			
D		5	Komunikace pozemní				-5 659,04	
8	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	-3,000	60,70	-182,10	SO 07.14.2
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vltčením, zhutněním s ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"POLOŽKA ČERPATELNÁ POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA"					
	VV		"stabilizace podloží vápnem, tl. 35cm, předpoklad 3% vápna"					
	VV		"osa 12B"		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
9	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-0,056	3 524,70	-197,38	SO 07.14.2
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	VV		"hmotnost vápna pro 3% vápnění 53,1 kg/m3" -3*0,35*0,0531		-0,056			
14	K	564861111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD tl 200 mm	m2	-3,000	242,60	-727,80	SO 07.14.2
	PP		Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		"vrstva ŠDa 0/32 v tl. 200mm"					
	VV		"osa 12B"		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
15	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	-0,450	240,90	-108,41	SO 07.14.2
	PP		Zřízení zemních krajnic z homin. jakékoliv třídy se zhuštěním					
	VV		"dosypěvky krajnic materiálem z výkopu"					
	VV		osa 12B zemní krajnice 0,2*-1,5+0,1*-1,5		-0,450			
	VV		Součet		-0,450			
16	K	581121304	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 140 mm	m2	-3,000	1 041,70	-3 125,10	SO 07.14.2
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 140 mm					
	VV		"silniční beton tl. 140mm - PROBARVENÝ"					
	VV		"osa 12B" 318+95		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,000	265,20	-795,60	SO 07.14.2
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zastřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"obruha do bet. lože C16/20"					
	VV		"osa 12B"		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
44	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-3,060	170,80	-522,65	SO 07.14.2
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		(-3)*1,03		-3,060			
	D	998	Přesun hmot				-6,22	
93	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,171	36,40	-6,22	SO 07.13.1
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis:

D_21.01 - Bourané konstrukce

ZMĚNA 062 - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ POLOHY CYKLOSTEZKY U VIADUKTU

KSO:

Místo:

Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum:

16.05.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládáno a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

-98 226,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 226,59	21,00%	-20 627,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-118 854,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objekt

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis: D_21.01 - Bourané konstrukce

Místo: Nábřeží Svratky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: 0

Datum: 16.05.2024
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-98 226,59
HSV - Práce a dodávky HSV	-98 226,59
1 - Zemní práce	-11 188,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-48 284,40
997 - Přesun suti	-38 753,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis:

D_21.01 - Bourané konstrukce

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

16.05.2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-98 226,59

o HSV

Práce a dodávky HSV

-98 226,59

D 1

Zemní práce

-11 188,20

3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drcaného, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-60,000	80,90	-4 854,00	D_21.01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	---------

W

W

W

W

Viz PD D.21-001-023
Odstranění asfaltu (pl)

-60,000

-60,000

W asfalt_pl

Součet

4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drcaného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-102,000	62,10	-6 334,20	D_21.01
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	---------

W

W

W

W

W

W

Viz PD D.21-001-023
Odstranění asfaltu - podsyp (pl)
(asfalt_pl)
Odstranění dlažby - podsyp (pl)
(dlažba_pl)
Součet

-60,000

-42,000

-102,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-48 284,40

5	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	-42,000	20,60	-865,20	D_21.01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	---------

W

W

W

W

Viz PD D.21-001-023
Odstranění dlažby (pl)

-42,000

-42,000

W dlažba_pl

Součet

6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-72,000	68,60	-4 939,20	D_21.01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	---------

10	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásyem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhuštění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	-80,000	531,00	-42 480,00	D_21.01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	---------

W

W

W

W

Viz PD D.21-001-023
Odstranění zábradlí (dl)
(-1)*(56*24)
Součet

-80,000

-80,000

D 997

Přesun sutě


-38 753,99

19	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	-67,320	68,70	-4 624,88	D_21.01
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-67,320	48,10	-3 238,09	D_21.01
21	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 279,080	11,50	-14 709,42	D_21.01
	W		(-67,320)*19 Přepočtené koeficientem množství		-1 279,080			
22	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-10,200	550,00	-5 610,00	D_21.01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-39,840	190,00	-7 569,60	D_21.01
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-15,800	190,00	-3 002,00	D_21.01

ET. 7, 8

INŽENÝR DBZ - SITUACE ÚPRAVY ROZSAHU REALIZACE STAVBY ORIENTAČNÍ PLOCHET 7, 8

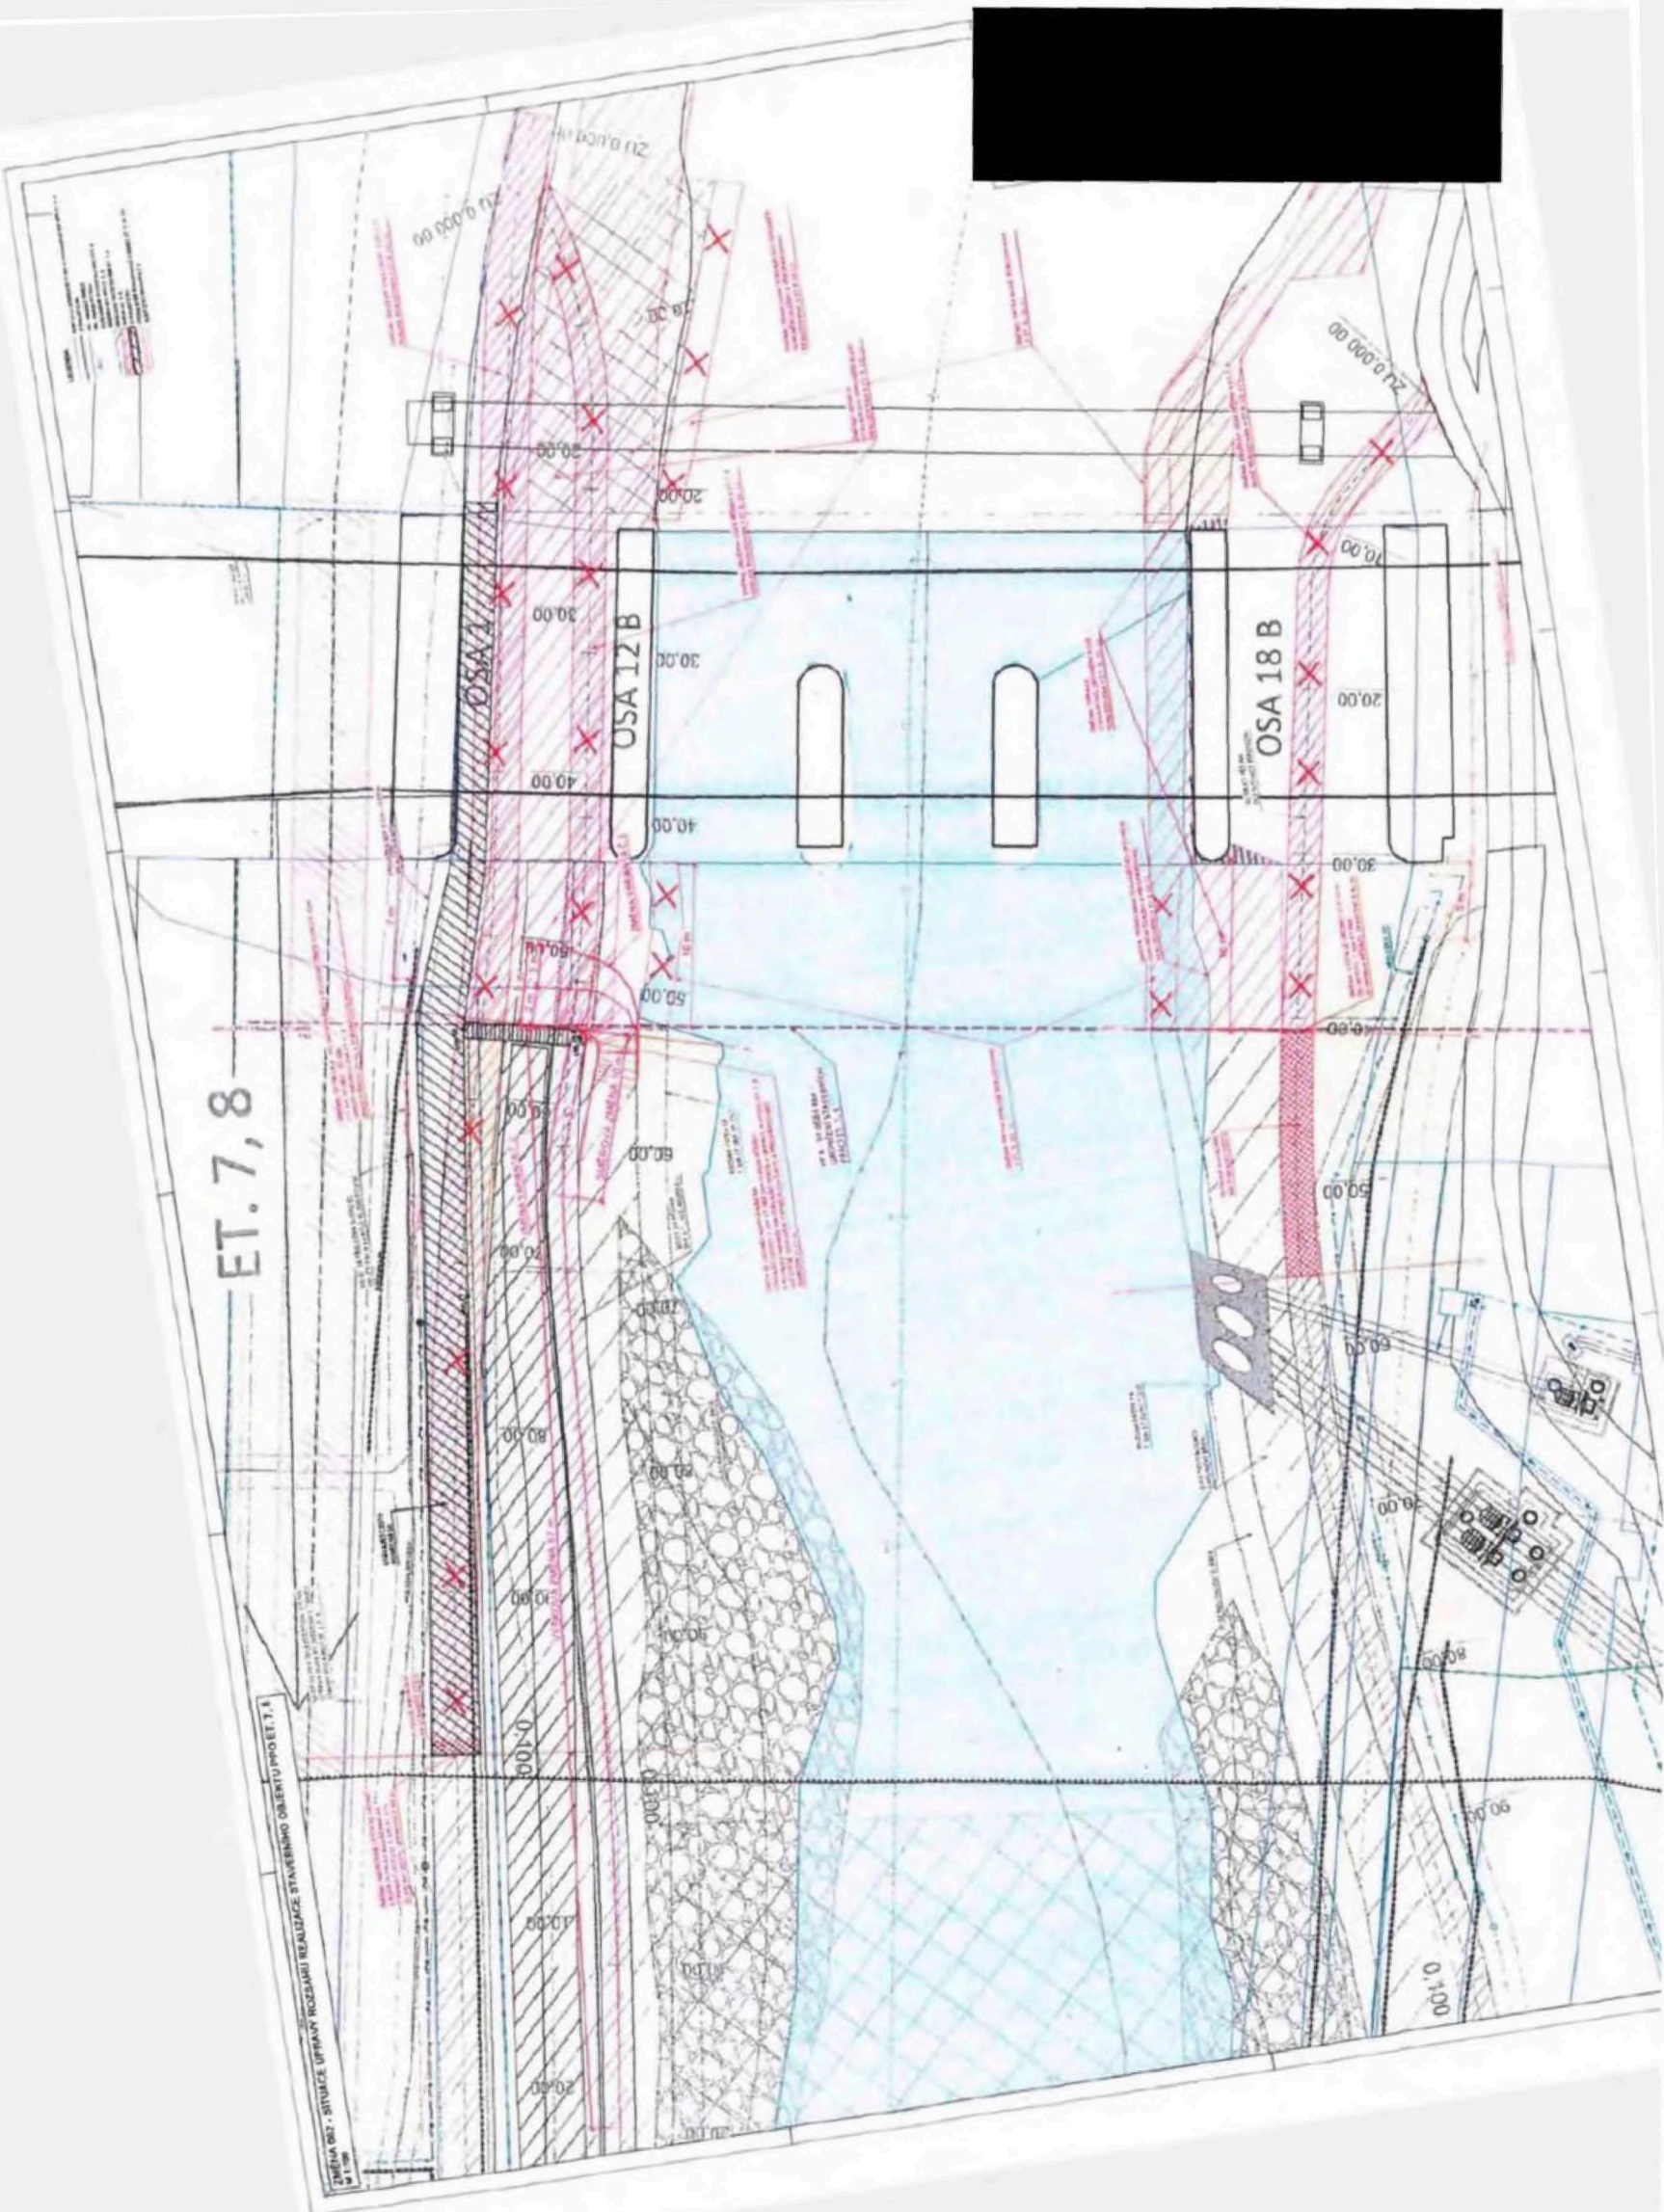

19.9.2023 Zástupce TDI zatím referenční úsek neodsouhlasil a požádal zástupce zhotovitele o provedení dostatečné vrstvy/mocnosti zásypu. Úprava frakcí 0/125 bude provedena až po úroveň budoucí pláně. Další kontrola proběhne po domluvě TDI a zhotovitele. Dojde k úpravě VV a příčného řezu. Ten bude upraven na základě kubatur referenčního úseku.

Zodpovídá zhotovitel

3.10.2023 Zástupce zhotovitele zaslal kubatury AD k zapracování. Bude upraven VV. Termínu úpravy v den konání KD AD nesdělil.

Za úpravu VV a příčného řezu zodpovídá AD

17.10.2023 Zástupce AD(Šindlar) poskytne potřebné podklady zástupci AD (Aplus) a ten vyhotoví závazné stanovisko. K termínu úpravy VV přítomní zástupci AD na KD neměli info.

Zodpovídá AD

31.10.2023 Zástupce AD (Aplus) obdržel potřebné podklady od zástupce AD(Šindlar). Termín pro upravený VV : do 7.11.2023. Zástupce TDI požádal ještě o vyhotovení vzorového příčného řezu obsahujícího všechny vrstvy. Ten AD přislíbil také do 7.11.2023

Zodpovídá AD

14.11.2023 V den konání KD zaslal AD opravený řez emailem. AD provede ještě úpravu tohoto řezu, aby byl čitelný. Zhotovitel zkontroluje zaslání řešení a poté informuje TDI, zda VV zpracuje sám.

Tato oblast není zapracována do ZM046.

Zodpovídá zhotovitel a AD

Po vzniku zápisu zhotovitel informoval, že tento VV zpracuje do 20.12.2023

28.11.2023 Zhotovitel na dnešním KD informoval, že má veškeré potřebné podklady pro zpracování VV a termín 20.12.2023 pro VV platí.

Za VV zodpovídá zhotovitel

12.12.2023 VV do 20.12.2023

Za VV zodpovídá zhotovitel

9.1.2024 Zhotovitel zaslal VV v elektronické podobě, připomínky TDI budou řešeny v den konání KD.

Za zapracování připomínek zodpovídá zhotovitel

23.1.2024 Jednání k dořešení po KD proběhlo, ale ještě nebylo odsouhlaseno. Zhotovitel a AD přislíbili zapracovat připomínky do 26.1.2024.

Zodpovídá AD a zhotovitel

13.2.2024 Připomínky TDI k VV bude řešit zástupce zhotovitele a zástupce TDI po skončení dnešního KD.

Zodpovídá TDI a zhotovitel

27.2.2024 Schůzka k dořešení VV po minulém KD proběhla. Nacenený VV obdržel zástupce TDI od zhotovitele

26.2.2024. Dle vyjádření TDI obsahuje VV nové položky, které nebyly projednány a nedošlo k zapracování domluveného. Zhotovitel na KD přislíbil, že tento VV s TDI dořeší do 1.3.2024.

Zodpovídá zhotovitel a TDI

12.3.2024 Schůzka proběhla. Zhotovitel provede sondu založení kamenné paty a následně zapracuje

připomínky TDI do VV. Termín : Do 19.3.2024

Zodpovídá zhotovitel

26.3.2024 Dle vyjádření TDI zasláný VV opět neobsahuje všechny položky dle domluvy. Po konání KD

proběhne další schůzka TDI a zhotovitele k dořešení.

Zodpovídá zhotovitel

4. Zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu ZM062

21.3.2023 V rámci PPO etapy IX a X. probíhá zpracování změny polohy cyklostezky na levém břehu u železničního viaduktu. Tato nová cyklostezka bude navazovat na nově budovanou cyklostezku v rámci etap VII, VIII přibližně v prostoru lávky CTP. Stávající cyklostezka v tomto prostoru zůstane zachována. Změna DPS bude. Změna DPS bude zpracována do 4.4.2021.

Zodpovídá AD

4.4.2023 Neproběhlo. Nový termín do : 11.4.2023

Zodpovídá AD

18.4.2023 Nebylo předáno. Dle informací zástupce KAM bude předáno do 2.5.2023

Zodpovídá AD

2.5.2023 Změna DPS bude předána zástupci KAM po skončení KD. Info na příštím KD.

Zodpovídá AD

16.5.2023 AD zpracovává změnu DPS, je potřeba ještě dořešit některé technické detaily. Dojde k úpravě, která se bude týkat obou etap PPO (VII-VIII i IX-XI). Pěšina v místě zůstává v původní poloze. Zodpovídá AD

30.5.2023 Dojde k úpravám v návaznosti na etapu IX-XI. Zbývá dořešit polohu spodní pěšiny a stanovit nápojně místo na stávající polohu stezky, doplnit příčné řezy na levém břehu. Zpracovatel PD pro etapu IX-XI projednával řešení se SŽ a obdržel k řešení od SŽ připomínky. Kompletní řešení AD (Šindlar) zpracuje za 14 dní po návratu z dovolené.

Zodpovídá AD

13.6.2023 Řešení bylo projednáno se SŽ a dle vyjádření AD s ním SŽ souhlasí. Výkresová část bude předána kompletní do konce týdne. Dle informace zástupců KAM bude navazující etapa IX, X, XI začínat cca 10m před viaduktem Uhelná. V rámci koordinace etap budou prováděny etapy VII, VIII ukončeny v místě začátku etap IX, X, XI. Výkresová část zpracovaná v rámci ZM 062 bude tyto koordinace obsahovat. Výkaz výměr upravující rozdíl v objemu prací bude součástí výkazu výměr ZM 046, který bude obsahovat kompletní změny v úpravě břehů koryta řeky.

27.6.2023 AD zašle elektronickou verzi dokumentace v den konání KD, v tištěné verzi bude předána do

30.6.2023. VV je zahrnut do ZM046.

Zodpovídá AD

11.7.2023 Připomínky TDI byly AD zaslány. Kontrolu provede i zhotovitel. AD zpracuje připomínky.

Zodpovídá : zhotovitel za kontrolu AD za zapracování připomínek

25.7.2023 Kontrola zhotovitele proběhla. AD Předá jedno paré v tištěné podobě k finální kontrole. Zodpovídá AD

8.8.2023 Zástupce AD předal zástupcům KAM jedno paré změnové DPS ke kontrole. Dle domluvy z dnešního KD ověří AD variantu snížení nivity stezky a vliv na délku opření paty v podélném směru a případný vliv této varianty na posun stezky. Detail řešení AD poté projedná se SŽ.

Termín : do 11.8.2023

Zodpovídá AD

22.8.2023 Detail řešení, včetně doplnění jímky a sypané hrázky do situačního výkresu byl zaslán TDI, KAM, zástupcům SŽ a dle informací od AD i zástupcům ČD. Info na příštím KD

5.9.2023 Zhotovitel přislíbil své vyjádření k dokumentaci, která byla již zaslána na SŽ do 6.9.2023. Stanovisko SŽ k tomuto řešení zatím nebylo zasláno, AD bude stanovisko urgovat. TDI upozornil na dopad do VV.

Info na příštím KD

19.9.2023 AD včera obdržel souhlasné stanovisko od SŽ pro ZM062. Souhlasné stanovisko od ČD je přislíbeno do konce 9/2023. VV bude pro ZM062 samostatně. Změna DPS bude zpracována kompletní, včetně VV do 29.9.2023.

Zodpovídá AD

3.10.2023 AD zatím neobdržel stanovisko od ČD pro ZM062 a provede další urgence na ČD. Probíhá další kontrola VV v souvislosti se změnou stezek. Zástupce TDI požádal o předání technického řešení alespoň v elektronické podobě pro potřeby zhotovitele. Elektronickou verzi zašle AD do 6.10.2023, případně prověří, zda je již v aktuální podobě vložena na sdíleném úložišti.

Zodpovídá AD

17.10.2023 AD zaslal souhlasné stanovisko ČD. Technické řešení je zpracované a kompletně vloženo na úložiště. AD (Aplus) zpracuje VV. Přítomní zástupci AD na KD neměli k termínu zpracování informace.

31.10.2023 Dle informací z dnešního KD zpracuje VV zástupce AD (Šindlar). Termín pro zpracování VV : přítomní zástupci AD neměli info k termínu zpracování a nebylo zasláno ani do doby rozeslání zápisu.

Zodpovídá AD

14.11.2023 Na dnešním KD zástupce AD informoval, že jeho subdodavatel má veškeré podklady pro zpracování VV. Termín pro zpracování VV : 24.11.2023

Za zpracování VV Zodpovídá AD

Zástupce zhotovitele na dnešním KD upozornil, že po cyklostezce v místě u viaduktu, jejíž část má být zachována se pohybuje těžká mechanizace a dochází k jejímu poškození. Práce z koryta nejsou možné. Zástupce zhotovitele provedl zápis do stavebního deníku a bude dále dokumentovat stav cyklostezky. Zástupce AD informoval, že tuto cyklostezku bude nutné uvést do původního stavu. Po skončení pohybu mechanizace bude vyhotoven ZL podle rozsahu nutných oprav.

Za dokumentaci poškození cyklostezky zodpovídá zhotovitel

28.11.2023 TDI na dnešním KD informoval, že dle sdělení KAM je uvažováno s opravou cyklostezky v PPO etapa IX,X,XI ve stávající poloze.

Pravděpodobně dojde po skončení pohybu těžké mechanizace pouze k zapravení cyklostezky tak, aby byl možný pohyb cyklistů. Zhotovitel bude dále dokumentovat stav této stezky.

Zodpovídá zhotovitel

VV nebyl zaslán. Chybí info k termínu zpracování VV.

12.12.2023 Zástupce AD informoval, že termín pro zpracování VV je do 19.12.2023.

Zodpovídá AD

9.1.2024 Na dnešním KD AD informoval, že VV bude dopracován do 12.1.2024. V tomto VV bude zapracována i obnova povrchu cyklostezky v místě.

Zodpovídá AD

23.1.2024 VV nebyl zaslán. AD zašle nenacenený VV do 26.1.2024, zhotovitel VV nacení.

Zodpovídá AD za zaslání VV a zhotovitel za nacenění

13.2.2024 TDI zaslal své připomínky k VV. Na dnešním KD zástupce AD informoval, že již v původním VV nebylo počítáno s bouráním cyklostezky a VV je tedy správně. AD tuto informaci ještě ověří u svého subdodavatele a případně zašle své závazné stanovisko.

Zodpovídá AD za zpracování připomínek a zhotovitel za nacenění VV

27.2.2024 Nesplněno. Bourání nebylo provedeno. Nový termín : 5.3.2024 – včetně zapracování připomínek TDI do VV. Připomínky byly zaslány dne 29.1.2024.

Zodpovídá AD

12.3.2024 V den konání KD zaslal AD dílčí část VV. Zástupce TDI upozornil, že dílčí rozpočty je nutné zkompletovat a rozdělit na vícepráce a méněpráce a poté zaslat zkompletovaný VV pro ZM062.

Termín : do 15.3.2024

Zodpovídá AD

26.3.2024 AD zaslal 25.3.2024 kompletní VV. Proběhne kontrola TDI.

Za kontrolu zodpovídá TDI

5. Nesoulad rozpočtu a projektové dokumentace stezek a komunikací u kolonády ZM073

31.10.2023 V rozpočtu jsou obsaženy pouze položky pro velkoformátovou dlažbu 500 x 500. Tyto položky nekorespondují s výkresovou částí, kde je uveden atypický formát dlažby 1060x600, 500,300 a tloušťka této dlažby bude min. 100mm, dále je v DPS uvedena žulová dlažba formátu 200x200, 200x150. Ve VV jsou pouze
