

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - L

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 104/1

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení Z + F lávka Lysá n/L
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; IČO:25117947, DIČ:CZ699004936
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno; IČO:25317628, DIČ:699004936

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-166 709,43	302 607,81	135 898,37

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-166 709,43	302 607,81	135 898,37

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 104/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 5/3
Strany smlouvy o dílo [S-788/00066001/2023] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Sdružení Z + F Lávka Lysá n/L		
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 4. Rozpis ocenění Změn položek 5. Přehled zařazení změn do Skupin 6. Přehled dokladů 7. Soupis prací SO po všech změnách Další doklady dle přehledu dokladů	 1 2 1 1 1 1 2 92	počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů
Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize		
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změna povrchu cyklostezky, úprava množství dle skutečného provedení a upřesnění prováděná v rámci zpracování RDS		
Dílčí změna 1.Důvody změny směsi ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 jsou kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, která je vhodnější spíše pro komunikace s velkým zatížením. Viz zápis z KD. Tato změna se týká položek: 24, 34 Dílčí změna 2.Úprava množství dle skutečně zjištěného množství prostavěnosti. Viz zápis ve stavebním deníku. Tato změna se týká položek č. 3, 5, 15 Dílčí změna 3.Úprava množství dle skutečně zjištěného množství násypů dle přiloženého protokolu zaměření. Důvodem pro navýšení množství byly terénní změny v prostoru stavby v období mezi vypracováním projektu a jeho realizací. Provedení bylo nezbytné pro realizaci díla. Tato změna se týká položky č. 11 Dílčí změna 4.V průběhu stavby byla zjištěna přítomnost železobetonových panelů v místě zřizování stupňů v podloží. Tyto panely byly odstraněny. Viz zápis ve stavebním deníku a přiložená fotodokumentace. Celkem 10 panelů o rozměru 3200x1100x170mm - 10x0,6m3=6m3. Tato změna se týká položek č. 35, 36 Dílčí změna 5.Sjednocení povrchové úpravy zábradlí podél cyklostezky s povrchovou úpravou na mostním zábradlí dle pokynu investora. Viz zápis z KD. Tato změna se týká položky č. 37 Dílčí změna 6.Vzhledem k technickému provedení asfaltových vrstev, bylo zjištěno, že spojení asfaltových vrstev a ohrub je dostatečné a těsnění dilatační záhlavkou podél ohrub proto není nutné. Zůstává pouze v napojení na stávající komunikaci. Viz zápis z KD. Tato změna se týká položky č. 32 Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-166 709,43	302 607,81	135 898,37	469 317,24

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis
-----------------------------	-------	---------------------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
-------------------------------------	--	--	--

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Mgr. Michael Kalný	podpis
-----------------------------	-------	--------------------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
------------------------------	-------	-------------------	--------

Stavební dozor:	jméno	Pavel Šeda	podpis
-----------------	-------	------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	[Doplňte]	podpis
---	-------	-------------	--------

Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	František Jelínek	podpis
-------------------------------	-------	-------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
--	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek této Smlouvy. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
-------------------------------	-------	----------------------	--------

Zhotovitel:	jméno	Ing. Alexander Strádal	podpis
-------------	-------	------------------------	--------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 104/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné

Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 002 495,99

Cena SO/PS v předchozích ZBV:		[Vypíšte všechny buňky]		Údaje v Kč bez DPH	
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě	
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1	
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 002 495,99	0,00	

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:		Údaje v Kč bez DPH		
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-166 709,43	302 607,81	302 607,81	15,11%

Cena SO/PS po této ZBV:		Údaje v Kč bez DPH		
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-166 709,43	2 138 394,36	135 898,37	6,79%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 104/1

Doklad		počet listů
07_ soupis prací po změnách		2
08_ 5. Dopis - oznámení ZBV KSUS		2
09_ Pasport změny v PDPS		5
10_ 1. Souhlas se zpracováním ZBV		1
11_ 2. Souhlas se zpracováním ZBV		1
12_ 3. Souhlas se zpracováním ZBV		1
13_ 4. Souhlas se zpracováním ZBV		1
14_ 5. Souhlas se zpracováním ZBV		2
15_ 6.Souhlas se zpracováním ZBV		1
16_ KD 05 2023 Lávka a cyklostezka Litol		6
17_ Hlavní stavební deník		11
18_ SD SOI04		14
19_ KD 13 2023 Lávka a cyklostezka Litol		8
20_ KUBATURA LYSA NAD LABEM_		1
21_ PROTOKOL KUBATURA		2
22_ Protokol o výpočtu kubatury		4
23_ Fotodokumentace		9
24_ Nabídka Blaník Aircraft CZ		2
25_ Nabídka SPEKTRUMLAK CZ		1
26_ Nabídka Zbyněk Sustr s.r.o.		1
27_ Vyjádření TDI k ZBV5_ Litol		2
28_ Vyjádření AD12_ 24-09-30		2
29_ Foto		9
30_ 1. Dopis - oznámení ZBV KSUS		2
31_ 2. Dopis - oznámení ZBV KSUS		1
32_ 3. Dopis - oznámení ZBV KSUS		1
33_ 4. Dopis - oznámení ZBV KSUS		1
34_ 6. Dopis - oznámení ZBV KSUS		1
Počet listů celkem		92

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Číslo a název SO/PS: SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné Číslo a název rozpočtu: SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uznatelné					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2 002 495,98	-166 709,43	302 607,81	2 138 394,35	135 898,37	6,79
								119 660,69	0,00	0,00	119 660,69	0,00	0,00
								90 911,90	0,00	0,00	90 911,90	0,00	0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup vč.dovozu zemina kvality ornice 648,56*0,15=97,284 [A]	M3	97,284	97,284	0,000	934,50						
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol.11130 217,3*0,3*2,0=130,380 [A]	T	130,380	130,380	0,000	220,50	28 748,79	0,00	0,00	28 748,79	0,00	0,00
1 Zemní práce													
3	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.likvidace 871,0=871,000 [A] ZBV5 - Výpočet - prostá změna množství	M2	871,000	690,650	-180,350	204,75	178 337,25	-36 926,66	0,00	141 410,59	-36 926,66	-20,71
4	11130	SEJMUTÍ DŘEVU tl.300 mm vč.odvozu a uložení na skládku 217,3=217,300 [A]	M2	217,300	217,300	0,000	115,50	25 098,15	0,00	0,00	25 098,15	0,00	0,00
5	112048	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM vč.likvidace 19=19,000 [A] ZBV5 - Výpočet - prostá změna množství	KUS	19,000	8,000	-11,000	1 291,50	24 538,50	-14 206,50	0,00	10 332,00	-14 206,50	-57,89
6	125731	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM zemina do násypu a výkopávek 143,53=143,530 [A]	M3	143,530	143,530	0,000	115,50	16 577,72	0,00	0,00	16 577,72	0,00	0,00
7	126731	ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM zazubení svahu - vč.odvozu na meziskládku 130,7+8,83*1+4*1=143,530 [A]	M3	143,530	143,530	0,000	227,85	32 703,31	0,00	0,00	32 703,31	0,00	0,00
8	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu 143,53-24,6=118,930 [A]	M3	118,930	118,930	0,000	75,60	8 991,11	0,00	0,00	8 991,11	0,00	0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 143,53=143,530 [A]	M3	143,530	143,530	0,000	20,37	2 923,71	0,00	0,00	2 923,71	0,00	0,00
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ AZ 109,0=109,000 [A]	M3	109,000	109,000	0,000	670,95	73 133,55	0,00	0,00	73 133,55	0,00	0,00
11	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp 1013,9-118,93=894,970 [A] ZBV5 - Výpočet - prostá změna množství - viz. příložené geodetické zaměření	M3	894,970	1 003,570	108,600	670,95	600 480,12	0,00	72 865,17	673 345,29	72 865,17	12,13
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu 0,15*2*82,0=24,600 [A]	M3	24,600	24,600	0,000	255,15	6 276,69	0,00	0,00	6 276,69	0,00	0,00
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 267,456=267,456 [A]	M2	267,456	267,456	0,000	17,01	4 549,43	0,00	0,00	4 549,43	0,00	0,00
14	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Zemina v kvalitě ornice tl.150 mm 648,56=648,560 [A]	M2	648,560	648,560	0,000	42,00	27 239,52	0,00	0,00	27 239,52	0,00	0,00
15	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM odhad 2,0x2,0=4,0m2/kus 11*4,0=44,000 [A] ZBV5 - Výpočet - prostá změna množství	M2	44,000	0,000	-44,000	311,64	13 712,16	-13 712,16	0,00	0,00	-13 712,16	-100,00
2 Základy													
16	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Vsakovací žebro ŠD 16/32 1*8,83+4*1=12,830 [A]	M3	12,830	12,830	0,000	929,25	11 922,28	0,00	0,00	11 922,28	0,00	0,00
17	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 8,83*2+11,53*1+4*2+8*1=45,190 [A]	M2	45,190	45,190	0,000	89,25	4 033,21	0,00	0,00	4 033,21	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce													
								59 733,90	0,00	0,00	59 733,90	0,00	0,00
18	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 lože dlažby tl.150 mm 20,0*0,15=3,000 [A]	M3	3,000	3,000	0,000	3 643,50	10 930,50	0,00	0,00	10 930,50	0,00	0,00
19	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO SP - lože dlažby tl.150 mm 20,0*0,15=3,000 [A]	M3	3,000	3,000	0,000	1 003,80	3 011,40	0,00	0,00	3 011,40	0,00	0,00
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba z lomového kamene tl.300 mm do betonu 20,0*0,3=6,000 [A]	M3	6,000	6,000	0,000	7 632,00	45 792,00	0,00	0,00	45 792,00	0,00	0,00
5 Komunikace													
21	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SD 0-63 tl.200 mm 254,72*1,05=267,456 [A]	M2	267,456	267,456	0,000	514,09	137 496,46	0,00	0,00	137 496,46	0,00	0,00
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	254,720	254,720	0,000	36,19	9 218,32	0,00	0,00	9 218,32	0,00	0,00

[illegible]

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov


V Praze dne 19.10.2023

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených události / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Na základě požadavku správce mostního objektu nebude z důvodu zachování bezpečného přístupu pro kontrolu a údržbu mostu a zajišťování pravidelných mostních prohlídek provedena demolice schodů, chodníku a navazujícího odvodňovacího žlabu na SO 202. Na schodišti bude provedeno opatření k zamezení přístupu veřejnosti.
- 2) Vzhledem k technickému provedení asfaltových vrstev, bylo zjištěno, že spojení asfaltových vrstev a obrub je dostatečné a těsnění dilatační zálivkou podél obrub proto není nutné. Také není vhodné provádět prořez přímo u hrany s obrubníkem, který by tímto byl narušen a to především v místech s vysokými poměry směrových oblouků cyklostezky. Zůstává pouze v napojení na stávající komunikaci. Viz zápis z KD.
- 3) V průběhu stavby vyplynula na základě záplavové zkoušky potřeba lepšího odvodnění stávajícího svahu na SO 103. Na koordinační schůzce mezi objednatelem, stavebníkem, a vodoprávním úřadem města Lysá n. Labem, bylo navrženo řešení v podobě vsakovacího žebra pod svahem na SO 103. Viz zápis z KD.



Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem



PASPORT ZMĚNY V PDPS - pro ZBV č:		Počet příloh: 1/1
Stavba: (Název a evidenční číslo Stavby) Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe Stavba: 1728300LysaCykl		Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): (číslo a název SO/PS) SO 102 Úprava komunikace – náklady nůznatelné
Název Změny: Dopracování PDSP do stupně RDS		Třída změny *) B
Kdo Změnu požadoval: (organizace) Sdružení „Z+F lávka Lysá n/L“		Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j. Projednána KD č. 6 dne 8.8.2023

Podrobný technický popis Změny:

1. Vyjmutí prací týkajících se rekonstrukce stávajícího oplocení na SO 102.
2. Vyjmutí prací týkajících se konstrukce křižovatky.

Zdůvodnění Změny:

1. V rámci detailního průzkumu území pro dopracování RDS, bylo shledáno, že rekonstrukce stávajícího oplocení není, vzhledem ke stávajícímu stavu, nutná, jelikož původní oplocení, které mělo být nahrazeno již bylo zrušeno.
Tato změna se týká položek: 16, 17, 18, 25, 28
2. Původní projekt předpokládal výstavbu křižovatky v prostoru původní cesty, kde ale mezitím byla zhotovena asfaltová komunikace. Navržené řešení je napojení SO 102 do stávající konstrukce silnice. Autorský dozor stanovil množství méněprací.
Tato změna se týká položek 2, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

Položky plusové: [A]

Položky minusové: [B]

Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (kódy položek):

			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-13,40 %
2	015111				
8	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-33,16 %
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-30,46 %
12	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	-12,30 %
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-28,35 %
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	-18,53 %
16	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	-100,00 %
17	33817D		VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	-100,00 %
18	34825		PLOTOVÉ ZIDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	M3	-100,00 %
19	56143		KÁMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM	M2	-30,31 %
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	-28,35 %
21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-30,31 %

22	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-30,31 %
23	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-30,31 %
24	574F56	ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	-30,31 %
25	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	-100,00 %
26	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-12,67 %
27	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	-12,67 %
28	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	-100,00 %

Nové položky: [C]

Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:
+ [A] - [B] + [C] = -497.675,82 Kč

Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:
0,00 Kč

Hlavní inženýr projektu R
(obchodní firma, jméno, datum)
Firesta-Fišer, rekonstrukce,

Stanovisko autorského do

PONTEK spol. s r.o.

Stanovisko Technického

*j Třída Změny:

A - Změna je ku prospěchu náje

B - Změna vyplývá z odlišné ú

C - Změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (noviny, TČP, TP) za účelem zvýšení nízkoých parametru nebo životnosti díla

D - Změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měř

PASPORT ZMĚNY V PDPS - pro ZBV č:		Počet příloh: 1/1
Stavba: (Název a evidenční číslo Stavby) Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe Stavba: 1728300LysaCykl		Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): (číslo a název SO/PS) SO 103.1 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady uznatelné
Název Změny: Dopracování PDSP do stupně RDS		Třída změny *) B
Kdo Změnu požadoval: (organizace) Sdružení „Z+F lávka Lysá n/L“		Změna projednána na technické radě dne / zápis č. j. Projednána KD č. 6 dne 8.8.2023

Podrobný technický popis Změny:

- Změna asfaltové směsi z modifikované na nemodifikovanou.
- Demontáž a zpětná montáž svodidel.

Zdůvodnění Změny:

- Důvody změny směsi ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 jsou kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, která je vhodnější spíše pro komunikace s velkým zatížením. Tato změna se týká položek: 23, 32
- Stávající svodidla byla shledána v dobrém stavu a jejich instalace v rozsahu, který odpovídá požadavku PDPS. Není tudíž nutná jejich náhrada a bude místo toho provedena zpětná montáž. Tato změna se týká položek: 27, 33

Položky plusové: [A]

Položky minusové: [B]

23	574B21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM	M2	-100,00 %
27	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-100,00 %

-100 %
-201.861,57 Kč

Nové položky: [C]

32	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	+100,00 %
33	91932	ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO SILNIČNÍHO	M	+100,00 %

+100 %
+104.354,91 Kč

Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:
 + [A] - [B] + [C] =

Cenové ovlivnění SO/PS:
 0,00 Kč

Hlavní inženýr projektu
 (obchodní firma, jméno, příjmení)
 Firesta-Fišer, rekonstrukce

Stanovisko autorské
 PORTEX s.r.o.

Stanovisko Technické

*) Třída Změny:
 A - Změna je ku prospěchu
 B - Změna vyplývá z od
 C - Změna vyplývá z akceptace změn v negativě (změny, 1x1, 11) za účelem zvýšení některých parametrů nebo zvýšení funk
 D - Změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měř

PASPORT ZMĚNY V PDPS - pro ZBV č:		Počet příloh: 1/1
Stavba: (Název a evidenční číslo Stavby) Lávká vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe Stavba: 1728300LysaCykl		Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): (číslo a název SO/PS) SO 103.2 Cyklostezka na levém břehu Labe – náklady neuznatelné
Název Změny: Dopracování PDSP do stupně RDS		Třída změny *) B
Kdo Změnu požadoval: (organizace) Sdružení „Z+F lávká Lysá n/L“		Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j. Projednána KD č. 6 dne 8.8.2023

Podrobný technický popis Změny:				
1. Změna asfaltové směsi z modifikované na nemodifikovanou.				
Zdůvodnění Změny:				
1. Důvody změny směsi ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 jsou kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, která je vhodnější spíše pro komunikace s velkým zatížením. Tato změna se týká položek: 18, 23				
Položky plusové: [A]				
Položky minusové: [B]				
18	574B21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM	M2	-100,00 %
-100 % -161.666,02 Kč				
Nové položky: [C]				
23	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	+100,00 %
+100 % +143.431,61 Kč				
Cenový dopad Změny v rámci SO/PS: + [A] - [B] + [C] = -18.234,41 Kč				

Cenové
0,00 Kč

Hlavní in
(obchodní
Firesta-F

Stanovis

PON

Stanovis

*) Třída Z
A - Změn
B - Změn
C - Změn
D - Změn

PASPORT ZMĚNY V PDPS - pro ZBV č:		Počet příloh:	1/1
Stavba: (Název a evidenční číslo Stavby) Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe Stavba: 1728300LysaCykl		Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): (číslo a název SO/PS) SO 104 Cyklostezka na pravém břehu Labe - náklady uзнatelné	
Název Změny: Dopracování PDSP do stupně RDS		Třída změny *) B	
Kdo Změnu požadoval: (organizace, u ŘSD jmenovitě) Sdružení „Z+F lávka Lysá n/L“		Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j. Projednána KD č. 6 dne 8.8.2023	

Podrobný technický popis Změny: 1. Změna asfaltové směsi z modifikované na nemodifikovanou.				
Zdůvodnění Změny: 1. Důvody změny směsi ACO 8 PMB na ACO 8 60/70 jsou kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, která je vhodnější spíše pro komunikace s velkým zatížením. Tato změna se týká položek: 23, 36				
Položky plusové: [A]				
Položky minusové: [B]				
23	574B21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM	M2	-100,00 %
-100 % -83.920,06 Kč				
Nové položky: [C]				
36	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	+100,00 %
+100 % +74.454,66 Kč				
Cenový dopad Změny v rámci SO/PS: + [A] - [B] + [C] = -9.465,39 Kč				
Cenové ovlivnění sousedních SO/PS: 0,00 Kč				

Hlavní inženýr (obchodní firma) Firesta-Firesta
Stanovisko POKR
Stanovisko

*) Třída Změny
 A - Změna
 B - Změna
 C - Změna
 D - Změna

V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“ - ohlášení změny během výstavby č. 1

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 1, jejímž přednětem je:

1. Snižování objemu prací na SO 102 o úpravu křižovatky v prostoru původní cesty a opravu stávajícího oplocení.
2. Změna asfaltové směsi z ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 na SO 103 a SO 104.
3. Ponechání stávajících svodidel v úseku SO 103.
4. Sjednocení technologie dláždění v úseku SO 103 s objekty SO 202, SO 104 a zbývajících mostních konstrukcí mimo stavbu.

Nutnost změny asfaltové směsi v bodě 2. bude řádně posouzena a odsouhlasena ze strany TDS a AD. Faktický stav svodidel na SO 103 posoudí a jejich ponechání odsouhlasí TDS a AD.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic

Stř
přis
Zbor
ICO

Právnísek veřejné správy

Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 1.

V Kolině

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II^a - ohlášení změny během výstavby č. 2

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II^a**“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 2, jejímž předmětem je nutnost odstranění 19 ks železobetonových panelů v místě zřizování stupňů podloží, které byly nalezeny po odstranění drnu na SO 103 a 104. Tyto panely brání postupu prací a proto je nutné je odstranit.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

P

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 2.

V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II^a - ohlášení změny během výstavby č. 3

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II^a“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 3, jejímž předmětem je navýšení množství násypů na SO 103, SO 104 a SO 202, zjištěné zaměřením skutečného množství. Zhotovitel tuto skutečnost doloží protokolem z geodetického zaměření.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Proje

ic
①
5
01

PR

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 3.

V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II* - ohlášení změny během výstavby č. 4

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II***“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 4, jejímž předmětem je sjednocení barevnosti zábradlí na SO 103 a SO 104 se zábradlím na mostním objektu SO 202. Tato změna vzniká na základě požadavku investora.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

Projektový manažer: Bc. Petr Lysáček

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 4.

V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II* - ohlášení změny během výstavby č. 5

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II*“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 1, jejímž předmětem je:

1. Na základě požadavku správce mostního objektu (KSÚS) nebude z důvodu zachování bezpečného přístupu pro kontrolu a údržbu mostu a zajišťování pravidelných mostních prohlídek provedena demolice schodů, chodníku a navazujícího odvodňovacího žlabu na SO 202. Na schodišti bude provedeno opatření k zamezení přístupu veřejnosti..
2. Neprovedení těsnění dilatační zálivkou podél obrub cyklostezky z důvodu dostatečného spojení realizovaných asfaltových vrstev s obrubami a nebezpečí poškození obrub při profezech především v místech s vysokými poměry směrových oblouků cyklostezky.
3. Zajištění odvodnění na stávajícím svahu SO 103 realizací vsakovacího žebra pod tímto svahem na základě výsledků záplavové zkoušky a požadavku vodoprávního úřadu.

Způsob řešení bez provedení těsnění dilatační zálivkou podél obrub bude řádně posouzen a odsouhlasen TDS a AD.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

KSÚS
PRAHA
ZEPRIS
IČ

František Jelínek

Projektový manažer oddělení cyklostezky a P+R

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 5.



V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II* - ohlášení změny během výstavby č. 6

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II*“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 6, jejímž předmětem jsou doměrky dle skutečně zjištěného množství prostavěnosti, týkající se zejména množství odstranění křovin, kácení a ochrany stromů.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

přís
Zbor
IČO:

Projektový manažer: Václav Čech, Lysá nad Labem

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 6.

Zápis z kontrolního dne stavby

„Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem-bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe“

Kontrolní den			
Číslo	5	konaný dne	11.7. 2023
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD			
Program kontrolního dne / operativní porady			
1. Předání staveniště			
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:			
a) popis provedených prací			
b) plnění věcného HMG			
c) finanční plnění			
3. Kontrola úkolů z minulého KD			
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období			
5. Stav BOZP a PO			
6. Nové úkoly			
7. Různé			
8. Závěr			
1. Předání staveniště			
předání staveniště		02.05.2023 bylo provedeno předání staveniště, investor předal staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný „Protokol o předání a převzetí staveniště“.	
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby			
a) popis provedených prací		15.05.2023 osazeno DIO, doprava na mostě je svedena do pravého jízdního pruhu s průjezdem na semaforech. SO 202 - dokončeno odbourání desky chodníku na levé straně mostu. Nakoupen materiál pro výrobu ocelové části lávky. probíhá přejímka dle TKP 19 A. Provedeno vybourání 1 poloviny mostního závěru, betonáž rozšiřujících konzol na levé straně mostu u OP1 a OP4, zahájena montáž lešení. Probíhá dokončování zemních prací, spodní stavby a hutněného násypového tělesa na SO 102 úprava komunikace, 103 cyklostezka na levém břehu a 104 cyklostezka na pravém břehu.	
b) plnění věcného HMG		Práce byly zahájeny a probíhají dle schváleného harmonogramu. Předpoklad dalších prací a termínů: - 12.7.2023 přejímka ocelových prvků lávky u zhot. Firesta v Brně - montáž lešení do cca 20.7. - od 12.7. zahájení pokládky obrub na SO 103 - 14.7. kontrolní zkoušky hutněných násypů - SZZ	
c) finanční plnění		Odsouhlasena fakturace za 06/2023 ve výši 3 273 245,89 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 4 429 141,13 Kč bez DPH. Fakturaci za 06/2023 předložit max do 12.7.2023 na podatelnu KSÚS.	
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 05/2023		„LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM-BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL - LABE“	FORMULÁŘ KD/OP
		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

Minulé úkoly				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.1.	Odkup dřevní hmoty	Zhotovitel ZEPRIS odkoupí za cenu uvedenou ve smlouvě vykácenou dřevní hmotu na staveništi. KD4: pro společnou objednávku odkupu zhot. dodá znalecký posudek na kostky	Zhot	trvá
1.2.	Předání výzisku-zábradlí	Demontované zábradlí bude protokolárně předáváno na KSÚS Mochov	Zhot	trvá
2.1.	Použití nemodif. asf. směsí	Zhotovitel navrhnul použít nemodif. asf. směsí (do konstrukce vozovky). K návrhu se vyjádří AD. KD3: AD předběžně souhlasí a vyjádří se písemně. KD5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn.	Zhot	
2.2.	Oplocení	V PD je zakresleno oplocení, ve skutečnosti se jedná o ohradník. AD se vyjádří, zda-li bude oplocení zřízeno dle rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stáv. ohradníku, který zasahuje do cyklotrasy a oplocení nebude realizováno. KD3: AD předběžně souhlasí s vypuštěním oplocení a podrobně se vyjádří ve svém písemném stanovisku. KD4: předpoklad nahrazení plotu ohradníkem, dle skutečnosti zachycené při stavbě, AD musí odůvodnit změnu pův. návrhu z důvodu dotací KD5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn.	Zhot	
2.3.	Křižovatka pod mostem	Po geodetickém vytyčení rozsahu vozovky průsečné křižovatky pod mostem geodetem Zhotovitele bylo zjištěno, že se směr. oblouk dostává do blízkosti kořenového systému stáv. stromu. U výškového řešení kříž. větve (směr Labe) je výškový rozdíl mezi stáv.stavem a projektem cca 0,25 m? AD potvrdí a zdůvodní navržené řešení nebo ev. navrhne úpravu pův. řešení. KD3: AD se domnívá, že kořenový systém nevede k vybudování napojení. Zdůvodnění zašle písemně. KD4: předpoklad vyjmutí křižovatky ze stavby a napojení SO 102 do stáv. pobřežní asfalt komunikace. Nutné vyjádření AD včetně info k případné souvislosti původního návrhu s územním plánem a rozvojem cyklotrasy atp. KD5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn.	Zhot	
2.4.	Havarijní plán	Zhotovitel předá Havarijní plán stavby KD3: Zhotovitel předal Havarijní plán stavby, který se odsouhlasuje. KD4: dle info ZHOT včera předběžně schválen KD5: HP schválen. Zhot zaslat sken včetně Rozhodnutí.	Zhot.	trvá
3.1.	Cyklistické dopravní značení	Středočeský kraj požaduje vybudování cyklistického dopravního značení. Svůj požadavek oznámí písemně Zhotoviteli i	KRAJ/ZH	trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO				FORMULÁŘ KD
KD 05/2023		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/4

		s podklady. Zhotovitel nacení změnu a předloží ke schválení Objednateli i se souhlasem PČR. KD4: Zatím od Stčk nežadáno		
3.2.	Vodoprávní úřad	Zástupce Vodoprávního úřadu pan Kašpar bude zván na KD a bude po schválení Havarijního plánu provádět kontrolu jeho plnění na stavbě KD5: Zástupce MÚ Lysá přítomen, aktuálně bez připomínek, kontrola dále průběžně.	TDI/ZH	Splněno, vypustit ze sledování.
3.3.	Napojení SO 102	AD musí dopřesnit napojení SO 102 na místní komunikaci v rámci místního šetření. KD5: dtto bod 2.3, viz vyjádření AD	AD	Splněno, vypustit.
4.1.	Info o zahájení montáže lešení	Zhotovitel dá v předstihu MÚ pí. Formánkové přesný termín zahájení montáže lešení.	Zhot	Splněno, vypustit.
4.2.	Autorský dozor na KD	Objednatel žádá účast AD na KD k projednání aktuálních změn v PD	AD	Splněno, vypustit.
4.3.	Kácení stromů	Objednatel podá žádost na kácení 2 ks kolizních stromů.	KSÚS	Trvá
4.4.	Zábradlí u cyklostezky	Sjednotit povrchovou úpravu zábradlí cyklostezky s úpravou na mostě včetně RAL KD5: Dle stanoviska zást. AD lze barvu sjednotit s barvou dle VTD na mostě, objednatel souhlasí. Zhot. předloží návrh tvaru zábradlí. Za AD doporučena výplň svislá v rozteči cca 1/2 výšky otvoru.	Zhot	Trvá
4.5.	Podloží SO 102	V podloží SO 102 zachycen únosný kamenitý podklad, zhot navrhuje ponechat, předá variantní návrh řešení.	Zhot	

4. Kontrola kvality

a) zpráva o vyhodnocení kvality	Průběžně, odsouhlaseny Tepř. dle postupu prací. Zkoušky, laboratorní deníky nehodnoceno, proběhly SZZ na podloží a násypu SO 103,104, kontrolní zkoušky betonu na SO 202.
---------------------------------	--

5. Stav BOZP a PO


Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí všechny zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli seznámeni.

Kontrola průběžně, viz samostatný elektronický inspekční deník koordinátora BOZP.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
5.1.	BOZP – schodiště	Udržovat bezpečné provizorní schodiště, zatluout uvolněné hřebíky.	Zhot.	

7. Různé

1.1		provádí zástup Ing. Jindřich Přívratský

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 05/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 3/4

8. Závěr

Datum konání příštího KD / OP

KD č.6 - 25.07.2023 ve 13,00 hod. na stavbě

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

Pavel Šeda

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD
2	Stanovisko AD č.1
3	

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 12.7.2023 na adresy uvedené v Prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li** účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání **zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		FORMULÁŘ KD
KD 05/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4

Prezenční listina KD č.5

Název akce: „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“			
Místo konání: Litol			
Datum konání: 11.07.2023			
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
František Jelínek	K	724 913 649	
Martin Dvořák	K	702 242 719	
Lukáš Kalecký	K	702 067 515	
Pavel Šeda	P	730 857 697	
Ing. Jindřich Přivratský	P	604 220 703	
Jakub Líha	P	734 234 961	
Martin Vysloužil	Z	734 863 181	
Michael Kalný	Z	725 950 706	
Marek Šulc	P	602 100 967	
Ing. Petr Jelínek	P	602 773 253	
Dana Urban Hančová	K	602 444 738	
Petra Posseltová	L	325 510 231	

Lávka vč. cyklostezky Lysá n./L.
-Bezbariérová trasa a cyklotrasa

STAVEBNÍ

Litol-Labe

DENÍK č.1

Hlavní stavební deník



7.5.2013




53 listů

samokopírovací

14 006

9568 RVD+



Firma.....

STAVEBNÍ DENÍK

Stavby Lávka vř. cyklostezky Lysá nad Labem
Bezbaníková trasa a cyklotrasa Litá - Labe

Informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

Pro objekt (označ. podle investič. plánu)

Kraj Středočeský

Úsek Hlavní stavební deník

Okres Nymburk

Obec Lysá nad Labem

Místo Most Bohumila Hrabala

Zúčastněné strany:

Jména, adresy, telef., odpov. zástupců:

Investor KSÚS Středočeského kraje

Technický (stavební)
dozor investora

Podis a.s.

TDI

Pavel Šedů 730 857 607

BOŽP

Petr Jelinek 602 773 253

Generální dodavatel

Správní, z.ř. Lysá n/L

Zepis, s.r.o.

Firesta - Fišer, rekonstrukce, st.

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Jiří Pokorný 724 752

Stavbyvedoucí

Mgr. Michael Kalný 725 950 70

Generální projektant

Ing. Pavel Hladina 10 00 0042 819

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Pontex, spol. s r.o.

ZMĚNY A DOPLŇKY

Vedení SD: Michael Kalný

Pověřuji vedením SD u Prací na stavbě


Michaela Kalného


LAUKA 49.4.4.L.
Heslo 1) 0.1.

Verz. 0300076

Datum	Zúčastněné strany:
2.5.23	Dnes proběhlo předání stavení.
Stav	Zápis z předání viz samostatný protokol.
	
	za TDI
16.5.23	Dnes proběhl 1. kontrolní den.
Stav	Zápis z KD viz samostatný protokol.
	
30.5.23	Dnes proběhl 2. kontrolní den.
	Zápis z KD viz samostatný protokol.
	
5.6.23	Dnes proběhlo vytyčení sítě společnosti ČEZ a CETIN. Zápis viz samostatné protokoly.
	
13.6.23	Dnes proběhl 3. kontrolní den.
	Zápis z KD viz samostatný protokol.
	

Datum	Zúčastněné strany:
27.6.23	Dnes proběhl 4. kontrolní den. Zápis z KD viz samostatný protokol.
	
11.7.23	Dnes proběhl 5. kontrolní den. Zápis z KD viz samostatný protokol
	
25.7.23	Dnes proběhl 6. kontrolní den. Zápis z KD viz samostatný protokol.
	
	Kontrola stavby pod BHPV hlavce konstrukce po spáse provedení kontrol: Podpěrování základů BHPV. Uplatnění na provedení výhledu po ukončení práce ve výloze pod mostem a vnitřní základy vstupu na konstrukci z nábytkem z této útrahy
	KLITOL, dne 25.7.23 PAVLA
	

Datum	Zúčastnění strany:
28.23	Dnes proběhl 2. kontrolní den. Zápis z KD viz. samostatný protokol. 
22.8.23	Dnes proběhl 3. kontrolní den. Zápis z KD viz. samostatný protokol. 
5.9.23	Dnes proběhl 4. kontrolní den. Zápis z KD viz. samostatný protokol. 
	zpr. TDI. V rámci ED 9 upozornění předložením na bove dělá a zápisu konceptu všech EDU, které dříve nebyly předloženy. Znovu je k tomu upozornění ihned po zjištění zápisu v pracovní starosti, nelze je fakturovat až do kompletního odložení dle schůdku! Sd. 

Datum	Zúčastněné strany:
19.9.12	Dnes proběhl 10. kontrolní den. Zápis z KD viz samostatný protokol. 
3.10.12	Dnes proběhl 11. kontrolní den. Zápis z KD viz samostatný protokol. 
17.10.12	Dnes proběhl 12. kontrolní den. Zápis z KD viz samostatný protokol. 
	Bo T11: K plnění HM6 - viz KD 12 zaslán dodávka předpřipravených formů obecně prospěšných zprávy, které musí k 1.11.2012 být dodány veškerých podmínek bezpečného provozu, přičemž doložit zodpovědnost systému, obrátit a zvláštní postup komunikace. 

Datum	Zúčastněné strany:
30.10.23	Dnes proběhla koordinací schůzka za účelem projednání rozšíření odvodnění. Výsledkem schůzky je požadavek na vytvoření odvodňovacího žlabu na SO 103 a zhotovení náhy na SO 102. Odvodňovací žlab bude součástí ZBV1. 
6.11.23	Dnes proběhlo předání výzeisku komerčního kostek z boukami na SO 103 a SO 109, v celkové množství 1,5t, na pobočku KSÚS Mochoy. T. H. 
7.11.23	Dnes proběhla 13. kontaktní den. Zápis z KD viz samostatný protokol. 
21.11.23	Dnes proběhla kontaktní den. Zápis z KD viz samostatný protokol. Za Td1: Bavčím předkládat více k odvolání dle postupu. 

Datum	Zúčastněné strany:
5.12.23	Dnes proběhl 15. kontrolní den Tepa z KD v 12. samostatný protokol [redacted]
20.12.23	Kontrolní prohlídka stávk a předání k zahájení řízení o předschválení včelárny stávk svolání MČ Lyžařský klub, včelářské objekty a TDS za účelem přípravy předání díla. [redacted]
22.12.23	Vydáno rozhodnutí o povolení předání včelárny stávk. Lyžařský klub Lyžařský klub - B + barikádová stávk a cyklostezka Litol - - Labe - C. MULHIL 250/90 608/2023/24 a 22.12.2023 včelářský výskyt a demonstrace předání MČ Lyžařský klub. Podmínky včetně dohody o předání a případných škodách mezi TDS a stávkem a samostatné dokumenty. [redacted]
25.1.24	Dnes bylo uskutečněno bezpečnostní zamykání skutečného předání stávk. v rámci kterého byly ověřeny domněnky v rámci objektů 90, 102, 103 a 104. Jedná se o tyto pracovní: Odstranění křovin, ochrana stromů bílou barvou, kosení trávy. Bude zapsáno v rámci ZBV. [redacted]

Datum	Zúčastněné strany:
20.1.2024	Za DI.
	Základem předložení v této práci je podle toho, že záměrem státního povolení státní a národní věci znamená být na výhled ke konci [redacted]
20.1.24	Dnes byly dokončeny práce dle smlouvy o dílo S- 788/000 66 001/2023 ze dne
24.3.2024	Výzva k předložení objednatel k převzetí díla [redacted]
22.2.2024	Za DI.
	Pracovní dle práce bylo předáno a převzato dile. V této době bylo zapsáno a objednatelům k SÚS v rámci úřadu protokol a práce. Základem zhotovitel v dokumentaci díla včetně dohledání souborů (DSR, geometrický přehled a v. zpráva) tak, aby bylo možné dílo zhotovitelům na konci období pro předání vzhledem k tomu, že bylo zapsáno do SÚS 2024 [redacted]

www.rvdplus.cz



8 594183 930084


10/10 1955

14 00 1/2

10/10 1955

10/10 1955

STAVBY

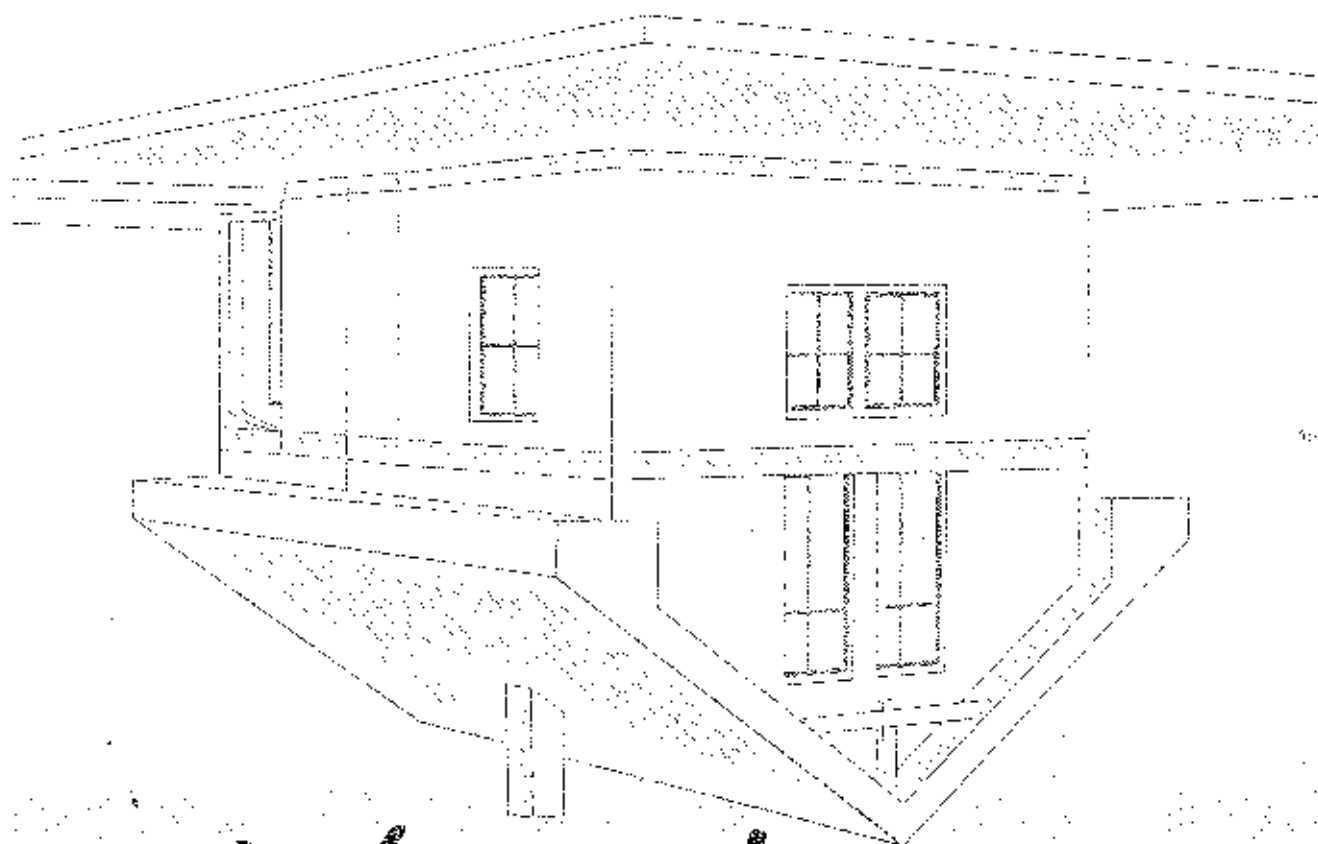


Lávka vč. cyklostezky Lysá n. L.

DENÍK

STAVBY

2.4

SO 104



Firma.....

STAVEBNÍ DENÍK

Stavby Láuka vč. cyklostezky Lysá nad Labem
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe

Informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

Pro objekt (znač. podle investič. plánu)

Kraj Středočeský

Úsek SO 104

Okres Nymburk

Obec Lysá nad Labem

Místo Most Bohomila Hebalá

Zúčastněné strany:
jména, adresy, telef., odpov. zástupců:

investor KSÚS Středočeského kraje

Technický (stavební)
dozor investora

Pudis a.s.

TOI

Pavel Šeda 730 853 697

BOEP

Petr Jelínek 602 773 253

Generální dodavatel

Sdružení Z+P Láva Lysá n.L.

Zedris, s.r.o.

Fikešta - Fišer, rekonstrukce, stavb.

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Jiří Pokorný 714 252 3

Stavbyvedoucí

Mgr. Michael Kalný 725 460 706

Generální projektant

Ing. Pavel Hrdina 10 00 00 12 819

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Pontex, spol. s.r.o.

ZMĚNY A DOPLNKY

Vedení SO: Michael Kalný

Pověřuji vedením SO a Práci na stavbě
Michaela Kalného.

SO 104
SD č. 1

list č. 214041

Datum	Zúčastněné strany:
12. 12. 23	Přes: 10/14°C
Přes:	Pracovní: Těles, míček
	Pracovní obš: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ / poz. 20 m
	Pracovní postoj: 2023/2024 m. v. 10/14°C
	obš: 10/14°C
	Pracovní: 10/14°C
	Bez a To bez zápasu
13. 12. 23	Přes: 11/15°C, 1. okružní, přechod
Ctěl:	Pracovní: Těles, míček, namáčkáno, 10/14°C
	Hodl, Prch, Sabarochce, Hodl,
	Pomoc
	Pracovní obš: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ / poz. 30 m
	Pracovní postoj: 2023/2024 m. v. 10/14°C
	obš: 10/14°C + 10/14°C obš: 10/14°C
	Stáží obš: 10/14°C
	Pracovní obš: 10/14°C
	Zúčastněné obš: 10/14°C
	+ obš: 10/14°C
	Pracovní obš: 10/14°C
	Byla pracovní obš: 10/14°C
	V patě obš: 10/14°C
	Pracovní obš: 10/14°C
14. 12. 23	Přes: 13/23°C
Ctěl:	Pracovní: Těles, míček, namáčkáno, 10/14°C
	Hodl, Prch, Sabarochce, Hodl,
	Pomoc
	Pracovní obš: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ / poz. 30 m
	Pracovní postoj: 2023/2024 m. v. 10/14°C
	obš: 10/14°C + obš: 10/14°C
	Pracovní obš: 10/14°C

Datum	Zúčastněné strany:
16. 2. 23	Přesah: 12°/22°
(Časová)	Pracovníci: Policie, Kamelchard, Parnat, Šablík,
	Schramm, Pech, Hrabal, Parnat, Miroslav
	Pracovní obla: 7° - 10° / práz. Se smím.
	Pracovní postup: Těžce zranění zraně,
	včetně na dopravu
	Přehled kontaktů: Boop a T
16. 2. 23	Přesah: 14°/18°
(Časová)	Pracovníci: Polie, Parn, Pech, Hrabal, Parnat, Šablík,
	Pracovní obla: 7° - 15° / práz. Se smím.
	Pracovní postup: Zranění dle TDI o přerazi
	Zhr. přerazi a zranění zraně
	Přehled kontaktů: Boop a T, bo
	Zápis z jednání: Zúčastnění TDI o přerazi
	Zranění zraně a zranění zraně
	Z TDI: 36 s vyhovujícím výsledkem,
	Přehled kontaktů: Boop a T, bo
16. 2. 23	Přesah: 14°/23°
(Časová)	Pracovníci: Polie, Miroslav, Šablík, Parnat, Hrabal,
	Pech, Kamelchard, Miroslav
	Pracovní obla: 7° - 10° / práz. Se smím.
	Pracovní postup: Zranění zraně + zranění
	ze zraně.
	Přehled kontaktů: Boop a T, bo
	Přehled kontaktů: Boop a T, bo

37 2.1.

List 4

Datum	Zúčastnění strany:
21.6.2023	Pátek: 19°/31°C
celkový	Pracovníci: Štěpán, Miroslav, Štěpán, Pávek, Hrabal, Bartoš, Štěpán, Pávek, Štěpán Pracovníci celkem: 700 - 1000 pracovníků Pracovníci postup: Pracovníci celkem a obecní pracovníci a budování po celkové pracovní síle.
	Pracovníci celkem: 700 a 1000
22.6.2023	Pátek: 19°/31°C
celkový	Pracovníci: Štěpán, Miroslav, Štěpán, Pávek, Hrabal, Bartoš, Štěpán, Pávek, Štěpán Pracovníci celkem: 700 - 1000 pracovníků Pracovníci postup: Pracovníci celkem a obecní pracovníci a budování po celkové pracovní síle.
	Pracovníci celkem: 700 a 1000
23.6.2023	Pátek: 19°/31°C
celkový	Pracovníci: Štěpán, Miroslav, Štěpán, Pávek, Hrabal, Bartoš, Štěpán, Pávek, Štěpán Pracovníci celkem: 700 - 1000 pracovníků Pracovníci postup: Pracovníci celkem a obecní pracovníci a budování po celkové pracovní síle.
	Pracovníci celkem: 700 a 1000
	Pracovníci celkem: 700 a 1000

Datum	Zúčastněné strany:
23.6.2023	Pozadí: 14/25°C
(Maj)	Pracovníci: Polák, Pomeř, Anišel, Bělík,
	Hodík, Škarnitz, Parnatková, Mareš
	Pracovní obla: 7 ^h - 15 ^h / pauza 30 min
	Pracovní postup: Byli provedeny zákroky šití
	na rozpuštění "vlny" a "vlny" podoben
	Pracovníci a pracovníci
	tělou a "vlny" z "vlny"
	na "vlny"
	ta 71: 100 vyložený, po 100 po 100
	Během "vlny" Bělík a Polák
24.6.2023	Pozadí: 15/25°C
(Maj)	Pracovníci: Polák, Pomeř, Anišel, Bělík,
	Hodík, Škarnitz, Parnatková, Mareš
	Pracovní obla: 7 ^h - 15 ^h / pauza 30 min
	Pracovní postup: Pracovníci a pracovníci
	tělou a "vlny"
	Byli provedena "vlny" Bělík
27.6.2023	Pozadí: 15/25°C
(Maj)	Pracovníci: Polák, Pomeř, Anišel, Bělík, Hodík,
	Škarnitz, Parnatková, Mareš
	Pracovní obla: 7 ^h - 15 ^h
	Pracovní postup: "vlny" a "vlny" z "vlny"
	tělou a "vlny" z "vlny"
3-1.7.2023	V těchto dnech probíhala realizace
	Děložní sítě CETIN, která překrývá tu
	trasu SO 104.
	koordinace: ZEPRI
	Administrace: investor

Datum	Začasné strany:
3.7.2023	Počasí: 19°-30°C
(pondělí)	Pracovníci: viz pracovní deník
	Práce: Náryp a hutnění tělesa cyklostezky.
4.7.2023	Počasí: 17°-32°C
(úterý)	Pracovníci: viz pracovní deník
	Práce: Náryp a hutnění tělesa cyklostezky
	na T41.
	Zakladní náryp, hutnění a vrtání dle
7.7.2023	Počasí: 16°-30°C
(pátek)	Pracovníci: viz pracovní deník
	Práce: Náryp a hutnění tělesa cyklostezky.
10.7.2023	Počasí: 19°-27°C
(pondělí)	Pracovníci: viz pracovní deník
	Práce: Náryp a hutnění tělesa cyklostezky.
11.7.2023	Počasí: 19°-31°C
(úterý)	Pracovníci: viz pracovní deník
	Práce: Náryp a hutnění tělesa cyklostezky.
12.7.2023	Počasí: 17°-20°C
(středa)	Pracovníci: viz pracovní deník
	Práce: Náryp a hutnění tělesa cyklostezky

Datum	Zúčastnění strany:
14.7.73 (Pátek)	Dnes byla provedena statická zotřídění těliska v rámci pláně, viz samostatný protokol.
	Pro TDI. Kontrola provedení 508 na plech. tělesa, základní dočet čistoty protokolu.
24.7.73	Dnes proběhla zvěření nasypaných těles, kvůli ověření množství materiálu zvezt. Kop poctu.
31.7.73	Počasí 11-22°C Pracovníci: Kočko, Kočko, Kočko, Polák, Kocí, Čouka mali: páseky bobcat Prac. doba 7-18 (práce zmr. m.) Práce zvažování objektů
1.8.73	Počasí 11-22°C Pracovníci: Kočko, Kočko, Kočko, Polák, Kocí, Čouka mali: páseky bobcat Prac. doba 7-18 (práce zmr. m.) Práce: paklárka obvození
	Pro TDI. Pro paklárku obvození základem provádět dostatečně velký, nezpřehledný beton, a následně ošetřit kroplivým připevňovacím křížem.

Datum	Zúčastněné strany:
2.8.23	13-23°C
	Pracovníci: Kočko, Kočko, Kočko, Polák, Koley, Janča mich: pásový bobcat
	Prac. doba 7-10 pracovní 30 min Práce: pokládka obrobků
3.8.23	Práce: 10-22°C
	Pracovníci: Kočko, Kočko, Kočko, Polák, Koley, Janča mich: pásový bobcat
	Prac. doba 7-10 pracovní 30 min Práce: pokládka obrobků
4.8.23	Práce: 11-22°C
	Pracovníci: Kočko, Kočko, Kočko, Polák, Koley, Janča mich: pásový bobcat
	Prac. doba 7-10 pracovní 30 min Práce: pokládka obrobků
7.8.23	Práce: 8-16°C
	Pracovníci: Kočko, Kočko, Kočko, Polák, Koley, Janča mich: pásový bobcat
	Prac. doba 7-10 pracovní 30 min Práce: vložení objektů, pokládka
8.8.23	Práce: 10-22°C
	Pracovníci: Kočko, Kočko, Kočko, Polák, Koley, Janča mich: pásový bobcat
	Prac. doba 7-10 pracovní 30 min Práce: vložení objektů, vložení

datum	Začasněné strany:
9.8.73	Počasí: 14-18°C Pracovníci: Kočka, Kočka, Kočka, Polák, Kopey, Fouda mech: přívaz, bobcat Prac. doba 7-12 po 30 min. Práce: uprostřed kanálu záhon, přelapové žlaby
10.8.73	Počasí: 15-21°C Pracovníci: Kočka, Kočka, Kočka, Polák, Kopey, Fouda mech: přívaz, bobcat Prac. doba 7-12 po 30 min. Práce: přelapové žlaby, štěrkové
11.8.73	Počasí: 12-22°C Pracovníci: Kočka, Kočka, Kočka, Polák, Kopey, Fouda mech: přívaz, bobcat Prac. doba 7-12 po 30 min. Práce: přelapové štěrkové vstupy, oba
14.8.73	Počasí: 15-23°C Pracovníci: Kočka, Kočka, Kočka, Polák, Kopey, Fouda mech: přívaz, bobcat Prac. doba 7-12 Práce: obrobínový štěrkové vst
15.8.73	Počasí: 15-33°C Pracovníci: Kočka, Kočka, Kočka, Polák, Kopey, Fouda mech: přívaz, bobcat Prac. doba 7-12 Práce: štěrkové vstupy

Datum	Zúčastněné strany:
21.8.73	Počasí: 14-32°C Pracovníci: Poucha, Máček, Hosták Baga CAT, tatna Prac. doba 7-11 Práce: Zemní práce, krajina
22.8.73	Počasí: 16-30°C Pracovníci: Poucha, Máček, Hosták Baga CAT, tatna Prac. doba 7-11 Práce: Zemní práce, krajina
1.9.73	Počasí: 12-20°C Pracovníci: Poucha, Máček, Hosták Baga CAT, tatna Prac. doba 7-11 Práce: zemní střešní vstupy, obrobky
4.9.73	Počasí: 10-23°C Pracovníci: Poucha, Máček, Hosták Baga CAT, tatna Prac. doba 7-11 Práce: střešní vstupy, obrobky
6.9.73	Dnes byla provedena statická zkušební zkouška v rámci střeš. vst. samostatný protokol.

Datum	Zúčastněné strany:
11-15.9.73	Pokládka ostalbových vstupů pod železniční světelný sloupní s.p.o., včetně zkoušek dle KZP. Podrobný výpis stavů, pracovníků a pracovního postupu viz příloha č. 1 Práce: Vrstvy - ACP 16 + - ALO 8
11.9.73	- ACP 16 +
12.9.73	- ACP 16 +
14.9.73	- ALO 8
Záměr:	kontrola stavu pod pokládkou
5.10.73	počasť Pracovníci: kuchař, polák Prac. doba 7-11 Práce: betonové patky na zábradlí, základna, základy
6.10.73	počasť Pracovníci: kuchař, polák Prac. doba 7-11 Práce: obrobky, betonové patky na zábradlí, základna
9.10.73	počasť Pracovníci: zedník kuch. traktor, doprava Prac. doba 7-11 Práce: zpětná montáž srovnání

Datum	Zúčastněné strany:
20.11.77	Počasí 5-12°C
	Pracovníci: 3x dělník, 2x strojník
	Mach: Bagr CAT, Bobcat, doprava
20.11.77	Prac. doba 7-18
	Práce: Rozprostření ornice
22.11.77	Počasí 5-10°C
	Pracovníci: 3x dělník, 2x strojník
	Mach: Bagr CAT, Bobcat, doprava
	Prac. doba 7-18
	Práce: Rozprostření ornice
13-15.12.77	Počasí 7-7°C
	Pracovníci: 3x dělník
	Práce: Montáž zábradlí
20.12.77	za TPL
	Základem opravt senírové a vyřkovet usrovněly
	zábradlí - horního madla, doplnit
	potřebažím: kotvení chůze plastové toh
	dle ZTS.
17.1.78	Byla provedeny opravy na zábradlí,
	dle předpisu TPL.

Zápis z kontrolního dne stavby

„Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem-bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe“

Kontrolní den			
Číslo	13	konaný dne	7.11.2023
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD č.13			
Program kontrolního dne / operativní porady			
1. Předání staveniště			
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:			
a) popis provedených prací			
b) plnění věcného HMG			
c) finanční plnění			
3. Kontrola úkolů z minulého KD			
4. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období			
5. Stav BOZP a PO			
6. Nové úkoly			
7. Různé			
8. Závěr			

1. Předání staveniště	
předání staveniště	02.05.2023 bylo provedeno předání staveniště, investor předal staveniště zhotoviteli a ten jej převzal. O předání staveniště je vyhotoven samostatný „Protokol o předání a převzetí staveniště“.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	Od 27.10.2023 odstraněno DIO (semafor) na mostě, spuštěn obousměrný provoz. SO 103,104 -VDZ v barvě (barevné bezpečnostní pásy až zároveň s plastem) -částečná oprava žlabovek a obrub SO 202: - izolace, LA, ACO, zálivky u DZ na vozovce mostu u OP1 -dokončena pochozí izolace (2. a 3. vrstva) na lávce komplet dle RDS -osazeny obruby podél schodiště u OP1 -PKO - probíhá oprava drobných oděrků na zábradlí a lávce -odvezen ocelový odpad-vážní lístek na KSÚS -výzisk zábradlí předán protokolem KSÚS
b) plnění věcného HMG	Práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Předpoklad předčasného užívání stavby v cca 12/2023 Předpoklad dalších prací a termínů: SO 102, 103, 104: -od 13.11.23 terénní úpravy, ornice, sadové úpravy

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 13/2023	„LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM-BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL - LABE“	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/6

	-kontrolní osazení rovných dílů zábradlí a další postup PKO, dokončení na přelomu 11 a 12. měsíce -opravy ACO přebroušením u DZ SO 202: -od 13.11.23 opravy odláždění svah. kuželů u OP4 -úklid stavební suti a materiálu
c) finanční plnění	Zhot předložil návrh fakturace za 10/2023 ve výši 5 374 940,91 Kč bez DPH, celkem vyfakturováno od začátku stavby 35 777 655,23 Kč bez DPH.

3. Kontrola úkolů z min. KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.1.	Odkup dřevní hmoty	Zhotovitel ZEPRIS odkoupí za cenu uvedenou ve smlouvě vykácenou dřevní hmotu na staveništi. KD č.4: pro společnou objednávku odkupu zhot. dodá znalecký posudek na kostky KD13: žulové kostky odevzdány na KSÚS Mochov, posudek nebude potřeba	Zhot	Splněno vypustit
1.2.	Předání výzisku-zábradlí	Demontované zábradlí bude protokolárně předáváno na KSÚS Mochov KD č.6: vyžádat iniciály a č. účtu KSUS, šrot z lávky doložit vážními lístky a odevzdávat jménem KSÚS KD12: probíhá KD13: šrot odevzdán, zábradlí předáno KSÚS	Zhot	Splněno vypustit
2.1.	Použití nemodif. asf. směsí	Zhotovitel navrhnul použít nemodif. asf. směsí (do konstrukce vozovky). K návrhu se vyjádří AD. KD č.3: AD předběžně souhlasí a vyjádří se písemně. KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh ZBV	Zhot	Trvá
2.2.	Oplocení	V PD je zakresleno oplocení, ve skutečnosti se jedná o ohradník. AD se vyjádří, zda-li bude oplocení zřízeno dle rozsahu v PD, nebo zda dojde k ev. posunu stáv. ohradníku, který zasahuje do cyklotrasy a oplocení nebude realizováno. KD č.3: AD předběžně souhlasí s vypuštěním oplocení a podrobně se vyjádří ve svém písemném stanovisku. KD č.4: předpoklad nahrazení plotu ohradníkem, dle skutečnosti zachycené při stavbě, AD musí odůvodnit změnu pův. návrhu z důvodu dotací KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh ZBV.	Zhot	Trvá
2.3.	Křižovatka pod mostem	Po geodetickém vytýčení rozsahu vozovky průsečné křižovatky pod mostem geodetem Zhotovitele bylo zjištěno, že se směr. oblouk dostává do blízkosti kořenového systému stáv. stromu. U výškového řešení kříž. větve (směr Labe) je výškový rozdíl mezi stáv.stavem a projektem cca 0,25 m? AD potvrdí a zdůvodní navržené řešení nebo ev. navrhne úpravu pův. řešení. ...	Zhot	Trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO				FORMULÁŘ KD
KD 13/2023		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/6

		KD č.4: předpoklad vyjmutí křižovatky ze stavby a napojení SO 102 do stáv. pobřežní asfalt komunikace. Nutné vyjádření AD včetně info k případné souvislosti původního návrhu s územním plánem a rozvojem cyklotrasy atp. KD č.5: AD souhlasí, viz vyjádření v příloze. ZHOT. dopracovat RDS a pasport změn. KD13: RDS a pasport předány, předložit návrh ZBV.		
4.4.	Zábradlí u cyklostezky	Sjednotit povrchovou úpravu zábradlí cyklostezky s úpravou na mostě včetně RAL KD č.5: Dle stanoviska zást. AD lze barvu sjednotit s barvou dle VTD na mostě, objednatel souhlasí. Zhot. předloží návrh tvaru zábradlí. Za AD doporučena výplň svislá v rozteči cca 1/2 výšky otvoru. KD č.6: návrh tvaru předložen, nutno zaslat RDS a odsouhlasit objednatelem, dle info zhot je barva nad rámec rozpočtu, TDI ověří položku, objednatel opětovně projedná způsob provedení, tj. sjednocení barvy s mostním zábradlím. KD č.7: předepsaná povrch. úprava zábradlí-pozink a barva, která bude předmětem ZBV KD9: Předložit návrhu pasportu a ZBV KD10: Tvar zábradlí odsouhlasen, předložit návrh ZBV.	Zhot	Trvá
7.1.	Vegetační úpravy	Pro upřesnění provedení sadových úprav je nutná přítomnost projektanta (Ing. Teslevič, Pontex, a.s.) na následujícím KD. Zást. města Lysá n. Labem požaduje použít na celou plochu svahů kokosové rohože pro stabilizaci ornice, v PD jsou rohože použity pouze lokálně. KD č.8: bylo předáno písemné vyjádření Ing. Ivana Marka, které je v příloze zápisu . KD9: Zhot. jedná s AD a v rámci RDS upřesní způsob provedení. KD11: Výsledná úprava po projednání s AD - na svazích hydrosev bez rohoží, výsadba na spodní rovné ploše dle Rozhodnutí. Zpracovat ZBV.	Ad/Zhot.	Trvá
9.1	Dešťová voda – ověření	Zhot. ověří a předloží MÚ Lysá n. L. výpočet dešťové vody a řešení jejího odtoku z cyklostezky v rámci RDS, především u SO 103 KD10: AD dosud neodpověděl na zaslané dotazy, MÚ trvá na požadavku z KD9, zároveň bude na dokončených cyklostezkách provedena záplavová zkouška k ověření odtoku (na KD11) KD11: úkol trvá plus předložit vyjádření a souhlas k přetoku dešťové vody na cizí pozemky, který je nutný ke kolaudaci (zkontrolovat předanou dokumentaci od objednatele resp. AD). Zhot. následně projedná se stavebním úřadem možná řešení, včetně např. terénních úprav za obrubami. KD13: Na samostatném jednání projednán návrh terénních úprav (rygol u SO 102, vsakovací pero u SO 103), p. Kašpar žádá projektanta doložit výpočtem na návrhový déšť	AD, projektant RDS, Zhot.	Trvá
9.2.	Návrhy ZBV	Urychleně dopracovat pasporty změn a předkládat návrhy ZBV k odsouhlasení	Zhot	Nesplněno, trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO				FORMULÁŘ KD
KD 13/2023		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 3/6

		KD11: zhot. předložil návrh rozdílového rozpočtu – zaslat elektronicky plus nové návrhy ZBV ke kontrole.		
9.4	Demolice stáv, schodiště	Zhot. žádá KSÚS ověřit potřebu demolice stávajícího obslužného schodiště u OP1 v rámci SO 202 KD10: po projednání na KSÚS objednatel potvrzuje demolici dle RDS KD11: Na žádost zhot. opětovně projednáno na místě za účasti objednatele, správce a AD s návrhem schodiště a skluz ponechat, ale zabezpečit (zabránit) vstup cizím osobám na schodiště pomocí uzamykatelné branky. Objednatel a AD předběžně souhlasí, zhot. navrhne umístění a tvar zábran a následně zpracuje odpočtové ZBV (úspora), objednatel se vyjádří. KD12: Rozhodnutí NEBOURAT trvá, zhot. žádá definitivní vyjádření KSÚS. KD13: konečné rozhodnutí- NEBOURAT	KSÚS	Splněno vypustit
10.1	Zálivky spar na cyklostezce	Zhot. navrhuje provedení zálivek pouze u veškerých pracovních, napojovacích a příčných spar. Zálivky podélných spár u obrub z důvodu malých poloměrů a nedostatečnému prostoru nerealizovat. Objednatel souhlasí, fakturace dle skutečnosti tj. úspora a odpočtové ZBV.	Zhot	Trvá
11.1	KSÚS - poškození asfalt. povrchu na mostě	Při stavbě došlo k poškození povrchu vozovky zhotovitelem. KSÚS požaduje plošnou opravu L poloviny vozovky případně zhot. objedná mimořádnou prohlídku zaměřenou na poškození včetně návrhů oprav. KD12: Mimořádná prohlídka provedena s PONTEX, bude zasláno vyjádření. KD13: Zhot navrhuje lokální opravu poškozených míst (po odstranění materiálu provizorních záplat) materiálem MasterEmaco T 1600, dle AD je návrh opravy možný, objednatel KSÚS souhlasí za podmínky, že zhotovitel ponese záruku za celý opravovaný jízdní pruh (levý).	Zhot.	Trvá
11.2.	KSÚS - poškození PKO mostní konstrukce	KSÚS požaduje opravu PKO mostní konstrukce poškozené při stavbě, např. oděrky na hranách hlav. nosníku atd. Zhot. avizuje, že opravy provede a má zahrnutý v rozpočtu. KD12: Opravy probíhají. TDI žádá důsledné opravy PKO poškozených míst (vrypy, nerovnosti)-přebroušení a napojení na stávající.	Zhot.	Trvá
11.3	KSÚS – měření ACO u dilatačního závěru	KSÚS požaduje kontrolní měření rovinatosti nového asf. povrchu u dilat. závěru u O4, povrch je nerovný, nedohutněný. KD12: Zhot. uvádí, že je v toleranci ruční pokládky s nerovnostmi max 5 mm. TDI a správce objektu trvá na výměně povrchu z dův nedohutnění a úpravě nerovnosti. KD13: nerovnosti TDI přeměřeny a nejsou v toleranci. Zhot. navrhuje opravu přebroušením povrchu.	Zhot.	Trvá
12.1	Dilatační zařízení – kontrola	TDI požaduje předložení protokolu o kontrole stavu a zaměření nového DZ po provedení středového svaru a před betonáží z důvodu směrových nerovností a rozevření dil. spáry.	Zhot.	Trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO				FORMULÁŘ KD
KD 13/2023		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 4/6

		KD13: Výrobce DZ přeměřil a potvrdil správnost osazení plus následné doplnění konstrukce a provedení drobných oprav středového sváru. Bude sledováno.		
12.2	Zimní údržba cyklostezky - dotaz	Vodoprávní úřad, p. Kašpar se dotazuje na způsob zimní údržby cyklostezky a případné nakládání s odtokem slané vody. Re KSÚS: Bude nutná schůzka a dohoda s MÚ KD13: Dle KSÚ zimní údržba nebude prováděna, dopravní značení bude doplněno o dodatkovou tabulku „Zimní údržba se neprovádí“	KSÚS	Vypustit

4. Kontrola kvality

a) zpráva o vyhodnocení kvality	Průběžně, odsouhlaseny TePř. dle postupu prací. Zkoušky, odběry vzorků, laboratorní deníky průběžně.
---------------------------------	---

5. Stav BOZP a PO

Během předání staveniště byl předán zhotoviteli Plán BOZP, Zhotovitel seznámí všechny zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce. Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli seznámeni.

Kontrola průběžně, viz samostatné elektronické inspekční deníky (EID) koordinátora BOZP.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
13.1.	Úklid suti a stavebního odpadu	Zhotovitel provede úklid suti z demolice, kameniva, zeminy atp. ze záplavové oblasti	Zhotovitel	T:30.11.2023

7. Různé


1.1	V případě nepřítomnosti TDI Pavla Šedy (730 857 697) provádí zástup Ing. Jindřich Přivratský (604 220 703)
-----	--

8. Závěr

Datum konání příštího KD / OP	KD č.14 – 21.11.2023 ve 13,00 hod. na stavbě
-------------------------------	---

Zapsal TDI:
PUDIS a.s.

Pavel Š e d a



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 13/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 5/6

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD č.13
2	
3	

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 8.11.2023 na adresy uvedené v Prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 13/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 6/6


Prezenční listina KD č.13

Název akce: „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“			
Místo konání: Litol			
Datum konání: 7.11.2023			
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
František Jelínek			
Martin Dvořák			
Lukáš Kalecký			
Pavel Šeda			
Ing. Jindřich Přivratský			
Jakub Líha			
Martin Vysloužil			
Michael Kalný			
Marek Šulc			
Ing. Petr Jelínek			
Dana Urban Hančová			
Petra Posseltová			

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM – BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL – LABE	Prezence
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD/OP 13/2023	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKA 1 z 2

Lenka Formánková			
Lubor Kašpar			
Ing. Blanka Černická, DiS.			
Hana Ottová			
Ing. Jitka Fialová			
Ing. Vendula Štěpánková			

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD/OP 13/2023	LÁVKA VČ. CYKLOSTEZKY LYSÁ NAD LABEM – BEZBARIÉROVÁ TRASA A CYKLOTRASA LITOL – LABE	Prezence
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKY 2 Z 2

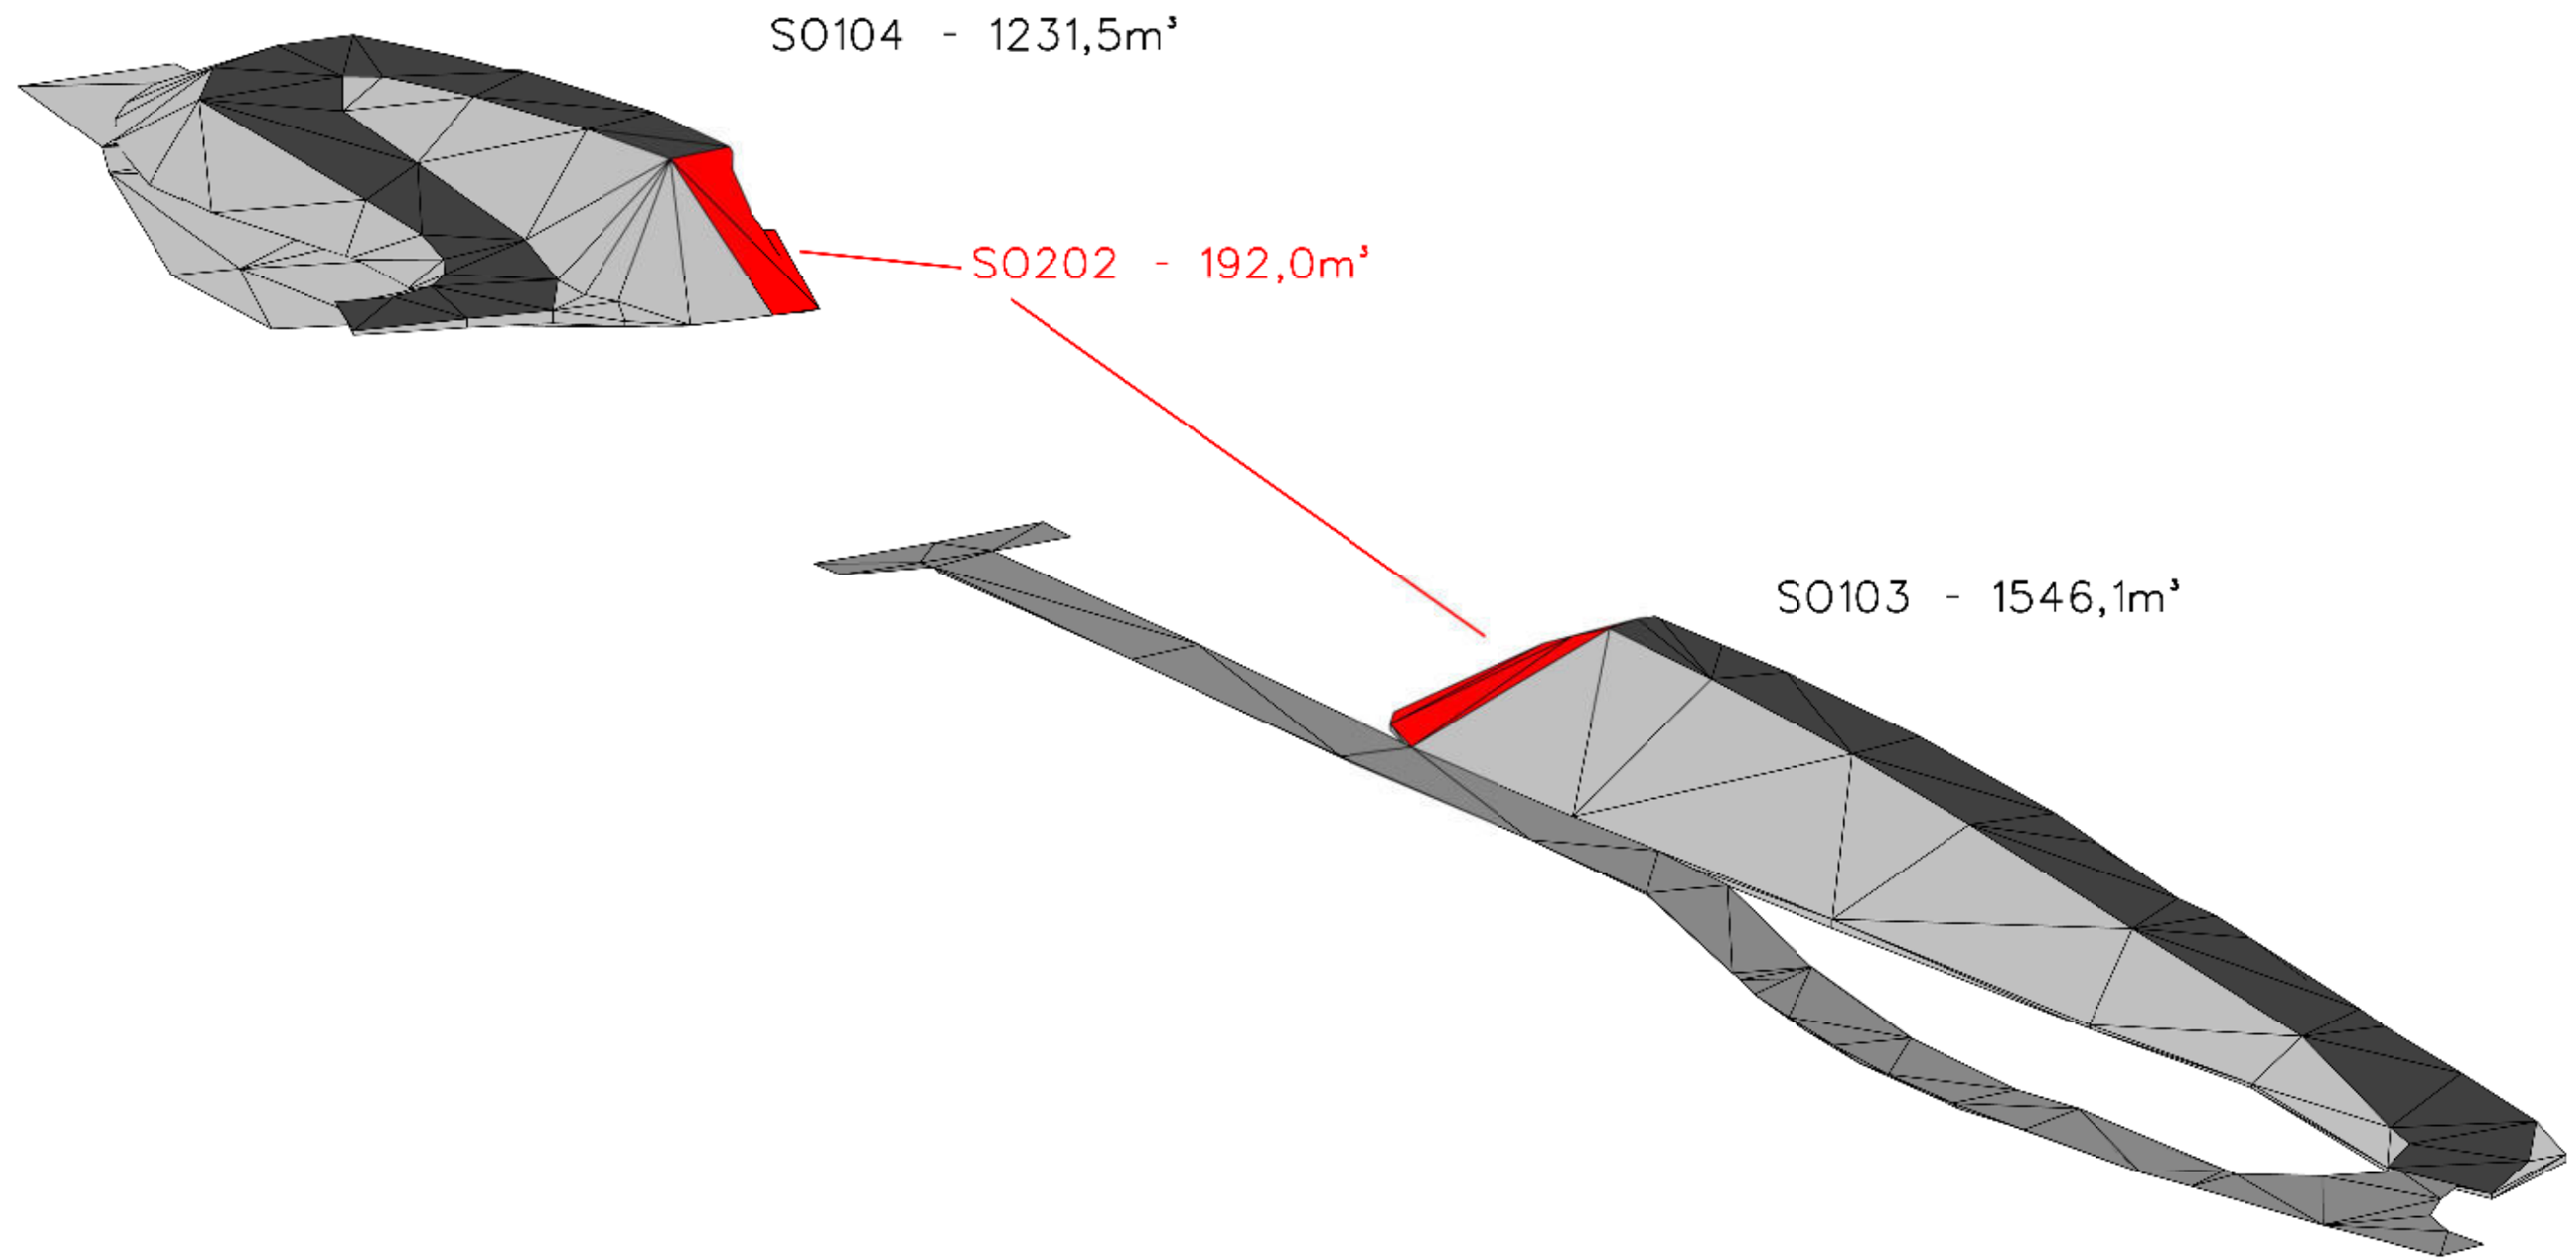


PROTOKOL O VÝPOČTU KUBATURY

Lávka vč. Cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

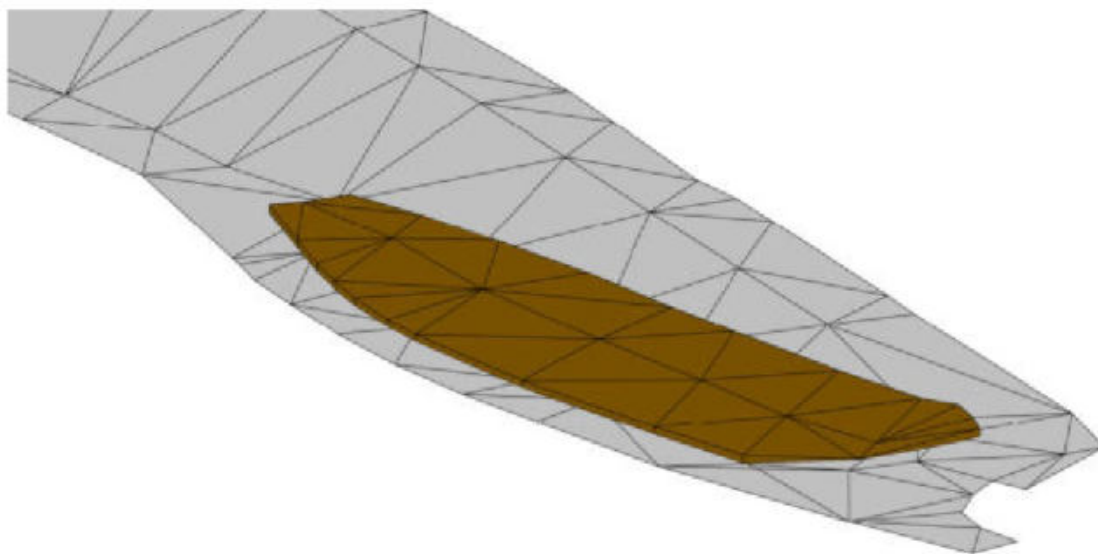

NAVEZENÁ HLÍNA - 267,8m³

Zaměření bylo provedeno robotickou totální stanicí TRIMBLE S5.

Výpočty byly provedeny v programu Groma12

Zaměřil: O. Frolík

Vyhotovil: O. Frolík

Ověřil: Ing. J. Zamazal – č.ov. 99/2023



SEZNAM SOUŘADNIC-PLÁN

BOD	Y	X	Z	POPIS
1	710905.926	1037344.765	176.205	PLÁN
2	710905.730	1037349.530	176.130	PLÁN
3	710906.040	1037354.000	176.190	PLÁN
4	710904.310	1037357.200	176.200	PLÁN
5	710903.780	1037364.380	176.510	PLÁN
6	710897.760	1037364.430	176.830	PLÁN
7	710887.110	1037351.950	177.980	PLÁN
8	710879.845	1037347.230	178.625	PLÁN
9	710872.580	1037342.510	179.270	PLÁN
10	710865.580	1037337.990	179.900	PLÁN
11	710858.580	1037333.470	180.530	PLÁN
12	710862.210	1037326.690	176.450	PLÁN
13	710871.330	1037322.100	176.231	PLÁN
14	710870.330	1037326.070	176.309	PLÁN
15	710879.064	1037325.368	176.231	PLÁN
16	710870.845	1037333.690	176.310	PLÁN
17	710882.684	1037331.778	176.262	PLÁN
18	710889.149	1037330.985	176.231	PLÁN
19	710879.480	1037340.690	176.170	PLÁN
20	710891.515	1037337.644	176.225	PLÁN
21	710894.607	1037340.967	176.208	PLÁN
22	710884.575	1037345.100	176.170	PLÁN
23	710894.056	1037334.542	176.230	PLÁN
24	710898.623	1037338.399	176.230	PLÁN
25	710889.670	1037349.510	176.170	PLÁN
26	710897.450	1037357.010	176.300	PLÁN
27	710900.190	1037358.190	176.270	PLÁN

SEZNAM SOUŘADNIC-UPRAVENÝ TERÉN


BOD	Y	X	Z	POPIS
28	710905.010	1037348.820	176.570	NAVEZENÁ ZEMINA
29	710900.310	1037344.210	176.570	NAVEZENÁ ZEMINA
30	710892.750	1037337.350	176.590	NAVEZENÁ ZEMINA
31	710885.220	1037331.770	176.590	NAVEZENÁ ZEMINA
32	710882.720	1037330.290	176.600	NAVEZENÁ ZEMINA
33	710879.140	1037328.500	176.620	NAVEZENÁ ZEMINA
34	710876.350	1037327.350	176.640	NAVEZENÁ ZEMINA
35	710873.540	1037326.340	176.660	NAVEZENÁ ZEMINA
36	710869.700	1037325.210	176.700	NAVEZENÁ ZEMINA
37	710863.790	1037323.510	176.750	NAVEZENÁ ZEMINA
38	710863.240	1037325.100	176.750	NAVEZENÁ ZEMINA
39	710862.130	1037327.370	176.830	NAVEZENÁ ZEMINA
40	710865.820	1037331.030	176.950	NAVEZENÁ ZEMINA
41	710870.220	1037335.030	177.020	NAVEZENÁ ZEMINA
42	710875.660	1037339.640	177.050	NAVEZENÁ ZEMINA
43	710881.240	1037344.030	177.020	NAVEZENÁ ZEMINA
44	710884.900	1037347.260	176.920	NAVEZENÁ ZEMINA
45	710891.490	1037352.740	176.950	NAVEZENÁ ZEMINA
46	710895.810	1037356.970	176.890	NAVEZENÁ ZEMINA
47	710897.180	1037358.870	177.010	NAVEZENÁ ZEMINA
48	710898.760	1037359.670	176.820	NAVEZENÁ ZEMINA
49	710900.530	1037360.090	176.780	NAVEZENÁ ZEMINA
50	710902.410	1037355.150	176.540	NAVEZENÁ ZEMINA
51	710904.240	1037354.400	176.250	NAVEZENÁ ZEMINA
52	710898.580	1037350.560	176.710	NAVEZENÁ ZEMINA
53	710892.860	1037346.090	176.780	NAVEZENÁ ZEMINA
54	710886.150	1037340.750	176.780	NAVEZENÁ ZEMINA
55	710878.050	1037334.650	176.840	NAVEZENÁ ZEMINA
56	710869.650	1037329.790	176.870	NAVEZENÁ ZEMINA

PROTOKOL O VÝPOČTU KUBATURY

Lávka vč. Cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

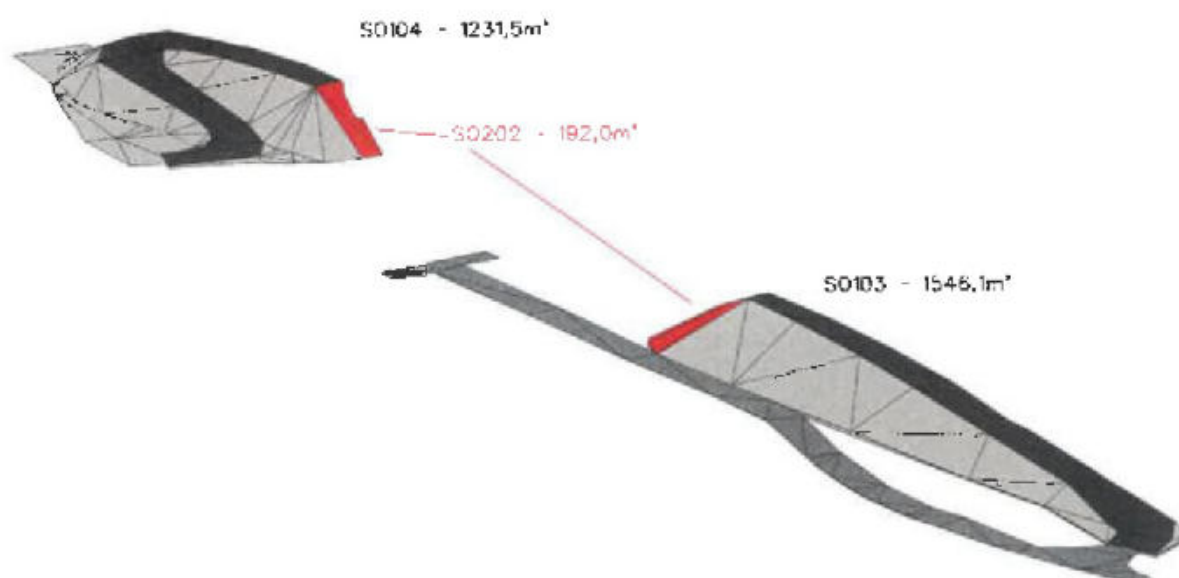

Zaměření bylo provedeno robotickou totální stanicí TRIMBLE SS.
Výpočty byly provedeny v programu Groma12

Zaměřil: M. Grössl
Vyhotovil: O. Frolík
Ověřil: Ing. J. Zamazal



SEZNAM SOUŘADNIC-PLÁN

BOD	Y	X	Z	POPIS	BOD	Y	X	Z	POPIS
1	710634.030	1037173.895	181.846	Schod	83	710665.307	1037191.001	178.377	Schod
2	710642.760	1037180.161	181.950	Schod	84	710666.072	1037190.559	178.295	Schod
3	710635.286	1037190.299	182.154	Schod	85	710666.194	1037190.451	177.753	Schod
4	710638.019	1037192.287	182.163	Schod	86	710667.007	1037190.049	177.220	Schod
5	710639.076	1037192.844	181.743	Schod	87	710668.615	1037189.899	176.556	Schod
6	710636.364	1037189.423	181.741	Schod	88	710664.757	1037195.453	178.993	Schod
7	710635.134	1037189.850	182.249	Schod	89	710665.562	1037195.946	178.290	Schod
8	710634.612	1037172.960	180.964	Schod	90	710666.451	1037194.510	177.745	Schod
9	710643.372	1037179.561	181.142	Schod	91	710667.356	1037194.836	177.112	Schod
10	710636.176	1037188.978	181.407	Schod	92	710668.265	1037195.409	176.487	Schod
11	710667.902	1037195.341	176.987	Schod	93	710659.941	1037187.443	179.518	Schod
12	710667.966	1037189.957	177.183	Schod	94	710657.767	1037178.426	177.348	Schod
13	710665.071	1037183.765	177.280	Schod	95	710670.003	1037195.133	176.518	Schod
14	710660.469	1037181.963	177.280	Schod	96	710663.813	1037192.012	176.428	Schod
15	710633.036	1037177.988	177.316	Schod	97	710667.201	1037187.776	176.684	Schod
16	710647.910	1037174.879	177.297	Schod	98	710655.839	1037177.984	176.870	Schod
17	710637.731	1037168.571	177.491	Schod	99	710818.353	1037307.288	176.205	Schod
18	710647.143	1037173.518	177.716	Schod	100	710819.957	1037307.713	176.543	Schod
19	710632.627	1037178.592	177.511	Schod	101	710819.693	1037309.035	176.524	Schod
20	710639.813	1037182.812	177.676	Schod	102	710820.195	1037308.613	177.317	Schod
21	710664.368	1037186.586	177.698	Schod	103	710820.571	1037308.957	177.380	Schod
22	710666.783	1037190.044	177.727	Schod	104	710821.120	1037309.363	178.105	Schod
23	710666.886	1037194.829	177.682	Schod	105	710821.780	1037309.790	178.143	Schod
24	710666.097	1037194.301	178.199	Schod	106	710822.252	1037310.175	178.920	Schod
25	710666.025	1037190.559	178.295	Schod	107	710822.711	1037310.604	178.944	Schod
26	710663.682	1037187.158	178.251	Schod	108	710823.081	1037311.175	179.698	Schod
27	710659.406	1037183.568	178.706	Schod	109	710824.260	1037304.802	176.542	Schod
28	710646.606	1037176.151	178.196	Schod	110	710824.421	1037305.941	176.673	Schod
29	710636.931	1037169.477	178.102	Schod	111	710824.534	1037306.306	177.257	Schod
30	710636.505	1037170.559	178.763	Schod	112	710824.723	1037307.383	177.435	Schod
31	710645.702	1037177.148	178.904	Schod	113	710824.774	1037307.781	177.935	Schod
32	710638.925	1037184.645	178.547	Schod	114	710824.927	1037308.726	178.093	Schod
33	710634.041	1037187.906	178.730	Schod	115	710825.165	1037309.302	178.839	Schod
34	710665.722	1037191.205	178.734	Schod	116	710825.324	1037310.126	178.915	Schod
35	710665.188	1037193.758	178.870	Schod	117	710825.361	1037310.535	179.538	Schod
36	710664.222	1037193.233	179.761	Schod	118	710827.448	1037310.649	179.488	Schod
37	710664.561	1037192.057	179.471	Schod	119	710827.568	1037310.487	178.948	Schod
38	710662.461	1037188.713	179.418	Schod	120	710828.013	1037309.528	178.761	Schod
39	710658.438	1037185.472	179.368	Schod	121	710828.469	1037309.141	178.045	Schod
40	710644.949	1037177.916	179.597	Schod	122	710828.697	1037308.648	177.955	Schod
41	710635.040	1037171.307	179.464	Schod	123	710828.870	1037308.323	177.467	Schod
42	710635.227	1037172.191	180.212	Schod	124	710829.112	1037307.817	177.271	Schod
43	710644.251	1037178.689	180.748	Schod	125	710829.274	1037307.596	176.953	Schod
44	710637.878	1037186.558	180.100	Schod	126	710829.758	1037306.932	176.868	Schod
45	710639.757	1037187.518	180.015	Schod	127	710830.122	1037306.470	176.283	Schod
46	710638.942	1037189.067	179.755	Schod	128	710832.935	1037313.026	176.414	Schod
47	710639.678	1037189.967	179.803	Schod	129	710837.675	1037312.748	177.046	Schod
48	710638.758	1037188.890	180.786	Schod	130	710837.404	1037313.470	177.104	Schod
49	710638.619	1037189.290	180.797	Schod	131	710837.161	1037313.744	177.653	Schod
50	710639.530	1037189.986	180.885	Schod	132	710836.759	1037314.131	177.662	Schod
51	710636.472	1037188.700	180.832	Schod	133	710836.500	1037314.324	178.059	Schod
52	710636.982	1037188.106	180.743	Schod	134	710835.919	1037314.829	178.126	Schod
53	710634.357	1037173.566	181.071	Schod	135	710835.572	1037315.051	178.803	Schod
54	710634.980	1037172.363	180.297	Schod	136	710834.656	1037315.444	178.941	Schod
55	710635.582	1037171.780	179.547	Schod	137	710834.320	1037315.551	179.345	Schod
56	710636.210	1037170.960	178.912	Schod	138	710843.571	1037318.695	176.383	Schod
57	710636.499	1037170.553	178.764	Schod	139	710843.337	1037319.092	177.023	Schod
58	710636.798	1037170.199	178.204	Schod	140	710842.856	1037319.702	177.069	Schod
59	710637.216	1037169.181	177.653	Schod	141	710842.595	1037319.597	177.441	Schod
60	710633.364	1037168.113	176.903	Schod	142	710842.211	1037320.384	177.541	Schod
61	710648.066	1037174.738	176.814	Schod	143	710842.152	1037320.666	177.907	Schod
62	710647.230	1037173.291	177.345	Schod	144	710841.652	1037321.013	177.964	Schod
63	710646.822	1037173.966	177.791	Schod	145	710841.346	1037321.364	178.637	Schod
64	710646.089	1037176.854	178.503	Schod	146	710840.646	1037322.304	178.805	Schod
65	710645.328	1037177.684	178.942	Schod	147	710840.479	1037322.584	179.242	Schod
66	710644.536	1037178.441	179.701	Schod	148	710840.024	1037323.076	179.271	Schod
67	710643.771	1037179.216	180.383	Schod	149	710839.732	1037323.422	179.707	Schod
68	710642.954	1037179.966	181.735	Schod	150	710839.378	1037323.882	179.836	Schod
69	710635.561	1037189.803	181.507	Schod	151	710839.030	1037324.177	180.876	Schod
70	710637.363	1037187.709	180.212	Schod	152	710840.446	1037322.080	176.524	Schod
71	710638.104	1037186.195	179.444	Schod	153	710840.197	1037322.321	176.896	Schod
72	710638.588	1037185.183	178.732	Schod	154	710839.777	1037322.557	176.963	Schod
73	710639.023	1037184.276	178.227	Schod	155	710839.579	1037322.733	177.313	Schod
74	710639.529	1037183.307	177.713	Schod	156	710839.370	1037322.994	177.361	Schod
75	710639.956	1037182.670	177.352	Schod	157	710839.208	1037323.231	177.551	Schod
76	710640.402	1037181.491	176.842	Schod	158	710838.817	1037323.424	177.657	Schod
77	710645.226	1037185.162	176.694	Schod	159	710838.580	1037323.784	178.244	Schod
78	710644.522	1037186.471	177.328	Schod	160	710838.164	1037324.239	178.287	Schod
79	710643.901	1037187.036	177.751	Schod	161	710837.875	1037324.661	178.791	Schod
80	710643.761	1037187.654	178.304	Schod	162	710837.664	1037324.946	178.982	Schod
81	710642.612	1037186.337	178.841	Schod	163	710837.365	1037325.338	179.458	Schod
82	710644.740	1037191.634	178.851	Schod	164	710836.719	1037325.765	179.552	Schod

165	710856.347	1037336.274	180.177	Schod
166	710855.694	1037337.219	180.531	Schod
167	710855.407	1037337.436	180.960	Schod
168	710855.001	1037337.962	181.225	Schod
169	710854.908	1037338.302	181.770	Schod
170	710863.888	1037338.323	176.409	Schod
171	710868.679	1037339.577	176.844	Schod
172	710867.803	1037339.159	177.002	Schod
173	710867.457	1037339.572	177.437	Schod
174	710867.022	1037340.260	177.571	Schod
175	710866.517	1037340.817	178.248	Schod
176	710866.142	1037341.219	178.445	Schod
177	710865.944	1037341.785	178.940	Schod
178	710865.225	1037342.543	179.400	Schod
179	710864.906	1037343.166	180.040	Schod
180	710864.516	1037343.666	180.283	Schod
181	710864.215	1037344.043	180.617	Schod
182	710864.097	1037344.466	180.906	Schod
183	710875.818	1037345.139	176.253	Schod
184	710876.560	1037345.531	176.805	Schod
185	710875.828	1037345.933	176.999	Schod
186	710875.367	1037346.283	177.476	Schod
187	710875.000	1037346.760	177.539	Schod
188	710874.767	1037347.111	177.790	Schod
189	710874.398	1037347.577	177.951	Schod
190	710874.137	1037348.026	178.556	Schod
191	710873.739	1037348.560	178.647	Schod
192	710873.794	1037342.764	176.308	Schod
193	710873.621	1037343.037	176.761	Schod
194	710872.951	1037343.476	176.939	Schod
195	710872.650	1037343.833	177.489	Schod
196	710871.838	1037344.464	177.595	Schod
197	710871.122	1037344.674	178.390	Schod
198	710870.436	1037345.056	178.484	Schod
199	710870.018	1037345.426	178.675	Schod
200	710869.876	1037345.771	179.340	Schod
201	710869.636	1037346.198	179.501	Schod
202	710869.295	1037346.572	180.025	Schod
203	710869.028	1037346.925	180.179	Schod
204	710868.960	1037347.171	180.559	Schod
205	710879.712	1037313.789	179.648	Schod
206	710830.894	1037313.100	179.417	Schod
207	710829.804	1037313.965	179.943	Schod
208	710829.100	1037314.632	180.682	Schod
209	710829.368	1037314.304	180.033	Schod
210	710828.353	1037315.195	180.799	Schod
211	710828.025	1037315.436	181.251	Schod
212	710827.259	1037314.867	181.376	Schod
213	710826.845	1037315.691	181.597	Schod
214	710827.257	1037316.426	182.192	Schod
215	710827.862	1037315.059	179.868	Schod
216	710829.026	1037314.162	179.663	Schod
217	710828.444	1037314.611	179.766	Schod
218	710840.161	1037326.162	181.282	Schod
219	710839.902	1037326.399	181.410	Schod
220	710839.753	1037326.689	182.027	Schod
221	710890.441	1037350.238	175.964	Schod
222	710906.744	1037362.840	175.976	Schod
223	710905.392	1037361.065	175.953	Schod
224	710904.235	1037361.200	176.014	Schod
225	710909.813	1037362.643	176.068	Schod
226	710870.682	1037339.132	176.175	Schod
227	710838.578	1037325.724	182.043	Schod
228	710893.429	1037360.669	176.611	Schod
229	710867.478	1037353.579	176.278	Schod
230	710892.379	1037357.782	176.013	Schod
231	710894.466	1037352.180	176.576	Schod
232	710876.359	1037348.245	177.572	Schod
233	710893.305	1037359.460	176.339	Schod
234	710837.214	1037323.179	180.694	Schod
235	710838.780	1037324.632	180.693	Schod
236	710879.244	1037170.848	181.781	Pláš
237	710628.831	1037161.324	177.174	Pláš
238	710632.141	1037156.521	177.066	Pláš
239	710638.793	1037158.520	177.009	Pláš
240	710646.352	1037161.271	176.940	Pláš
241	710655.464	1037163.918	176.898	Pláš
242	710665.415	1037166.448	176.817	Pláš
243	710674.713	1037168.689	176.738	Pláš
244	710673.711	1037174.085	176.674	Pláš
245	710669.440	1037182.967	176.658	Pláš
246	710669.845	1037184.537	176.629	Pláš
247	710674.182	1037187.917	176.470	Pláš
248	710640.749	1037169.878	176.877	Pláš
249	710635.489	1037165.980	176.934	Pláš
250	710631.622	1037163.275	177.074	Pláš

251	710629.240	1037170.850	181.781	Pláš
252	710630.550	1037169.360	180.903	Pláš
253	710631.150	1037168.580	179.942	Pláš
254	710630.420	1037167.040	179.528	Pláš
255	710630.920	1037166.510	179.091	Pláš
256	710631.020	1037164.580	178.814	Pláš
257	710833.152	1037307.700	176.127	Pláš
258	710834.561	1037306.444	175.992	Pláš
259	710855.739	1037323.565	176.262	Pláš
260	710872.771	1037336.866	176.160	Pláš
261	710854.703	1037325.745	176.296	Pláš
262	710870.326	1037326.069	176.309	Pláš
263	710882.684	1037331.778	176.262	Pláš
264	710870.330	1037326.070	176.309	Pláš
265	710796.919	1037280.387	176.080	Pláš
266	710813.826	1037291.786	176.248	Pláš
267	710797.835	1037280.423	175.762	Pláš
268	710799.955	1037277.832	175.798	Pláš
269	710914.026	1037291.650	176.050	Pláš
270	710816.240	1037288.794	176.000	Pláš
271	710800.087	1037277.589	176.105	Pláš
272	710816.474	1037288.538	176.181	Pláš
273	710833.754	1037300.084	176.261	Pláš
274	710847.807	1037310.728	176.136	Pláš
275	710848.208	1037310.626	176.390	Pláš
276	710833.669	1037300.410	176.033	Pláš
277	710831.870	1037303.630	176.260	Pláš
278	710848.838	1037316.071	176.151	Pláš
279	710857.391	1037317.116	176.095	Pláš
280	710856.475	1037320.821	176.131	Pláš
281	710871.086	1037322.438	176.061	Pláš
282	710871.330	1037322.100	176.231	Pláš
283	710870.686	1037321.864	176.225	Pláš
284	710857.374	1037316.977	176.261	Pláš
285	710874.308	1037323.358	176.016	Pláš
286	710872.439	1037322.569	176.231	Pláš
287	710872.060	1037326.730	176.090	Pláš
288	710877.280	1037328.660	176.010	Pláš
289	710880.610	1037326.390	176.000	Pláš
290	710879.064	1037325.368	176.231	Pláš
291	710884.093	1037327.948	176.231	Pláš
292	710886.228	1037329.353	175.945	Pláš
293	710889.149	1037330.985	176.231	Pláš
294	710891.682	1037333.214	175.998	Pláš
295	710894.036	1037334.542	176.230	Pláš
296	710894.035	1037334.904	175.920	Pláš
297	710897.235	1037337.584	176.067	Pláš
298	710898.623	1037338.399	176.230	Pláš
299	710895.120	1037340.530	176.120	Pláš
300	710905.060	1037342.580	176.160	Pláš
301	710905.926	1037344.765	176.205	Pláš
302	710891.840	1037337.320	175.590	Pláš
303	710894.607	1037340.967	176.208	Pláš
304	710891.515	1037337.644	176.225	Pláš
305	710883.040	1037331.430	175.940	Pláš
306	710870.331	1037326.070	176.309	Pláš
307	710870.340	1037325.790	176.039	Pláš
308	710870.337	1037325.788	176.039	Pláš
309	710870.330	1037326.070	176.309	Pláš
310	710856.295	1037321.021	176.425	Pláš
311	710850.108	1037317.201	176.378	Pláš

SEZNAM SOUŘADNIC-UPRAVENÝ TERÉN

BOD	Y	X	Z	POPIS	BOD	Y	X	Z	POPIS
312	710640.740	1037170.500	180.160	UPRAVENÝ TERÉN	393	710827.250	1037314.900	181.920	UPRAVENÝ TERÉN
313	710644.679	1037170.720	179.400	UPRAVENÝ TERÉN	394	710828.900	1037313.570	181.860	UPRAVENÝ TERÉN
314	710641.680	1037172.580	180.450	UPRAVENÝ TERÉN	395	710828.370	1037313.820	181.890	UPRAVENÝ TERÉN
315	710651.770	1037174.860	178.850	UPRAVENÝ TERÉN	396	710856.500	1037337.690	130.570	UPRAVENÝ TERÉN
316	710647.700	1037177.550	181.250	UPRAVENÝ TERÉN	397	710845.650	1037330.200	131.300	UPRAVENÝ TERÉN
317	710655.240	1037183.730	181.820	UPRAVENÝ TERÉN	398	710848.640	1037326.960	181.220	UPRAVENÝ TERÉN
318	710652.200	1037180.960	177.570	UPRAVENÝ TERÉN	399	710858.580	1037333.470	180.530	UPRAVENÝ TERÉN
319	710660.890	1037188.300	181.960	UPRAVENÝ TERÉN	400	710872.580	1037342.510	179.270	UPRAVENÝ TERÉN
320	710667.910	1037182.930	177.560	UPRAVENÝ TERÉN	401	710866.070	1037344.560	179.560	UPRAVENÝ TERÉN
321	710670.290	1037184.410	177.470	UPRAVENÝ TERÉN	402	710891.090	1037360.230	177.340	UPRAVENÝ TERÉN
322	710671.380	1037186.700	177.480	UPRAVENÝ TERÉN	403	710887.110	1037351.950	177.980	UPRAVENÝ TERÉN
323	710672.070	1037189.390	176.480	UPRAVENÝ TERÉN	404	710826.200	1037311.530	180.630	UPRAVENÝ TERÉN
324	710672.650	1037189.640	176.810	UPRAVENÝ TERÉN	405	710823.970	1037309.970	179.560	UPRAVENÝ TERÉN
325	710673.500	1037178.630	177.080	UPRAVENÝ TERÉN	406	710827.880	1037302.330	176.300	UPRAVENÝ TERÉN
326	710669.500	1037174.650	176.980	UPRAVENÝ TERÉN	407	710825.390	1037302.390	176.210	UPRAVENÝ TERÉN
327	710675.100	1037172.920	176.820	UPRAVENÝ TERÉN	408	710819.330	1037306.440	176.230	UPRAVENÝ TERÉN
328	710669.820	1037171.710	176.718	UPRAVENÝ TERÉN	409	710831.870	1037303.630	176.260	UPRAVENÝ TERÉN
329	710668.140	1037176.460	177.180	UPRAVENÝ TERÉN	410	710823.130	1037310.570	179.400	UPRAVENÝ TERÉN
330	710672.430	1037182.920	177.260	UPRAVENÝ TERÉN	411	710844.130	1037312.320	176.350	UPRAVENÝ TERÉN
331	710649.740	1037161.110	176.890	UPRAVENÝ TERÉN	412	710862.210	1037326.690	176.450	UPRAVENÝ TERÉN
332	710641.960	1037163.360	179.750	UPRAVENÝ TERÉN	413	710879.480	1037340.680	176.170	UPRAVENÝ TERÉN
333	710642.130	1037158.900	176.910	UPRAVENÝ TERÉN	414	710889.670	1037349.510	176.170	UPRAVENÝ TERÉN
334	710639.060	1037163.830	180.050	UPRAVENÝ TERÉN	415	710908.960	1037362.790	176.240	UPRAVENÝ TERÉN
335	710632.700	1037160.350	177.180	UPRAVENÝ TERÉN	416	710819.101	1037307.685	176.541	UPRAVENÝ TERÉN
336	710635.660	1037159.200	177.100	UPRAVENÝ TERÉN	417	710818.999	1037307.058	176.236	UPRAVENÝ TERÉN
337	710635.590	1037166.870	180.200	UPRAVENÝ TERÉN	418	710835.485	1037322.336	181.037	UPRAVENÝ TERÉN
338	710639.760	1037162.450	177.290	UPRAVENÝ TERÉN	419	710827.041	1037316.041	181.860	UPRAVENÝ TERÉN
339	710633.630	1037158.650	180.240	UPRAVENÝ TERÉN	420	710831.180	1037319.598	181.762	UPRAVENÝ TERÉN
340	710657.260	1037172.570	178.500	UPRAVENÝ TERÉN	421	710835.486	1037322.886	181.638	UPRAVENÝ TERÉN
341	710661.700	1037175.640	178.030	UPRAVENÝ TERÉN	422	710860.446	1037340.033	180.226	UPRAVENÝ TERÉN
342	710664.790	1037178.860	177.660	UPRAVENÝ TERÉN	423	710870.383	1037346.613	179.354	UPRAVENÝ TERÉN
343	710666.560	1037177.060	177.360	UPRAVENÝ TERÉN	424	710882.669	1037354.617	178.202	UPRAVENÝ TERÉN
344	710663.050	1037179.950	181.240	UPRAVENÝ TERÉN	425	710873.254	1037346.504	179.078	UPRAVENÝ TERÉN
345	710652.090	1037187.020	181.840	UPRAVENÝ TERÉN	426	710879.368	1037346.612	179.347	UPRAVENÝ TERÉN
346	710658.610	1037191.170	181.980	UPRAVENÝ TERÉN	427	710885.021	1037356.024	177.970	UPRAVENÝ TERÉN
347	710642.442	1037178.972	181.135	UPRAVENÝ TERÉN	428	710882.673	1037354.617	178.204	UPRAVENÝ TERÉN
348	710642.399	1037178.862	181.123	UPRAVENÝ TERÉN	429	710823.034	1037316.042	181.876	UPRAVENÝ TERÉN
349	710639.613	1037176.557	180.875	UPRAVENÝ TERÉN	430	710826.700	1037315.770	181.890	UPRAVENÝ TERÉN
350	710642.792	1037179.696	181.213	UPRAVENÝ TERÉN	431	710796.919	1037260.367	176.080	UPRAVENÝ TERÉN
351	710638.242	1037158.789	177.014	UPRAVENÝ TERÉN	432	710800.087	1037277.589	176.105	UPRAVENÝ TERÉN
352	710638.361	1037158.775	177.013	UPRAVENÝ TERÉN	433	710813.826	1037291.786	176.348	UPRAVENÝ TERÉN
353	710638.781	1037158.796	177.006	UPRAVENÝ TERÉN	434	710835.754	1037300.084	176.261	UPRAVENÝ TERÉN
354	710639.783	1037158.874	177.095	UPRAVENÝ TERÉN	435	710816.474	1037288.538	176.181	UPRAVENÝ TERÉN
355	710639.614	1037158.813	176.977	UPRAVENÝ TERÉN	436	710848.208	1037310.628	176.300	UPRAVENÝ TERÉN
356	710638.404	1037158.778	177.013	UPRAVENÝ TERÉN	437	710857.574	1037316.977	176.261	UPRAVENÝ TERÉN
357	710638.674	1037158.789	177.006	UPRAVENÝ TERÉN	438	710850.108	1037317.201	176.378	UPRAVENÝ TERÉN
358	710634.560	1037164.378	176.695	UPRAVENÝ TERÉN	439	710856.295	1037321.027	176.425	UPRAVENÝ TERÉN
359	710634.528	1037164.604	176.895	UPRAVENÝ TERÉN	440	710871.530	1037322.100	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
360	710652.131	1037162.932	176.978	UPRAVENÝ TERÉN	441	710870.326	1037326.069	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
361	710657.331	1037162.993	176.890	UPRAVENÝ TERÉN	442	710872.439	1037322.569	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
362	710661.395	1037172.059	176.833	UPRAVENÝ TERÉN	443	710874.308	1037323.358	176.016	UPRAVENÝ TERÉN
363	710662.314	1037172.314	176.832	UPRAVENÝ TERÉN	444	710889.149	1037330.985	176.251	UPRAVENÝ TERÉN
364	710661.750	1037171.798	176.834	UPRAVENÝ TERÉN	445	710882.684	1037331.778	176.262	UPRAVENÝ TERÉN
365	710660.895	1037170.952	176.838	UPRAVENÝ TERÉN	446	710884.093	1037327.948	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
366	710654.790	1037164.858	176.990	UPRAVENÝ TERÉN	447	710891.515	1037337.644	176.225	UPRAVENÝ TERÉN
367	710655.294	1037165.390	176.395	UPRAVENÝ TERÉN	448	710894.056	1037334.542	176.230	UPRAVENÝ TERÉN
368	710667.860	1037174.999	176.752	UPRAVENÝ TERÉN	449	710896.623	1037336.399	176.230	UPRAVENÝ TERÉN
369	710669.087	1037173.473	176.739	UPRAVENÝ TERÉN	450	710894.607	1037340.967	176.208	UPRAVENÝ TERÉN
370	710667.463	1037173.318	176.757	UPRAVENÝ TERÉN	451	710905.926	1037344.765	176.705	UPRAVENÝ TERÉN
371	710663.246	1037172.918	176.828	UPRAVENÝ TERÉN	452	710905.060	1037348.980	176.160	UPRAVENÝ TERÉN
372	710667.126	1037175.260	176.762	UPRAVENÝ TERÉN	453	710870.331	1037326.070	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
373	710667.248	1037175.340	176.760	UPRAVENÝ TERÉN	454	710870.330	1037326.070	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
374	710669.789	1037171.752	176.734	UPRAVENÝ TERÉN	455	710870.330	1037326.070	176.309	UPRAVENÝ TERÉN
375	710670.076	1037194.015	176.494	UPRAVENÝ TERÉN	456	710879.064	1037325.368	176.231	UPRAVENÝ TERÉN
376	710669.869	1037194.526	176.506	UPRAVENÝ TERÉN	457	710645.165	1037159.268	176.804	UPRAVENÝ TERÉN
377	710669.046	1037196.310	176.570	UPRAVENÝ TERÉN	458	710643.026	1037179.926	181.226	UPRAVENÝ TERÉN
378	710670.914	1037192.276	176.480	UPRAVENÝ TERÉN					
379	710665.779	1037194.111	178.434	UPRAVENÝ TERÉN					
380	710665.188	1037193.758	178.753	UPRAVENÝ TERÉN					
381	710664.222	1037193.233	179.274	UPRAVENÝ TERÉN					
382	710663.375	1037192.624	179.769	UPRAVENÝ TERÉN					
383	710662.312	1037191.421	181.266	UPRAVENÝ TERÉN					
384	710659.005	1037191.364	181.776	UPRAVENÝ TERÉN					
385	710663.889	1037193.771	179.254	UPRAVENÝ TERÉN					
386	710900.190	1037358.190	176.270	UPRAVENÝ TERÉN					
387	710904.310	1037357.200	176.200	UPRAVENÝ TERÉN					
388	710903.780	1037364.390	176.510	UPRAVENÝ TERÉN					
389	710897.760	1037364.430	176.830	UPRAVENÝ TERÉN					
390	710897.450	1037357.010	176.500	UPRAVENÝ TERÉN					
391	710901.960	1037366.210	176.360	UPRAVENÝ TERÉN					
392	710897.000	1037359.180	181.670	UPRAVENÝ TERÉN					





















Blanik Aircraft CZ, s.r.o
Beranových 65
areál Letov

Zeprís s.r.o.
IČO 25117947

Telephone:
Email: tomas.hala@ase.cz
TERMS AND CONDITIONS

Mokrý stříkání pole zábradlí,
odmaštění acetonem
základová barva DYNA epoxid
svrchní barva DYNA Akryl
odstín RAL 5022
dodací lhůta 2 týdny
záloha 30% předem
doplatek po převzetí díla

THANK YOU

For questions concerning this quote,
please contact

WORK SITE LOCATION

Beranových 65
areál Letov
Praha 9 - Letňany, 199 00

DATE
OF QUOTE

15-Aug-2023

WORK
START DATE

TBD

WORK
END DATE

TBD

QUOTE
NUMBER

2023-007

VALID
UNTIL

31-Aug-2023

PAYMENT
DUE BY

TBD

PARTS

QTY

UNIT PRICE

TOTAL

Mokrý nátěr jednoho pole zábradlí

70,00

2 884,00 CZK

201 880,00 CZK

TOTAL PARTS

201 880,00 CZK

SERVICES

QTY

UNIT PRICE

TOTAL

TOTAL SERVICES

0,00 CZK

TOTAL

201 880,00 CZK

DISCOUNT

0,00 CZK

SUBTOTAL LESS DISCOUNT

201 880,00 CZK

TAX RATE

21,00

TOTAL TAX

42 394,80 CZK

SHIPPING/HANDLING

0,00 CZK

OTHER

0,00 CZK

TOTAL

244 274,80 CZK

CUSTOMER SIGNATURE

The first part of the paper discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also mentions the scope of the study and the limitations. The second part of the paper discusses the methodology used in the study. It mentions the data sources and the data collection methods. The third part of the paper discusses the results of the study. It mentions the findings and the conclusions. The fourth part of the paper discusses the implications of the study. It mentions the practical implications and the theoretical implications. The fifth part of the paper discusses the future research. It mentions the areas for further research and the suggestions for future studies.

References

1. Smith, J. (2010). The importance of the study and the objectives of the research. *Journal of Research*, 10(1), 1-10.
2. Jones, A. (2011). The methodology used in the study. *Journal of Research*, 11(2), 1-10.
3. Brown, C. (2012). The results of the study. *Journal of Research*, 12(3), 1-10.
4. White, D. (2013). The implications of the study. *Journal of Research*, 13(4), 1-10.
5. Black, E. (2014). The future research. *Journal of Research*, 14(5), 1-10.
6. Green, F. (2015). The importance of the study and the objectives of the research. *Journal of Research*, 15(6), 1-10.
7. Grey, G. (2016). The methodology used in the study. *Journal of Research*, 16(7), 1-10.
8. White, H. (2017). The results of the study. *Journal of Research*, 17(8), 1-10.
9. Black, I. (2018). The implications of the study. *Journal of Research*, 18(9), 1-10.
10. Brown, J. (2019). The future research. *Journal of Research*, 19(10), 1-10.

Appendix

The appendix contains the data used in the study. It includes the raw data and the processed data. The raw data is presented in Table 1 and the processed data is presented in Table 2. The appendix also includes the code used in the study. The code is presented in Table 3. The appendix is an important part of the paper as it provides the reader with the data and the code used in the study. This allows the reader to verify the results of the study and to reproduce the study if needed.

Cenová nabídka pro investora společnost Zepris s.r.o. - IČ : 2511794

Lakování zábradlí cyklostezky:

Pole zábradlí cca 2,5 x 1,3 m, celkem 143 bm, barva RAL5022

Naceňuji 1 pole zábradlí o rozměrech viz výše, lakování mokrou variantou.

Postup práce: manipulace

základování reaktivním základem

2x lakování požadovaným barevným odstínem

včetně dopravy vlastním dodávkovým vozem

Cena 1 pole zábradlí činí 4950 Kč bez DPH.

V případě přistoupení na mou nabídku požaduji termín přijetí dílů a jejich dodání (popř. průběžné dodání dílů).

Dále Vaši písemnou objednávku a vše potřebná data k fakturaci a ke splatnosti faktury.

Děkuji za vyřízení a těšíme se na spolupráci. Čekáme Vaši odpověď a názor na naši nabídku.

V případě zájmu nás kontaktujte, co nejdříve, abychom mohli zakázku zrealizovat.

Při jakýchkoliv nejasnostech se na nás neváhejte obrátit, řešíme každou zakázku s individuálním přístupem.

Zakázku zpracoval: SPEKTRUMLAK CZ

Vacek Petr

Komárov 44

530 02 Pardubice





s politováním Vám musíme oznámit, že po zvážení všech hledisek a na základě rozhodnutí vedení Zbyněk Šustr s.r.o. nebudeme realizovat lakování ocelového zábradlí na akci : „cyklostezka Lysá nad Labem“

K tomuto rozhodnutí nás vede skutečnost, že nejsme schopni, vzhledem ke kapacitním možnostem - nalakovat ocelové zábradlí..

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

S upřímným pozdravem

Michal Dvořáček


vedoucí závodu



E-mail: dvoracek@sustrgroup.cz



ŠUSTR
OCELOVÉ KONSTRUKCE

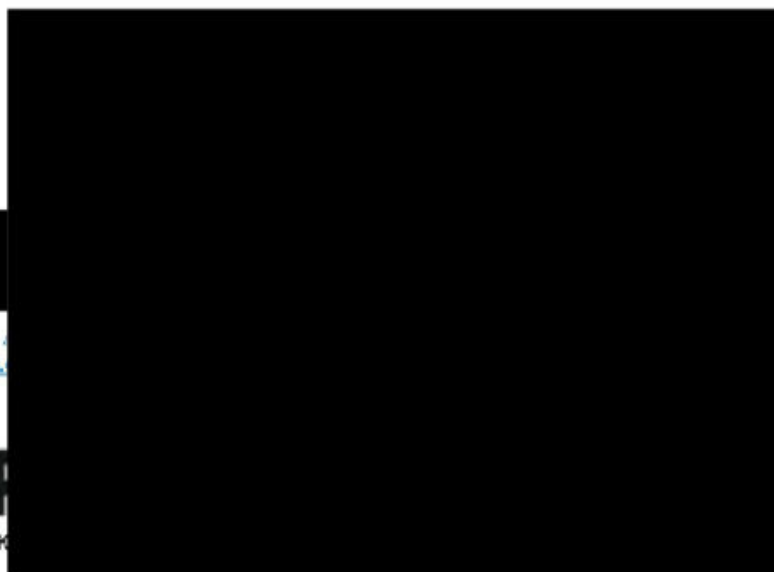

Vaše č.j.	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II	Sdružení Z + F lávka Lysá n/L ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4
Naše spis. zn.		
Naše č.j.		
Vyřizuje:		
Tel.:		
E-mail:		
Datum:		

Věc: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II - vyjádření TDI k návrhu ZBV 5

Byla posouzena žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby:

ZBV 5 - SO 104/1 Cyklostezka na PB – změna rozsahu prací dle skutečnosti

Na základě zjištění skutečného stavu na místě a v rámci dopracování RDS došlo k úpravě rozsahu prací na cyklostezce a jejím okolí dle skutečnosti. Další úpravy nastaly dle požadavků objednatele a technickými důvody.

Především stávající terén neodpovídal předpokladům PDPS a došlo k navýšení objemu násypového tělesa dle skutečnosti, na místě stávajícího zemního tělesa byly zachyceny žb panely bránící dalšímu postupu prací, které bylo nutno zdemontovat a zlikvidovat. Naproti tomu se snížil rozsah prací při kácení stromů a odstranění křovin.

Z technických důvodů došlo po dohodě ke změně použité asfaltové směsi ACO.

Na žádost objednatele byla sjednocena povrchová úprava zábradlí cyklostezky a zábradlí na mostě. S ohledem na technické provedení asfaltových vrstev a poměry cyklostezky byl upraven rozsah dilatační zálivky.

Změna byla nepředvídaná, nezbytná a má vliv na rozsah a cenu díla.

Změna je ve výši změn záporných -166 709,43Kč bez DPH a změn kladných 302 607,81 Kč bez DPH.

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 135 898,37 Kč bez DPH.

TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV5 včetně všech jeho příloh a konstatuje:

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění předloženém objednatelům Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru č. S-1913/DOP/2020)
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo a „Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV5 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Jakub Líha, TDI - pracovník pro kontrolu rozpočtu

J

Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

KSUS Středočeského kraje p.o.

František Jelínek

Zborovská 11

Praha. 150 21

Čj : PX 2024

V Praze : 30. září 2024

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.: 736 662 206

e-mail: hrdina@pontex.cz

Akce: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe

Věc: Vyjádření AD č. 12

Vážený pane Jelínku,

AD obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 5, které řeší změnu SO 104 v následujících dílčích bodech.

1. Změna obrusné vrstvy

V rámci zadávací dokumentace byla obrusná vrstva navržena ze směsi ACO 8 PmB.

Zhotovitel navrhl objednateli změnu pojiva ve směsi na silniční asfaltové pojivo (tj. nemodifikované) a zhotovitel s návrhem souhlasil. AD se k této problematice vyjádřil ve vyjádření AD č. 1.

2. Změna rozsahu kácení

V rámci zadávací dokumentace bylo předpokládáno kácení dřevin v přímé kolizi se stavbou a ochrana ponechaných dřevin tak, aby nebyly poškozeny činností stavby.

Stav dřevin mezi zpracování průzkumů území pro projektovou přípravu a zahájení realizace stavby se změnil, nebylo nutné provádět ochranu dřevin a rozsah kácení se zmenšil.

3. Změna množství objemu zemních prací

V rámci zadávací dokumentace byl proveden návrh sklonu svahů zemního tělesa dle ČSN 73 6133 na nejstrmější svah umožňující údržbu. Tímto návrhem byly umenšeny zemní práce. Výpočet objemu zemních prací odpovídal min. možnému zazubení do stávajícího svahu.

V rámci realizace došlo ke zvětšení zazubení kvůli přístupnosti jednotlivých pracovních míst a mírným odchylkám od navrženého sklonu svahu, které zvětšily objem zemních prací.

4. Neprovedení zálivek podél obrubníků

V rámci zadávací dokumentace bylo navrženo těsnění spoje obrusné vrstvy a obrubníku asfaltovou zálivkou.

Na návrh zhotovitele objednatel souhlasil, že těsnění nebude provedeno.

5. Odstranění železobetonových panelů

V rámci zadávací dokumentace nebylo odstranění silničních panelů předpokládáno – nebyly na místě nalezeny.

V průběhu stavebních prací bylo objeveny silniční panely, které byly v kolizi s prostorovým návrhem stavby a bylo je nutné odstranit pro dokončení stavby.

6. Sjednocení povrchové úprava zábradlí

V rámci zadávací dokumentace byla pro zábradlí podél stezky uvažována protikorozní ochrana dle TKP 19b (tj. III.E – žárovým zinkováním).

Na základě požadavku objednatele byla protikorozní ochrana sjednocena se zábradlím na mostě tj. 4 vrstvá s nátěrem.

AD souhlasí s návrhem ZBV č. 5

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina























Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 19.5.2023

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených události / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Na základě požadavku investora dojde k navýšení počtu informačních tabulí o 2 ks a zhotovení 2 ks informačních bannerů.
- 2) Změna v rámci RDS.
 1. SO 102: V rámci detailního průzkumu území pro dopracování RDS, bylo shledáno, že původní projekt předpokládal výstavbu křižovatky v prostoru původní cesty, kde ale mezitím byla zhotovena asfaltová komunikace. Navržené řešení je napojení komunikace do stávající konstrukce silnice. Tím dojde ke snížení objemu prací. Rekonstrukce stávajícího oplocení není, vzhledem ke stávajícímu stavu, nutná. Původní oplocení, které mělo být nahrazeno již bylo zrušeno.
 2. SO 103 a SO 104: V rámci změn RDS byla navržena změna asfaltové směsi ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, která je vhodnější pro komunikace s velkým zatížením. Poměry oblouků cyklostezky neumožňují technické provedení v požadované kvalitě při použití modifikované směsi. Při pohybu finišeru v oblouku by mohlo dojít k vytvoření mikrotrhlin, které by v kombinaci s nízkou pružností směsi mohly způsobit narušení povrchu například vlivem mrazu. To by vedlo k významnému snížení životnosti vozovky.

3. Stávající svodidla na SO 103 byla shledána v dobrém stavu a v rozsahu, který odpovídá požadavku PDPS. Není tudíž nutná jejich náhrada a bude místo toho provedena pouze zpětná montáž.
4. Na SO 103 dojde ke sjednocení technologie dláždění s objekty SO 202, SO 104 a zbývajících mostních konstrukcí mimo stavbu. Na SO 103 byla původně navržena dlažba z kostek žulových, nicméně všechny ostatní konstrukce dlažeb byly navrženy z lomového kamene, a to včetně částí navazujících na navrženou žulovou dlažbu. Pro sjednocení vizuálního vjemu se zbytkem mostu, bude použit lomový kámen se spárováním.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem





Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 13.6.2023

**Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem -
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla**

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Po odstranění drnu na objektech SO 103 a 104 byla zjištěna přítomnost 19 ks železobetonových panelů v místě zřizování stupňů v podloží. Tyto panely brání v postupu prací, je nutno odstranit.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem

Mgr. Michael Kalný
stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Tel.: 725 950 706
Email: kalny@zepris.cz





Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 25.7.2023

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených události / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Ze skutečného zaměření množství násypů na objektech SO 103, 104 a 202 vyplývá navýšení množství násypů. Toto množství bude doloženo protokolem o zaměření skutečného množství.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem





Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 13.7.2023

**Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem -
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla**

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) Z požadavku investora bude zábradlí na cyklostezce na SO 103 a 104 opatřeno nátěrem ve stejném barevném provedení jako mostní zábradlí na SO 202. KD. Č 5 projednání.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem





Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 08.01.2024

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:

- 1) V rámci celé stavby proběhly doměrky dle skutečně zjištěného množství prostavěnosti, týkající se zejména množství odstranění křovin, kácení, ochrana stromů.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem

