

SMLOUVA O DÍLO

číslo 227/2024

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

STG trade, s.r.o.

se sídlem **Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov, Česká republika**

Identifikační číslo: 25832069

Daňové registrační číslo: CZ25832069

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
Radlická 333/150,
Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika

Číslo účtu: **152038972/0300**

IBAN: CZ26 0300 0000 0001 5203 8972

BIC/Swift: CEKOCZPP

Společnost je zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20286.

Zastupující: **Rostislav Schnürch, jednatel společnosti**, tel.:

(dále jen „**z h o t o v i t e l**“)

a

EKO servis Zábřeh s.r.o.

se sídlem **Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh**

Identifikační číslo: 25896903

Daňové identifikační číslo: CZ25896903

Bankovní spojení:

Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24885.

Zastupující: **Bc Milan Doubravský, jednatel**,

(dále jen „**o b j e d n a t e l**“)

oba dále společně nazýváni jen „účastníci“ nebo „účastníci smlouvy“

uzavřely

níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě v souladu
s občanským zákoníkem a dále uvedených podmínek tuto

Smlouvu o dílo.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele stavební výrobek:

Sestava kontejnerů 6055 x 6010 x 2920 mm, vnitřní výška 2600 mm,

dle technického popisu a půdorysného schématu, které jsou nedílnou přílohou číslo 1. a 2. této
Smlouvy o dílo, dále jen „**díla**“ nebo „**předmětu smlouvy**“.

2. K dílu budou předány následující doklady:

1x zpráva o revizi elektrického zařízení, dle ČSN (výchozí revize)

1x schéma elektrického zapojení rozvodnice + půdorys s elektroinstalací

1x záruční listy zařizovacích předmětů (dle vybavení kontejneru a v rozsahu dle výrobců)

1x obecný návod k použití a údržbě obytných a sanitárních kontejnerů

1x prohlášení výrobce o jakosti a kompletnosti výrobku

Všechny doklady jsou v českém jazyce, není-li uvedeno jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v dohodnutém termínu, ve sjednaném množství, druhu
a obvyklé jakosti, a převést na objednatele vlastnické právo a nebezpečí škody za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.

4. Součástí díla je doprava a kompletace díla na adrese: **789 01 Zábřeh, Dvorská 1491/19** kde si objednatel nebo jeho oprávněný zástupce dílo převezme. Za oprávněnou osobu bude považována osoba podepisující předávající protokol, nestanoví-li tato smlouva konkrétně jinak. Odbornou vykládku kontejnerů v místě kompletace zajistí objednatel sám na vlastní riziko a náklady, v dohodnutém termínu. Zhotovitel mu poskytne dostatečnou odbornost a součinnost. Kompletace v celém rozsahu díla je prováděna v pracovní době, v jednom nepřetržitém časovém období. Termín počátku kompletace zhotovitel potvrdí objednateli nejméně 3 dny před započatím kompletace.

Kontaktní osoba objednatele: ☐ tel.: ☐
e-mail: ☐

Kontaktní osoba zhotovitele: ☐

5. Objednatel se touto smlouvou o dílo zavazuje převzít od zhotovitele dílo dle článku II. smlouvy v dohodnutém termínu, co do množství, druhu a rozsahu, zaplatit zhotoviteli cenu díla, převzít na sebe vlastnické právo a nebezpečí škody za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
6. Zástupce (zástupci) objednatele i zhotovitele prohlašují (jednotně prohlašují), že na majetek objednatele i zhotovitele není podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo vůči majetku objednatele i zhotovitele neprobíhá insolvenční nebo exekuční řízení, a že objednatel má dostatek volných finančních prostředků umožňující řádnou úhradu kupní ceny v souladu se sjednanými platebními podmínkami.
7. Objednatel se zavazuje užívat dílo k účelu – **kancelářské zázemí**. Předmět smlouvy není určen k výkonu trvalé práce ve smyslu §46, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
8. Objednatel bere tímto na vědomí, že celoročně je zařízení nutno dostatečně provětrávat (zamezit kondenzaci vodních par) a v zimním období je nutno zařízení dostatečně temperovat (chránit proti zamrznutí) a zabezpečit proti možné škodě způsobené mrazem, sněhem, ledem. Objednatel se zavazuje užívat dílo a provádět průběžnou údržbu v souladu s obecným návodem k použití a údržbě obytných a sanitárních kontejnerů.
9. Objednatel se zavazuje převzít dílo k užívání, a to i v případě vad, které nemají vliv na účel užívání. Případné vady budou odstraněny zhotovitelem v dohodnutém termínu 14 dnů. Vady nebránící objednateli v užívání předmětu smlouvy neznamenaají prodloužení zhotovitele s dodávkou předmětu smlouvy.
10. Zatřídění kontejnerových systémů a sestav, dle klasifikace produkce CZ-CPA:
- | | | |
|--------|----------|-------------------------|
| SKP | 28.11.10 | Kovové montované stavby |
| CZ-CPA | 25.11.10 | Kovové montované stavby |

III. Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy o dílo je vyroben v souladu s platnými technickými normami a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví, kladenými na druh výrobku Obytné kontejnery, obytné buňky. Výrobce neručí za případný nesoulad s hygienickými nebo technickými normami ve vztahu k účelu užívání.

IV. Cena díla

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a prováděcími předpisy se účastníci dohodli na ceně s DPH za předmět smlouvy blíže specifikovaný v článku II. této smlouvy takto:

Sestava kontejnerů 6055 x 6010 x 2920 mm / 2600 mm **383.400,- Kč**
včetně dopravy a kompletace v místě plnění

DPH bude účtováno dle platných předpisů, t.č. činí DPH 21 % **80.514,- Kč**

Celková cena díla, vč. DPH 21 % **463.914,- Kč**
(slovy: čtyři sta šedesát tři tisíc devět set čtrnáct korun českých)

V. Termín plnění

1. Termín splnění díla je stanoven do **12. března 2025** včetně, v místě plnění dle této smlouvy.
2. Termín dodání dokladů uvedených v čl. II, této smlouvy je stanoven při převzetí díla.
3. Zhotovitel není v prodlení s dodávkou dle této smlouvy o dílo v případě, že neobdrží platbu od objednatele dle dohodnutých podmínek v čl. VI. Termín plnění se prodlužuje s každým dnem v prodlení s úhradou zálohové platby, bez sankcí smluvní pokuty.
4. V případě, že objednatel je v prodlení s úhradou zálohy delší než 7 dnů má zhotovitel nárok stanovit objednateli zcela nový termín plnění s ohledem úhradu zálohy a výrobní možnosti.

VI. Platební podmínky

Účastníci smlouvy si dohodli následující platební podmínky:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za dílo, takto:

1. zálohu ve výši 60 % z celkové ceny díla včetně příslušného DPH, v termínu do 20. 01. 2025, a
2. doplatek 35 % ceny díla včetně DPH zaplatí objednatel do 14 dnů po předání díla k užívání, doplatek 5 % ceny díla včetně DPH (zádržné do doby odstranění vad a nedodělků nebránících v užívání díla) do 14 dnů po konečném předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli úplnou cenu díla dle článku IV. neprodleně po předání bez vad a nedodělků bránících užívání díla v souladu s jeho účelem užívání. Ve faktuře, daňovém dokladu zohlední přijaté zálohy ke dni vystavení daňového dokladu.
4. V případě, že objednatel svým přičiněním nebo překážkami na jeho straně neumožní dopravu kontejnerů nebo řádné provedení kompletace ve sjednaném termínu, má zhotovitel nárok vyúčtovat druhou mimořádnou zálohu ve výši 35% ceny díla včetně DPH se splatností 14 dnů objednateli v den uplynutí lhůty pro předání díla. Doplatek 5% ceny díla včetně DPH se splatností do 14 dnů, bude odběrateli vyúčtován po provedení kompletace a po konečném předání díla bez vad a nedodělků.
5. V případě prodlení s úhradou ceny díla nebo její části, dle těchto platebních podmínek, může zhotovitel požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení.
6. Cenu díla včetně případného rozdílu ceny díla dle článku VIII., odst. 13 uhradí objednatel výhradně na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

VII. Záruční doba, reklamace

1. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, tj. předání a převzetí díla.
2. Nároky objednatele při dodávce díla zanikají, nejsou-li předloženy písemně v předávacím protokolu, u zjevných vad při předání díla (to jsou vady zjištěné při přechodu „nebezpečí škody na díle“). U skrytých vad je to lhůta 24 měsíců od převzetí díla. Záruční lhůta na ocelovou konstrukci 60 měsíců.
3. Zhotovitel posoudí oprávněnost reklamace do 7 pracovních dnů od jejího doručení a sdělí objednateli způsob vyřízení oprávněné reklamace nebo zamítne jako neoprávněnou. Oprávněná reklamace bude pak odstraněna do 7 pracovních dnů, nedohodnou-li se účastníci jinak.
4. Záruky na zařizovací předměty se řídí záručními podmínkami příslušných výrobců.
5. Objednatel ztrácí záruku především v případě, když do díla provede neodborné zásahy, jimiž naruší konstrukci nebo některou z funkčních vlastností díla. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo poškození a vady vzniklé v důsledku běžného užívání, opotřebení nebo úmyslného chování. Záruka se neposkytuje i v případě užívání v rozporu s návodem k použití a údržbě obytných kontejnerů nebo při užívání k jinému účelu, než je uvedeno v této smlouvě.
6. Žádné další záruky a závazky na sebe zhotovitel nepřebírá kromě případu, že je ve smlouvě o dílo ujednáno jinak.

VIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmět smlouvy je stavebním výrobkem a následně stavbou, na kterou je nutné vypracovat projektovou dokumentaci autorizovanou osobou a provést stavební řízení, ve smyslu Stavebního zákona.
2. Zhotovitel neručí za soulad předmětu smlouvy s §46, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví světlá výška prostor pro práci.
3. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmět smlouvy nesplňuje normu ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Norma neplatí pro obytné buňky, viz odstavec č. 1, předmět normy.
4. Zhotovitel neodpovídá za parametry instalovaného vnitřního osvětlení vůči požadavkům ČSN EN 12464. ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení, Osvětlení pracovních prostor Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Za soulad instalovaného osvětlení vůči požadavkům ČSN EN 12464 vzhledem k zamýšlenému způsobu využití výrobku odpovídá objednatel.
5. Objednatel zajistí na vlastní náklady a riziko odborné připojení díla k inženýrským sítím, vodě, odpadu, elektřině a provede příslušné zkoušky. Dále provede řádné stavební řízení, vyžaduje-li to zákon. Zhotovitel mu poskytne odbornost a součinnost.
6. Za neodborné připojení díla k inženýrským sítím nese riziko objednatel.
7. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení a předání díla. Zajistí k hladkému průběhu kompletace díla zhotoviteli přístup k přípojce elektrické energie a dále kontejner (popelnici, nádobu) na drobný komunální odpad, a to na vlastní náklady.
8. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 6 tohoto článku se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.
9. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že předmět smlouvy o dílo plně splňuje zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších zákonů, o technických požadavcích na výrobky. Dílo nebo výrobek není vybraným výrobkem ve smyslu zákona č. 22/1997, a výrobce není oprávněn na něj vydat prohlášení o shodě.
10. Předmět smlouvy o dílo je převzat objednatelem potvrzením dodacího listu, resp. předávacího protokolu, po předchozí kontrole kompletnosti díla.
11. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla (a to i včetně vedlejších vad a nedodělků) v místě stanoveném v této smlouvě o dílo.
12. V případě, že kompletace celého díla nepřijde provést z důvodu překážek na straně objednatele v jednom nepřetržitém časovém období, má zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů spojených s každým započatím kompletace díla ve výši 10.000,00 Kč + příslušné 21 % DPH.
13. Případné technické změny díla požadované nebo zjištěné v průběhu realizace, budou objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseny elektronickou poštou (zaručený elektronický podpis se nevyžaduje).
14. Případné technické změny v provedení díla, změny do výše 20% ceny díla nebo termínu dodání díla vzešlé v průběhu realizace, budou objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseny elektronickou poštou (zaručený elektronický podpis se nevyžaduje). Oprávněným k potvrzení těchto změn je ze strany objednatele kontaktní osoba nebo zastupující, nestanoví-li tato smlouva jinak.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,07 % z ceny nedodaného plnění za každý započatý den prodlení, minimálně 100,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu v termínu 7 dnů od úplného zaplacení ceny díla zaplatit.
2. V případě prodlení s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,07 % denně z dlužné částky, minimálně 100,- Kč za každý den prodlení. Objednatel se zavazuje, zhotovitelem vyúčtovanou smluvní pokutu v termínu 14 dnů od obdržení vyúčtování uhradit.

X. Zvláštní ujednání

Vyšší moc – okolnosti vylučující odpovědnost

1. V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu smlouvy předvídat, a které způsobí zhotoviteli překážku v plnění jeho smluvních podmínek, je zhotovitel oprávněn posunout lhůtu plnění na dobu, po kterou tato překážka trvala, a o přiměřenou potřebu k rozběhu své normální činnosti.

- Okolnosti vylučující odpovědnost představují události, které zhotovitel při péči, kterou lze po něm požadovat, nemůže odvrátit, např. stávka, válka, povstání, nepokoje, různá opatření úřadů, přírodní události, jako povodně, záplavy, sněhové vánice, vichřice atd., dále zhotovitelem nezaviněné zpoždění dodávek materiálů, energií a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností zhotovitele.

XI. Závěrečná ustanovení

- Obě strany se dohodly, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran.
- Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou o dílo, se řídí ustanoveními občanského zákona v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejbližší původnímu záměru v ekonomickém smyslu.
- Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá strana obdrží jeden stejnopis.
- Účastníci smlouvy prohlašují, že se seznámili s textem této smlouvy a obsahu rozumí. Smlouva není uzavírána proti jejich vůli.
- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem účastníků.

Přílohy:

- číslo 1. - Technický popis kontejnerů
- číslo 2. - Půdorys sestavy kontejnerů

V Krnově, dne 2025

V Zábřehu, dne 2025



Digitálně podepsal
Rostislav Schnürch
Datum: 2025.01.13
11:16:05 +01'00'

.....
za STG trade, s.r.o.,
Rostislav Schnürch, jednatel

**Bc. Milan
Doubravský**

Digitálně podepsal
Bc. Milan Doubravský
Datum: 2025.01.13
10:15:20 +01'00'

.....
za EKO servis Zábřeh s.r.o.
Bc. Milan Doubravský, jednatel

Technický popis kontejnerů ke Smlouvě o dílo číslo 227/2024

**Sestava kontejnerů 6055 x 6010 x 2920 mm, vnitřní výška 2600 mm,
Skládající se z:
2 ks kontejnerového modulu 6055 x 3000 x 2920 mm/2600 mm**

Provedení kontejneru:

Základní modul kontejneru: 6055 x 3000 x 2920 mm, vnitřní výška 2600 mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikoročním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvizného vozíku.

Standardní izolace (podlaha/stěny/strop): 100/80/100 mm

Podlaha: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), cementotřísková deska tl. 20 mm, PVC podlahová krytina – šedá, mramorovaná, tl. 1,4 mm.
Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 250 kg/m².

Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.
Nosnost (zatížení): standardně 150 kg/m².

Vnější dveře:

- vnější dveře plastové – průchozí rozměr 810 x 1970 mm, z obou stran bílé, plné	- 1 ks
s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou,	
opatřené venkovní žárově zinkovanou mříží,	není
opatřené samozavíračem, tzv. branem	- 1 ks

**Upozornění: Plastové dveře je nutné průběžně i několikrát za rok seřizovat!
Seřízení a údržba plastových dveří není předmětem záruky výrobce!
Prodávající provede první seřízení při dodávce.**

Okna: plastová, s izotermickým sklem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, z obou stran bílá

- okno jednokřídlé 1200 x 1200 mm, otvíravé, sklopné,	- 2 ks
opatřené venkovní pozinkovanou mříží,	není
opatřené vnitřní žaluzií bílé barvy,	není
opatřené venkovní plastovou roletou	- 2 ks

Výška parapetu oken standardně 850 mm.

Elektroinstalace: 3x400/230 V, 50 Hz, TN-S,

dle ČSN 33 2130 ed.3, souboru norem ČSN 33 2000, ČSN 50 174 a ČSN 7308XX.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek ZA.4 - prostory normální.

tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami.

Instalace je tažena ve stěnách kontejnerových modulů, propojení mezi kontejnery ve stěně.

Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel apod. dle situačního nákresu.

- rozvaděč na omítku 12 MOD, IP40 (nebo obdobný)	- 1 ks
- proudový chránič 40/4/003, dI=30 mA	- 1 ks
- jističe:	
1x světelný okruh, 10A/B (S1)	
2x zásuvkový okruh, 16A/B (Z1, Z2)	
2x zásuvkový okruh – pro topení, 16A/B (ZT1, ZT2)	

- svítidlo LED 36 W, MODUS KX5000M4KO/ND - 4 ks
- přívod elektrického proudu – venkovní nástěnná krabice Spels ABOX 40-4 se svorkovnicí, - 1 ks
umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru,
přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4

Dodávka a instalace datových sítí: není

Vytápění:

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 2000 W, IP24, - 2 ks
Fenix ECOFLEX F117T-TAC 2000W, s vestavěným termostatem
(se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou)

Odvětrávání:

- Přirozené odvětrávání prostoru, okny (viz položka okna)
- Odvětrávání prostoru, standardní ventilátor ø100mm (s doběhem), **není**

Klimatizace: **není**

Ostatní vybavení:

- V sestavě jsou kontejnery mezi sebou utěsněny gumovým těsněním, sešroubovány pozinkovanými šroubovými spoji, propojeny PE zemnicemi propojkami a opatřeny šrouby pro přizemnění M10.

Povrchová úprava: provedení jednobarevné, barevný odstín **šedobílá, RAL 9002**

Dispoziční řešení: dle přiloženého nákresu

Hmotnost kontejneru / 1 modulu: cca do 2.700 kg

(orientační informace jen pro účely zajištění jeřábu s čtyřbodovým uchycením, čtyřháčkem)

Usazení kontejneru / kompletace sestavy kontejnerů:

Kontejnery se pokládají na rovný zpevněný podklad nebo základové pásy (patky). Na manipulaci je potřebný jeřáb.

Kompletací sestavy kontejnerů se rozumí přiměřené ustavení kontejnerových modulů na předem připravené základové pásy. Propojení jednotlivých modulů přívody elektrické energie a propojení uzemňovacími propojkami.

K sestavě kontejnerů je nutné přivést samostatně jištěný přívod elektrické energie a provést přizemnění dle ČSN.

Dodávka kontejneru neobsahuje provedení stavební přípravy, základy pro kontejner ani venkovní inženýrské sítě. **Dodávka rovněž neobsahuje odbornou vykládku a uložení, vč. nákladů na jeřáb v místě dodání.** Zákazník si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě sám na vlastní riziko a náklady, zajistí příslušná zákonem stanovená povolení /např. stavební řízení v rozsahu stavebního zákona a dalších předpisů/ a provede potřebné kontroly a revize.

V případě kolize textového popisu a půdorysu je závazné provedení dle půdorysu!

Vnitřní rozměry kontejneru nebo sestavy jsou uvedeny orientačně. Závazné jsou obvodové rozměry kontejneru s přiměřenou rozměrovou tolerancí.

Upozornění:
Výrobce upozorňuje, že neručí za parametry instalovaného vnitřního a vnějšího osvětlení vůči požadavkům ČSN EN 12464.
ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
Za soulad instalovaného osvětlení vůči požadavkům ČSN EN 12464 vzhledem k zamýšlenému způsobu využití výrobku odpovídá kupující.
/Kontrolní výpočty umělého osvětlení budou prováděny jen na vyžádání a za úplatu. Kupující musí stanovit umístění pracovní plochy a charakter pracovního prostoru./

Kontejnerový modul: **6055x3000x2920mm/2600mm**
Zvýšená vnitřní výška kontejneru 2600mm!

Požární odolnost stavebních konstrukcí kontejnerového modulu:
z vnitřní strany (i → o): **R15, EI30, EW30 DP2**
z vnější strany (o → i): **EI30, EW30 DP2**
Konstrukce stěn a střechy kontejnerového modulu
je v souladu s typizovaným modulem obytného kontejneru.
Požární odolnost bude doložena prohlášením výrobce.

Podlaha: CTD 20-22mm, krytina PVC, Fatra DOMO, šedá
Nosnost podlahy: **standardní 250 kg/m²**
Kontejnerový modul nelze manipulovat v zatížením stavu!

Standardní izolace (podlaha/stěny/strop): 100/80/100 mm
Použitá izolace: URSA GEO DF38, λ = 0,038 W/mK

Vnější obložení: pozinkovaný trapézovaný plech, tl. 0,55mm, lakovaný
Vnitřní obložení: LDTD, tl. 10mm, bílá, uložená v PVC profilech
Stěnové výplně - dveře: plastové, plné, oboustranně bílé
Stěnové výplně - okna: plastová s izotermickým zasklením, oboustranně bílá, opatřena vnější plastovou roletou

Elektroinstalace:
3+NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S, dle ČSN 33 2130 ed.3,
souboru norem ČSN 33 2000, ČSN 50 174 a ČSN 7308XX.
ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek ZA.4 - Prostory normální

Rozvodnice nástěnná 12MOD, IP40
Schrack N12-CW, BK080151

Jištění:
RCD1 - 1x 40/4/0.03, dI=30mA, typ AC
/plní i funkci hlavního vypínače/
S1 - 1x 10A/1B, osvětlení vnitřní
Z1, Z2 - 2x 16A/1B, zásuvky 230V, obecné
ZT1, ZT2 - 2x 16A/1B, zásuvka 230V, pro přímotop

Elektroinstalační přístroje: Schrack VISIO50
Vypínače a zásuvky dle ČSN, zapuštěná montáž.

Elektrický přívod:
- přívodní krabice se svorkovnicí, kabel CYKY-J 5x4,
Spels ABOX 60-6, u dolního rámu kontejneru

Vnitřní osvětlení:
4 ks - MODUS KX5000M40/ND, 36W, 5400lm, IP54, opálový kryt (S1)
nebo obdobné typy osvětlení

Barevné provedení: jednobarevné,
odstín: **šedobílá, RAL 9002**

Doprava a kompletace: 789 01 Zábřeh,



Digitálně podepsal
Rostislav Schnürch
Datum: 2025.01.13
11:18:55 +01'00'



Datum: 18.12.2024
Vyřizuje.

Název, popis:

SESTAVA KONTEJNERŮ
6055 x 6010 x 2920 mm / 2600 mm


STG trade, s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov / tel.: +

www.stgtrade.cz / e-mail: info@stgtrade.cz, cont@stgtrade.cz, palety@stgtrade.cz

Zakázka číslo / [N]abídka číslo:

227 / 2024 / PD

Bc. Milan
Doubravský
Digitálně
podepsal Bc. Milan
Doubravský
Datum: 2025.01.13

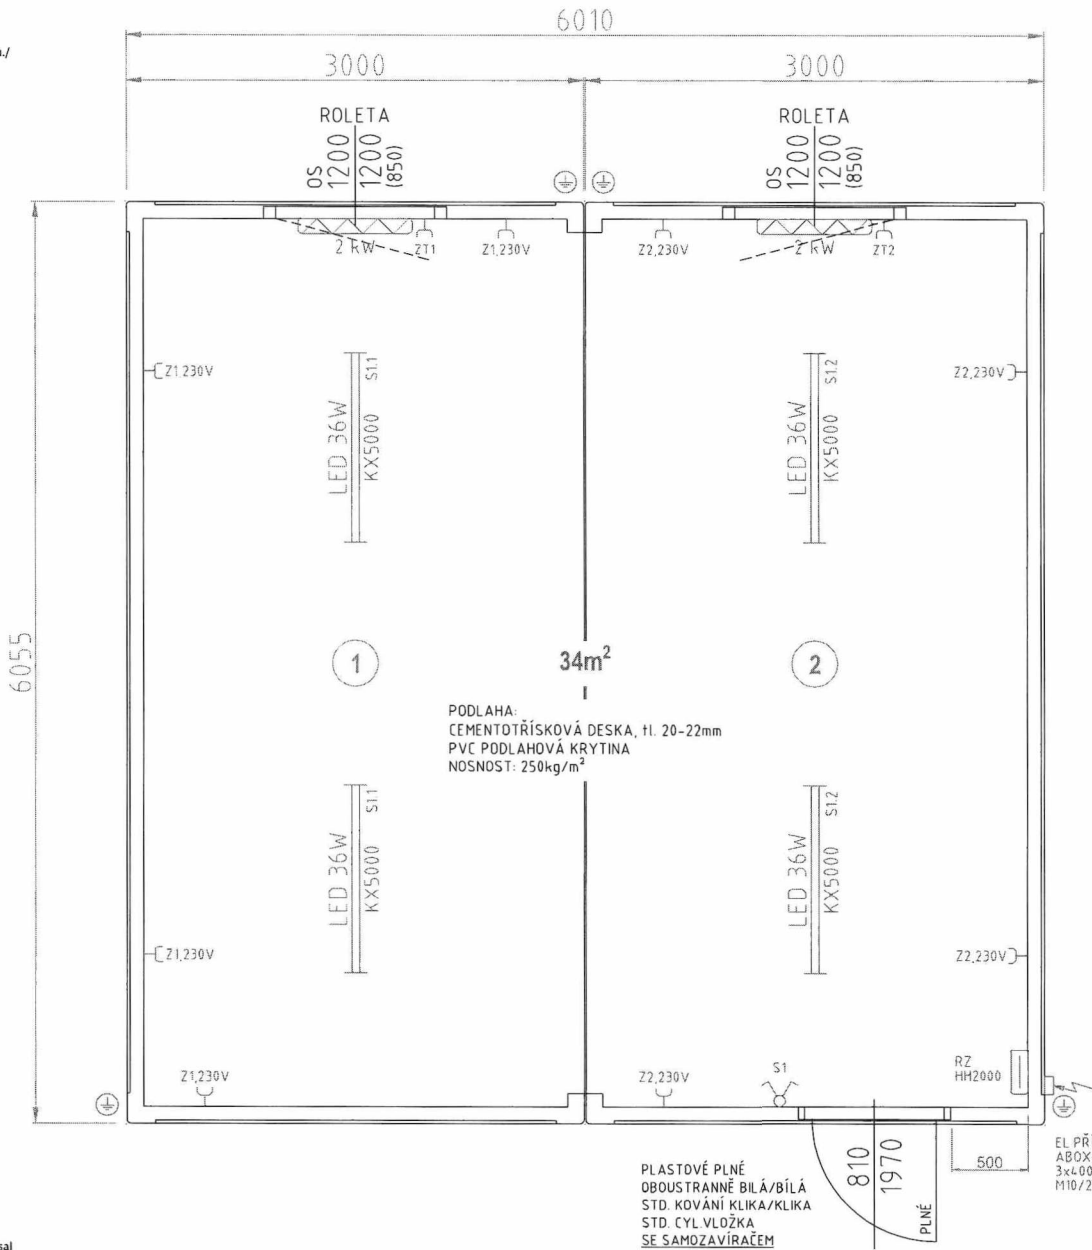

Všechny uvedené rozměry jsou zatíženy výrobní tolerancí a v případě instalace nábytku a vybavení je nutné tyto zholovit až podle skutečných vnitřních rozměrů.
Všechny pozice pokud nejsou přímo kótovány jsou orientační!

