


Příloha č. 2

Fotodokumentace k ZL č. 33

Část díla: Doplnění kanálu pro kabely v části Tuzexu, SO 101 hala

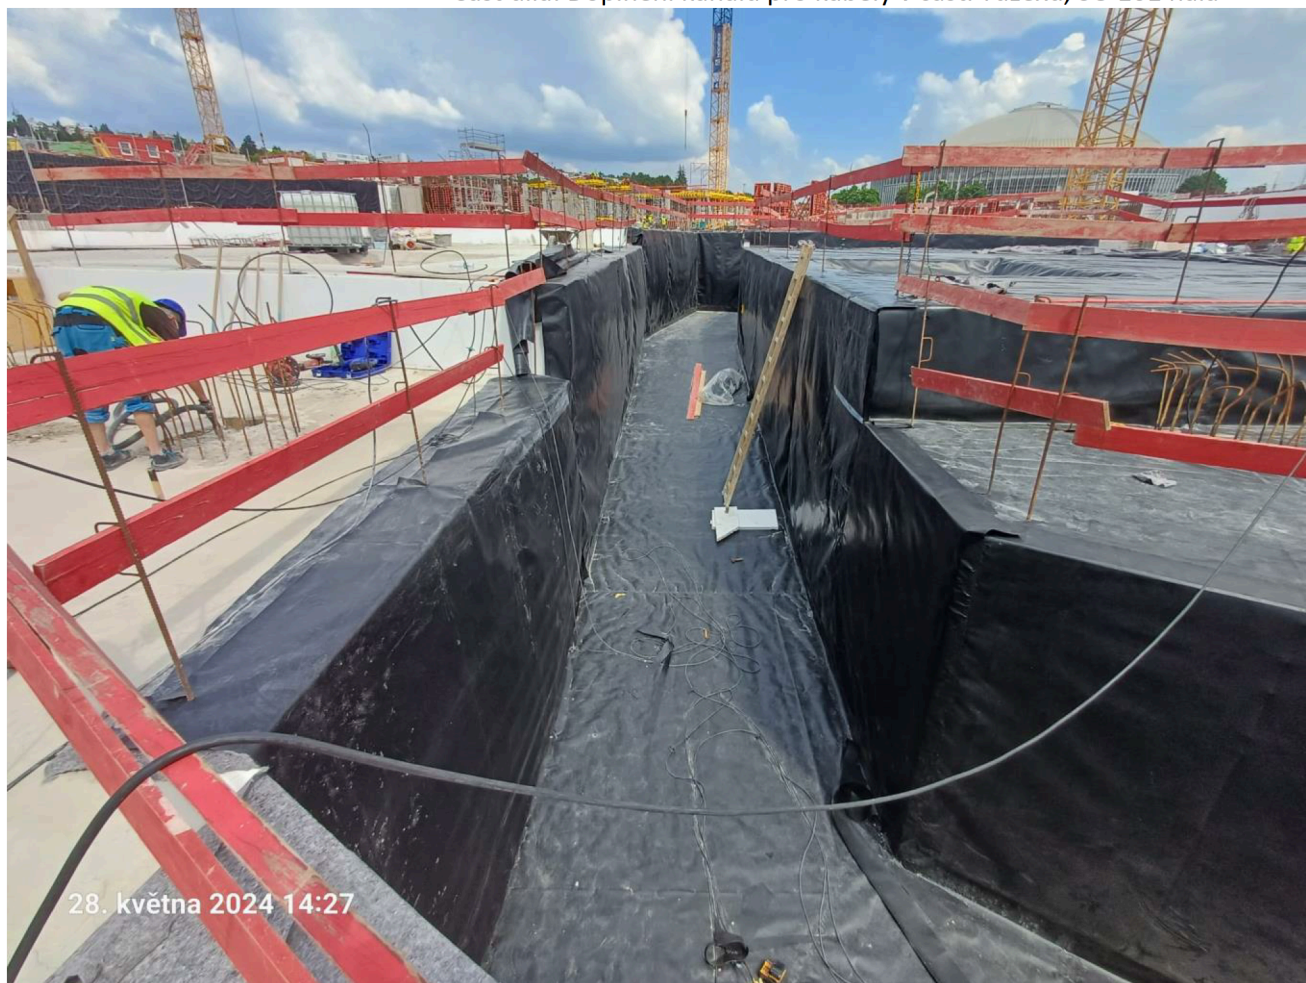

Příloha č. 2

Fotodokumentace k ZL č. 33

Část díla: Doplnění kanálu pro kabely v části Tuzexu, SO 101 hala



Příloha č. 3

k ZL č. 33 - Doplnění kanálů pro kabely u Tuzexu

Rozdíl výztuže C2-C8 po zapracování elektrokanálu [kg]

Spodní C2		
ubýlo	pc21 28ks	-410,928
ubýlo	pc71	-25,438
rozdíl	pc124+154-81	378,885
zkrátilo	pc54 31ks na pc 48	-315,722
celkem		-373,203

Horní C2		
přibýlo	pc65 4ks	164,523
přibýlo	pc33 8ks	116,395
ubýlo	pc 88 10ks	-128,232
Zkrátilo	pc57 31ks	-316,486
ubýlo	pc34 29ks	-589,991
přibýlo	pc131 15ks	129,218
přibýlo	pc132 4ks	42,662
přibýlo	pc9 8ks	59,184
celkem		-522,726

Trámy C2		
přibýlo	pc31	84,584
přibýlo	pc41	116,395
přibýlo	pc150	946,944
přibýlo	pc155	133,972
ubýlo	pc98 126ks	-1180,721
Celkem		101,174

CELKEM C2 -794,755 kg

Spodní C8		
přibýlo	pc 189 51ks	553,3704
přibýlo	pc 279 12ks	82,8576
zkrátilo	pc 64 18ks na pc57	-84,3372
zkrátilo	pc 64 22ks na pc60	-86,8032
zkrátilo	pc 64 27ks na pc69	-59,9238
zkrátilo	pc 64 12ks na pc29	-183,4704
zkrátilo	pc 55 7ks na pc 278	-48,3336
zkrátilo	pc 51 13ks na pc 277	-83,3508
celkem		90,009

Horní C8		
ubýlo	pc 40 2ks	-41,4288
ubýlo	pc 43 12ks	-260,4096
ubýlo	pc 47 6ks	-136,1232
přibýlo	pc 11 37ks	273,726
zkrátilo	pc 61 13ks na pc25	-192,348
celkem		-356,5836




Trámy C8		
přibýlo	pc 56 4ks	88,776
přibýlo	pc 23 2ks	20,7144
přibýlo	pc 88 4ks	117,3816
přibýlo	pc 111 51ks	176,0724
ubýlo	pc 97 76ks	-262,3824
celkem		140,562

CELKEM C8 -126,0126 kg

CELKEM ZMĚNA VÝZTUŽE = 46985,732 kg

	KG/M
F116	1,578
F120	2,466
F125	3,853


VV Kolektor			
C2	MSKP_DD_SO101_D12a_D3C24_VV-ZD-Kanál	24588,1	
C2	MSKP_DD_SO101_D12a_D3C24_VV-ZD-Kanál 00a	4397,6	
C8	MSKP_DD_SO101_D12a_D3C87_VV_ZD_elektrokanál	18867,5	
C8	MSKP_DD_SO101_D12a_D3C87_VV_ZD_elektrokanál 00a	53,3	
CELKEM C2 a C8		47906,5	kg



LEGENDA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ


- | | |
|---|---|
|  | ZLIZOVANÁ ROZLIŠOVANÁ KONSTRUKCE V ŘEŽI |
|  | ZLIZOVANÁ PŘEPÍŠKOVANÁ KONSTRUKCE V ŘEŽI |
|  | ZLIZOVANÁ ROZLIŠOVANÁ VODNĚPRŮPUSNÁ KONSTRUKCE V ŘEŽI |
|  | PŘEPÍŠKOVANÁ KONSTRUKCE ZLIZOVANÁ BETOVÝM ŘEŽÍ |
|  | NORM. KONSTRUKCE VÝPOČETU |
|  | NORM. KONSTRUKCE NAD PŘÍKLADY ŘEŽI (PŘÍKLAD NAD) |

POZNÁMKY

[illegible]

BETONY DLE ČSN EN 1992, ČSN EN 206+A2, ČSNP 73 2404

Protein/peptide	EWID
Zellulose deacetylase	D303P KCA, P1 V2, J64, mar, p, c, o, k, a, t, 38 mm 36 demper, 1, 3, 5, 6 N10 [7]
Oxidoreductase UPP-UPP	D303P KCA, P1 V2, J64, mar, p, c, o, k, a, t, 38 mm 36 demper, 1, 3, 5, 6 N10 [7]
Alcohol dehydrogenase UPP-UPP	D303P KCA, P1
Glucose UPP-UPP	D303P KCA, P1
Glucose oxidase UPP-UPP	D303P KCA, P1

[illegible]

Výměry Kolektor

	<i>d</i>	<i>v</i>	<i>m2</i>
Plocha pod ZD			140,98

Plocha stropu kolektoru			67,18
-------------------------	--	--	-------

Bednění: Plocha stěn uvnitř kolektoru

ŘEZ 05 pod otvorem	16,6	3,52	58,432
ŘEZ 05 za otvorem	41,33	2,1	86,793
ŘEZ 06 - Skloněná část			64,2
ŘEZ 07 - Rovná část	16,67	2,6	43,342
ŘEZ 07 - Otvor	9,06	0,6	5,436
Čela odskoku stropu	1,8	1,03	1,854
Čela odskoku stropu	1,76	0,47	0,8272
Čela odskoku stropu	3,35	1,42	4,757

Celkem			265,64
---------------	--	--	---------------

Izolace: Plocha stěn vně kolektoru

ŘEZ 05 pod otvorem	16,6	3,52	58,432
ŘEZ 05 za otvorem	41,33	2,7	111,591
ŘEZ 06 - Skloněná část			78,98
ŘEZ 07 - Rovná část	16,67	3,2	53,344

Celkem			302,35
---------------	--	--	---------------

HOCHTIEF CZ a.s.
Divize Pozemní stavby Morava

Sokolská třída 2800/99
70200 Ostrava

DATUM: Praha 20.6.2024

ČÍSLO NABÍDKY:

TEL.:

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon Brno – nabídka proj.práce
PŘEDMĚT NABÍDKY: – doplnění kanálů pro kabely- změnový list vůči investorovi č.33

1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky **doplnění kanálů pro kabely** – návrh OK a koordinace, statický výpočet, 3D model.

2. Podklady

Cenová nabídka byla zpracována na základě těchto podkladů:

Zadání změn emailem ze 7.6.2024 , potvrzené objednatelem HT () 9.6.2024.

3. Cenová nabídka

Vícepráce:	86.400,- Kč bez DPH	
	Návrh a koordinace, 3D model	40hod
	Statický výpočet + DPS	32hod
Méněpráce:	0,- Kč bez DPH	

Cena celkem: 86.400,- Kč bez DPH

Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.

4. Předběžný harmonogram

Dodací termín bude upřesněn po schválení 3D modelu.

5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Dle uzavřené SoD

6. Ostatní



Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Příloha č.2 - Návrh ZL008

S pozdravem



Zapsáno do OR
u MS v Praze, 6. 6.1990, B. 88
IČO: 00506729
DIČ: CZ 00506729

EXCON, a.s.
Sokolovská 187/203
190 00 Praha 9
Česká republika

