



ARCHAIA Brno z.ú.

Bezručova 78/15, 602 00 Brno

IČ: 26268469; DIČ: CZ26268469

bankovní spojení: FIO, č.ú.: 290 148 2974/2010

Číslo jednací: 9/25



Návrh řešení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při stavbě: „Žďár nad Sázavou - tvrz“

Práce lze rozdělit do tří etap či úseků:

Etapa I (2-3 týdny)

Jedná se o prostor kolem kostela sv. Prokopa, kaple sv. Barbory a komunikaci mezi ulicemi Veselská a Radniční. Prostor bude zkoumán následovně:

- 1) po základní skrývce drnu proběhne detektorová prospekce po níž bude následovat další skrývka na pláň cca 0,5 m pod současný terén. Pokud zde budou zachyceny ojedinělé hroby, tak budou ponechány na vyvýšeném soklu. Nedávno provedenými sondami při kostele sv. Prokopa se do úrovně cca 0,4 m pod terénem nacházely pouze dislokované kosti. Hroby se dle sondy při kapli sv. Barbory mohou vyskytovat především od úrovně 0,7 m pod současným terénem.
- 2) Následovat bude detektorová prospekce a dozkoumání ojedinělých hrobů.
- 3) Dále budou zkoumány hrobové situace v prostoru budoucí kašny a jejího přívodu vody a odtoku vodu. Pokud hřbitov zasahoval pod příjezdovou komunikaci směrem k faře a domu Veselská č. 2/13, tak budou zkoumány hroby ve stavbou snížené části hřbitovního areálu při kapli sv. Barbory.



Umístění sondy při kapli sv. Barbory



Profil sondou – v hloubce cca 0,7 m se nachází hrob orientovaný nohama směrem ke kostelu



Etapa II (8 týdnů)

Etapa II bude zahájena pouze v případě, že bude z hlediska stavby nezbytné sanovat podkladovou vrstvu nově budovaných komunikací při kostele resp. po nevyhovujících zkouškách únosnosti. Jednalo by se o cca 2 až 3 měsíce práce na středověkém hřbitově, který se nacházel při kostele sv. Prokopa a zasahoval místy pravděpodobně i pod spojující komunikaci mezi ulicemi Radnická a Veselská. Vzhledem k velikosti prostoru a našim zkušenostem odhadujeme počet zkoumaných hrobů orientačně na 500. Z pohledu stavby a objednatele by bylo vhodné této situaci předejít.

Etapa III (6 týdnů)

Jedná se prostor Tvrze při současném regionálním muzeu. Zkoumána by měla být celá plocha až na koridor mezi Moučkovým domem a muzeem. Sondou při muzeu byly archeologické situace zachyceny až do hloubky přesahující 1,7 m. V rámci ZAV by byly zkoumány výkopy nové kanalizace a vodovodu a lokálně i dochovaná archeologická souvrství. Vzhledem k množství starších inženýrských sítí a nutnosti přístupu k domům by uvedená fáze trvala cca 6 týdnů.



Umístění sondy před regionálním muzeem.




Profil sondy při muzeu – pod současnou dlažbou začíná archeologický terén, cca v hloubce cca 0,4 m byla zachycena starší konstrukce či destrukce.



Etapa IV (2 týdny)

Jednalo by se o dozkoumání koridoru mezi Moučkovým domem a muzeem. Případně mohou být etapy III a IV sloučeny dohromady.

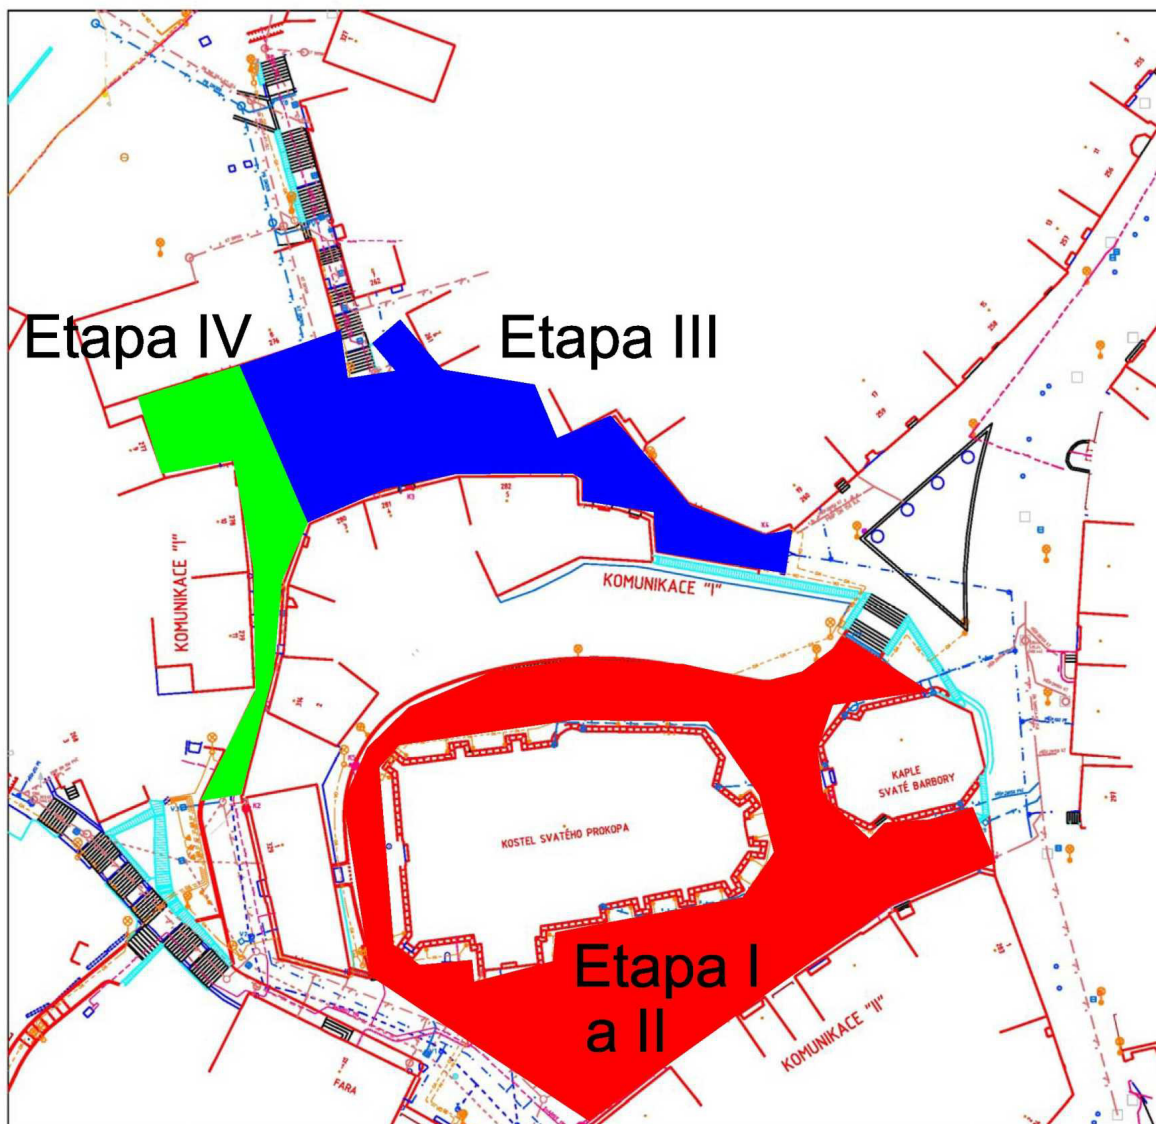

Situace jednotlivých ploch v rámci katastrální mapy.

v Brně 4. února 2025

Mgr. Pavel Staněk
Mgr. Marek Peška, Ph.D.
Archaia Brno z.ú.

