

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami**

Přikotvení meziokenních piliřů

Pořadové číslo změnového listu:

04

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Práce a dodávky HSV			
Popis změny: Meziokenní piliře bylo nutné uchytit k I profilu dle detailu zakreslené GP viz. příloha č. 1.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUPA</i>			
Posouzení změny - technický dozor <i>SOUPA</i>			
Dopady:			
do projektové dokumentace: ne	zpracovány	ne	
do časového plánu: ano	zpracovány	ne	
	zpracovány	ne	
do ceny: ano	zvýšení o:	12 278,00	Kč
	s DPH 21%	2 578,38	Kč
	snížení o:	-	Kč
	s DPH 21%	-	Kč
Navrhovatel změny :	Zhotovitel na základě zjištěného stavu a následného potvrzení TDI a AD.		
Věcná kontrola:	Cena		
Vyjádření zhotovitele:	Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků.		
Vyjádření objednatele:	<i>SOUPA</i>		
	Celková cena změnového listu č. 04	12 278,00 Kč	
	s DPH 21%	14 856,38 Kč	

V Praze dne: **25.2.2025**

Přílohy: Příloha č. 1: Detail kotvení meziokenních piliřů zpracovaný GP

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce

Změnový list č. 04

Přikotvení meziokenních piliřů

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Místo: Mezi školami 2322/1


Datum: 07.01.2025

Zadavatel: MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 5

Projektant: Ing. Evžen Krouský

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
								12 278,0 Kč	12 278,0 Kč	0,0 Kč
Uchycení meziokenních piliřů								12 278,00		
URS		K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	6,000	466,00	2 796,00	2 796,00	
Navaření profilů R12 k profilu HEB						6,000				
URS		K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	22,000	431,00	9 482,00	9 482,00	
Provedení svislé drážky a doplnění lepidlem						12,000				
dočasná opora pro vyzdění piliře						4,000				
přidaná výztuž 3x R16 x22piliřů pro provázání piliře s věncem						6,000				

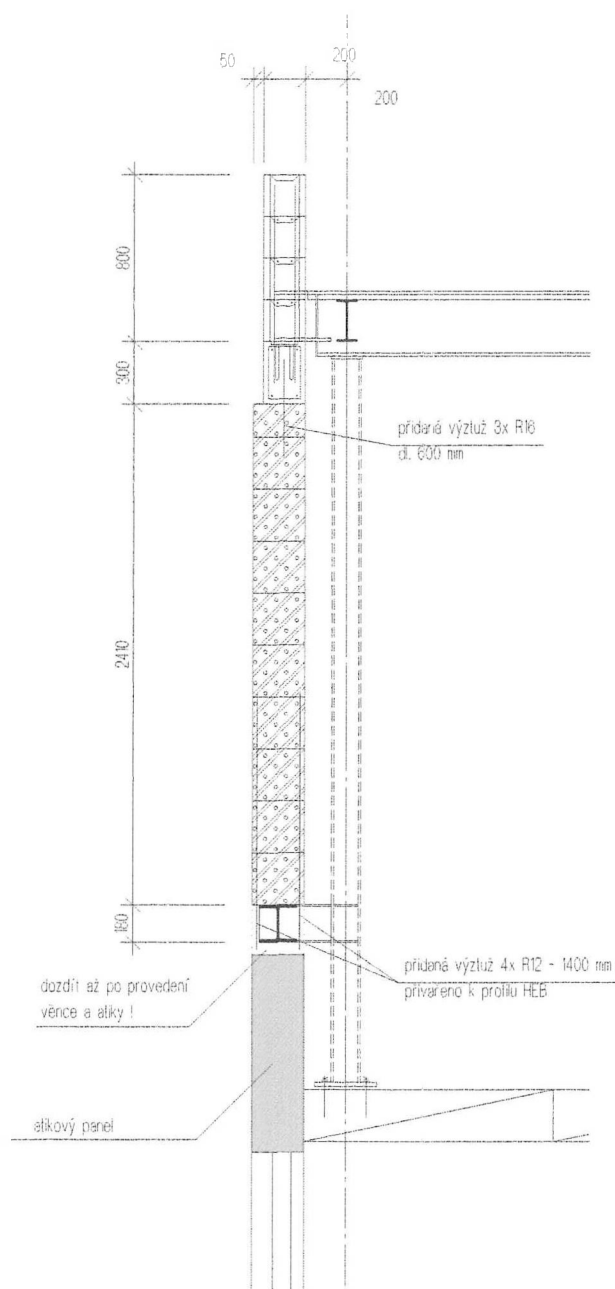

Postup provádění meziokenních vyzdívek

- 1.) provedení meziokenních vyzdívek - vyzdění na vodorovný ocelový profil zdivo je nutné dočasně stabilizovat proti překlopení!

návrh 1

k ocelovému profilu HEB přivařit svisle 4x R12 s výškou do 1/2 stěny, do přorobetonových tvarnic provést v místě výztuže svislou drážku a doplnit lepidlem.

návrh 2

z dřevěných hranolů a prken vytvořit dočasnou oporu pro vyzdění plíže.

POZOR!

do provedení věnce není stěna stabilní a je nutno se vyvarovat bočnímu tlaku!

- 2.) v horní části zdiva zakončit vložením svisle výztuže 3x R16 pro provázání s věncem
- 3.) provedení železobetonového věnce. Ve věnci je nutné mít zabetonovány kolevní desky a svislou výztuž atky.
- 4.) provázání s ocelovým rámem v místech příčných nosníků
- 5.) provedení atky ze ztraceného bednění + výztuž + beton
- 6.) naposled podezdít a dozdít parapet (HEB)

