

Změnový list č. 1		Datum předložení zhotovitelem	16.4.2025
Objednatel	Město Nepomuk, Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk		
TDS	Ing. Jiří FENCL IČ 11415011		
Zhotovitel	SILNICE NEPOMUK s.r.o. U Pošty 513, 335 01 Nepomuk		

Charakter změny:	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	Modernizace sběrného dvora odpadů Města Nepomuk	
Specifikace změny a zdůvodnění:		
01 - Úprava svahu – Terénní úpravy, svahování		
Zdůvodnění: Práce požadované objednatelem nad rámec SoD		
02 – Sanace 1 – Neúnosné podloží pláň		
03 – Sanace 2 – Neúnosné podloží pláň		
Zdůvodnění: Po provedených statických zkouškách, které nedosahovaly hodnoty Edef2 45 Mpa bylo rozhodnuto o provedení sanačních prací s využitím místního kamenitého materiálu.		
Protokoly statických zkoušek v příloze		
Finanční dopad změny: 115.470,79 Kč bez DPH		navýšení

Přílohy:	č.1 – Fotodokumentace č.2 – Soupis prací, rozpočet č.3 – Protokol č. 16, 17,18/Sz/25
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
Změnu schvaluji  Ing. Jiří Fencel Digitálně podepsal Ing. Jiří Fencel Datum: 2025.04.16 13:17:08 +02'00' Ing. Jiří Fencel	Změnu schvaluji
Datum:	Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
Josef Skala Digitálně podepsal Josef Skala Datum: 2025.04.22 12:11:12+02'00' Josef Skala, Cert. Mgmt.	Změnu schvaluji
Datum: 16.4.2025	Datum: 16.4.2025





REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEP
Stavba: NEPOMUK sběrný dvůr - vícepráce

KSO:
Místo: Nepomuk

CC-CZ:
Datum: 11. 3. 2025

Zadavatel:
Město Nepomuk

IČ: 002 56 986
DIČ:

Zhotovitel:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			115 470,79
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	115 470,79	24 248,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			139 719,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEP

Stavba: NEPOMUK sběrný dvůr - vícepráce

Místo: Nepomuk

Datum: 11. 3. 2025

Zadavatel: Město Nepomuk

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		115 470,79	139 719,66
01	Úprava svahu	61 740,00	74 705,40
02	Sanace 1	27 953,00	33 823,13
03	Sanace 2	25 777,79	31 191,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEPOMUK sběrný dvůr - vícepráce
Objekt: 01 - Úprava svahu

Misto: Nepomuk Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Město Nepomuk Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 61 740,00

D HSV Práce a dodávky HSV 61 740,00

D 1 Zemní práce 61 740,00

1000	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,500	47,80	5 855,50
	VV		70*7*0,25		122,500		
1001	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	122,500	167,00	20 457,50
	VV		70*7*0,25		122,500		
1002	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	490,000	72,30	35 427,00
	VV		70*7		490,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEPOMUK sběrný dvůr - vícepráce
Objekt: 02 - Sanace 1

Místo: Nepomuk Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Město Nepomuk Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 953,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				27 953,00
D 1			Zemní práce				21 513,49
35	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	32,400	89,05	2 885,22
	vv		"zadní sanace" 8*5*0,6		24,000		
	vv		"sanace v místě s odpady" 7*2*0,6		8,400		
	vv		Součet		32,400		
1003	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	32,400	100,00	3 240,00
	vv		32,4		32,400		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,400	97,00	3 142,80
	vv		(8*5*0,6)+(7*2*0,6)		32,400		
1004	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	32,400	217,00	7 030,80
	vv		32,4		32,400		
33	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	54,000	8,02	433,08
	vv		(8*5)+(7*2)		54,000		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,400	21,98	712,15
	vv		(8*5*0,6)+(7*2*0,6)		32,400		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	32,400	125,60	4 069,44
	vv		32,4		32,400		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				4 843,87
1005	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	66,720	72,60	4 843,87
	vv		((8*5)+((8+8+5+5)*0,6))*1,2		66,720		
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				1 595,64
22	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,320	27,36	1 595,64
	vv		((8*5*0,6)+(7*2*0,6))*1,8		58,320		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEPOMUK sběrný dvůr - vícepráce
Objekt: 03 - Sanace 2

Místo: Nepomuk Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Město Nepomuk Projektant:
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 777,79

D HSV Práce a dodávky HSV 25 777,79

D 1 Zemní práce 23 997,47

35	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	36,150	89,05	3 219,16
VV		(5*2,5*1,1)+(7*3*0,6)+(4*5*0,4)+(2*3*0,3)			36,150		
100	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,150	100,00	3 615,00
VV		(5*2,5*1,1)+(7*3*0,6)+(4*5*0,4)+(2*3*0,3)			36,150		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,150	97,00	3 506,55
VV		(5*2,5*1,1)+(7*3*0,6)+(4*5*0,4)+(2*3*0,3)			36,150		
100	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	36,150	217,00	7 844,55
VV		(5*2,5*1,1)+(7*3*0,6)+(4*5*0,4)+(2*3*0,3)			36,150		
33	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	59,500	8,02	477,19
VV		(5*2,5)+(7*3)+(4*5)+(2*3)			59,500		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,150	21,98	794,58
VV		(5*2,5*1,1)+(7*3*0,6)+(4*5*0,4)+(2*3*0,3)			36,150		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,150	125,60	4 540,44
VV		(5*2,5*1,1)+(7*3*0,6)+(4*5*0,4)+(2*3*0,3)			36,150		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 780,32
22	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	65,070	27,36	1 780,32
VV		((5*2,5*1,1)+(7*3*0,6)+(4*5*0,4)+(2*3*0,3))*1,8			65,070		



Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018


Počet výtisků	3	Výtisk č.	1	Počet listů	1	List č.	1	Počet příloh	0
---------------	---	-----------	---	-------------	---	---------	---	--------------	---

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 016/Sz/25 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DLE ČSN 72 1006 - PŘÍLOHA A

Objednatel	SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk		
Stavba	Modernizace SD Nepomuk		
Objekt	komunikace	Konstrukční prvek	plášť
Profil č.		Staničení [km] ⁽¹⁾	komunikace 1
Vzdálenost od osy	osa	Průměr zatěž.desky [mm]	300
Zemina	hrubozrná	Předtížení [MPa]	0,01 po dobu min. 30 s
Datum zkoušky	26.3.2025	Zkoušku provedl	Kovářík, Štaif

Kontaktní napětí p (MPa)	0,00	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,45	0,50	0,25	0,12	0,00	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,45
Fáze zkoušky	zatěžovací cyklus I.								odlehčení		zatěžovací cyklus II.						
Zatlačení desky y (mm)	0,00	0,52	1,25	2,10	2,78	3,35	3,69	4,04	3,82	3,45	2,37	2,67	2,98	3,29	3,56	3,83	3,99

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus		Požadavek ⁽¹⁾
označení	rozměr	I.	II.	E_{def2} min. 45 MPa
p_{max}	MPa	0,500	0,450	E_{def2}/E_{def1} max.
a_1	mm.MPa ⁻¹	11,603	4,038	
a_2	mm.MPa ⁻²	-5,490	-0,929	
E_{def}	MPa	25,4	62,2	
E_{def2}/E_{def1}	—	2,45		

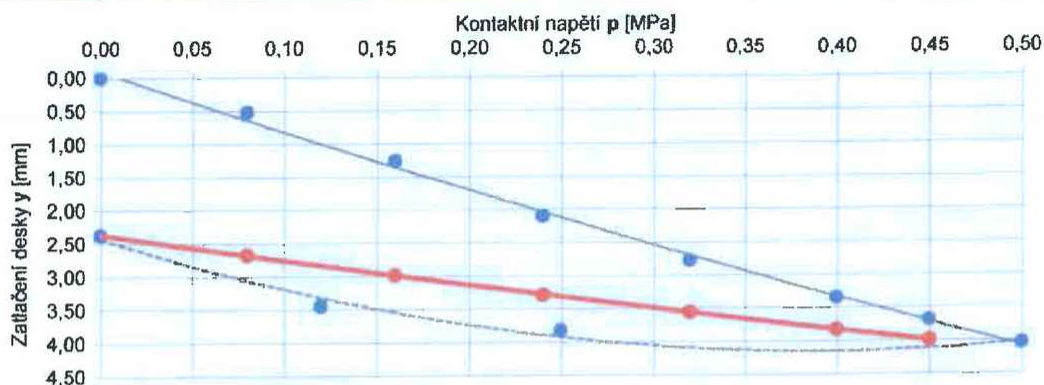

Pozn.: ⁽¹⁾ údaj objednatele

Prohlášení:

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušené místo
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95% pro koeficient rozšíření k = 2

Nejistota měření:	U = 2,4 MPa
-------------------	-------------

Rozdělovník: 2 x objednatel 1 x vlastní	Protokol zpracoval: Dne: 27.3.2025	Schválil zástupce vedoucího laboratoře: Dne: 27.3.2025
---	---------------------------------------	---

— konec protokolu —





Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018


Počet výtisků	3	Výtisk č.	1	Počet listů	1	List č.	1	Počet příloh	0
---------------	---	-----------	---	-------------	---	---------	---	--------------	---

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 017/Sz/25
STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DLE ČSN 72 1006 - PŘÍLOHA A

Objednatel	SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk		
Stavba	Modernizace SD Nepomuk		
Objekt	komunikace	Konstrukční prvek	pláň
Profil č.		Staničení [km] ⁽¹⁾	komunikace 2 - sanace
Vzdálenost od osy	osa	Průměr zatěž. desky [mm]	300
Zemina	hrubozrná	Předtížení [MPa]	0,01 po dobu min. 30 s
Datum zkoušky	26.3.2025	Zkoušku provedl	Kovářík, Štaif

Kontaktní napětí p [MPa]	0,00	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,45	0,50	0,25	0,12	0,00	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,45
Fáze zkoušky	zatěžovací cyklus I.								odlehčení		zatěžovací cyklus II.						
Zatlačení desky y [mm]	0,00	0,31	0,77	1,29	1,83	2,30	2,62	2,90	2,69	2,34	1,60	1,79	2,04	2,27	2,50	2,73	2,88

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus		Požadavek ⁽¹⁾
označení	rozměr	I.	II.	E_{def2} min. 45 MPa
p_{max}	MPa	0,500	0,450	E_{def2}/E_{def1} max.
a_1	mm.MPa ⁻¹	6,430	2,742	
a_2	mm.MPa ⁻²	-0,315	0,288	
E_{def}	MPa	35,9	78,4	
E_{def2}/E_{def1}	—	2,18		

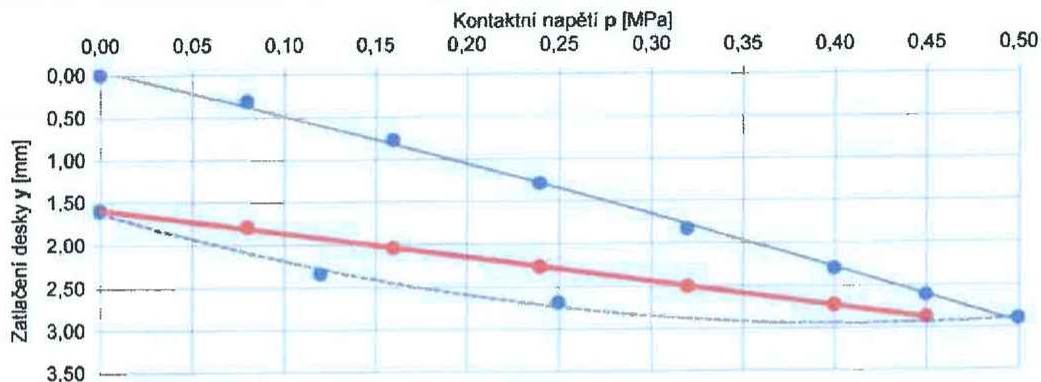

Pozn. ⁽¹⁾ údaj objednatele

Prohlášení:

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušené místo
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95% pro koeficient rozšíření $k = 2$

Nejistota měření:	$U = 3,1 \text{ MPa}$
-------------------	-----------------------

Rozdělovník: 2 x objednatel 1 x vlastní	Protokol zpracoval: Dne: 27.3.2025	Schválil zástupce vedoucího laboratoře: Dne: 27.3.2025
---	---------------------------------------	---

— konec protokolu —





Silniční inženýrská společnost, s.r.o., Žižkova 54, 301 00 Plzeň
zkušební laboratoř Dobřany

zkušební laboratoř č. 1194 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018


Počet výtisků	3	Výtisk č.	1	Počet listů	1	List č.	1	Počet příloh	0
---------------	---	-----------	---	-------------	---	---------	---	--------------	---

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 018/Sz/25 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DLE ČSN 72 1006 - PŘÍLOHA A

Objednatel	SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, Nepomuk		
Stavba	Modernizace SD Nepomuk		
Objekt	komunikace	Konstrukční prvek	pláň
Profil č.		Staničení [km] ⁽¹⁾	komunikace 3
Vzdálenost od osy	osa	Průměr zatěž.desky [mm]	300
Zemina	hrubozrnná	Předtížení [MPa]	0,01 po dobu min. 30 s
Datum zkoušky	26.3.2025	Zkoušku provedl	Kovářík, Štaif

Kontaktní napětí p (MPa)	0,00	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,45	0,50	0,25	0,12	0,00	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,45
Fáze zkoušky	zatěžovací cyklus I.								odlehčení		zatěžovací cyklus II.						
Zatlačení desky y (mm)	0,00	0,52	1,14	1,74	2,26	2,78	3,10	3,35	3,14	2,76	1,56	1,98	2,30	2,60	2,91	3,16	3,34

Zjišťované a počítané veličiny		Zatěžovací cyklus		Požadavek ⁽¹⁾
označení	rozměr	I.	II.	E_{def2} min. 45 MPa
p_{max}	MPa	0,500	0,450	E_{def2}/E_{def1} max.
a_1	mm.MPa ⁻¹	8,541	4,829	
a_2	mm.MPa ⁻²	-3,060	-2,095	
E_{def}	MPa	32,1	57,9	
E_{def2}/E_{def1}	—	1,80		

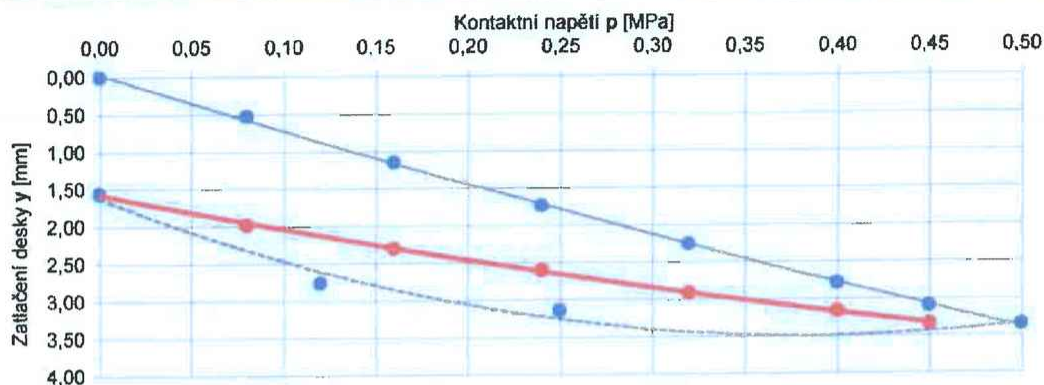

Pozn.: ⁽¹⁾ údaj objednatele

Prohlášení:

- výsledky zkoušek platí jen pro zkoušené místo
- bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý
- uvedená rozšířená nejistota odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95% pro koeficient rozšíření k = 2

Nejistota měření:	U = 2,3 MPa
-------------------	-------------

Rozdělovník: 2 x objednatel 1 x vlastní	Protokol zpracoval: Dne: 27.3.2025	Schválil zástupce vedoucího laboratoře: Dne: 27.3.2025
---	---------------------------------------	---

— konec protokolu —

