



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 110

D_21 - Úpravy konstrukcí

- Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 -2PB

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 110

- **Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386 - 37,437 – úsek 2 PB**

Dle PD budou nábřežní zdi na úseku 2 PB (v km 37,386-37,437) zcela odstraněny, části zdi nad projektovaným terénem budou rozebrány a odstraněny.

Na základě zjištěné různé mocnosti nábřežních zdí dojde k navýšení bouracích prací dle předloženého zaměření a dokumentace.

AD nemá připomínek k předloženému výpočtu a odpovídá realitě. Souhlasí s navýšením bouracích prací v tomto úseku.

V Brně dne :



Společnost HOCHTIEF CZ a. s. prohlašuje, že jednání učiněné elektronickými prostředky, které není podepsané zaručeným elektronickým podpisem, není právním jednáním a společnost HOCHTIEF CZ a. s. jím není vázána. Tento e-mail nelze považovat za nabídku, přijetí nabídky a adresát bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednávání o smlouvě v jakékoliv fázi, a to i bez vážného důvodu nelze vyvozovat žádné následky.

The company HOCHTIEF CZ a. s. declares that an act made via electronic means that is not signed with advanced electronic signature is not a legal act and the company HOCHTIEF CZ a. s. shall not be bound by it. This e-mail cannot be deemed an offer, acceptance of an offer, and the addressee acknowledges that no consequences can be inferred from a possible termination of contract negotiations in any stage, namely even without a serious reason.

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 11, 2025 3:11 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: PPO Svratka_oceněný VV_PB2 část OKA09

Dobrý den,

Za AD nemám připomínek k předloženému výpočtu a měl by tak odpovídat realitě. Souhlasíme s navýšením bouracích prací v tomto úseku. Toto řešení se zakládá na dohodách, že finální vyhodnocení bouracích prací bude provedeno na základě zaměření z důvodu, že tvar nábrežních zdí byl jiný než podklad od Povodí Moravy pro vypracování DVD.

S pozdravem | Kind regards



[REDACTED]
vedoucí projekce | ČKAIT 1006565 | partner

[REDACTED]
A PLUS, a.s.
Česká 12, 602 00 Brno
www.aplus.cz

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, March 11, 2025 2:27 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: PPO Svratka_oceněný VV_PB2 část OKA09

Dobrý den, všem,




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	Změnový list č. 110															
ÚSEK: D_21 - Úpravy konstrukcí																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.17 - Úprava konstrukcí - Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 – úsek 2 PB</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.17 - Úprava konstrukcí - Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 – úsek 2 PB	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.17 - Úprava konstrukcí - Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 – úsek 2 PB	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:														
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:														
		FAX:														
		OSOBNĚ:														
		MAIL														
PŘEDMĚT ZMĚNY: Byla zjištěna vyšší mocnost nábřežních zdí – navýšení bouracích prací na úseku 2PB - km 37,386-37,437 DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.- ZL 110 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.110 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																
POPIS ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.17 na pravém břehu řeky Svratky v km 37,386-37,437 – úsek 2PB, je třeba provedení navýšení bouracích prací z důvodu různorodé mocnosti nábřežních zdí. POKYN VYDAL:																
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.																
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 															

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	110																
ÚSEK: D_21 - Úpravy konstrukcí																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.17 - Úprava konstrukcí - Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 – úsek 2 PB NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Byla zjištěna vyšší mocnost nábřežních zdí – navýšení bouracích prací na úseku 2PB - km 37,386-37,437 DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 110 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 110 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 642 940,83 Kč</td><td style="text-align: right;">345 017,57 Kč</td><td style="text-align: right;">1 987 958,40 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 642 940,83 Kč</td><td style="text-align: right;">345 017,57 Kč</td><td style="text-align: right;">1 987 958,40 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 642 940,83 Kč	345 017,57 Kč	1 987 958,40 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	1 642 940,83 Kč	345 017,57 Kč	1 987 958,40 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 642 940,83 Kč	345 017,57 Kč	1 987 958,40 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	1 642 940,83 Kč	345 017,57 Kč	1 987 958,40 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:																	
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OL 																

Rekapitulace - úsek 2 PB-v km 37,386-37,437 - nové bourání		
Název objektu	Vícepráce	Méněpráce
SO 07.17 - Úprava konstrukcí	1 642 940,83 Kč	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis:

SO 07.17 - Úprava konstrukcí - navýšení kubatury bouraných kcí - úsek 2 PB - v km 37,386-37,437

ZL 110 - Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 -2PB

KSO: 833 21 29

CC-CZ:

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 07.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 642 940,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 642 940,83	21,00%	345 017,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 987 958,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis:

SO 07.17 - Úprava konstrukcí - navýšení kubatury bouraných kcí - úsek 2 PB - v km 37,386-37,437**ZL 110 - Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 -2PB**

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

07.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 642 940,83****HSV - Práce a dodávky HSV****1 642 940,83**

1 - Zemní práce

66 877,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 102 992,60

997 - Přesun sutě

473 070,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_21 - Úpravy konstrukcí

Soupis:

SO 07.17 - Úprava konstrukcí - navýšení kubatury bouraných kcí - úsek 2 PB - v km 37,386-37,437**ZL 110 - Navýšení kubatury bouraných prací v km 37,386-37,437 -2PB**

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

07.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 642 940,83	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 642 940,83	
D	1		Zemní práce				66 877,33	
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	55,111	629,50	34 692,37	SO 07.17
FP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
P			Poznámková položka					
VV			Pro poznámku k položce					
			Pro poznámku k položce					
			Dle výpočtu kubatury					

[illegible]

VÝPOČET KUBATUR - NÁŘEŽNÍ ŽEĐ KM 37,386 - 37,437

VSTUPNÍ HODNOTY:

- PŮVODNÍ ZMĚNOVÝ VV - ČÁST POHLEDU PB P(6) - P(11) = $166,5 \text{ m}^3$
- PLOCHA ŘEZU (OEO. ZAMĚŘENO) = $11,5 \text{ m}^2$
- DĚLKA ŘEŠENÉHO ÚSEKU = 51 m (DLE ÚKRESU REKONSTRUKCE)
- TL. KAMENE = $0,4 \text{ m}$

BOURANÉ BET. STĚLY


NOVÝ VÝPOČET:

$$45 \times 11,5 + \frac{11,5 \times 6}{2} = \underline{\underline{552 \text{ m}^3}}$$

PŮVODNÍ VÝPOČET:

$$\underline{\underline{166,5 \text{ m}^3}}$$

$$\text{N.V.} - \text{P.V.} = 552 - 166,5 = \underline{\underline{385,5 \text{ m}^3}}$$

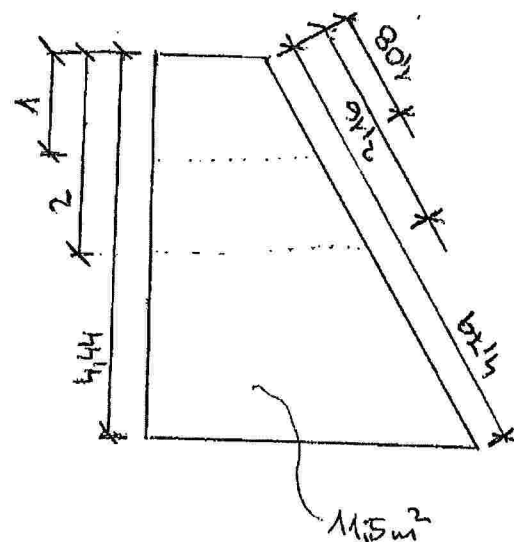

BOURANÁ KAMENNÁ DLÁŽBA

NOVÝ VÝPOČET:

$$4,79 \times 45 + \frac{4,79 \times 6}{2} = 213,12 \text{ m}^2 \times 0,4 = \underline{\underline{85,248 \text{ m}^3}}$$

DLE ŘÚVODNÍHO:

$$\frac{8,99 \times (4,79 - 1,08)}{2} + 7 \times 1,08 + \frac{2 \times (2,16 - 1,08)}{2} + 20,01 \times 2,16 + \frac{6,3 \times 2,16}{2} = 75,34 \text{ m}^2$$

$$75,34 \times 0,4 = \underline{\underline{30,137 \text{ m}^3}}$$

$$\text{N.V.} - \text{P.V.} = 85,248 - 30,137 = \underline{\underline{55,111 \text{ m}^3}}$$

49.09

38.00

P(G) STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA, BUDE ROZEBRÁNA 1m A 2m

P(H) STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ, PONECHÁ SE
DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ DLAŽBY A
NOVÉ ZASPÁROVÁNÍ
OKRAJE ROZEBRÁNY VE SPÁDU V DĚLCE 6.30m A 6.0m

ÚZEMÍ PODÉL BUDOVY BRNĚNSKÝCH KOMUNIKACÍ a.s.
8.99 7.00 2.00 20.01 6.30

MOST NA RENNÉSKÉ

203.00

200.70

→ ZACHOVÁNO

BOURÁNO NAD RÁMEC PD
KM 37,386 - 37,437

37.38 km
37.3796

37.39 km

37.40 km

37.4000

37.41 km

37.42 km

37.43 km

37.4328


37.44 km

37.4411

37.4427

37.45 km

37.46 km

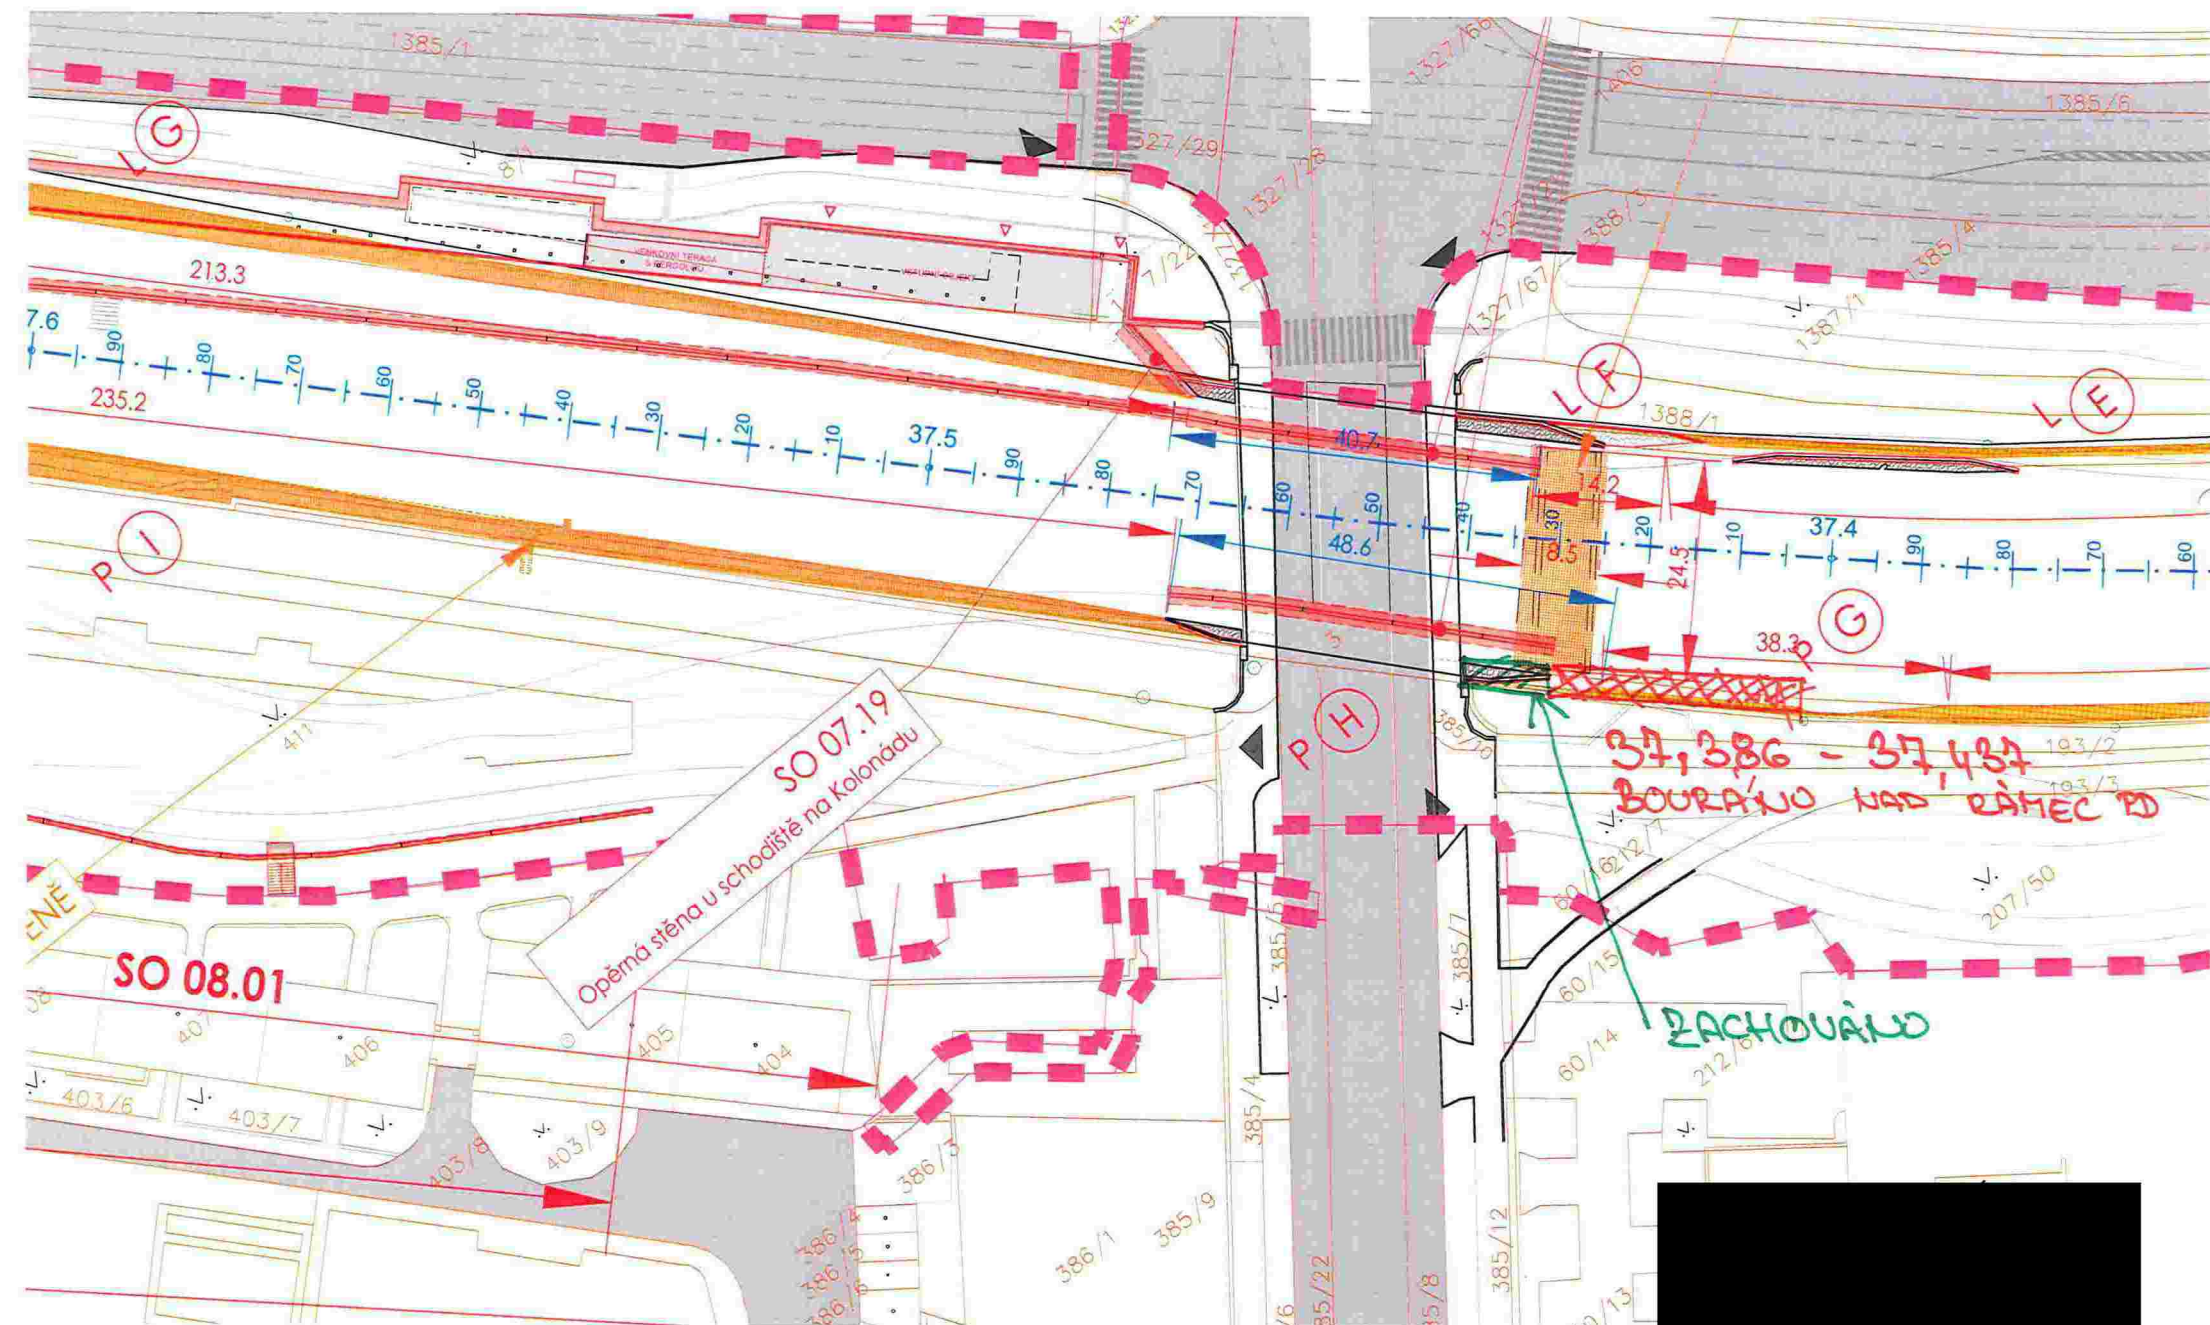

4. Zvednutí CB krytů a asfaltového krytu na objektech stezek a pěšin

14.1.2025 Dne 2.1.2025 Zástupce zhotovitel provedl zápis do stavebního deníku. Při kontrole stavby bylo zjištěno nežádoucí přizvednutí cementobetonového (CB) krytu a živičného krytu v části, kde tyto vrstvy komunikace dosahují stejné výškové úrovně jako obruba. V zápise požádal autorský dozor (AD) a technický dozor stavby (TDS) o posouzení situace a stanovení dalšího postupu k zajištění nápravy. Dne 3.1.2025 provedl kontrolu TDI a do stavebního deníku popsal úseky, kde došlo k přizvednutí a v jakém rozsahu. Nejedná se o všechny CB kryty a k přizvednutí dochází především podél zapuštěné chodníkové obruby. Dále bylo zjištěno, že došlo lokálně k přizvednutí asfaltového krytu mezi ul. Heršpickou a viaduktem Uhelná a na Táborského nábřeží. TDI požádal zhotovitele a AD o posouzení příčin zvednutí krytů a o návrh na další postup. Info na příštím KD. Zodpovídá AD a zhotovitel

28.1.2025 Zástupci objednatele obdrželi stanovisko zhotovitele ke zvednutí CB krytů. AD se ke stanovisku zhotovitele vyjádří do konce týdne. Zhotovitel dle svého vyjádření postupoval v souladu s platnou DPS a jedná se tedy podle něj o vadu DPS. AD požádal o místní šetření, kde bude stanoveno kde přesně k pozvednutí došlo a kde ne. Schůzka proběhne 3.2.2025 v 10 hod za účasti TDI, zhotovitel, AD, KAM. Zástupce OI MMB oslovil nezávislé soudní znalce. Zhotovitel informoval, že v den konání KD má schůzku se zástupcem Consultest s.r.o. Info na příštím KD.

11.2.2025 Proběhnou sondy v místech předem domluvených na pochůzce s TDI. Info na příštím KD.

25.2.2025 Zástupce zhotovitele včera zaslal přehled, kde je specifikováno, který subdodavatel daný úsek realizoval, za jakých klimatických podmínek, zda byla použita separační fólie částečně, celoplošně nebo vůbec a zda došlo ke zvednutí CB krytu. Výsledky odvrtů zašle zástupce zhotovitele v den konání KD. Zástupce zhotovitele požádal o informaci, zda má postupovat dle platné DPS. Zástupce AD se vyjádří do 4.3.2025. Info na příštím KD.

5. Vstupní jednání ohledně provozních řádů PPO

28.1.2025 Na dnešním KD bylo domluveno, že jednání ohledně provozních řádů proběhne v úterý 4.2.2025 po technickém dni. Zhotovitel zajistí přítomnost svého subdodavatele pro provozní řády.

11.2.2025 Jednání ohledně provozních řádů proběhlo. Subdodavatele zhotovitele připraví návrh, který bude zaslán jednotlivým správcům a poté případně doplněn.

25.2.2025 trvá

6. Doplnění hydroosevu případně rohoží

28.1.2025 Vzhledem k aktuálně projednanému harmonogramu a termínu dokončování terénních úprav včetně osetí zelených ploch navrhl na dnešním KD zástupce TDI provést opatření některých úseků zatravňovaných svahů koryta řeky pomocí hydroosevu nebo jejich zpevnění kokosovou rohoží. Na základě návrhu TDI zhotovitel připraví nacenění hydroosevu, nebo rohoží, protože v některých svazích dochází ke splavení zeminy a osetí. Zhotovitel připraví cenovou nabídku.

11.2.2025 Zhotovitel přislíbil cenovou nabídku do 14.2.2025

25.2.2025 Zhotovitel zaslal návrh dne 24.2.2025. Bude předmětem jednání, které proběhne za účasti AD, TDI, zhotovitel dne 26.2.2025 ve 13 hod.

7. Geometrický plán koryta řeky

11.2.2025 Na dnešním KD byl přítomný zhotovitelův subdodavatel pro GP koryta. Subdodavatel zhotovitele upozornil na nutnost zpracování digitální technické mapy dle. Zákon č. 283/2021 Sb. §232/2g, Dle vyjádření zhotovitele není tato mapa v rozpočtu. Zástupce zhotovitele požádal o info, zda tuto mapu zajišťuje nebo nezajišťuje objednatel. Tuto mapu je možné zpracovat až po vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení. Bylo domluveno, že dne 17.2.2025 v 10 hod proběhne na zařízení staveniště další jednání v této věci za účasti OI MMB. Bude přizván i zástupce MČ Brno střed jako budoucí správce. Info na příštím KD.

25.2.2025 Zhotovitel zaslal pracovní verzi geometrického plánu k seznámení. Zhotovitel svolá další schůzku kvůli projednání pracovní verze i s vlastníky a správcí dotčených pozemků na 4.3.2025.

8. Nesoulad DPS částí D02 a D05 (SO 07.17)

25.2.2024 Byl zjištěn nesoulad v DPS mezi částmi D02 a D05, v dokumentaci objektu SO 07.17 nejsou zohledněny průběhy stezek. Bude nutné navýšit rozsah bouracích prací. Na základě domluvy s AD a TDI zpracuje zhotovitel změnový list.

Zodpovídá zhotovitel
