



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 91

D_17 Drobná doprovodná opatření

- ZM 095 – Mobiliář



SEZNAM PŘÍLOH


Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
Pokyn MMB -cyklostojany	3
Pokyn MMB -zpevněné povrchy	4
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	5
příloha č. 9	6
Rozpočet	7
Výkresová část	8
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9


**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 91
ZM 095 - MOBILIÁŘ**

Na základě udělení souhlasu objednatelem na Kontrolním dnu dne 17.12.2024 bude proveden zpevněný povrch pod lavičkami. Pro zachování přírodního charakteru byl zvolen kamenný materiál bez použití obrub. Kamenná dlažba bude tvořena novým štípaným kamenem osazeným do betonu. Tento povrch bude použit u míst se sezením tak i u stojanů pro kola. V místech osazení odpadkových košů nebude povrch zpevněn. Barevně bude materiál zpevněných ploch u mobiliáře volen dle stávajících kamenných ploch v rámci stavby. Ukončení dlažby s přechodem na zeleň bude přiznána nerovnost kamene. Položení kamene v místě noh laviček bude použito bez zabetonování spáry z důvodu přístupu ke kotvení mobiliáře.

V Brně dne :





Datum: 30. říjen 2024


Věc: **Stojany na kola ve standardu města Brna**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“


Z důvodu sjednocení vzhledu stojanů na kola v rámci města Brna a z důvodu změny ZM 095 ve které se řešilo jiné umístění a počet mobiliáře dojde k následujícím sestavám stojanů.

Stojany pro tři kola. Jeden výrobek se třemi stojany s manipulačním prostorem 2,0 x 2,7 m.

V řešeném území na 6 místech.

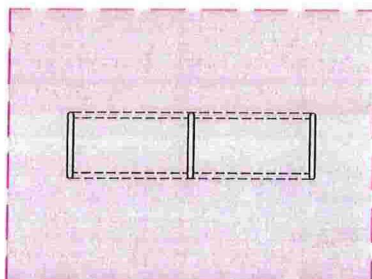


Stojany pro pět kol. Jeden výrobek se třemi stojany a jeden výrobek se dvěma stojany. Celkový manipulační prostor 2,0 x 4,5 m. V řešeném území na 5 místech.

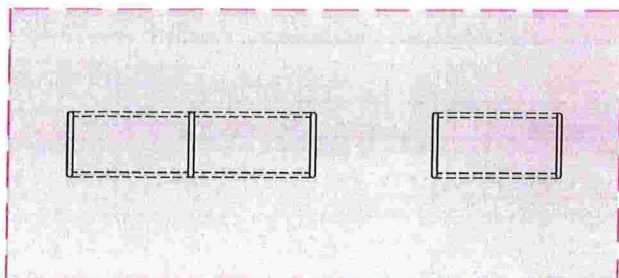


SINDLAR



Stojan pro 8 kol. Dva výrobky se třemi stojany a jeden výrobek se dvěma stojany. Celkový manipulační prostor 2,0 x 7,2 m. V řešeném území na 3 místech.

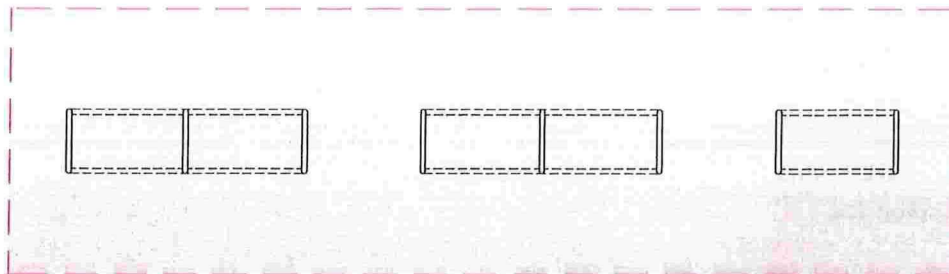

Stojany na kola uvedená v dokumentaci by se nahradila za uvažovaný standard města Brna. Jedná se o nerezový stojan tvořený z trubky tl. 2mm a průměru 38 mm kotvený pod upraveným terénem do základu. Základ bude tvořen například betonovým chodníkovým obrubníkem o rozměru 1000 x 100 x 250 mm a ukotvený pomocí závitových tyčí s chemickými kotvami.

Reference kotvení:

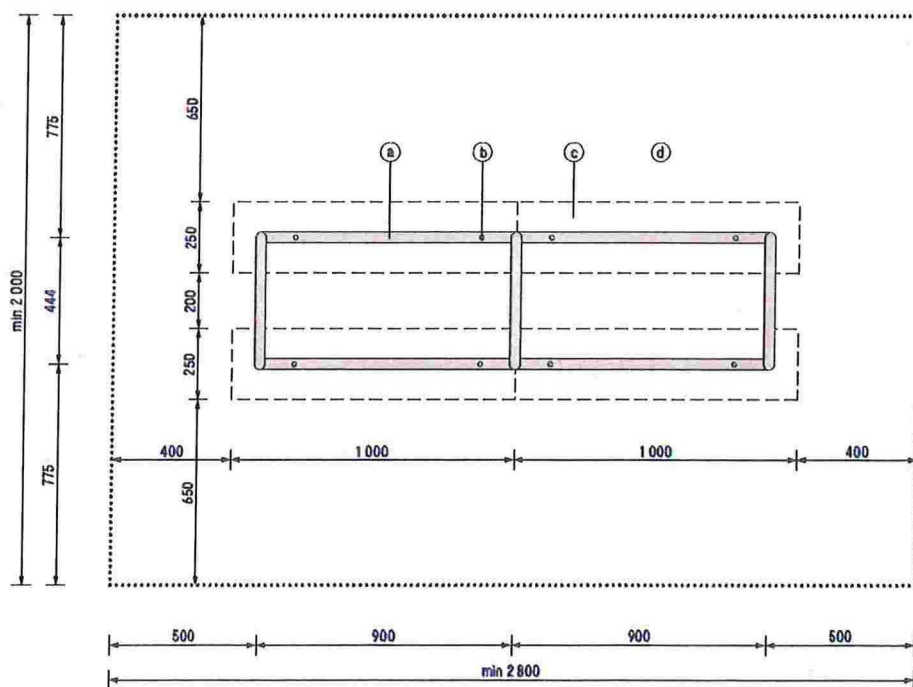

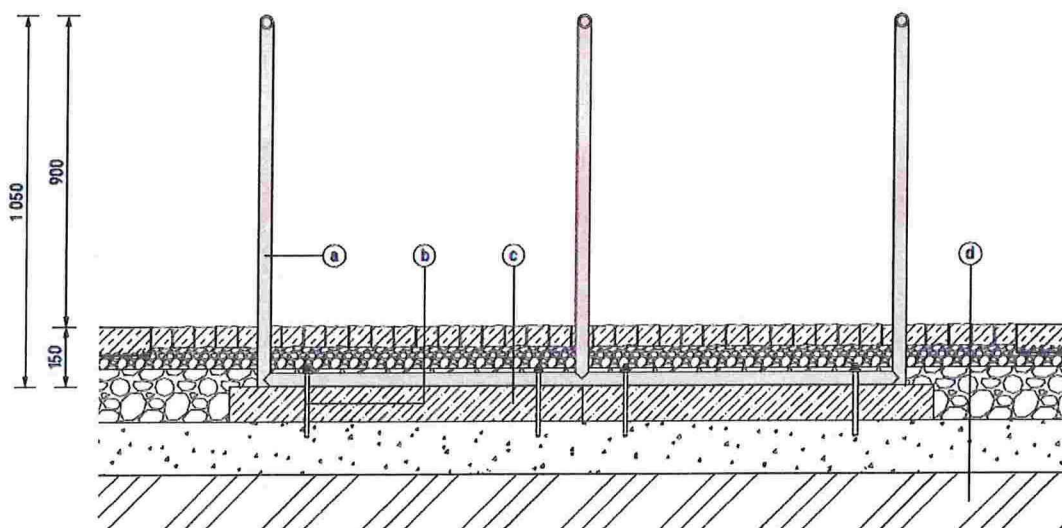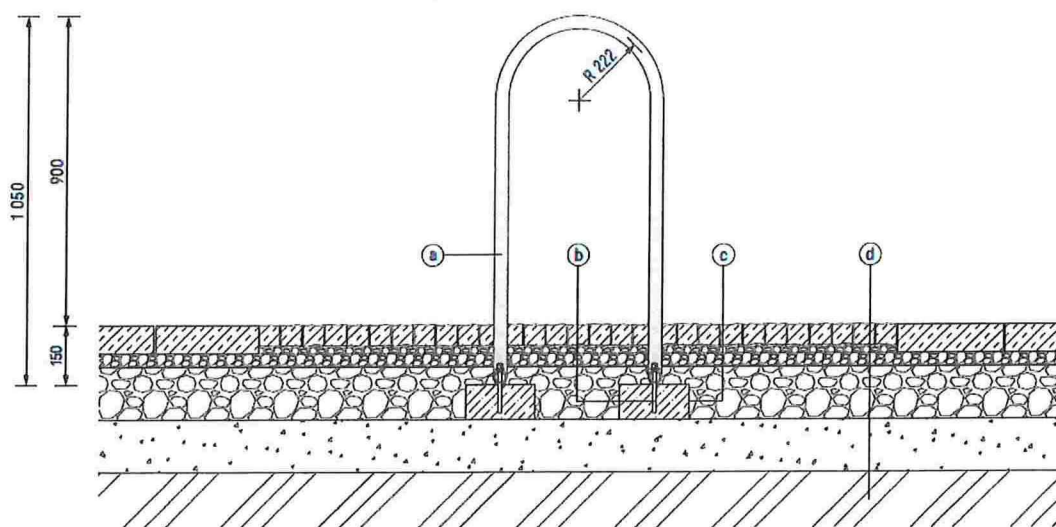


Legenda:


- a) STOJAN JIZDNICH KOL, nerezova kartačovana trubka vnější průměr 38 mm, stěna tl. 2 mm, poloměr ohybu 222 mm
- b) KOTVENÍ, zavitova tyč 8 × M10 dl. 200 mm, podložka Ø 30 mm, M10 matice, kotveno pomoci chemicke kotvy
- c) BETONOVY OBRUBNIK 1 000 × 100 × 250 mm
- d) Skladby manipulačního prostoru pro umístění kol (kamenná mozaika, betonová dlažba, mlat...)

V rámci výše uvedeného by byl použit následující počet stojanů:


- Dvojstojan v celkovém počtu 8 kusů

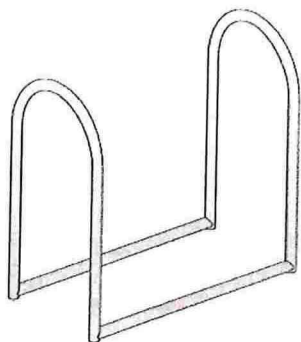


- Trojstojan v celkovém počtu 17 kusů.

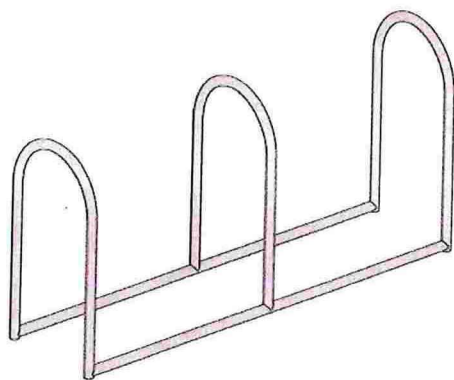

Vyhotovil:





Datum: 10. prosinec 2024

Věc: **Zpevněná plocha pod mobiliářem**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Dle požadavku budoucího správce bylo dohodnuto na místním šetření, že povrch pod lavičkami bude zpevněný. Osazení laviček například do mlatového povrchu či do rostlého terénu se zelení je nežádoucí z důvodu údržby a životnosti. Pro zachování přírodního charakteru byl zvolen kamenný materiál bez použití obrub. Kamenná dlažba bude tvořena kamenem ze stavby, případně novým štípaným kamenem osazeným do betonu. Celková mocnost skladby bude maximálně 300 mm.

Tento povrch bude použit u míst se sezením tak i u stojanů pro kola. V místech osazení odpadkových košů nebude povrch zpevněn.

Při použití pravoúhlých kamenů, bude dlažba kladena na vazbu. V případě různorodého tvaru kamene bude dlažba kladena na tzv. kyklopskou vazbu. Barevně bude materiál zpevněných ploch u mobiliáře volen dle stávajících kamenných ploch v rámci stavby.

Ukončení dlažby s přechodem na zeleň nemusí být provedeno lineárně, ale bude přiznána nerovnost kamene. Položení kamene v místě noh laviček bude použito bez zabetonování spáry z důvodu přístupu ke kotvení mobiliáře.

Reference zpevněné ploch se dá využít kamenná dlažba v místě osazení sloupů pro vodáky.



Celková plocha zpevněných ploch pro mobiliář je 289 m² dle níže uvedeného rozpisu.


Lavičky:

- Rozšířená plocha pro imobilní osoby $5 \times 7,0 \text{ m}^2 = 35 \text{ m}^2$
- Plucha u laviček $34 \times 5,0 \text{ m}^2 = 170 \text{ m}^2$

Cyklo stojany:

- Pro 3 kola $6 \times 5,4 \text{ m}^2 = 32,4 \text{ m}^2$
- Pro 5 kol $1 \times 9,0 \text{ m}^2 = 9,0 \text{ m}^2$
- Pro 8 kol $3 \times 14,2 \text{ m}^2 = 42,6 \text{ m}^2$

Vyhotovil:



[REDACTED]

Od:

Odesláno:

Komu:

Kopie:

Předmět:

[REDACTED]
středa 23. října 2024 14:34

[REDACTED]
stojany PPO

Vážený pane řediteli,

z důvodů unifikace stojanů na kola ve městě Brně bychom rádi využili v rámci stavby "Protipovodňových opatření VII. a VII. Etapa" městské stojany, které jsou uskladněny ve vaší společnosti. Jedná se v rámci stavby o výměnu cca 70i stojanů.

Moc děkuji za spolupráci. S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí úseku

4. úsek

Magistrát města Brna | Husova 12 | 601 67 Brno

[REDACTED]
www.brno.cz | [facebook](https://www.facebook.com/magistratbrno) | [twitter](https://twitter.com/magistratbrno)

[REDACTED]

Od:

Odesláno:

[REDACTED]
pondělí 19. května 2025 13:45

Komu:

Kopie:

Předmět:

[REDACTED]
Pokyn Zhotoviteli - zpevněný povrch pod lavičkami a stojany na kola

Upozornění: Externí

Pokyn zhotoviteli

Žádáme Zhotovitele stavby "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" o provedení zpevněného povrchu pod lavičkami a stojany na kola (změna č.91). Zvolený materiál je štípaný kámen do betonu bez obrub.

Použití:

- Pod lavičkami
- Pod stojany na kola

Poznámka: Pod odpadkovými koši nebude povrch zpevněn.

[REDACTED]

Investiční manažer vodohospodářských staveb

Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

Odbor investiční

Magistrát města Brna | Kounicova 67a | 601 67 Brno

Tel: [REDACTED]

www.brno.cz | [facebook](#) | [twitter](#)

B | R | N | O

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 17 – Drobná doprovodná opatření	Změnový list č. 91
OZNÁMENÍ ZMĚNY D 17 – Drobná doprovodná opatření ZM 095 – MOBILIÁŘ PŘÍKAZ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna se týká umístění laviček, odpadkové koše, stojany na kola, opěrné zídky pro mobiliář, infopanely a směrníky. Úprava byla provedena na základě umístění a návaznosti na vedení stezek. U laviček a stojanů na kola je řešené vydláždění navazujících ploch kamennou dlažbou osazenou do betonu DOTČENÉ MÍSTO: D _ 17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 095 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.91 vícepráce, ZL č.91 méněpráce, ZL č.91 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 08.20 bylo dohodnuto, že povrch pod lavičkami bude zpevněný, přírodního charakteru bez použití obrub. Kamenná dlažba bude tvořena novým štípaným kamenem osazeným do betonu u míst se sezením i u stojanů pro kola. V místech osazení odpadkových košů nebude povrch zpevněn. Ukončení dlažby s přechodem na zeleň nemusí být provedeno lineárně, ale bude přiznána nerovnost kamene. Položení kamene v místě noh laviček bude použito bez zabetonování spáry z důvodu přístupu ke kotvení mobiliáře. NAVRHL: [REDACTED] DATUM: _____ PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED] DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [REDACTED]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:
A PLUS a.s.

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

IČ:
DIČ:

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		829 299,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	829 299,99	21,00%	174 153,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 003 452,99

D_17	Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095 - MÉNĚPRÁCE	-1 564 146,82
D_17	Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095 - VÍCEPRÁCE	2 393 446,81
CELKEM		829 299,99

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/ba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
ekt:

D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095			
to:	Nábřeží Svratky	Datum:	
avatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
azeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.
dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
klady ze soupisu prací		829 299,99	
HSV - Práce a dodávky HSV		1 686 626,59	
1 - Zemní práce		156 467,52	
2 - Zakládání		-11 195,97	
4 - Vodorovné konstrukce		228 375,70	
5 - Komunikace pozemní		1 098 200,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		79 072,20	
998 - Přesun hmot		135 707,14	
PSV - Práce a dodávky PSV		-857 326,60	
767 - Konstrukce zámečnické		-857 326,60	

JUPIS PRACÍ

/ba:	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII		
ekt:	D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095		
to:	Nábřeží Svratky	Datum:	
avatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
azeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

klady soupisu celkem		829 299,99					
D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 686 626,59				
D	1	Zemní práce	156 467,52				
K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	-2,451	1 058,10	-2 593,64	D_17
VV		Viz PD D17					
VV		Výkop pro patky (dl * š * v)					
VV		M01					
VV		(0,48*0,75*0,4*2)*(-10)	-2,880				
VV		M02					
VV		(0,48*0,75*0,4*2)*10	2,880				
VV		M05					
VV		(0,87*0,35*0,35)*(-23)	-2,451				
VV	výkop_patky_obj	Součet	-2,451				
K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	86,700	248,40	21 536,28	SO 08.08.1
VV		odkop pro dlažbu					
VV		položka z prozpočtu 07.14.02					
VV		Lavičky:					
VV		"Rozšířená plochu pro imobilní osoby" 5*7	35,000				
VV		"Plocha u laviček"34*5	170,000				
VV		Cyklostojany:					
VV		"Pro 3 kola"6* 5,4	32,400				
VV		"Pro 5 kol "1* 9	9,000				
VV		"Pro 8 kol" 3*14,2	42,600				
VV		Mezisoučet	289,000				
VV		289*0,3	86,700				
K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	20,000	1 058,10	21 162,00	D_17
VV		25*2,5*0,8*0,4"položka z rozpočtu	20,000				
K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	104,249	67,80	7 068,07	D_17
VV		Viz PD D17					
VV		Zemní práce - přesun po stavbě (obj)					
VV		výkop_patky_obj	-2,451				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		86,7"odkopávky		86,700			
		25*2,5*0,8*0,4"položka z rozpočtu		20,000			
		Součet		104,249			
	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	104,249	10,90	1 136,31	D_17
VV		Viz PD D17					
VV		Zemní práce - skládka po stavbě (obj)					
VV		104,249"položka z rozpočtu		104,249			
VV		Součet		104,249			
K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,249	54,30	5 660,71	D_17
VV		Viz PD D17					
VV		Zemní práce - nakládání na stavbě (obj)					
VV		104,249"položka z rozpočtu		104,249			
VV		Součet		104,249			
K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	104,249	284,80	29 690,05	D_17
VV		Viz PD D17					
VV		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
VV		104,249"položka z rozpočtu		104,249			
VV		Součet		104,249			
K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 042,488	6,80	7 088,92	D_17
VV		104,249*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 042,488			
K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	187,648	300,00	56 294,34	D_17
VV		104,249*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		187,648			
K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,380	256,00	2 657,28	ÚRS 2025 01
VV		dosypání terénu					
VV		25*2,5*0,8*0,4"hloubení		20,000			
VV		-25*2,5*0,8*0,1"lože ze ŠD		-5,000			
VV		-84*1*0,25*0,1" obruby		-2,100			
VV		-84*1*0,3*0,1"beton		-2,520			
VV		Součet		10,380			
VV		nová položka, URS 2024/2					
M	58331201	šterkopísek netříděný zásypový	t	30,760	220,00	6 767,20	SO_08.26a.a.
VV		15,38*2 "Přepočtené koeficientem množství, položka z rozpočtu SO 26 a.a.		30,760			
D	2	Zakládání				-11 195,97	
K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	-2,451	4 567,50	-11 195,97	D_17
VV		Viz PD D17					
VV		Patky pro mobilář (dl * š * v)					
VV		M01					
VV		(0,48*0,75*0,4*2)*(-10)		-2,880			
VV		M02					
VV		(0,48*0,75*0,4*2)*10		2,880			
VV		M05					
VV		(0,87*0,35*0,35)*(-23)		-2,451			
VV		Součet		-2,451			
D	4	Vodorovné konstrukce				228 375,70	
K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	289,000	628,00	181 492,00	SO 07.07
VV		289"dlažba		289,000			
VV		položka z rozpočtu SO 07.07					
VV		Součet		289,000			
K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	339,000	138,30	46 883,70	SO 07.07
VV		289"dlažba		289,000			
VV		25*2,5*0,8"lože ze ŠD, položka z rozpočtu SO 07.07		50,000			
VV		Součet		339,000			
D	5	Komunikace pozemní				1 098 200,00	
K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu	m2	289,000	1 420,00	410 380,00	ÚRS 2025 01
VV		nová položka, cena URS 2024/2					
VV		Lavičky:					
VV		"Rozšířená plochu pro imobilní osoby" 5*7		35,000			
VV		"Plocha u laviček"34*5		170,000			
VV		Cyklostojany:					
VV		"Pro 3 kola"6* 5,4		32,400			
VV		"Pro 5 kol "1* 9		9,000			
VV		"Pro 8 kol" 3*14,2		42,600			
VV		Součet		289,000			
M	58381082	haklík hrubý štipaný (1t=3m2)	m2	289,000	2 380,00	687 820,00	ÚRS 2025 01
VV		nová položka, cena URS 2024/2					
VV		Lavičky:					
VV		"Rozšířená plochu pro imobilní osoby" 5*7		35,000			
VV		"Plocha u laviček"34*5		170,000			
VV		Cyklostojany:					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"Pro 3 kola"6* 5,4		32,400			
VV		"Pro 5 kol "1* 9		9,000			
VV		"Pro 8 kol" 3*14,2		42,600			
VV		Součet		289,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 072,20	
K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	84,000	500,00	42 000,00	ÚRS 2025 01
VV		17*4+8*2		84,000			
M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	84,000	170,80	14 347,20	SO 08.08.1
K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	25,000	909,00	22 725,00	ÚRS 2025 01
VV		"stojan pro 3 kola"6		6,000			
VV		"stojan pro 5 kol - sestava 1x pro 3 kola, 1x pro 2 kola celkem 5" 5*2		10,000			
VV		"stojan pro 8 kol - sestava 2x pro 3 kola, 1x pro 2 kola, celkem 3" 3*3		9,000			
VV		Součet		25,000			
D	998	Přesun hmot				135 707,14	
K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	287,393	472,20	135 707,14	D_17
D	PSV	Práce a dodávky PSV				-857 326,60	
D	767	Konstrukce zámečnické				-857 326,60	
K	M01	D+M lavička s opěradlem dl. 1850 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	kpl	-10,000	18 644,80	-186 448,00	D_17
		Původní počet 78 kusů. Nově 68kusů					
		68-78		-10,000			
		Součet		-10,000			
K	M02	D+M lavička bez opěradla dl. 1850 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	kpl	10,000	61 019,10	610 191,00	D_17
		Původní počet 12 kusů. Nově 22 kusů.					
		22-12		10,000			
		Součet		10,000			
K	M04	D+M odpadkový koš vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	kpl	0,000	13 220,80	0,00	D_17
		Původní počet 64 kusů					
		Nově 37 kusů + 9 na tříděný odpad.					
		-64		-64,000			
		37+3*9		64,000			
		Součet		0,000			
K	M05	D+M stojan na kola vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	kpl	-90,000	10 000,40	-900 036,00	D_17
		-90 ks		-90,000			
		Součet		-90,000			
K	M06	D+M informační tabule vč. kotvení, základu a příslušenství (dle PD)	kpl	-8,000	40 679,40	-325 435,20	D_17
		Původní počet 10 kusů. Nově 2 kusy.					
		2-10		-8,000			
		Součet		-8,000			
K	M07	D+M rozcestník vč. kotvení, základu a příslušenství (dle PD)	kpl	-8,000	16 949,80	-135 598,40	D_17
		Původní počet 13 kusů. Nově 5 kusů.					
		5-13		-8,000			
		Součet		-8,000			
K	M15	D+M architektonický prvek vývodu VZT vč. Kotvení, základu a příslušenství (dle PD)	kpl	2,000	40 000,00	80 000,00	D_17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095
MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

-1 564 146,82

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 564 146,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-327 874,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 892 021,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095
MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	-1 564 146,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 629,22
1 - Zemní práce	-2 593,64
2 - Zakládání	-11 195,97
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 547 517,60
767 - Konstrukce zámečnické	-1 547 517,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII		
Objekt:	D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095 MĚNĚPRÁCE		
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	28. 9. 2020
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 564 146,82	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-16 629,22	
D		1	Zemní práce				-2 593,64	
1	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	-2,451	1 058,10	-2 593,64	D_17
		VV	Viz PD D17					
		VV	Výkop pro patky (dl * š * v)					
		VV	M01					
		VV	(0,48*0,75*0,4*2)*(-10)		-2,880			
		VV	M02					
		VV	(0,48*0,75*0,4*2)*10		2,880			
		VV	M05					
		VV	(0,87*0,35*0,35)*(-23)		-2,451			
		VV	výkop_patky_obj		-2,451			
		VV	Součet					
D		2	Zakládání				-11 195,97	
14	K	275313911	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	-2,451	4 567,50	-11 195,97	D_17
		VV	Viz PD D17					
		VV	Patky pro mobiliář (dl * š * v)					
		VV	M01					
		VV	(0,48*0,75*0,4*2)*(-10)		-2,880			
		VV	M02					
		VV	(0,48*0,75*0,4*2)*10		2,880			
		VV	M05					
		VV	(0,87*0,35*0,35)*(-23)		-2,451			
		VV	Součet		-2,451			
D		998	Přesun hmot				-2 839,61	
23	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	-6,014	472,20	-2 839,61	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-1 547 517,60	
D		767	Konstrukce zámečnické				-1 547 517,60	
24	K	M01	D+M lavička s opěradlem dl. 1850 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	kpl	-10,000	18 644,80	-186 448,00	D_17
			Původní počet 78 kusů. Nově 68kusů					
			68-78		-10,000			
			Součet		-10,000			
28	K	M05	D+M stojan na kola vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	kpl	-90,000	10 000,40	-900 036,00	D_17
			-90 ks		-90,000			
			Součet		-90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	M06	D+M informační tabule vč. kotvení, základu a příslušenství (dle PD)	kpl	-8,000	40 679,40	-325 435,20	D_17
			Původní počet 10 kusů. Nově 2 kusy.		-8,000			
			2-10		-8,000			
			Součet		-8,000			
30	K	M07	D+M rozcestník vč. kotvení, základu a příslušenství (dle PD)	kpl	-8,000	16 949,80	-135 598,40	D_17
			Původní počet 13 kusů. Nově 5 kusů.		-8,000			
			5-13		-8,000			
			Součet		-8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095
VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

2 393 446,81

DPH základní
snížená

Základ daně
2 393 446,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
502 623,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 896 070,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

**D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		2 393 446,81	
HSV - Práce a dodávky HSV		1 703 255,81	
1 - Zemní práce		159 061,16	
2 - Zakládání		0,00	
4 - Vodorovné konstrukce		228 375,70	
5 - Komunikace pozemní		1 098 200,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		79 072,20	
998 - Přesun hmot		138 546,75	
PSV - Práce a dodávky PSV		690 191,00	
767 - Konstrukce zámečnické		690 191,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: **D_17 - Drobná doprovodná opatření. Změna ZM 095
VÍCEPRÁCE**


Místo:	Nábřeží Svratky	Datum:	28. 9. 2020
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 393 446,81	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 703 255,81	
D	1	Zemní práce					159 061,16	
1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	86,700	248,40	21 536,28	SO 08.08.1
	VV	odkop pro dlažbu						
	VV	položka z rozpočtu 07.14.02						
	VV	Lavičky:						
	VV	"Rozšířená plocha pro imobilní osoby" 5*7				35,000		
	VV	"Plocha u laviček"34*5				170,000		
	VV	Cyklostojany:						
	VV	"Pro 3 kola"6* 5,4				32,400		
	VV	"Pro 5 kol "1* 9				9,000		
	VV	"Pro 8 kol" 3*14,2				42,600		
	VV	Mezisoučet				289,000		
	VV	289*0,3				86,700		
1	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	20,000	1 058,10	21 162,00	D_17
	VV	25*2,5*0,8*0,4"položka z rozpočtu				20,000		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	104,249	67,80	7 068,07	D_17
	VV	Viz PD D17						
	VV	Zemní práce - přesun po stavbě (obj)						
	VV	výkop _patky _obj				-2,451		
	VV	86,7"odkopávky				86,700		
	VV	25*2,5*0,8*0,4"položka z rozpočtu				20,000		
	VV	Součet				104,249		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	104,249	10,90	1 136,31	D_17
	VV	Viz PD D17						
	VV	Zemní práce - skládka po stavbě (obj)						
	VV	104,249"položka z rozpočtu				104,249		
	VV	Součet				104,249		
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,249	54,30	5 660,71	D_17
	VV	Viz PD D17						
	VV	Zemní práce - nakládání na stavbě (obj)						
	VV	104,249"položka z rozpočtu				104,249		
	VV	Součet				104,249		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	104,249	284,80	29 690,05	D_17
	VV		Viz PD D17					
	VV		Zemní práce - přesun na skládku (obj)					
	VV		104,249*položka z rozpočtu		104,249			
	VV		Součet		104,249			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 042,488	6,80	7 088,92	D_17
	VV		104,249*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 042,488			
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	187,648	300,00	56 294,34	D_17
	VV		104,249*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		187,648			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,380	256,00	2 657,28	ÚRS 2025 01
	VV		dosypání terénu					
	VV		25*2,5*0,8*0,4"hloubení		20,000			
	VV		-25*2,5*0,8*0,1"lože ze ŠD		-5,000			
	VV		-84*1*0,25*0,1" obruby		-2,100			
	VV		-84*1*0,3*0,1"beton		-2,520			
	VV		Součet		10,380			
	VV		nová položka, URS 2024/2					
49	M	58331201	štěrkopísek netříděný zásypový	t	30,760	220,00	6 767,20	SO_08.26a.a.
	VV		15,38*2 "Přepočtené koeficientem množství, položka z rozpočtu SO 26 a.a.		30,760			
	D	4	Vodorovné konstrukce				228 375,70	
22	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	289,000	628,00	181 492,00	SO 07.07
	VV		289"dlažba		289,000			
	VV		položka z rozpočtu SO 07.07					
	VV		Součet		289,000			
35	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	339,000	138,30	46 883,70	SO 07.07
	VV		289"dlažba		289,000			
	VV		25*2,5*0,8"lože ze ŠD, položka z rozpočtu SO 07.07		50,000			
	VV		Součet		339,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 098 200,00	
36	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu	m2	289,000	1 420,00	410 380,00	ÚRS 2025 01
	VV		nová položka, cena URS 2024/2					
	VV		Lavičky:					
	VV		"Rozšířená plocha pro imobilní osoby" 5*7		35,000			
	VV		"Plocha u laviček"34*5		170,000			
	VV		Cyklostojany:					
	VV		"Pro 3 kola"6* 5,4		32,400			
	VV		"Pro 5 kol "1* 9		9,000			
	VV		"Pro 8 kol" 3*14,2		42,600			
	VV		Součet		289,000			
37	M	58381082	haklik hrubý štípaný (1t=3m2)	m2	289,000	2 380,00	687 820,00	ÚRS 2025 01
	VV		nová položka, cena URS 2024/2					
	VV		Lavičky:					
	VV		"Rozšířená plocha pro imobilní osoby" 5*7		35,000			
	VV		"Plocha u laviček"34*5		170,000			
	VV		Cyklostojany:					
	VV		"Pro 3 kola"6* 5,4		32,400			
	VV		"Pro 5 kol "1* 9		9,000			
	VV		"Pro 8 kol" 3*14,2		42,600			
	VV		Součet		289,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 072,20	
38	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	84,000	500,00	42 000,00	ÚRS 2025 01
	VV		17*4+8*2		84,000			
55	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	84,000	170,80	14 347,20	SO 08.08.1
40	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotvevními šrouby na pevný podklad	kus	25,000	909,00	22 725,00	ÚRS 2025 01
	VV		"stojan pro 3 kola"6		6,000			
	VV		"stojan pro 5 kol - sestava 1x pro 3 kola, 1x pro 2 kola celkem 5" 5*2		10,000			
	VV		"stojan pro 8 kol - sestava 2x pro 3 kola, 1x pro 2 kola, celkem 3" 3*3		9,000			
	VV		Součet		25,000			
	D	998	Přesun hmot				138 546,75	
23	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	293,407	472,20	138 546,75	D_17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				690 191,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				690 191,00	
25	K	M02	D+M lavička bez opěradla dl. 1850 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)	kpl	10,000	61 019,10	610 191,00	D_17
			Původní počet 12 kusů. Nově 22 kusů.					
			22-12		10,000			
			Součet		10,000			
31	K	M15	D+M architektonický prvek vývodu VZT vč. Kotvení, základu a příslušenství (dle PD)	kpl	2,000	40 000,00	80 000,00	D_17

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 17 – Drobná doprovodná opatření	91																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D 17 – Drobná doprovodná opatření ZM 095 – Mobiliář</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D 17 – Drobná doprovodná opatření ZM 095 – Mobiliář	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D 17 – Drobná doprovodná opatření ZM 095 – Mobiliář	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			Mail _____	
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:															
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____															
		FAX: _____															
		OSOBNĚ: _____															
		Mail _____															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna se týká umístění laviček, odpadkové koše, stojany na kola, opěrné zídky pro mobiliář, infopanely a směrníky. Úprava byla provedena na základě umístění a návaznosti na vedení stezek. U laviček a stojanů na kola je řešené vydláždění navazujících ploch kamennou dlažbou osazenou do betonu DOTČENÉ MÍSTO: D_17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 095 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.91 vícepráce, ZL č.91 méněpráce, ZL č.91 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 393 446,81 Kč</td><td style="text-align: right;">502 623,83 Kč</td><td style="text-align: right;">2 896 070,64 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 1 564 146,82 Kč</td><td style="text-align: right;">- 328 470,83 Kč</td><td style="text-align: right;">1 892 617,65 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">829 299,99 Kč</td><td style="text-align: right;">174 153,00 Kč</td><td style="text-align: right;">1 003 452,99 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 393 446,81 Kč	502 623,83 Kč	2 896 070,64 Kč	Méněpráce:	- 1 564 146,82 Kč	- 328 470,83 Kč	1 892 617,65 Kč	Rozdíl:	829 299,99 Kč	174 153,00 Kč	1 003 452,99 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 393 446,81 Kč	502 623,83 Kč	2 896 070,64 Kč														
Méněpráce:	- 1 564 146,82 Kč	- 328 470,83 Kč	1 892 617,65 Kč														
Rozdíl:	829 299,99 Kč	174 153,00 Kč	1 003 452,99 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____</td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____														
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																




DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZMĚNA 095

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	A PLUS a.s.
PROJEKTANT ČÁSTI:	A PLUS a.s.
DATUM:	30. 10. 2024




POPIS ZMĚNY 095

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	A PLUS a.s.
PROJEKTANT ČÁSTI:	A PLUS a.s.
DATUM:	30. 10. 2024



1. Popis změny

- Změna se týká umístění mobiliářů a drobných doprovodných opatření jako lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, opěrné zídky pro mobiliář, infopanely a směrníky. Úprava byla provedena na základě obchůzky na stavbě, kde se vytypovali konkrétní umístění a návaznosti na vedení stezek.
- U míst s lavičky a stojanů na kola je řešené vydláždění navazujících ploch kamennou dlažbou osazenou do betonu. Rozsah vydláždění u laviček je uveden na výkrese s označením SVR-DPS-D.17-_-105 revize 01 a pro stojany na kola na výkrese SVR-DPS-D.17-_-108 revize 01
- V rámci této změny je řešena záměna typu stojanů na kola dle nového městského standardu a dle stanoviska autorského dozoru ze dne 30.10.2024 – Stojany na kola ve standardu města Brna.

2. Posouzení, stanoviska:

- Změna nevyžaduje projednání s DOSS.
- Stanovisko AD „Stojany na kola ve standardu města Brna,, ze dne 30.10.2024

3. Revize výkresů DPS:

- SVR-DPS-D.17-_-101-01 SITUACE UMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE V PROSTORU KORYTA ŘEKY
- SVR-DPS-D.17-_-105-01 REFERENČNÍ MÍSTA A.1 V PROSTORU KORYTA ŘEKY
- SVR-DPS-D.17-_-108-01 REFERENČNÍ MÍSTA A.2 V PROSTORU KORYTA ŘEKY

4. Doplněné nové výkresy DPS:

- Žádné

5. Aktualizovaný výkaz výměr v členění na vícepráce a méněpráce

- Změna má dopad do výkazu výměr a bude tvořen vícepracemi a méněpracemi.

9. Jednání k zapravení povrchů na ulici Poříčí

3.9.2024 Na minulém KD měl zhotovitel dotaz k obnově 4 řad žulových kostek na ulici Poříčí. Zástupce TDI informoval, že v týdnu od 23.9.2024 proběhne jednání k zapravení povrchů na ulici Poříčí, které svolá PK Ossendorf. Zhotovitel se tohoto jednání také zúčastní. Info k termínu na příštím KD.

17.9.2024 Jednání proběhne 25.9.2024 a bude přítomen zástupce zhotovitele i TDI. Info na příštím KD.

10. Revize mobiliáře objektu SO 08.20 ZM095

3.9.2024 Na dnešním KD bylo domluveno, že definitivní umístění prvků z objektu Drobná doprovodná opatření SO 08.20 stanoví AD. Proběhne schůzka na místě samém. První část AD zašle do 5.9.2024. AD stanoví přesnou polohu všech prvků do příštího KD (17.9.2024)

Zodpovídá AD

17.9.2024 AD provádí kompletní revizi mobiliáře. Dojde k redukci počtu stojanů na kola a odpadkových košů. Bod byl přejmenován a jedná se o změnu DPS. Zástupci zhotovitele svolají místní šetření. Součástí revize bude i řešení infopanelů a rozcestníků, jejichž podoba bude dle vyjádření zástupce KAM do 10/2024.

Zodpovídá AD a zhotovitel

11. Sloup VO u lávky CTP

3.9.2024 Na dnešním KD zástupce zhotovitele upozornil na kolizi sloupu VO se stávajícím stromem u lávky CTP. Stožár sloupu zasahuje do kořenového systému stromu a zároveň do koruny stromu. Zástupce zhotovitele požádal o prověření a případné stanovení nové polohy sloupu VO. Proběhne schůzka na místě samém dne 4.9.2024

Zodpovídá AD

17.9.2024 Poloha sloupu VO se nemění. Pravděpodobně dojde pouze k prořezu stromu. Bod bude vypuštěn.

12. Výšková nesrovnalost stezky a terénu u CTP

3.9.2024 Zhotovitel upozornil na výškové rozdíly nových stezek a stávajícího terénu v blízkosti stromu před lávkou CTP. Dle AD bude výškový rozdíl řešen palisádami. Zhotovitel požádal o zaslání detailu palisád. AD zašle své závazné stanovisko do příštího KD (17.9.2024)

Zodpovídá AD

17.9.2024 Navazuje na předchozí bod. Palisády nebudou realizovány. Dojde k prořezu stromu a přísypu kořenového systému. Bod bude vypuštěn.

13. Původní larseny pod Heršpickým mostem

3.9.2024 Zhotovitel při výkopech pod Heršpickým (Svrateckým) mostem (pravá strana) narazil na larsenovou stěnu pod dnem, která zasahuje do prostoru budoucích základových patek stěny SO 07.19. Larsenová stěna se vyskytuje pod celou šíří Svrateckého mostu. Zhotovitel žádá o informaci, jak dále postupovat. AD zašle své vyjádření do 9.9.2024

Zodpovídá AD

17.9.2024 Technické řešení bylo diskutováno v rámci technického dne 9.9.2024. Dojde k odřezání původních larsen na úrovni stávajícího betonového základu.

14. Zálivky náhradní výsadby mimo stavbu a objednávka stromů pro náhradní výsadbu do staveniště

17.9.2024 Dle zástupce subdodavatele zhotovitele jsou všechny stromy v oblasti mimo staveniště vysazené a předané jednotlivým městským částem, zástupce zhotovitele upozornil, že tyto výsadby je třeba předat i přímo objednateli MMB OI.

Některé stromy je třeba vyměnit, protože uschly. Následná péče se počítá až od předání objednateli.

Zástupce technického poradce požádal, zda by zhotovitel mohl zaslat objednávku stromů v oblasti staveniště, až proběhne. To zástupce zhotovitele odmítl. Technický poradce MMB OI sdělil, že tedy postačí pouze formou bodu v KD informace, že stromy jsou již objednané.

15. Projednávaná změna koncepce značení

17.9.2024 Zástupce KAM a TDI informovali, že Odbor dopravy projednává změnu koncepce značení – dojde k úpravě počtu a druhu značení – zhotovitel nebude objednávat značení podle původního zadání.

SO 07.14 Pěšina – práce v tomto období neprobíhají

SO 07.14b Lávka – práce v tomto období neprobíhají

SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava koryta – úsek 39,750 - 39,870 - dokončeno

SO 08.19 Výsadba dřevin – výsadba dřevin dle klimatických podmínek

SO 08.20 Drobná doprovodná opatření – práce v tomto období neprobíhají, nemá vliv na konečný termín

Úsek 12_ 39,870 - 40,170

Dokončeno

4) Změny PD

1. Revize mobiliáře objektu SO 08.20 ZM095

3.9.2024 Na dnešním KD bylo domluveno, že definitivní umístění prvků z objektu Drobná doprovodná opatření SO 08.20 stanoví AD. Proběhne schůzka na místě samém. První část AD zašle do 5.9.2024. AD stanoví přesnou polohu všech prvků do příštího KD (17.9.2024)

Zodpovídá AD

17.9.2024 Bod byl přesunut z části ostatní. Jedná se o změnu DPS. AD provádí kompletní revizi mobiliáře. Dojde k redukci počtu stojanů na kola a odpadkových košů.

Bod byl přejmenován a jedná se o změnu DPS. Zástupci zhotovitele svolají místní šetření. Součástí revize bude i řešení infopanelů a rozcestníků, jejichž podoba bude dle vyjádření zástupce KAM do 10/2024.

Zodpovídá AD a zhotovitel

1.10.2024 Bod byl přesunut z části ostatní, jedná se o změnu DPS. Proběhne další jednání k dořešení mobiliáře. Zhotovitel svolá jednání, za účasti viz jednání 15.8.2024 – umístění mobiliáře v rámci PPO.

Za svolání zodpovídá zhotovitel

15.10.2024 Jednání proběhlo, zápis rozešle zástupce zhotovitele. AD zaslal v den konání KD upravenou verzi situačního výkresu, ta je vložena i na sdílené úložiště. Změna bude předána kompletní i v tištěné podobě, včetně VV.

Za předání zodpovídá AD

29.10.2024 AD zaslal změnu DPS v tištěné podobě. Po zaslání změny DPS vydal zástupce OI MMB pokyn, na základě kterého dojde k záměně navržených cyklostanů za cyklostan, které odpovídají městským standardům a jsou uloženy ve skladě na Bkom. AD zpracuje finální revizi ZM 095, která bude zahrnovat tento požadavek i s ohledem na způsob osazení cyklostanů VV bude rovněž opraven. AD k revizi DPS ještě doplní část městských standardů, týkající se cyklostanů.

Zástupce Kam zašle do konce 10/2024 zhotoviteli podobu infopanelů a rozcestníků dle domluvy.

Zodpovídá AD a KAM

19.11.2024 AD zaslal dokumentaci pro ZM095. Zástupce KAM zaslal dospecifikování některých technických detailů zástupci zhotovitele, jedná se o VTD. Počet kusů mobiliáře je konečný, AD zašle ještě půdorys a řez pro řešení povrchů v místě zaměňovaných cyklostanů.

Termín : do 3.12.2024.

Zodpovídá AD

3.12.2024 AD dnes zašle schémata povrchů v místě zaměňovaných cyklostanů. VV bude řešen na technickém dni 10.12.2024.

17.12.2024 Na dnešním KD bylo diskutováno použití štípaného kamene pod lavičky a cyklostan. Pod odpadkové koše použít nebude. Zástupce TDI upozornil na vícenáklady, které jsou s touto změnou spojené.

Dle vyjádření AD se jedná o požadavek MČ. Zástupce AD vydá závazné stanovisko, které bude obsahovat i jednoduchý náčrt. Zástupce OI MMB odsouhlasí zařazení po vydání stanoviska AD a po kalkulaci vícenákladů.

Termín pro stanovisko AD : Do 7.1.2025

Zodpovídá AD

14.1.2024 Závazné stanovisko AD a VV ještě nebyly zaslány. AD dořeší stanovisko i VV dnes po konání KD se zhotovitelem a 15.1.2025 předá vše zástupcům KAM.

Bylo řešeno umístění drenáží za opěrnými zídkami, drenáže budou provedeny dle DPS, jejich ukončení nebude vyvedeno nad terén, ale bude ukončeno na konci opěrné zídky pod terénem.

28.1.2025 Změna DPS byla předána, zhotovitel zkompletuje ZL. Bod bude vypuštěn.

2. Sadové úpravy -výsadba do staveniště – úprava výsadeb ve svahu ZM 033.3

6.8.2024 Dnešního kontrolního dne se zúčastnili zástupci firmy Kavyl (subdodavatel zhotovitele pro náhradní výsadbu). Zástupci Kavylu měli dotazy k výsadbě stromů do kamenného záhozu, dále k umístění některých
