



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 116

SO 07.09 Kolonáda

ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě-ZVĚTŠENÍ
PROKOŘENITELNÉHO PROSTORU



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH


Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
Pokyn OI MMB	3
Vyjádření KAM	4
příloha č. 7	5
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	7
Rozpočet	8
Výkresová část	9
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	10


**"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 116
ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě-
ZVĚTŠENÍ PROKOŘENITELNÉHO PROSTORU**

Uvedený změnový list navazuje na změny listy ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě (ZL 82) a ZM 096 změna založení prefabrikovaných schodů Kolonáda (ZL 88). Před zahájením realizace prací dle změny bylo zhotovitelem navrženo zvážení využití technologického výkopu, provedeného pro možnost realizace základového pasu pro uložení schodiště, jako dodatečného prokořenitelného žebra pro stromy vysazené v květináčích. Jedná se o prostor průřezu 0,7*0,7 prakticky po celé délce schodiště (vyjma úseku v přímé kolizi se stávající stěnou). Tento prostor bude vyplněn strukturálním substrátem „A“ překrytým separační geotextilií. Z hlediska prosperity stromů na místě lze považovat jakékoliv zvětšení prokořenitelného prostoru za přínosné opatření. Uvedené opatření sice nezajistí ideální podmínky, ale z pohledu časových možností při realizaci je jako maximálně možné s tím, že si zachovává významnou funkčnost.

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 16. duben 2025

Věc: **ZMĚNA 089 – Zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě – varianta 5**


Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Změna vegetačních úprav na kolonádě spočívá ve zvětšení prokořenitelného prostoru pro vysazované stromy. Tato varianta uvažuje úpravy v rámci konstrukce květináčů a doplnění prokořenitelného žebra. Tato změna slouží k dosažení optimálního a dlouhodobě udržitelného cílového stavu stromořadí bez nutnosti zásahu do okolních konstrukcí.

Květináč bude vyplněn podkladním strukturním substrátem A o mocnosti cca 1200 mm. Nad touto vrstvou bude proveden pěstební strukturní substrát B. Od rostlého nebo nasypaného terénu bude substrát oddělen separační geotextilií. Pro revizi nasyceného stavu substrátu bude do květináče umístěna drenážní trubka DN 160 s víčkem. Prokořenitelné žebro, které zvětšuje prostor pro růst kořenů a nahrazuje zhutnělou zemní pláň, bude založeno jako průběžný pás strukturálního substrátu navázaný na otevřenou zadní stranu květináče. Žebro bude založeno v šíři cca 700 mm a mocnosti cca 700 mm.

Řez navrženou konstrukcí viz strana 2.

Tato změna nemá vliv na povolení stavby a řeší úpravy v rozšíření prokořenitelné vrstvy vysazovaných stromů.

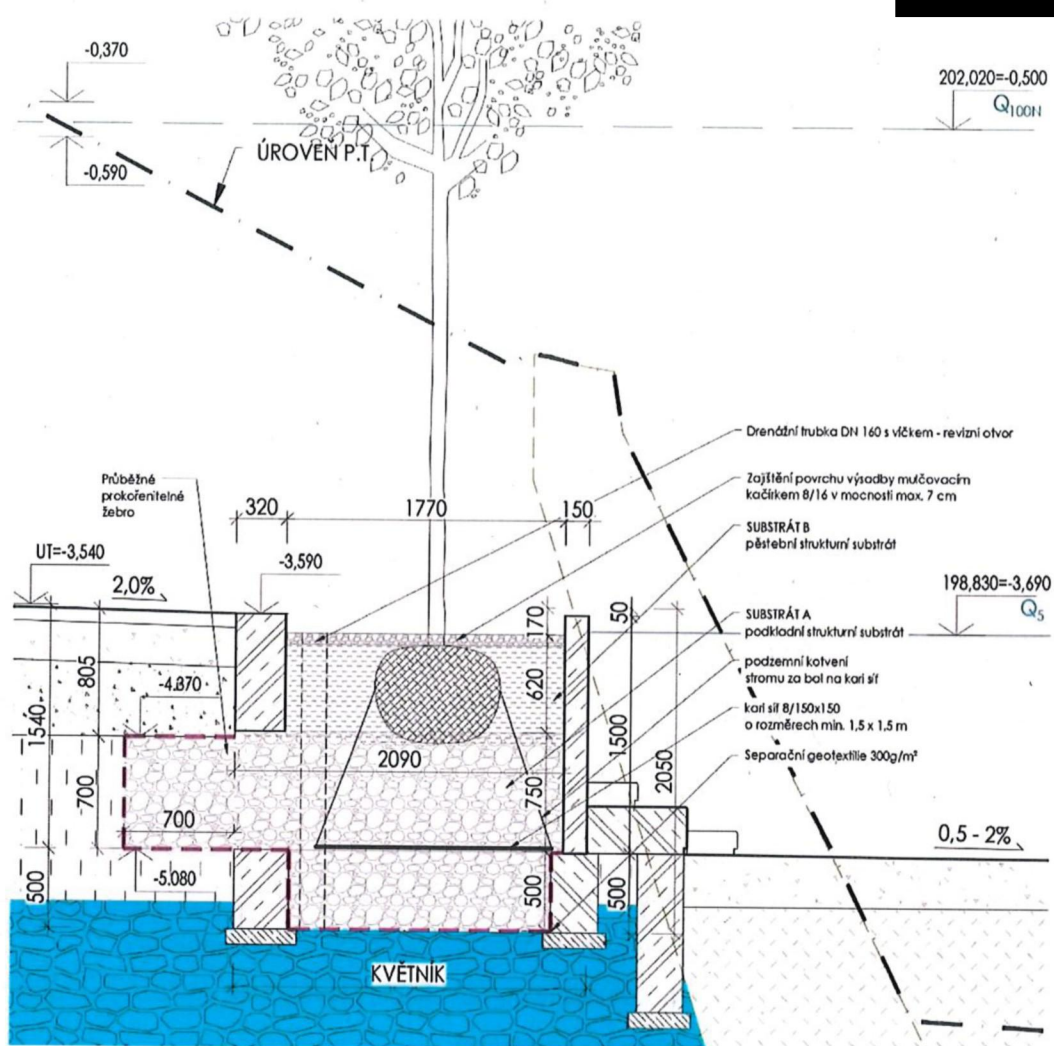

Odhadované množství materiálu:

- Substrát A (strukturální) – květináč+žebro	179,758 m ³
- Substrát B (výsadbový)	32,80 m ³
- Drenážní trubka (revizní)	34 m
- Víčko na drenážní trubku	17 ks
- Mulčovací kačírek 8/16	4,403 m ³
- Kari síť 8/150x150 o rozměru 1,5x1,5 m	17 ks

Vyhotovil: Tomáš Zelinka

[REDACTED]

Od:

Odesláno:

[REDACTED]
pondělí 19. května 2025 13:53

Komu:

Kopie:

Předmět:

[REDACTED]
Pokyn Zhotoviteli - Prokořenitelné žebro v objektu Kolonáda

Upozornění: Externí

Pokyn zhotoviteli

Žádáme Zhotovitele stavby "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" o provedení prokořenitelného žebra pro zlepšení podmínek pro stromy v objektu Kolonáda. Tento písemný pokyn je vydán na základě ústního pokynu vedoucího odboru investičního MMB, Ing. Tomáše Pivce, MBA, ze dne 23.4.2025.

[REDACTED]

Investiční manažer vodohospodářských staveb
Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

Odbor investiční
Magistrát města Brna | Kounicova 67a | 601 67 Brno

Tel:

[REDACTED]
www.brno.cz | [facebook](#) | [twitter](#)

B | R | N | O

Od:

Odesláno:

Komu:

Kopie:

čtvrtek 17. dubna 2025 13:39

Předmět:

Přílohy:

PPO VII, VIII - Podklady k prokořenitelnému žebro

Podklady - Stromy kolonáda.zip

Upozornění: Externí

Dobrý den,

dle domluvy zasíláme podklady pro posouzení aktuálně navrhované změny v podobě doplnění prokořenitelného žebra pro stromy v květináčích na kolonádě v rámci akce „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“.

- Záměr „Zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě“ byl jako Změna 089 projednáván od 04/2024. Tehdy byla zpracována původní varianta č.1, kterou naleznete v Příloze č. 1 „Kolonáda – vegetační úpravy - DPS“. Tento záměr byl z časových důvodů zamítnut. Nicméně je možné ověřit původně navržené technické řešení i vyjádření Veřejné zeleně města Brna.
- Podkladem pro aktuálně platný změnový list byla varianta řešení č. 4 – naleznete v Příloze č. 2; která zahrnuje prohloubení dna květináče na úroveň základů schodiště, což zajistí zvětšení prokořenitelného prostoru pro jednotlivé stromy. Prokořenitelný prostor pro každý strom je ale stále omezený s ohledem na požadavky navrženého taxonu. Důležitou součástí technologického postupu výsadby je rozrušení propustného dna květináče (rozrušení zhutnělého podloží, odstranění podkladního betonu).
- Aktuálně navržené technologické opatření se v principu vrací k původní variantě č.1 – tj. zahrnuje realizaci průběžného prokořenitelného prostoru, nyní redukováného do podoby žebra. Toto opatření, které zvětšuje prostor pro růst kořenů a nahrazuje zhutnělou zemní pláň, bude založeno jako průběžný pás strukturálního substrátu navázaný na otevřenou zadní stranu květináče. Žebro bude založeno v šíři cca 700 mm a mocnosti cca 700 mm. Každý květináč je primárně odvodněn skrze propustné dno (rozrušení rostlého podloží je součástí technologického postupu výsadby), položeného pod úrovní rýhy. Z hlediska prosperity stromů na místě lze považovat jakékoliv zvětšení prokořenitelného prostoru za přínosné opatření. Více viz Příloha č.3 Stanovisko AD a níže uvedený text k prokořenitelnému prostoru stromu.
- Prokořenitelný prostor:
Prokořenitelným prostorem se rozumí prostor využitelný pro růst kořenového systému dřeviny, jehož objem musí být dostatečně velký, aby umožňoval dosažení velikosti dospělého jedince daného taxonu dřeviny bez závislosti na doplňkové závlaze či výživě. Velikost prokořenitelného prostoru je v městském prostředí jedním z rozhodujících faktorů primárně ovlivňujících dobu aktivního růstu stromu. Velikost prokořenitelného prostoru má také logicky vliv na stav stromu, délku jeho života, odolnost vůči stresu při přísušku a v extrémních případech ovlivňuje i stabilitu stromu. Systémovým krokem v rámci přípravy projektové dokumentace pro výsadby stromořadí by mělo být zajištění minimálního prokořenitelného objemu půdy ověřené

výpočtem ve standardu SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin. Zajištění dostatečného prokořenitelného prostoru nejsme v naprosté většině situací schopni dosáhnout v půdorysu stromové mísy a rozšiřujeme ho do oblasti výsadbového pásu (žebra). V případě použití substrátů s komponenty majícími vysokou vododržnost a s účinným systémem hospodaření se srážkovou vodou je možné realizovat výsadbu do menších objemů půdy (pro navržený taxon je potřebný objem 20 m³). Zdroj: Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu, © Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2022.

- Založení výsadby stromů do dostatečně velkého prokořenitelného prostoru s využitím strukturálního substrátu bylo v investičních akcích města např. na Mendlově náměstí, na ul. Šámalova a na Moravském náměstí.

Děkuji a v případě dotazů jsme k dispozici.

S přáním hezkého dne

Vedoucí oddělení Protipovodňová opatření



Kancelář
architekta
města Brna

Náš projekt? Brno!
Lidé, územní plán, veřejný prostor.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	Změnový list č. 116									
ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</td></tr><tr><td>SO 07.09 Kolonáda</td><td>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr><tr><td colspan="2">ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:	SO 07.09 Kolonáda	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:									
SO 07.09 Kolonáda	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:								
	MAIL									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - zvětšení prokořenitelného prostoru-doplnění žebra za květináči strukturálním substrátem DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 116 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.116 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:										
POPIS ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.09 bude využito technologického výkopu, provedeného pro možnost realizace základového pasu pro uložení schodiště, jako dodatečného prokořenitelného žebra pro stromy vysazené v květináčích. Jedná se o prostor průřezu 0,7*0,7 prakticky po celé délce schodiště. Tento prostor bude vyplněn strukturálním substrátem „A“ + překrytým separační geotextilií. 										
POKYN VYDAL										
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŮTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,									

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda	116																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 Kolonáda ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - zvětšení prokořenitelného prostoru-doplnění žebra za květináči strukturálním substrátem DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 089.a ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.116 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">754 334,29 Kč</td><td style="text-align: right;">158 410,20 Kč</td><td style="text-align: right;">912 744,49 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">754 334,29 Kč</td><td style="text-align: right;">158 410,20 Kč</td><td style="text-align: right;">912 744,49 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	754 334,29 Kč	158 410,20 Kč	912 744,49 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	754 334,29 Kč	158 410,20 Kč	912 744,49 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	754 334,29 Kč	158 410,20 Kč	912 744,49 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	754 334,29 Kč	158 410,20 Kč	912 744,49 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 Vstupní objekt a kolonáda

ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - zvětšení prokořenitelného prostoru -
doplnění žebra za květináči strukturálním substrátem

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			754 334,29
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	754 334,29	158 410,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			912 744,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 Vstupní objekt a kolonáda

ZM 089.a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - zvětšení prokořenitelného prostoru - doplnění žebra za květináči strukturálním substrátem

Místo: Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		754 334,29	912 744,49
D_06	Vstupní objekt a kolonáda	754 334,29	912 744,49
	zvětšení prokořenitelného prostoru-doplnění žebra za květináči strukturálním substrátem MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
	zvětšení prokořenitelného prostoru-doplnění žebra za květináči strukturálním substrátem VÍCEPRÁCE	754 334,29	912 744,49

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 Vstupní objekt a kolonáda

Místo: ZM 089a - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - zvětšení prokořenitelného prostoru - doplnění žebra za květináči strukturálním substrátem

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							754 334,29
D	HSV	Práce a dodávky HSV					754 334,29
D	1	Zemní práce					633 359,10
25	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	54,880	2 040,00	111 955,20
	VV	dočištění pro zásyp za květináči 17 ks, vzdálenost 14 m					
	VV	14*16*0,7*0,7*0,5					54,880
	VV	1/2 objemu rýhy					
	VV	cena URS 2025/1					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	164,640	60,60	9 977,18
	VV	dočištění pro zásyp za květináči 17 ks, vzdálenost 14 m					
	VV	14*16*0,7*0,7*0,5					54,880
	VV	1/2 objemu rýhy					
	VV	doplnění substrátu					
	VV	14*16*0,7*0,7					109,760
	VV	Součet					164,640
	VV	cena SOD, SO 07.09					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	164,640	254,50	41 900,88
	VV	dovoz substrátů, SO 07.09					
	VV	dočištění pro zásyp za květináči 17 ks, vzdálenost 14 m					
	VV	14*16*0,7*0,7*0,5					54,880
	VV	1/2 objemu rýhy					
	VV	14*16*0,7*0,7 "substrát A doplnění za květináče					109,760
	VV	Součet					164,640
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 646,400	6,10	10 043,04
	VV	164,64*1" cena SO 07.09					1 646,400
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	384,160	72,40	27 813,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		164,64"nakládání na stavbě				
	VV		14*16*0,7*0,7*2 "substrát A doplnění za květináče, 2x překládání		164,640		
	VV		cena SO 07.18a		219,520		
	VV		Součet				
					384,160		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	98,784	300,00	29 635,20
	VV		54,88*1,8				
	VV		cena SO 07.09		98,784		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,880	9,70	532,34
	VV		54,88				
	VV		cena SO 07.09		54,880		
26	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	109,760	907,00	99 552,32
	VV		doplnění substrátu				
	VV		14*16*0,7*0,7				
	VV		cena URS 2025/1		109,760		
13	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	109,760	221,00	24 256,96
	VV		doplnění substrátu				
	VV		14*16*0,7*0,7				
	VV		cena URS 2024/2		109,760		
14	M	103715001a	Strukturální substrát A	m3	109,760	2 530,00	277 692,80
	VV		doplnění substrátu				
	VV		14*16*0,7*0,7				
	VV		cena dle nabídky dodavatele		109,760		
D	2		Zakládání				17 283,84
27	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	224,000	38,40	8 601,60
	VV		14*16*1" překrytí substrátu geotextilií, položka z rozpočtu D_17		224,000		
28	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	268,800	32,30	8 682,24
	VV		224*1,2 "Přepočtené koeficientem množství, položka z rozpočtu D_17		268,800		
	VV		Součet		268,800		
D	998		Přesun hmot				103 691,35
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	164,694	155,60	25 626,39
			SO 08.19.1				
24	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	164,694	474,00	78 064,96

8.4.2025 Zhotovitel sklon prověřil a konstatoval, že je nutná oprava. Termín : do 22.4.2025

Zodpovídá zhotovitel

22.4.2025 Zhotovitel neprovedl opravu. Nový termín : do 25.4.2025.

Zodpovídá zhotovitel

6.5.2025 Zhotovitel provedl opravu svahu, zaměření přislíbil v týdnu od 12.5.2025. AD ve 3/2025 upozornil emailem, že je třeba ještě opravit dojezdovou plochu dle DPS, tato oprava ještě nebyla provedena. Zhotovitel upraví sklon dle platné DPS.

Zodpovídá zhotovitel

20.5.2025 Autorský dozor provedl kontrolu daného úseku. Není provedeno dle PD. Bude realizována další oprava dle domluvy.

Zodpovídá zhotovitel

8. Kabelovod DPMB

8.4.2025 Zástupce TDI upozornil zhotovitele, že je třeba předat přeložku kabelovodu zástupcům DPMB. Přeložka je ve zkušebním provozu. Zhotovitel informoval, že opravy komor bude realizovat do konce 4/2025 a poté bude možné přeložku předat zástupcům DPMB.

Zodpovídá zhotovitel

22.4.2025 Zhotovitel na dnešním KD informoval, že opravu neprovede do konce 4/2025, ale spíše do konce 5/2025. DPMB požaduje přejímku až ve chvíli, kdy budou hotové finální povrchy. TDI upozornil na možné problémy spojené s pozdním předáním, zkušební provoz trvá od 11/2023.

6.5.2025 Trvá

20.5.2025 Trvá. Zhotovitel odstraňuje závady na jednotlivých komorách.

9. Zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě

8.4.2025 Subdodavatel zhotovitele navrhl další možnosti zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě. Po dnešním KD proběhne schůzka na místě samém. Info na příštím KD.

22.4.2025 Schůzka proběhla, byl domluven dosyp substrátem dle domluvy. Zhotovitel zašle VV ke kontrole. Zástupce OI MMB požaduje podklady pro projednání. Info na příštím KD.

6.5.2025 Zhotovitel zkompletoval ZL pro další zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě, jedná se o zvětšení prokořitelného prostoru. AD ještě prověří kubatury zeminy.

20.5.2025 ZL byl zkompletován a odsouhlasen. Bod bude vypuštěn.

10. Oplocení NMB

22.4.2025 Na dnešním KD zástupce zhotovitele informoval, že ho kontaktoval zástupce řádu sv. Jana z Boha, pan Kozubík kvůli navrženým místům oplocení. Bude řešit zástupce KAM. Info na příštím KD.

6.5.2025 Na jednání se zástupcem konventu bylo domluveno oplocení na hranici PPO zdi, nad rámec DPS budou doplněna dvě pole oplocení směrem k hotelu Sharningham. AD již zaslal upravený situační výkres a dle domluvy na dnešním KD vloží zápis do SD.

Zodpovídá AD

20.5.2025 proběhlo. Bod bude vypuštěn.

11. Vyhotovení povodňového plánu v souvislosti s realizací PPO etapy VII a VIII

22.4.2025 V návaznosti na realizaci stavby protipovodňových opatření je nutné zpracovat aktualizovaný povodňový plán. Aktualizovaný povodňový plán požaduje i SÚ pro kolaudaci stavby. Výkaz výměr zpracování tohoto plánu neobsahuje. Zástupce OI MMB přislíbil tuto skutečnost ještě prověřit. Info na příštím KD.

6.5.2025 Trvá

20.5.2025 Zástupce OI MMB zaslal administrátorovi VZ k vyjádření. Info na příštím KD.

12. Lávka – mokřad

22.4.2025 Bylo zjištěno, že patky nově budované lávky by byly po realizaci trvale pod vodou, což je v rozporu s výrobní dokumentací lávky. Hladina 199,60 ze stavebního povolení byla upravena na základě autorského požadavku ing. [REDACTED] na to navázaného přepočtu hydrotechniky a následně povolena změnou stavby před dokončením. Dojde k úpravě výrobní dokumentace, pravděpodobně bude zvolena jiná antikorozi ochrana ocelových částí. TDI požádal o vyjádření AD. Zástupce TDI se vyjádří po obdržení navržené změny.

6.5.2025 TDI žádal odbourání patek, s tím nesouhlasil zástupce OI MMB. Zástupce OI MMB požaduje realizaci zvýšené antikorozi ochrany – bude realizováno na základě pokynu zástupce OI MMB na dnešním KD.

Za realizaci zodpovídá zhotovitel

20.5.2025 Bod bude vypuštěn.
