

**ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ****Název stavby:** Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov**Číslo Změnového listu:** 1**Číslo SO/PS:** Stavba není členěna na SO či PS**Název stavebního objektu / provozního souboru:** Stavba není členěna na SO či PS**Objednatel:** Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**Zhotovitel:** PETROM STAVBY a.s. Běchovická
701/26, 100 00 Praha 10**Předmět změny:** Sanace zemní pláň, změna kontejnerů z podnětu Objednatele**Iniciátor změny:** Zhotovitel/Objednatel**Popis změny:**

(popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)

1. V projektové dokumentaci byla navržena výměna nevhodné zeminy aktivní zóny v celkové tloušťce 0,5 m, s požadavkem únosnosti zemní pláň Edef,2 = 45 MPa. Po provedení zkušební úseku sanace byla zemní pláň odzkoušena s nevyhovujícím výsledkem. Na základě doporučení geotechnika a po konzultaci s TDS, bylo navrženo navýšení výměny nevhodné zeminy aktivní zóny o 0,15 m, tedy v celkové tloušťce sanace 0,65 m, pro splnění požadované únosnosti. Na základě doporučení geotechnika, v rámci šetření přírodních zdrojů a z důvodu opětovného využití stavebního a demoličního odpadu, navrhuje zhotovitel použít jako vhodný materiál do aktivní zóny komunikace betonový recyklát fr. 0/63. 2. Na základě požadavku Objednatele a dle požadavku zástupce odpadového hospodářství TSMCH budou

provedeny úpravy nadzemních kontejnerů 2 m³ :

"Umístění A" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks

"Umístění B" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks

"Umístění C" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks

"Umístění D" provedení TRIPLE - PLAST+SKLO+BIO (3x vana 300 l) 1 ks

Jedná se o dodatečné práce provedené na požadavek Objednatele a zároveň o práce, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

Na základě výše uvedeného vyplývá, že se jedná o nezbytné dodatečné stavební práce od původního zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nutné pro dokončení díla. Změnový list bude proto zařazen do odst. 5 a odst. 6, § 222, zák. č. 134/2016 Sb. (ZVZ).

Odkazy na výkresy:

Neobsazeno.

Dopad do celkových termínů:**ANO/NE****Původní termín dle SOD:** 07.07.2027 (945 dní)**Termín dle ZL č. 1** + 0 dní**Nový termín:** 07.07.2027 (945 dní)**NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):****Odpočty v Kč bez DPH** 0,00 Kč**Přípočty v Kč bez DPH** 226 787,05 Kč**Celkem bez DPH** 226 787,05 Kč**DPH** 47 625,28 Kč**Celkem včetně DPH** 274 412,33 Kč**Jméno:****Datum:****Podpis:****Zástupce objednatele:** Ing. Marian Trubiroha**Autorský dozor:** Ing. Robert Weisz**Objednatel:** Mgr. Hana Nováková**osoby s oprávněním
vydání povolení konat dle** Mgr. Milan Märk**Zhotovitel:** Petr Kasper**Přílohy změnového listu:** Změnový rozpočet

Výkresová dokumentace

Vyjádření ADP

Vyjádření zástupce objednatele / TDS


Fotodokumentace

Oznámení variace

Orientační zakres do koordinační situace

Pokyn k provedení variace

Harmonogram



Označení/číslo Smlouvy: d202400468

Dílo: Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov

Věc: Změnový proces č. 1

Odesílatel/Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Ing. Marian Trubiroha, správce stavby

Adresát/Zhotovitel: PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Petr Kasper, předseda představenstva

ZL č.: 1

DOHODA O ROZSAHU CLAIMU

Vážení,

v návaznosti na Zhotovitelem podané „Oznámení o návrhu Variace“ ze dne 23.05.2025 a 05.06.2025 Vám sděluji, že nárok byl posouzen s řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti předloženého Claimu/Variace a je považován za **oprávněný**.

Touto „Dohodou“ se schvaluje nárok v plném rozsahu.

	<i>Cena Díla [bez DPH]</i>	<i>Doba pro dokončení</i>
Dle uzavřené SoD	66 840 442,55 Kč	07.07.2027 (945 dní)
Navýšení ZL1a	123 287,05 Kč	07.07.2027 (+ 0 dní)
Navýšení ZL1b	103 500,00 Kč	07.07.2027 (+ 0 dní)
CELKEM	67 067 229,60 Kč (+0,33 %)	07.07.2027 (945 dní)

Mgr. Milan Märc
Náměstek primátora

Ing. Marian Trubiroha
Správce stavby

Petr Kasper
Zhotovitel, PETROM STAVBY a.s.



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ699006672

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018**

**Statutární město Chomutov
Ing. Marian Trubiroha
Správce stavby**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 23.05.2025

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov

Věc: Oznámení okolnosti č.1 – úprava sanace v Etapě 4a - aktualizace 1

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, ev. č. d202400468 na akci Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov, předkládáme Oznámení okolnosti č.1 dle Smluvních podmínek, čl. 6.1 – Povinnost včasného varování, kdy „Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu, zpozdit provádění Díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování.“

1. V projektové dokumentaci byla navržena výměna nevhodné zeminy aktivní zóny v celkové tloušťce 0,5 m, s požadavkem únosnosti zemní pláně $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$. Po provedení zkušebního úseku sanace byla zemní pláň odzkoušena s nevyhovujícím výsledkem. Na základě doporučení geotechnika a po konzultaci s TDS, bylo navrženo navýšení výměny nevhodné zeminy aktivní zóny o 0,15 m, tedy v celkové tloušťce sanace 0,65 m, pro splnění požadované únosnosti. Na základě doporučení geotechnika, v rámci šetření přírodních zdrojů a z důvodu opětovného využití stavebního a demoličního odpadu, navrhuje zhotovitel použít jako vhodný materiál do aktivní zóny komunikace betonový recyklát fr. 0/63.

Nad nově zrekonstruovanou kanalizací, která vede v komunikaci, byl minulou stavbou proveden zásyp štěrkodrtí 0/32 o celkové šířce 2 m. Tento materiál je vhodný pro použití do aktivní zóny komunikace, byl promíchán s dodaným betonovým recyklátem a byl zpětně použit do aktivní zóny komunikace. Tím vznikla úspora za dodání materiálu do aktivní zóny komunikace.

Z důvodu ponechání stávajícího materiálu uprostřed komunikace nad kanalizací, nebylo možné provádět celoplošné odkopávky komunikace, bylo prováděno hloubení rýh šířky 2 m po obou stranách tohoto ponechaného pruhu.

2. V projektové dokumentaci je v místě vjezdů požadována únosnost zemní pláně $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$. Únosnost stávající zemní pláně v místě vjezdů je nedostatečná. Protože v místě vjezdů vede značné množství inženýrských sítí (ČEZ, CC internet, O2, VO) v nedostatečných hloubkách, není možné provedení sanace výměnou nevhodné zeminy aktivní zóny. Zhotovitel navrhuje zaměnit podkladní vrstvu ze štěrkodrti ŠDa 150 mm za podkladní vrstvu ze směsi stmelené cementem SC C3/4 150 mm.

Tyto uvedené okolnosti nebudou mít vliv na Dobu pro dokončení, ale mají vliv na cenu Díla.

Zhotovitel předkládá rozpočet návrhu této Variace ve výši 123.287,05 Kč bez DPH.



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ699006672

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018**

Jiří Blochin
Zástupce zhotovitele

*Přílohy: Situace sanací Etapa 4a
Stanovisko geotechnika
Zápis ze stavebního deníku
Rozpočet Variace
Situace pruh nad kanalizací*


Jiří
Blochin

Digitálně podepsal
Jiří Blochin
Datum: 2025.05.23
08:05:34 +02'00'

Ul. školní - sanace vozovky

ETAPA IVa

	vjezdy	135,4 m ²
	vozovka	1099 m ²

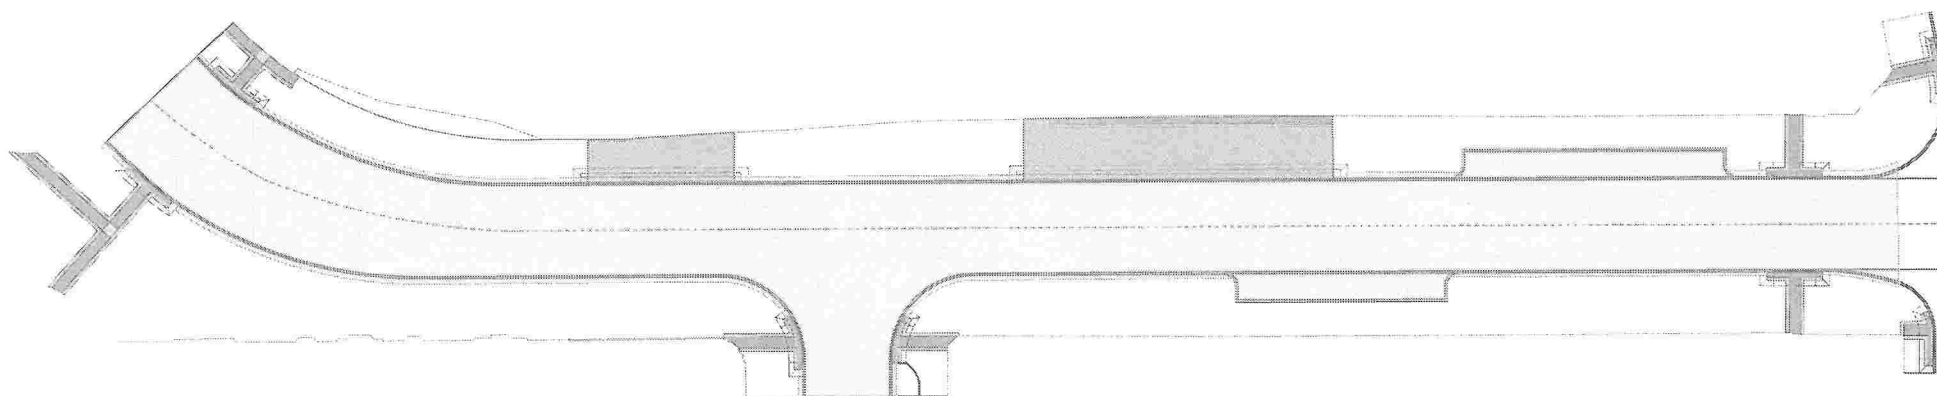

AKCE:			ČÍSLO ZAKÁZKY:	—
Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov			DATUM:	—
			REVIZE:	00
ČÍSLO PŘÍLOHY:	NÁZEV PŘÍLOHY:	FORMÁT:		
—	Etapa IVa sanace vozovky	MĚŘÍTKO: —		

PETROM STAVBY, a.s.
p. Kasper Petr
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10

Věc: Stanovisko geotechnika k naměřeným únosnostem na stavbě **Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov.**

Na Vaši žádost byla ve dnech 9.4., 14.4. a 15.4.2025 provedena měření únosnosti statickou zatěžovací zkouškou, a to vždy v úrovni zemních plání dle projektové dokumentace. Veškeré níže uvedené statické zatěžovací zkoušky probíhaly v jízdním pruhu u č.p. 1903/19 a 3668/1..

S ohledem na zastižené zeminy (materiály) v podloží a naměřené únosnosti navrhuji následující postup prací – viz další text.

Požadavek projektové dokumentace

Dle projektové dokumentace je požadována únosnost zemní pláně komunikace v ulici Školní - $E_{def,2} > 45 \text{ MPa}$ a zároveň poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,2} < 2,5$.

Zjištění na stavbě dne 9.4.2025

- Naměřená hodnota modulu přetvárnosti (na stávajícím podloží) $E_{def,2} = 40,1 \text{ MPa}$ (viz Protokol o zkoušce č. ZZcš 1/25/106) **NESPLŇUJE** požadavek na únosnost zemní pláně dle PD - $E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$, poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,2} = 2,22$ **SPLŇUJE** požadavek dle PD - $E_{def,2} / E_{def,2} \leq 2,5$.
- Naměřená hodnota modulu přetvárnosti (na stávajícím podloží) $E_{def,2} = 38,9 \text{ MPa}$ (viz Protokol o zkoušce č. ZZcš 2/25/107) **NESPLŇUJE** požadavek na únosnost zemní pláně dle PD - $E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$, poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,2} = 1,89$ **SPLŇUJE** požadavek dle PD - $E_{def,2} / E_{def,2} \leq 2,5$.
- Naměřená hodnota modulu přetvárnosti (na stávajícím podloží) $E_{def,2} = 25,3 \text{ MPa}$ (viz Protokol o zkoušce č. ZZcš 3/25/108) **NESPLŇUJE** požadavek na únosnost zemní pláně dle PD - $E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$, poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,2} = 2,52$ **SPLŇUJE** požadavek dle PD - $E_{def,2} / E_{def,2} \leq 2,5$.

Návrh vedení stavby pro další postup

1. Zemní pláň bude přetěžena o 0,50m (odtěžení neúnosných navážek).
2. Pro sanační vrstvu bude použit betonový recyklát frakce 0/63 mm v tloušťce 0,50m, hutněný ve 2 vrstvách po 0,25 m (po zhutnění) těžkou vibrační deskou.
3. Po realizaci sanačního polštáře budou opakována měření únosnosti zemní pláně.

Zjištění na stavbě dne 14.4.2025

- Naměřená hodnota modulu přetvárnosti (na sanačním polštáři) $E_{def,2} = 29,9 \text{ MPa}$ (viz Protokol o zkoušce č. ZZcš 4/25/121) **NESPLŇUJE** požadavek na únosnost zemní pláň dle PD - $E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$, poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,2} = 2,29$ **SPLŇUJE** požadavek dle PD - $E_{def,2} / E_{def,2} \leq 2,5$.
- Naměřená hodnota modulu přetvárnosti (na sanačním polštáři) $E_{def,2} = 46,3 \text{ MPa}$ (viz Protokol o zkoušce č. ZZcš 5/25/122) **SPLŇUJE** požadavek na únosnost zemní pláň dle PD - $E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$, poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,2} = 2,26$ **SPLŇUJE** požadavek dle PD - $E_{def,2} / E_{def,2} \leq 2,5$.

Stanovisko geotechnika k naměřeným rozdílným únosnostem

1. V místě **SZZ č. 4** byla vykopána sonda až na úroveň pod sanační vrstvu, tzn. na paraplán – viz foto v přílohouvé části. Zde byly ještě zastiženy mokré neúnosné navážky v mocnosti cca 150 – 200 mm. Pod nimi se již vyskytovalo ulehle únosné podloží. Tyto navážky byly i přes mocnou sanační vrstvu příčinou nedosažení požadované únosnosti.
2. V místě **SZZ č. 5** byla rovněž vykopána sonda až na úroveň pod sanační vrstvu, tzn. na paraplán – viz foto v přílohouvé části. Zde byly také zastiženy neúnosné navážky v mocnosti cca 150 – 200 mm. Avšak v části pod místem zkoušky byly vyskládány cihly (viz foto v přílohouvé části), které pozitivně ovlivnily výsledek zkoušky.
3. Operativně bylo na místě rozhodnuto o dalším navýšení mocnosti sanačního polštáře, a to na celkovou vrstvu 0,65 m. Po realizaci tohoto opatření bude nově provedeno měření SZZ.

Zjištění na stavbě dne 14.4.2025

- Naměřená hodnota modulu přetvárnosti (na zesíleném sanačním polštáři) $E_{def,2} = 99,5 \text{ MPa}$ (viz Protokol o zkoušce č. ZZcš 6/25/124) **SPLŇUJE** požadavek na únosnost zemní pláň dle PD - $E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$, poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,2} = 1,83$ **SPLŇUJE** požadavek dle PD - $E_{def,2} / E_{def,2} \leq 2,5$.

Kopie: vlastní

Přílohy: protokoly o zkouškách č. ZZcš 1 – 3, 2.strany protokolů o zkouškách
ZZcš 4 – 6
fotodokumentace dle textu

V Klášterci n. Ohří 4.5.2025

Ladislav Potůček
geotechnik, vedoucí zkušební laboratoře

Ladislav
Potůček

Digitálně podepsal Ladislav Potůček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28710835,
o=LAPo zkušební laboratoř s.r.o., ou=1,
cn=Ladislav Potůček, sn=Potůček,
givenName=Ladislav,
serialNumber=P891229
Datum: 2025.05.04 22:31:51 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Školní Chomutov
Objekt: D1 - Dodatek č. 1

Soupis: Změna 1 - Úprava sanace Etapa 4a

Místo: Chomutov Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Jiří Blochin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 123 287,01

D HSV Práce a dodávky HSV 123 287,01

D 1 Zemní práce 89 843,21

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-571,221	85,00	-48 553,79	
	W		"Odpočet odkopu" -571,221		-571,221			
	W		Součet		-571,221			
2	K	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	555,750	232,00	128 934,00	CS ÚRS 2025 01
	W		"Odpočet pruhu nad kanalizací" -122*2*0,65		-158,600			
	W		"Hloubení rýhy" 1099*0,65		714,350			
	W		Součet		555,750			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,250	200,00	1 250,00	
	W		"Rýha" 555,75		555,750			
	W		"Odkop" -549,5		-549,500			
	W		Součet		6,250			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,250	7,00	218,75	
	W		6,25*5		31,250			
	W		Součet		31,250			
5	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	128,250	54,00	6 925,50	
	W		"Navýšení tl. AZ Etapa 4a o 15 cm" (1099-122*2)*0,15		128,250			
	W		Součet		128,250			
6	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	-1 055,925	250,00	-263 981,25	
	W		"Sanace Etapa 4a odpočet sanačního materiálu" - (1099*0,65*1,9-122*2*0,65*1,9)		-1 055,925			
	W		Součet		-1 055,925			
7	M	58981144	recyklát betonový 0/125	t	1 055,925	250,00	263 981,25	
	W		"Sanace Etapa 4a změna sanačního materiálu" 1099*0,65*1,9-122*2*0,65*1,9		1 055,925			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,875	90,00	1 068,75	
	W		6,25*1,9		11,875			
	W		Součet		11,875			
D 5			Komunikace pozemní				33 443,80	
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-135,400	165,00	-22 341,00	
	W		"sanace vjezdů Etapa 4a plocha dle GZ" -135,4		-135,400			
10	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	135,400	412,00	55 784,80	CS ÚRS 2024 02
	W		"sanace vjezdů Etapa 4a plocha dle GZ" 135,4		135,400			

PRŮH NAD KANALIZACÍ 5 2M

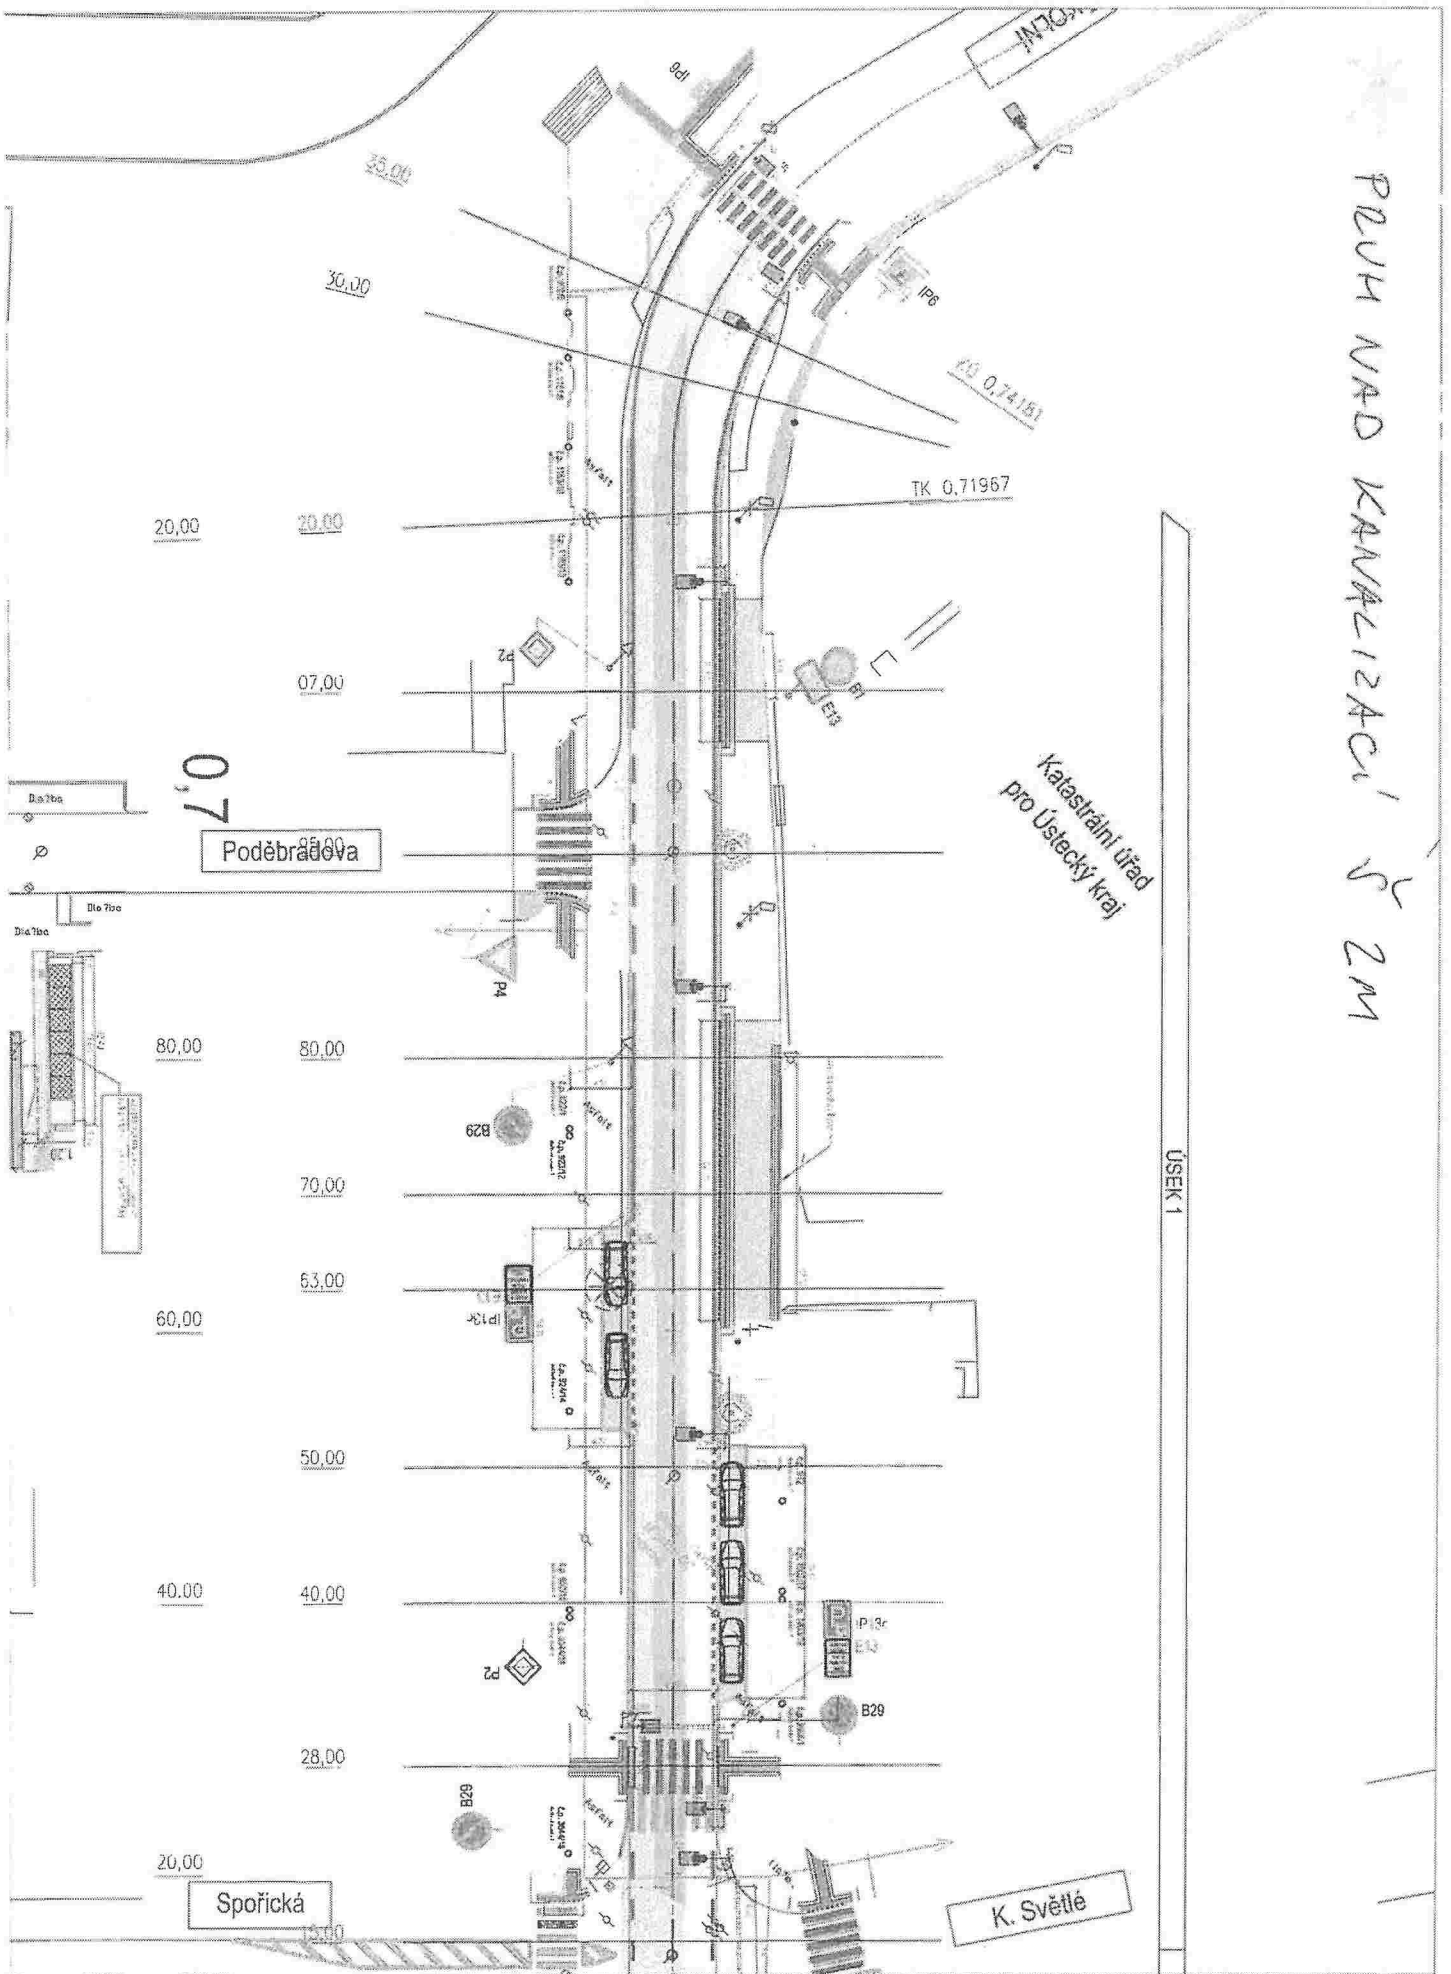



PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611 DIČ: CZ699006672

**Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20765
ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018**

**Statutární město Chomutov
Ing. Marian Trubiroha
Správce stavby**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 05.06.2025

Vyřizuje: Jiří Blochin

E-mail: blochin@silnicetopolany.cz

Mobil: +420 602 233 080

Stavba: Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov

Věc: Oznámení okolnosti č.2 – úprava nadzemních kontejnerů

Na základě vzájemně uzavřené Smlouvy o dílo, ev. č. d202400468 na akci Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov, předkládáme Oznámení okolnosti č.2 dle Smluvních podmínek, čl. 6.1 – Povinnost včasného varování, kdy „Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu, zpozdit provádění Díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování.“

Na základě požadavku Objednatele a dle požadavku zástupce odpadového hospodářství TSMCH budou provedeny úpravy nadzemních kontejnerů 2 m3 :

"Umístění A" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks

"Umístění B" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks

"Umístění C" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks

"Umístění D" provedení TRIPLE - PLAST+SKLO+BIO (3x vana 300 l) 1 ks

Tyto uvedené okolnosti nebudou mít vliv na Dobu pro dokončení, ale mají vliv na cenu Díla.

Zhotovitel předkládá rozpočet návrhu této Variace ve výši 103.500,00 Kč bez DPH.

Jiří Blochin
Zástupce zhotovitele


*Přílohy: Požadavek Objednatele
Specifikace odpadu dle stanovišť
Rozpočet Variace č.2
Kalkulace nové položky
Cenová nabídka dodavatele kontejnerů*

**Jiří
Blochin**


Digitálně podepsal
Jiří Blochin
Datum: 2025.06.05
09:27:57 +02'00'

KONTEJNERY ŠKOLNÍ


UMÍSTĚNÍ "A"	vedle ZŠ Chomutov, Školní		druh odpadu
	polopodzemní	5 m ³	SKO
	polopodzemní	5 m ³	PAPÍR
	polopodzemní	5 m ³	PLASTY
DUO PROVEDENÍ	nadzemní	2 m ³	SKLO + BIO (vak + pevná vana 500l)
	nadzemní	2 m ³	PAPÍR

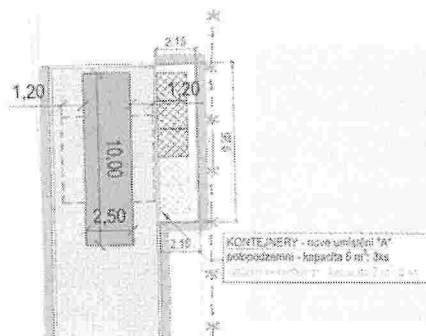


UMÍSTĚNÍ "B"	ulice Vodních staveb		druh odpadu
	nadzemní	2 m ³	SKO
	nadzemní	2 m ³	PAPÍR
	nadzemní	2 m ³	PLASTY
DUO PROVEDENÍ	nadzemní	2 m ³	SKLO + BIO (vak + pevná vana 500l)
	nadzemní	2 m ³	PLASTY

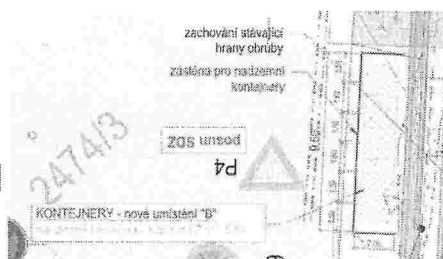

UMÍSTĚNÍ "C"	u garáží u ulice Poděbradova		druh odpadu
	polopodzemní	5 m ³	SKO
	polopodzemní	5 m ³	SKO
	polopodzemní	5 m ³	PAPÍR
	polopodzemní	5 m ³	PAPÍR
	polopodzemní	5 m ³	PLASTY
	polopodzemní	5 m ³	PLASTY
DUO PROVEDENÍ	nadzemní	2 m ³	SKLO + BIO (vak + pevná vana 500l)

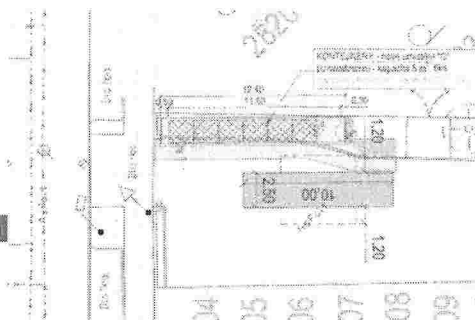

UMÍSTĚNÍ "D"	ulice Mjr. Šulce		druh odpadu
	nadzemní	2 m ³	SKO
	nadzemní	2 m ³	PAPÍR
TRIPLE PROVEDENÍ	nadzemní	2 m ³	PLAST + BIO + SKLO 3x vana 500l

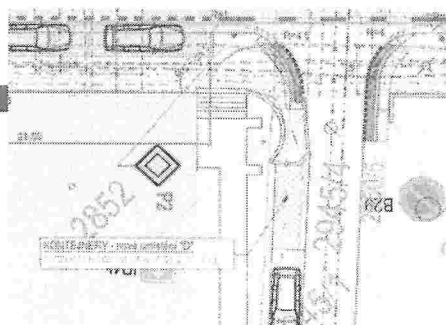

NÁVRH - CELKEM

SKO =	12000 l
PAPÍR =	12000 l
PLASTY =	12000 l
SKLO =	9000 l
BIOODPAD =	9000 l

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Školní Chomutov
Objekt: ZL2 - Úprava nadzemních kontejnerů

Místo: Chomutov Datum: 05.06.2025
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: ADVISIA s.r.o.
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Jiří Blochin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							103 500,00	
D N00 Nepojmenované práce							103 500,00	
D N01 Nepojmenovaný díl							103 500,00	
1	K	R6985498R1	Nadzemní kontejner 2m3 - provedení DUO a TRIPLE	KPL	1,000	103 500,00	103 500,00	kalkulace

R6985498R1

TOV 000

TOV 000

MJ KPL

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

[illegible]

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:	Chomutov ul. Školní - úpravy kontejnerů dle požadavku Objednatel	P24-049	Petrom stavby		
SO 101.1	Kontejnery				
R6985498R1	Nadzemní kontejner 2m3 - příplatek za DUO PROVEDENÍ	ks	3,000	20 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	Nadzemní kontejner 2m3, referenční výrobek - Molok Domino				
	"Umístění A" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks				
	"Umístění B" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks				
	"Umístění C" provedení DUO - SKLO+BIO (vak+pevná vana 500 l) 1 ks				
R6985498R2	Nadzemní kontejner 2m3 - TRIPLE PROVEDENÍ	ks	1,000	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Nadzemní kontejner 2m3, referenční výrobek - Molok Domino				
	"Umístění D" provedení TRIPLE - PLAST+SKLO+BIO (3x vana 300 l) 1 ks				
	Celkem bez DPH				90 000,00 Kč

V Roudnici nad Labem dne 3.6.2025

